


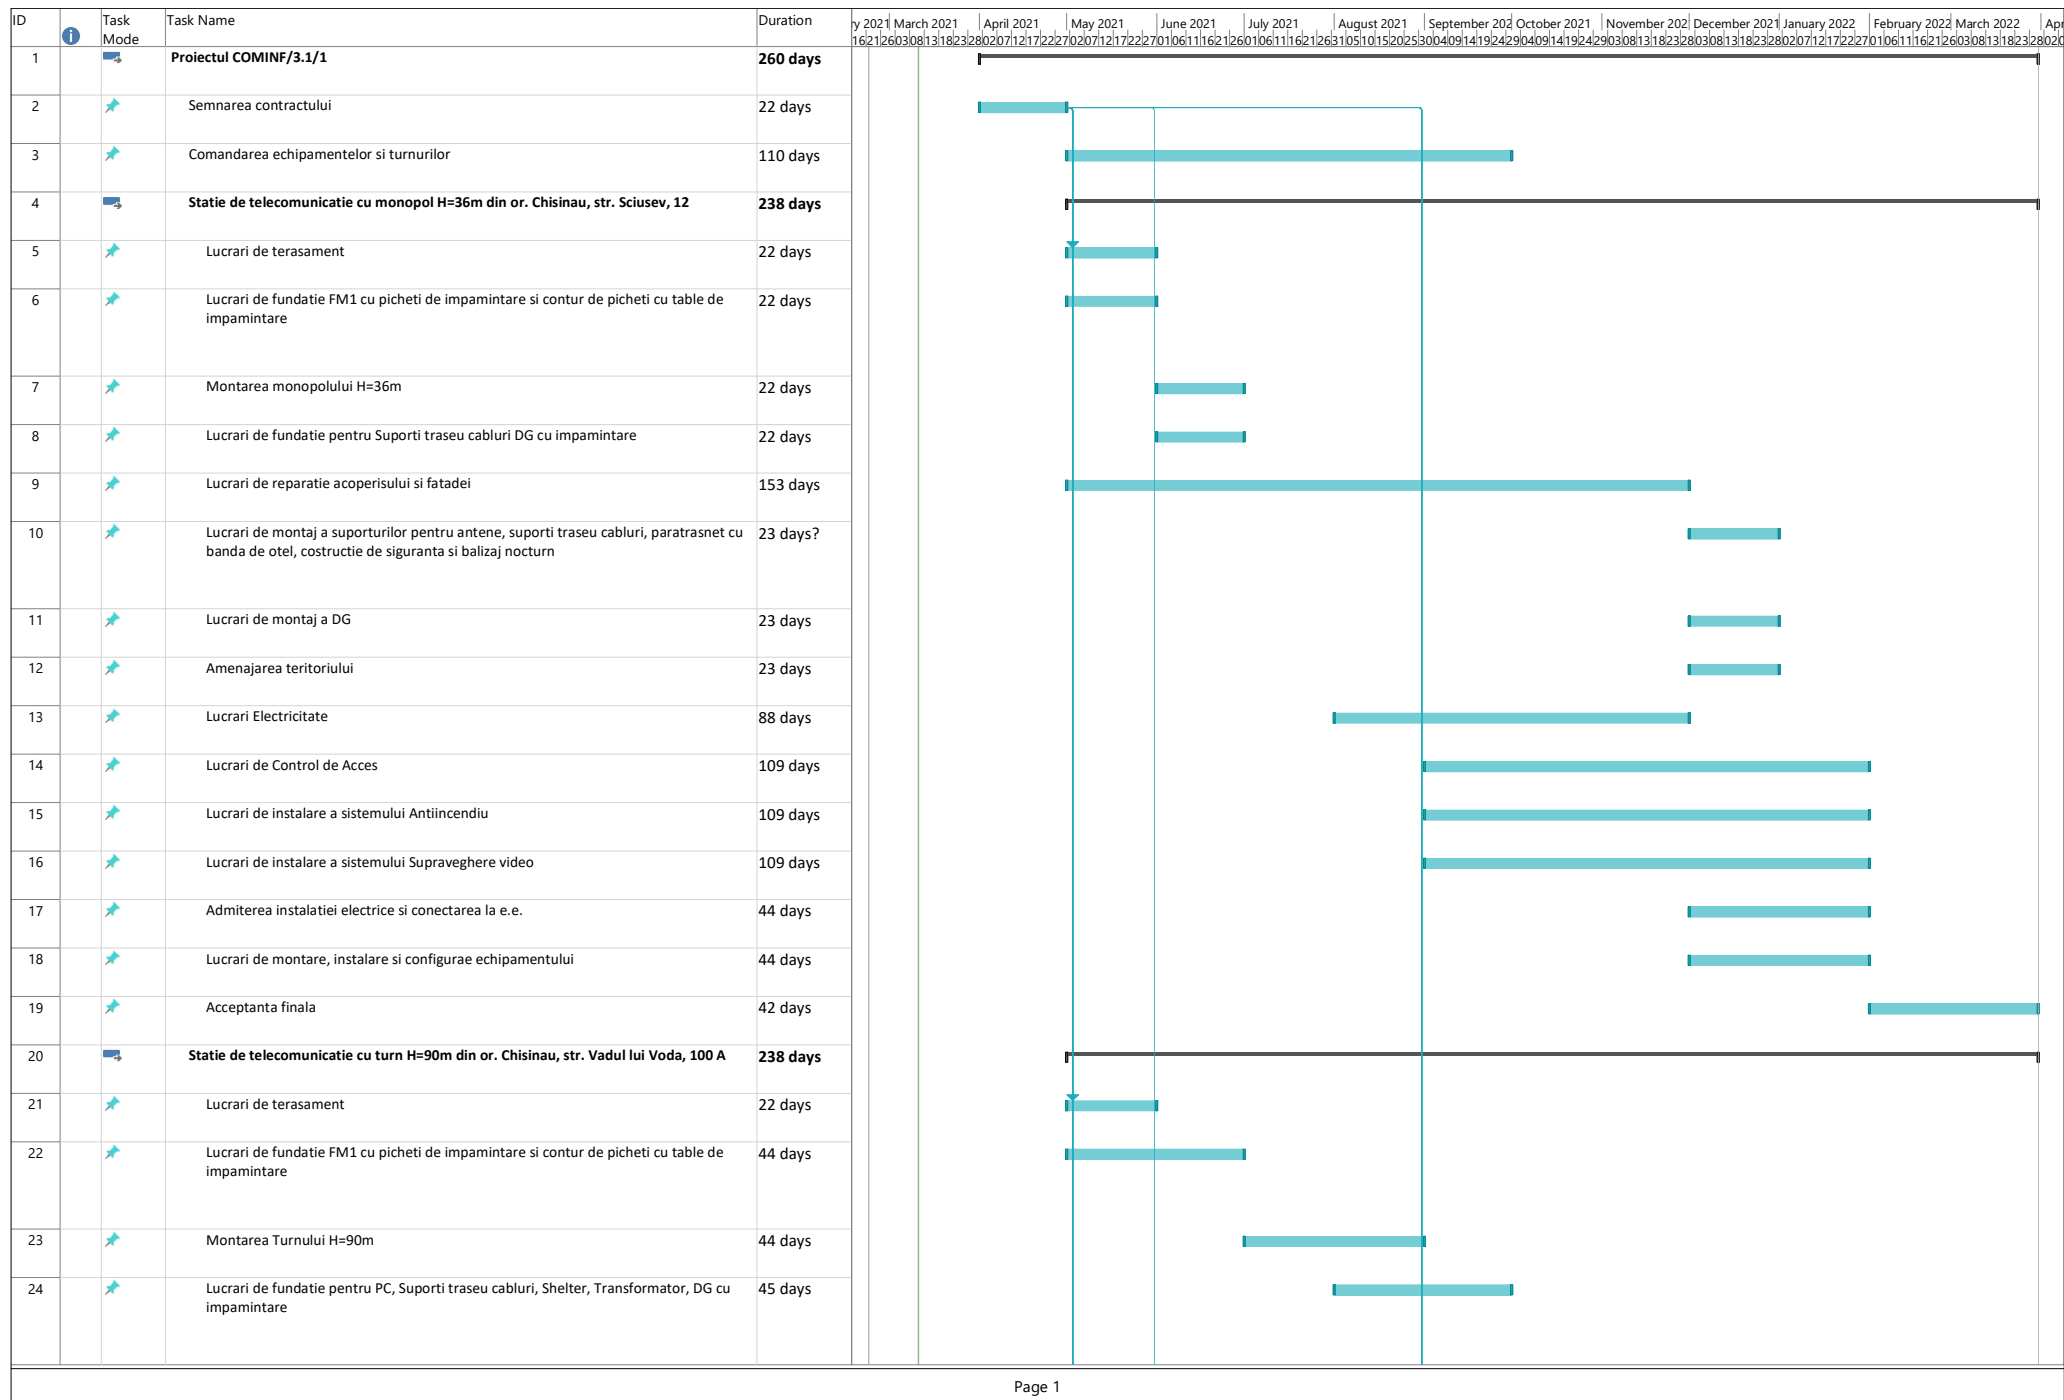

[illegible]

[illegible]

ID	Task Mode	Task Name	Duration	y 2021	March 2021	April 2021	May 2021	June 2021	July 2021	August 2021	September 2021	October 2021	November 2021	December 2021	January 2022	February 2022	March 2022	April 2022
119		Lucrari de montaj a suporturilor pentru antene, suporti traseu cabluri, paratrasnet cu banda de otel, constructie de siguranta si balizaj nocturn	23 days															
120		Lucrari de montaj a DG si Shelter	23 days															
121		Lucrări de instalare a gardurilor	23 days															
122		Amenajarea teritoriului	23 days															
123		Lucrari Electricitate	88 days															
124		Lucrari de Control de Acces	109 days															
125		Lucrari de instalare a sistemului Antiincendiu	109 days															
126		Lucrari de instalare a sistemului Supraveghere video	109 days															
127		Admiterea instalatiei electrice si conectarea la e.e.	44 days															
128		Lucrari de montare, instalare si configurare echipamentului	44 days															
129		Acceptanta finala	42 days															
130		Statie de telecomunicatie cu turn H=50m in s. Gura Cainarului, r. Floresti	238 days															
131		Lucrari de terasament	44 days															
132		Lucrari de fundatie FM1 cu picheti de impamintare si contur de picheti cu table de impamintare	67 days															
133		Montarea Turnului H=50m	109 days															
134		Lucrari de fundatie pentru PC, Suporti traseu cabluri, Shelter, Transformator, DG cu impamintare	88 days															
135		Lucrari de montaj a suporturilor pentru antene, suporti traseu cabluri, paratrasnet cu banda de otel, constructie de siguranta si balizaj nocturn	23 days															
136		Lucrari de montaj a DG si Shelter	23 days															
137		Lucrări de instalare a gardurilor	23 days															
138		Amenajarea teritoriului	23 days															
139		Lucrari Electricitate	88 days															
140		Lucrari de Control de Acces	109 days															
141		Lucrari de instalare a sistemului Antiincendiu	109 days															
142		Lucrari de instalare a sistemului Supraveghere video	109 days															

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Timeline
143		🚀	Admiterea instalatiei electrice si conectarea la e.e.	44 days	
144		🚀	Lucrari de montare, instalare si configurare echipamentului	44 days	
145		🚀	Acceptanta finala	42 days	
146		🏗️	Statie de telecomunicatii cu turn H=50m din or. Ocnița, str. Burebista, 49	238 days	
147		🚀	Lucrari de terasament	44 days	
148		🚀	Lucrari de fundatie FM1 cu picheti de impamintare si contur de picheti cu table de impamintare	67 days	
149		🚀	Montarea Turnului H=50m	109 days	
150		🚀	Lucrari de fundatie pentru PC, Suporti traseu cabluri, Shelter, Transformator, DG cu impamintare	88 days	
151		🚀	Lucrari de montaj a suporturilor pentru antene, suporti traseu cabluri, paratrasnet cu banda de otel, constructie de siguranta si balizaj nocturn	23 days	
152		🚀	Lucrari de montaj a DG si Shelter	23 days	
153		🚀	Lucrări de instalare a gardurilor	23 days	
154		🚀	Amenajarea teritoriului	23 days	
155		🚀	Lucrari Electricitate si LAN	65 days	
156		🚀	Lucrari de Control de Acces	109 days	
157		🚀	Lucrari de instalare a sistemului Antiincendiu	109 days	
158		🚀	Lucrari de instalare a sistemului Supraveghere video	109 days	
159		🚀	Admiterea instalatiei electrice si conectarea la e.e.	44 days	
160		🚀	Lucrari de montare, instalare si configurare echipamentului	44 days	
161		🚀	Acceptanta finala	42 days	
162		🏗️	Statie de telecomunicatii cu turn H=50m din or. Donduseni, str. Independentei, 43	238 days	
163		🚀	Lucrari de terasament	44 days	
164		🚀	Lucrari de fundatie FM1 cu picheti de impamintare si contur de picheti cu table de impamintare	67 days	
165		🚀	Montarea Turnului H=50m	109 days	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	y 2021	March 2021	April 2021	May 2021	June 2021	July 2021	August 2021	September 2021	October 2021	November 2021	December 2021	January 2022	February 2022	March 2022	April 2022
166		Lucrari de fundatie pentru PC, Suporti traseu cabluri, Shelter, Transformator, DG cu impamintare	88 days															
167		Lucrari de montaj a suporturilor pentru antene, suporti traseu cabluri, paratrasnet cu banda de otel, constructie de siguranta si balizaj nocturn	23 days															
168		Lucrari de montaj a DG si Shelter	23 days															
169		Lucrări de instalare a gardurilor	23 days															
170		Amenajarea teritoriului	23 days															
171		Lucrari Electricitate si LAN	65 days															
172		Lucrari de Control de Acces	109 days															
173		Lucrari de instalare a sistemului Antiincendiu	109 days															
174		Lucrari de instalare a sistemului Supraveghere video	109 days															
175		Admiterea instalatiei electrice si conectarea la e.e.	44 days															
176		Lucrari de montare, instalare si configurare echipamentului	44 days															
177		Acceptanta finala	42 days															
178		Statie de telecomunicatie cu turn H=90m in s. Grinauti, r. Ocnița	238 days															
179		Lucrari de terasament	22 days															
180		Lucrari de fundatie FM1 cu picheti de impamintare si contur de picheti cu table de impamintare	67 days															
181		Montarea Turnului H=90m	44 days															
182		Lucrari de fundatie pentru PC, Suporti traseu cabluri, Shelter, Transformator, DG cu impamintare	45 days															
183		Lucrari de montaj a suporturilor pentru antene, suporti traseu cabluri, paratrasnet cu banda de otel, constructie de siguranta si balizaj nocturn	23 days															
184		Lucrari de montaj a DG si Shelter	23 days															
185		Lucrări de instalare a gardurilor	23 days															
186		Amenajarea teritoriului	23 days															
187		Lucrari Electricitate si LAN	65 days															
188		Lucrari de Control de Acces	109 days															

ID	Task Mode	Task Name	Duration	y 2021	March 2021	April 2021	May 2021	June 2021	July 2021	August 2021	September 2021	October 2021	November 2021	December 2021	January 2022	February 2022	March 2022	April 2022
189		Lucrari de instalare a sistemului Antiincendiu	109 days															
190		Lucrari de instalare a sistemului Supraveghere video	109 days															
191		Admiterea instalatiei electrice si conectarea la e.e.	44 days															
192		Lucrari de montare, instalare si configurare echipamentului	44 days															
193		Acceptanta finala	42 days															
194		Statie de telecomunicatie cu turn H=90m din or. Criuleni, str. 31 August 1989, 72	238 days															
195		Lucrari de terasament	22 days															
196		Lucrari de fundatie FM1 cu picheti de impamintare si contur de picheti cu table de impamintare	67 days															
197		Montarea Turnului H=90m	44 days															
198		Lucrari de fundatie pentru PC, Suporti traseu cabluri, Shelter, Transformator, DG cu impamintare	88 days															
199		Lucrari de montaj a suporturilor pentru antene, suporti traseu cabluri, paratrasnet cu banda de otel, constructie de siguranta si balizaj nocturn	23 days															
200		Lucrari de montaj a DG si Shelter	23 days															
201		Lucrări de instalare a gardurilor	23 days															
202		Amenajarea teritoriului	23 days															
203		Lucrari Electricitate si LAN	88 days															
204		Lucrari de Control de Acces	109 days															
205		Lucrari de instalare a sistemului Antiincendiu	109 days															
206		Lucrari de instalare a sistemului Supraveghere video	109 days															
207		Admiterea instalatiei electrice si conectarea la e.e.	44 days															
208		Lucrari de montare, instalare si configurare echipamentului	44 days															
209		Acceptanta finala	42 days															
210		Statie de telecomunicatie cu turn H=50m din or. Orhei, str. Vasile Mahu, 144	238 days															
211		Lucrari de terasament	44 days															
212		Lucrari de fundatie FM1 cu picheti de impamintare si contur de picheti cu table de impamintare	66 days															

ID	 Task Mode	Task Name	Duration	January 2021	March 2021	April 2021	May 2021	June 2021	July 2021	August 2021	September 2021	October 2021	November 2021	December 2021	January 2022	February 2022	March 2022	April 2022
280		Amenajarea teritoriului	23 days															
281		Lucrari Electricitate si LAN	43 days															
282		Lucrari de Control de Acces	87 days															
283		Lucrari de instalare a sistemului Antiincendiu	87 days															
284		Lucrari de instalare a sistemului Supraveghere video	87 days															
285		Admiterea instalatiei electrice si conectarea la e.e.	44 days															
286		Lucrari de montare, instalare si configurare echipamentului	44 days															
287		Acceptanta finala	42 days															
288		Statia de telecomunicatii cu pilon existent H=22, din or. Soldanesti, str. Victoriei, 30	151 days															
289		Lucrari de terasament	22 days															
290		Lucrari de fundatie pentru PC, Suporti traseu cabluri, Shelter, Transformator, DG cu impamintare	43 days															
291		Lucrari de montaj a suporturilor pentru antene, suporti traseu cabluri, paratrasnet cu banda de otel, constructie de siguranta si balizaj nocturn	23 days															
292		Lucrari de montaj a DG si Shelter	23 days															
293		Amenajarea teritoriului	23 days															
294		Lucrari Electricitate si LAN	43 days															
295		Lucrari de Control de Acces	87 days															
296		Lucrari de instalare a sistemului Antiincendiu	87 days															
297		Lucrari de instalare a sistemului Supraveghere video	87 days															
298		Admiterea instalatiei electrice si conectarea la e.e.	44 days															
299		Lucrari de montare, instalare si configurare echipamentului	44 days															
300		Acceptanta finala	42 days															
301		Statie de telecomunicatie cu piloneta H=6.0m in or. Drochia, str.31 august 1989,7/1	151 days															
302		Lucrari de terasament	22 days															
303		Lucrari de fundatie FM1 cu picheti de impamintare si contur de picheti cu table de impamintare	44 days															

ID	Task Mode	Task Name	Duration	September 2021	October 2021	November 2021	December 2021	January 2022	February 2022	March 2022	April 2022
304		Montarea Pilonetului H=6m	43 days								
305		Lucrari de fundatie pentru PC, Suporti traseu cabluri, Shelter, Transformator, DG cu impamintare	43 days								
306		Lucrari de montaj a suporturilor pentru antene, suporti traseu cabluri, paratrasnet cu banda de otel, constructie de siguranta si balizaj nocturn	23 days								
307		Lucrari de montaj a DG si Shelter	23 days								
308		Amenajarea teritoriului	23 days								
309		Lucrari Electricitate si LAN	43 days								
310		Lucrari de Control de Acces	87 days								
311		Lucrari de instalare a sistemului Antiincendiu	87 days								
312		Lucrari de instalare a sistemului Supraveghere video	87 days								
313		Admiterea instalatiei electrice si conectarea la e.e.	44 days								
314		Lucrari de montare, instalare si configurare echipamentului	44 days								
315		Acceptanta finala	42 days								
316		Statie de telecomunicatie cu piloneta H=9.0m in or. Briceni, str. Independentei, 46.	151 days								
317		Lucrari de terasament	22 days								
318		Lucrari de fundatie FM1 cu picheti de impamintare si contur de picheti cu table de impamintare	44 days								
319		Montarea Pilonetului H=9 m	43 days								
320		Lucrari de fundatie pentru PC, Suporti traseu cabluri, Shelter, Transformator, DG cu impamintare	43 days								
321		Lucrari de montaj a suporturilor pentru antene, suporti traseu cabluri, paratrasnet cu banda de otel, constructie de siguranta si balizaj nocturn	23 days								
322		Lucrari de montaj a DG si Shelter	23 days								
323		Amenajarea teritoriului	23 days								
324		Lucrari Electricitate si LAN	43 days								
325		Lucrari de Control de Acces	87 days								
326		Lucrari de instalare a sistemului Antiincendiu	87 days								

Project: COMINF Constructie
Date: Thu 11.03.21

Task
Split
Milestone
Summary



Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary



Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary



Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone



Deadline
Progress
Manual Progress

