

I. GENERAL CONTRACT DATA	INTERIM PAYMENT STATEMENT		No:	2	from:	2 noiembrie 2021	until:	7 martie 2022
	Contract title:		N47899/W/02/2 Energy Efficiency Rehabilitation of 17 public Building Lot 3 Energy Efficiency Measures in 8 Lyceums		Contract code:	Lot 3		
	Contracting Authority:		City Hall of Chisinau		Contract Agreement:	47899/W/02/2 Lot 3		
	Contractor:		JVCA TEHNO TEST SRL					
Consultant:		JV Eptisa Romania SRL - Eptisa Servicios de Ingenieria						
II. GENERAL FINANCIAL DATA	Contract Price	5 884 800,00	EUR	Start-date	19.04.2021			
	VAT	N/A EUR		End-date (time for completion)	19.04.2022			
	Advance (20%)	N/A EUR		Extension of the execution period	0 (days)			
	Instalments	sole instalment		Revised End-date	N/A			
	Total advance granted	N/A		Defect Notification Period (DNP)	365 (days)			
	Summary of Changes / Variations	0,00		End-date (including DNP)	19.04.2023			
according to the below points 14,15,16								
Revised Contract Price		0,00						
(according to addenda)								
III. SECURITIES			<i>Performance Security (10%)</i>		<i>Advance Return Guarantee (20% from the Contract Price)</i>			
	Bank Security value:	EUR	588 480,00	EUR	N/A			
	Expiration date:		21.06.2023		N/A			
	Bank for Securities:		CB "ProCredit Bank" S.A.			N/A		
IV. STRUCTURE OF THE PAYMENT APPLICATION (according Sub-Clause 14.3)	Index	Sub-Clause						
	1	14.3 a)	Total Value of the executed works -excluding VO (Annex A - Annex E)		816 744,00			
	2	14.3 b)	Additions or deductions acc. Sub-Clause 13.7 [Amendments for changes in legislation] or 13.8 [Adjustment for changes in cost]		0,00			
	3	14.3 c)	Retention Money					
	4		Limit of Retention Money (5% - acc. Appendix to tender)		294 240,00			
	5		Retention made in this Certificate		40 837,20			
	5		Total Retention made to date		222 352,85			
	6	14.9	Release of Retention Money					
	7				First half 0,00			
	7				Second half 0,00			
	8		Total Release of Retention Money		0,00			
	9	14.3 d)	Advance					
	9		14.2 Advance granted		0,00			
	10		14.2 b) Advance repayment in this certificate		0,00			
	11		Total advance returned to date		0,00			
	12		Advance remaining to be returned		0,00			
	12	14.3 e)	Additions or Deductions for Equipments and Materials					
	13		acc. Sub-Clause 14.5 [Equipments and Materials intended for Works]		0,00			
14	14.3 f)	Additions or Deductions for Changes						
14	14.3 f)-1	acc. Clause 13 [Changes and Updates]		0,00				
15	14.3 f)-2	acc. Sub-Clause 20.1 [Contractor's Claims]		0,00				
16	14.3 f)-3	acc. Sub-Clause 2.5 [Beneficiary's Claims]		0,00				
17		SUBTOTAL		775 906,80				
18	14.3 g)	Deduction of the cumulative value of the previously issued Payment Certificates		0,00				
V. AMOUNT PAYABLE			NET AMOUNT REQUESTED FOR PAYMENT		775 906,80 EUR			
			Note: The minimum amount of Interim Payment Certificate (acc. Appendix to Tender)		300 000 EUR			
VI. DATE	DETAILS RELATED TO STATEMENT ISSUANCE							
	Payment Application / Contractor's Works Statement issued on: 07.03.2022							
VII. SIGNATURES	ISSUED AND SIGNED BY THE CONTRACTOR							
	Contractor's Representative	Date:	07.03.2022	Other person from the Contractor	Date:	07.03.2022		
Gheorghe BURDILA, director		Lurii ZAMA, Contract Manager						



GRCF CHISINAU BUILDINGS SUB-PROJECT
Tranche I. Energy Efficiency Measures in 17 public buildings
Works Contract for Lot 3 (47899/W/02/2 Lot 3) Energy Efficiency Measures in 8 lyceums

Contractor: JVCA Techno Test S.R.L.
Employer: Chisinau City Hall

Annex 1 to INTERIM PAYMENT STATEMENT Nr. 2

Methodology of calculations according to Schedule of Payments

Schedule of Payments - Construction works - cumulative works certified

Item	Description	Total Contract Price	Cumulative Works certified		% of works already paid according to GCC 14.4 Schedule of payments	% of works to be paid according to GCC 14.4 Schedule of payments	Payment amount
			Euro	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TOTAL SECTION 1. Lyceum "Nicolae Sulac"	1069771	88%	938 021.40	50%	25%	267 442.75
2	TOTAL SECTION 2. Lyceum "VASILE ALECSANDRI"	635885	77%	486 963.00	50%	25%	158 971.25
3	TOTAL SECTION 3. Art Theoretical High School "Elena Alistar"	508190	83%	422 140.00	50%	25%	127 047.50
4	TOTAL SECTION 4. Lyceum B.P.Hasdeu	1243160	83%	1 032 630.00	75%	0%	-
5	TOTAL SECTION 5. Lyceum "V. Lupu"	729560	84%	615 560.00	75%	0%	-
6	TOTAL SECTION 6. Lyceum "Natalia Dadiani 1"	555090	77%	424 990.00	75%	0%	-
7	TOTAL SECTION 7. Lyceum "Natalia Dadiani 2"	282010	81%	227 710.00	75%	0%	-
8	TOTAL SECTION 8. Lyceum "Vasile Vasilache"	526565	87%	458 085.00	25%	50%	263 282.50
	GRAND TOTAL	5 550 231.00	83%	4 606 099.40			816 744.00


Schedule of Payments - Design works

Item	Description	Total Contract Price	Cumulative Works certified		% of works already paid according to GCC 14.4 Schedule of payments	% of works to be paid according to GCC 14.4 Schedule of payments	Payment amount
			Euro	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TOTAL SECTION 1. Lyceum "Nicolae Sulac"	63673	100%	63673.00	85%	0%	-
2	TOTAL SECTION 2. Lyceum "VASILE ALECSANDRI"	39688	85%	33734.80	85%	0%	-
3	TOTAL SECTION 3. Art Theoretical High School "Elena Alistar"	31342	100%	31342.00	85%	0%	-
4	TOTAL SECTION 4. Lyceum B.P.Hasdeu	78081	85%	66368.85	85%	0%	-
5	TOTAL SECTION 5. Lyceum "V. Lupu"	44520	100%	44520.00	85%	0%	-
6	TOTAL SECTION 6. Lyceum "Natalia Dadiani 1"	26760	85%	22746.00	85%	0%	-
7	TOTAL SECTION 7. Lyceum "Natalia Dadiani 2"	17970	85%	15274.50	85%	0%	-
8	TOTAL SECTION 8. Lyceum "Vasile Vasilache"	32535	100%	32535.00	85%	0%	-
	GRAND TOTAL	334 569.00	93%	310194.15		0.00	

Schedule of Payments - Summary

Item	Description	Total Contract Price	Amount for payment according to GCC 14.4 Schedule of payments
1	2	3	4
1	TOTAL ALL SECTIONS DESIGN WORKS	334 569.00	-
2	TOTAL ALL SECTIONS CONSTRUCTION WORKS	5 550 231.00	816 744.00
	GRAND TOTAL for Payment	5 884 800.00	816 744.00

Contractor: Techno Test S.R.L.
Director / Gh. Burdila
Manager Contract/ Iurii Zama
Stamp



2.5	Replacement of openings (windows and doors)	13	130	1690	100%	1690	0%	0	100%	1690	0%	1690	0%	0
2.6	Replacement of the heating system	1	125000	125000	95%	118750	5%	6250	100%	125000	0%	125000	0%	0
2.7	Installation of an individual heating substitution	1	15500	15500	100%	15500	0%	0	100%	15500	0%	15500	0%	0
2.8	Upgrade of the ventilation system	1	65000	65000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	65000
2.9	Installation of LED lamps	1	26000	26000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	26000
2.10	Installation of PV system	1	15400	15400	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	15400
2.11	Energy management system (Smart metering)	1	3300	3300	0%	0	66%	2178	66%	3300	34%	2178	34%	1122
2.12	Non-energy efficiency measures	1	138000	138000	70%	96600	0%	0	70%	96600	30%	96600	30%	41400
TOTAL (TO GRAND SUMMARY)			675573	675573	57%	387603,7	20%	133094,1	77%	520697,8	23%	154875,2		

SECTION 3, "Elena Alistar", Art Theoretical High School														
3	Design	1	31342	31342	85%	26640,7	0%	0	85%	26640,7	15%	4701,3		
3.1	Thermal insulation of walls	1968	55	108240	100%	108240	0%	0	100%	108240	0%	0	0%	0
3.2	Insulation of attic floors	2001	50	100050	50%	50025	50%	50025	100%	100050	0%	0	0%	0
3.3	Basement ceiling insulation and soole insulation	305	60	18300	100%	18300	0%	0	100%	18300	0%	0	0%	0
3.4	Replacement of openings (windows and doors)	10	220	2200	100%	2200	0%	0	100%	2200	0%	0	0%	0
3.5	Replacement of the heating system	1	68000	68000	100%	68000	0%	0	100%	68000	0%	0	0%	0
3.6	Installation of an individual heating substitution	1	15600	15600	100%	15600	0%	0	100%	15600	0%	0	80%	74400
3.7	Upgrade of the ventilation system	1	93000	93000	0%	0	20%	18600	20%	93000	0%	0	0%	0
3.8	Installation of LED lamps	1	16000	16000	100%	16000	0%	0	100%	16000	0%	0	0%	0
3.9	Installation of PV system	1	33000	33000	0%	0	80%	26400	80%	33000	20%	6600		
3.10	Energy management system (Smart metering)	1	3300	3300	33%	1089	67%	2211	100%	3300	0%	0	0%	0
3.11	Non-energy efficiency measures	1	50500	50500	90%	45450	0%	0	90%	45450	10%	5050		
3.12	TOTAL (TO GRAND SUMMARY)		539532	539532	65%	351544,7	18%	97236	83%	448780,7	17%	90751,3		

SECTION 4, Theoretical Lyceum B.P. Hasdeu														
4	Design	1	78081	78081	85%	66368,85	0%	0	85%	66368,85	15%	11712,15		
4.1	Thermal insulation of walls	4820	55	265100	98%	259798	2%	5502	100%	265100	0%	0	0%	0
4.2	Insulation of attic floors	1491	50	74550	100%	74550	0%	0	100%	74550	0%	0	0%	0
4.3	Insulation of flat roof	1603	70	112210	100%	112210	0%	0	100%	112210	0%	0	0%	0
4.4	Basement ceiling insulation and soole insulation	1158	60	69480	15%	10422	85%	59058	100%	69480	0%	0	0%	0
4.5	Replacement of openings (windows and doors)	714	130	92820	100%	92820	0%	0	100%	92820	0%	0	0%	0
4.6	Replacement of the heating system	1	250000	250000	95%	237500	5%	12500	100%	250000	0%	0	0%	0
4.7	Installation of an individual heating substitution	1	27000	27000	0%	0	100%	27000	100%	27000	0%	0	0%	0
4.8	Upgrade of the ventilation system	1	100000	100000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	100000
4.9	Installation of LED lamps	1	42000	42000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	42000
4.10	Installation of PV system	1	33000	33000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	33000
4.11	Installation new kitchen equipment	1	2500	2500	0%	0	100%	2500	100%	2500	0%	0	0%	0
4.12	Energy management system (Smart metering)	1	4500	4500	0%	0	66%	2970	66%	4500	34%	1530		
4.13	Non-energy efficiency measures	1	170000	170000	80%	136000	0%	0	80%	136000	20%	34000		
4.14	TOTAL (TO GRAND SUMMARY)		1321241	1321241	75%	989668,85	8%	109330	83%	1098998,85	17%	222242,15		

SECTION 5, Lyceum "V. Lupu"														
5	Design	1	44520	44520	85%	37842	0%	0	85%	37842	15%	6678		
5.1	Thermal insulation of walls	3077	55	169235	50%	84617,5	50%	84617,5	100%	169235	0%	0	0%	0
5.2	Insulation of flat roof	2092	70	146440	80%	117152	20%	29288	100%	146440	0%	0	0%	0
5.3	Basement insulation	2092	50	104600	100%	104600	0%	0	100%	104600	0%	0	0%	0
5.4	Replacement of openings (windows and doors)	711	135	95985	100%	95985	0%	0	100%	95985	0%	0	0%	0
5.5	District heating substitution improvement	1	16000	16000	100%	16000	0%	0	100%	16000	0%	0	0%	0
5.6	Modernisation of heating distribution system	1	79800	79800	100%	79800	0%	0	100%	79800	0%	0	0%	0
5.7	Installation of the ventilation system	1	90000	90000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	90000
5.8	Replacement of lamps with energy efficient	1	24000	24000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	24000
5.9	Energy Management System (Smart metering)	1	3500	3500	33%	1155	67%	2345	100%	3500	0%	0	0%	0
5.10	Non-energy efficiency measures	1	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
5.11	TOTAL (TO GRAND SUMMARY)		774080	774080	69%	537151,5	15%	116250,5	84%	653402	16%	120678		

SECTION 6, Lyceum "Natalia Dadiani 1"														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.1	Design	1	26760	26760	85%	22746	0	0	85%	22746	15%	4014
6.2	Thermal insulation of walls	3314	55	182270	100%	182270	0	0	100%	182270	0%	0
6.3	Thermal insulation of attic roof	1462	60	87720	90%	78948	8772	0	100%	87720	0%	0
6.4	Thermal insulation of plate roof	655	70	45850	98%	44933	917	0	100%	45850	0%	0
6.5	Replacement of openings (windows and doors)	475	130	61750	100%	61750	0	0	100%	61750	0%	0
6.6	Modernisation of heating distribution system	1	45000	45000	90%	40500	4500	0	100%	45000	0%	0
6.7	Installation of the ventilation system	1	64000	64000	0%	0	0	0	0%	0	100%	64000
6.8	Replacement of lamps with energy efficient	1	25500	25500	0%	0	0	0	0%	0	100%	25500
6.9	PV System	1	27500	27500	0%	0	0	0	0%	0	100%	3500
6.10	Energy Management System (Smart metering)	1	3500	3500	0%	0	0	0	0%	0	100%	3500
6.11	Non-energy efficiency measures	1	12000	12000	20%	2400	0	0	0%	2400	0%	9600
TOTAL (TO GRAND SUMMARY)				581850	75%	433547	14189	0	77%	447736	23%	134114
7 SECTION 7. Lyceum "Natalia Dadiani 2"												
7.1	Design	1	17970	17970	85%	15274,5	0	0	85%	15274,5	15%	2695,5
7.2	Thermal insulation of walls	1504	55	82720	92%	76102,4	6617,6	0	100%	82720	0%	0
7.3	Thermal insulation of roof	1216	60	72960	100%	72960	0	0	100%	72960	0%	0
7.5	Replacement of openings (windows and doors)	381	130	49530	100%	49530	0	0	100%	49530	0%	0
7.6	Heat distribution system rehabilitation	1	22500	22500	95%	21375	1125	0	100%	22500	0%	0
7.7	Ventilation system rehabilitation	1	36600	36600	0%	0	0	0	0%	0	100%	36600
7.8	Lighting system modernization	1	14200	14200	0%	0	0	0	0%	0	0%	14200
7.9	Energy management system (Smart metering)	1	3500	3500	0%	0	0	0	0%	0	100%	3500
TOTAL (TO GRAND SUMMARY)				299980	78%	235241,9	7742,6	0	81%	242984,5	19%	56995,5
8 SECTION 8. Lyceum "Vasile Vasilache"												
8.1	Design	1	32535	32535	85%	27654,75	0	0	85%	27654,75	15%	4880,25
8.2	Thermal insulation of walls	2197	55	120835	50%	60417,5	60417,5	0	100%	120835	0%	0
8.3	Thermal insulation of attic roof	1301	60	78060	0%	0	78060	0	100%	78060	0%	0
8.4	Thermal insulation of flat roof	913	70	63910	80%	51128	12782	0	100%	63910	0%	0
8.5	Replacement of openings (windows and doors)	462	130	60060	30%	18018	42042	0	100%	60060	0%	0
8.6	Installation of an individual heating station and heat distribution systems rehabilitation	1	90000	90000	100%	90000	0	0	100%	90000	0%	0
8.7	Ventilation system rehabilitation	1	71200	71200	0%	0	7120	0	10%	7120	90%	64080
8.8	Lighting system modernization	1	17000	17000	100%	17000	0	0	0%	17000	0%	0
8.9	Photovoltaic system installation	1	22000	22000	0%	0	17600	0	80%	17600	20%	4400
8.10	Energy management system (Smart metering)	1	3500	3500	33%	1155	2345	0	100%	3500	0%	0
TOTAL (TO GRAND SUMMARY)				559100	47%	264218,25	220366,5	0	87%	485739,75	13%	73360,25

Contractor: Techno Test S.R.L.
Director / Gh. Burdib
Manager Contract/ Iurii Zama
Stamp



GRCF CHISINAU BUILDINGS SUB-PROJECT
Tranche I, Energy Efficiency Measures in 17 public buildings
Works Contract for Lot 3 (47899/W/02/2 Lot 3) Energy Efficiency Measures in 8 lycceums

Contractor: JVCA Techno Test S.R.L.
Employer: Chisinau City Hall

Annex 3 to NTERIM PAYMENT STATEMENT Nr. 2

Methodology of calculations for Works certified during reporting period

Construction works

Item	Description	Qty.	Unit Price	Total Contract Price	Works certified before reporting period		Works certified during reporting period		Cumulative certified works		Outstanding works to be certified	
					Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
1	2											
1	TOTAL SECTION 1, Lyceum "Nicolae Sulac"			1069771	51%	543062	37%	394959,4	88%	938021,4	12%	131749,6
2	TOTAL SECTION 2, Lyceum "VASILE ALECSANDRI"			635885	56%	353868,9	21%	133094,1	77%	486963	23%	148922
3	TOTAL SECTION 3, Art Theoretical High School "Elena Alistar"			508190	64%	324904	19%	97236	83%	422140	17%	86050
4	TOTAL SECTION 4, Lyceum B.P. Hasdeu			1243160	74%	923300	9%	109330	83%	1032630	17%	210530
5	TOTAL SECTION 5, Lyceum "V. Lupu"			729560	68%	499309,5	16%	116250,5	84%	615560	16%	114000
6	TOTAL SECTION 6, Lyceum "Natalia Dadiani 1"			555090	74%	410801	3%	14189	77%	424990	23%	130100
7	TOTAL SECTION 7, Lyceum "Natalia Dadiani 2"			282010	78%	219967,4	3%	7742,6	81%	227710	19%	54300
8	TOTAL SECTION 8, Lyceum "Vasile Vasiliache"			526565	45%	237718,5	42%	220366,5	87%	458085	13%	68480
	GRAND TOTAL			5 550 231,00	63%	3512931,3	20%	1093168,1	83%	4606099,4	17%	944131,6

Item	Description	Qty.	Unit Price	Total Contract Price	Works certified before reporting period		Works certified during reporting period		Cumulative certified works		Outstanding works to be certified	
					Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
1	2											
1	SECTION 1, Lyceum "Nicolae Sulac"											
1.2	Thermal insulation of walls	3339	55	183645	70%	128551,5	30%	55093,5	100%	183645	0%	0
1.3	Thermal insulation of attic floors	2817	50	140850	35%	49297,5	65%	91552,5	100%	140850	0%	0
1.4	Insulation of flat roof	789	70	55230	80%	44184	20%	11046	100%	55230	0%	0
1.5	Basement ceiling insulation and soole insulation	4281	60	256860	10%	25686	90%	231174	100%	256860	0%	0
1.6	Replacement of openings (windows and doors)	551	130	71630	100%	71630	0%	0	100%	71630	0%	0
1.7	Insulation of heating pipelines and valves in the basement	1474	12	17688	100%	17688	0%	0	100%	17688	0%	0
1.8	Replacement of the heating system	1	120000	120000	100%	120000	0%	0	100%	120000	0%	0
1.9	Modernization of individual heating substation	1	14000	14000	100%	14000	0%	0	100%	14000	0%	0
1.10	Upgrade of the ventilation system	1	88368	88368	0%	0	5%	4418,4	5%	4418,4	95%	83949,6
1.11	Modernization of the lighting system	1	12000	12000	100%	12000	0%	0	100%	12000	0%	0
1.12	Installation of PV system	1	33000	33000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	33000
1.13	Energy management system (Smart metering)	1	2500	2500	33%	825	67%	1675	100%	2500	0%	0
1.14	Non-energy efficiency measures	1	74000	74000	80%	59200	0%	0	80%	59200	20%	14800
	TOTAL (TO GRAND SUMMARY)			1069771	45%	483862	37%	394959,4	88%	938021,4	12%	131749,6
2	SECTION 2, Theoretical Lyceum "VASILE ALECSANDRI"											
2.2	Thermal insulation of walls 120 mm	2251	55	123805	98%	121328,9	2%	2476,1	100%	123805	0%	0

2.3	Insulation of attic floors	1509	50	75450	0%	0	100%	75450	100%	75450	0%	0
2.4	Basement ceiling insulation and soole insulation	779	60	46740	0%	0	100%	46740	100%	46740	0%	0
2.5	Replacement of openings (windows and doors)	13	130	1690	100%	1690	0%	0	100%	0	0%	0
2.6	Replacement of the heating system	1	125000	125000	95%	118750	5%	6250	100%	125000	0%	0
2.7	Installation of an individual heating substitution	1	15500	15500	100%	15500	0%	0	100%	15500	0%	0
2.8	Upgrade of the ventilation system	1	65000	65000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	65000
2.9	Installation of LED lamps	1	26000	26000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	26000
2.10	Installation of PV system	1	15400	15400	0%	0	0%	0	0%	0	100%	15400
2.11	Energy management system (Smart metering)	1	3300	3300	0%	0	66%	2178	66%	2178	34%	1122
2.12	Non-energy efficiency measures	1	138000	138000	70%	96600	0%	0	70%	96600	30%	41400
TOTAL (TO GRAND SUMMARY)												
635885 56% 353868,9 21% 133094,1 77% 486963 23% 148922												

3 SECTION 3. "Elena Alistar" Art Theoretical High School												
3.2	Thermal insulation of walls	1968	55	108240	100%	108240	0%	0	100%	108240	0%	0
3.3	Insulation of attic floors	2001	50	100050	50%	50025	50%	50025	100%	100050	0%	0
3.4	Basement ceiling insulation and soole insulation	305	60	18300	100%	18300	0%	0	100%	18300	0%	0
3.5	Replacement of openings (windows and doors)	10	220	2200	100%	2200	0%	0	100%	2200	0%	0
3.6	Replacement of the heating system	1	68000	68000	100%	68000	0%	0	100%	68000	0%	0
3.7	Installation of an individual heating substitution	1	15600	15600	100%	15600	0%	0	100%	15600	0%	0
3.8	Upgrade of the ventilation system	1	93000	93000	0%	0	20%	18600	20%	18600	80%	74400
3.9	Installation of LED lamps	1	16000	16000	100%	16000	0%	0	100%	16000	0%	0
3.10	Installation of PV system	1	33000	33000	0%	0	80%	26400	80%	26400	20%	6600
3.11	Energy management system (Smart metering)	1	3300	3300	33%	1089	67%	2211	100%	3300	0%	0
3.12	Non-energy efficiency measures	1	50500	50500	90%	45450	0%	0	90%	45450	10%	5050
TOTAL (TO GRAND SUMMARY)												
508190 64% 324904 19% 97236 83% 422140 17% 86050												

4 SECTION 4. Theoretical Lyceum B.P.Hasdeu												
4.2	Thermal insulation of walls	4820	55	265100	98%	259798	2%	5302	100%	265100	0%	0
4.3	Insulation of attic floors	1491	50	74550	100%	74550	0%	0	100%	74550	0%	0
4.4	Insulation of flat roof	1603	70	112210	100%	112210	0%	0	100%	112210	0%	0
4.5	Basement ceiling insulation and soole insulation	1158	60	69480	15%	10422	85%	59058	100%	69480	0%	0
4.6	Replacement of openings (windows and doors)	714	130	92820	100%	92820	0%	0	100%	92820	0%	0
4.7	Replacement of the heating system	1	250000	250000	95%	237500	5%	12500	100%	250000	0%	0
4.8	Installation of an individual heating substitution	1	27000	27000	0%	0	100%	27000	100%	27000	0%	0
4.9	Upgrade of the ventilation system	1	100000	100000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	100000
4.10	Installation of LED lamps	1	42000	42000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	42000
4.11	Installation of PV system	1	33000	33000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	33000
4.12	Installation new kitchen equipment	1	2500	2500	0%	0	100%	2500	100%	2500	0%	0
4.13	Energy management system (Smart metering)	1	4500	4500	0%	0	66%	2970	66%	2970	34%	1530
4.14	Non-energy efficiency measures	1	170000	170000	80%	136000	0%	0	80%	136000	20%	34000
TOTAL (TO GRAND SUMMARY)												
1243160 74% 923300 9% 109330 83% 1032630 17% 210530												

5 SECTION 5. Lyceum "V. Lupu"												
5.2	Thermal insulation of walls	3077	55	169235	50%	84617,5	50%	84617,5	100%	169235	0%	0
5.3	Thermal insulation of flat roof	2092	70	146440	80%	117152	20%	29288	100%	146440	0%	0
5.4	Basement insulation	2092	50	104600	100%	104600	0%	0	100%	104600	0%	0
5.5	Replacement of openings (windows and doors)	711	135	95985	100%	95985	0%	0	100%	95985	0%	0
5.6	District heating substitution improvement	1	16000	16000	100%	16000	0%	0	100%	16000	0%	0
5.7	Modernisation of heating distribution system	1	79800	79800	100%	79800	0%	0	100%	79800	0%	0
5.8	Installation of the ventilation system	1	90000	90000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	90000
5.9	Replacement of lamps with energy efficient	1	24000	24000	0%	0	0%	0	0%	0	100%	24000
5.10	Energy Management System (Smart metering)	1	3500	3500	33%	1155	67%	2345	100%	3500	0%	0
TOTAL (TO GRAND SUMMARY)												
729560 68% 499309,5 16% 116250,5 84% 615560 16% 114000												

GRCF CHISINAU BUILDINGS SUB-PROJECT

Tranche 1. Energy Efficiency Measures in 17 public buildings

Works Contract for Lot 3 (47899/W/02/2 Lot 3) Energy Efficiency Measures in 8 lyceums

Contractor: JVCA Techno Test S.R.L.

Employer: Chisinau City Hall

Annex 4 to NTERIM PAYMENT STATEMENT Nr. 2

Methodology of calculations for Works certified during reporting period

Design Works

Item	Description	Total Contract Price Euro	Works certified before reporting period		Works certified during reporting period		Cumulative certified works		Outstanding works to be certified	
			%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro
1	2	63673	85%	54122,05	15%	9550,95	100%	63673	0%	0
2	TOTAL SECTION 1. Lyceum "Nicolae Sulac"	63673	85%	54122,05	15%	9550,95	100%	63673	0%	0
3	TOTAL SECTION 2. Lyceum "VASILE ALECSANDRI"	39688	85%	33734,8	0%	0	85%	33734,8	15%	5953,2
4	TOTAL SECTION 3. Art Theoretical High School "Elena Alistar"	31342	85%	26640,7	15%	4701,3	100%	31342	0%	0
5	TOTAL SECTION 4. Lyceum B.P.Hasdeu	78081	85%	66368,85	0%	0	85%	66368,85	15%	11712,15
6	TOTAL SECTION 5. Lyceum "V. Lupu"	44520	85%	37842	15%	6678	100%	44520	0%	0
7	TOTAL SECTION 6. Lyceum "Natalia Dadiani 1"	26760	85%	22746	0%	0	85%	22746	15%	4014
8	TOTAL SECTION 7. Lyceum "Natalia Dadiani 2"	17970	85%	15274,5	0%	0	85%	15274,5	15%	2695,5
9	TOTAL SECTION 8. Lyceum "Vasile Vasilache"	32535	85%	27654,75	15%	4880,25	100%	32535	0%	0
	GRAND TOTAL	334 569.00	85%	284383.65	8%	25810.5	93%	310194,15	7%	24374,85

Contractor/Antreprenor: JVCA Techno Test S.R.L.
 Director: Iuri Zaita
 Contract Manager: Iuri Zaita
 Stamp



07.03.2022

GRCF CHISINAU BUILDINGS SUB-PROJECT

Tranche I, Energy Efficiency Measures in 17 public buildings

Works Contract for Lot 3 (47899/W/02/2 Lot 3) Energy Efficiency Measures in 8 lyciems

Contractor: JVCA Techno Test S.R.L.

Employer: Chisinau City Hall

PROTOCOL OF EXECUTED CONSTRUCTION WORKS
INTERIM PAYMENT STATEMENT Nr. 2

Item	Description	Works certified before reporting period	Works certified during reporting period	Cumulative certified works	Outstanding works to be certified
		%	%	%	%
1	2	7	9	11=7+9	13=4+1
1	SECTION 1, Lyceum "Nicolae Sulac"				
1.2	Thermal insulation of walls	70%	30%	100%	0%
1.3	Thermal insulation of attic floors	35%	65%	100%	0%
1.4	Insulation of flat roof	80%	20%	100%	0%
1.5	Basement ceiling insulation and socle insulation	10%	90%	100%	0%
2	SECTION 2, Theoretical Lyceum "VASILE ALECSANDRI"				
2.2	Thermal insulation of walls 120 mm	98%	2%	100%	0%
2.3	Insulation of attic floors	0%	100%	100%	0%
2.4	Basement ceiling insulation and socle insulation	0%	100%	100%	0%
3	SECTION 3, "Elena Alistar" Art Theoretical High School				
3.3	Insulation of attic floors	50%	50%	100%	0%
4	SECTION 4, Theoretical Lyceum B.P.Hasdeu				
4.2	Thermal insulation of walls	98%	2%	100%	0%
4.5	Basement ceiling insulation and socle insulation	15%	85%	100%	0%
5	SECTION 5, Lyceum "V. Lupu"				
5.2	Thermal insulation of walls	50%	50%	100%	0%
5.3	Thermal insulation of flat roof	80%	20%	100%	0%
6	SECTION 6, Lyceum "Natalia Dadiani 1"				
6.3	Thermal insulation of attic roof	90%	10%	100%	0%
6.4	Thermal insulation of plate roof	98%	2%	100%	0%
7	SECTION 7, Lyceum "Natalia Dadiani 2"				
7.2	Thermal insulation of walls	92%	8%	100%	0%
7.3	Thermal insulation of roof	100%	0%	100%	0%
8	SECTION 8, Lyceum "Vasile Vasilache"				
8.2	Thermal insulation of walls	50%	50%	100%	0%
8.3	Thermal insulation of attic roof	0%	100%	100%	0%
8.4	Thermal insulation of flat roof	80%	20%	100%	0%
8.5	Replacement of openings (windows and doors)	30%	70%	100%	0%

Engineer: Joint Venture of EPTISA

Technical supervisor Civil Construction Works / Grigore Vascan

Stamp if applicable



Contractor: Techno Test S.R.L.

Director / Gh. Burdila

Manager Contract / Tudor Zama

Stamp



GRCF CHISINAU BUILDINGS SUB-PROJECT

Tranche I, Energy Efficiency Measures in 17 public buildings

Works Contract for Lot 3 (47899/W/02/2 Lot 3) Energy Efficiency Measures in 8 lyciums

Contractor: JVCA Techno Test S.R.L.

Employer: Chisinau City Hall

**PROTOCOL OF EXECUTED ELECTRICAL WORKS
INTERIM PAYMENT STATEMENT Nr. 2**

Item	Description	Works certified during reporting period	Comments
		%	
1	SECTION 1, Lyceum "Nicolae Sulac"		
1.13	Energy management system (Smart metering)	34%	Electricity meter was installed
3	SECTION 3, "Elena Alistar" Art Theoretical High School		
3.10	Installation of PV system	80%	Pannels and cables installed
3.11	Energy management system (Smart metering)	34%	Electricity meter was installed
5	SECTION 5, Lyceum "V. Lupu"		
5.10	Energy Management System (Smart metering)	34%	Electricity meter was installed
8	SECTION 8, Lyceum "Vasile Vasilache"		
8.9	Photovoltaic system installation	80%	Pannels and cables installed
8.10	Energy management system (Smart metering)	34%	Electricity meter was installed

Engineer: Joint Venture of EPTISA
Technical supervisor Civil Construction Works / Denis Danilov

Stamp if applicable



Contractor: Techno Test S.R.L.
Director / G. Burdila
Manager Contractor / Igor Zama
Stamp



GRCF CHISINAU BUILDINGS SUB-PROJECT

Tranche I, Energy Efficiency Measures in 17 public buildings

Works Contract for Lot 3 (47899/W/02/2 Lot 3) Energy Efficiency Measures in 8 lycceums

Contractor: JVCA Techno Test S.R.L.

Employer: Chisinau City Hall

PROTOCOL OF EXECUTED HVAC WORKS
INTERIM PAYMENT STATEMENT Nr. 2

Item	Description	Works certified before reporting period	Works certified during reporting period	Cumulative certified works	Description
		%	%	%	
1	2	7	9	11=7+9	
1	SECTION 1, Lyceum "Nicolae Sulac"				
1.10	Upgrade of the ventilation system	0%	5%	5%	Ventilation and air trickle vents in toilets were installed
1.13	Energy management system (Smart metering)	33%	33%	66%	Heat and water meters installed
2	SECTION 2, Theoretical Lyceum "VASILE ALECSANDRI"				
2.6	Replacement of the heating system	95%	5%	100%	Works were commissioned
2.11	Energy management system (Smart metering)	0%	66%	66%	Heat and water meters installed
3	SECTION 3, "Elena Alistar" Art Theoretical High School				
3.8	Upgrade of the ventilation system	0%	20%	20%	Ventilation and air trickle vents in toilets were installed. Ventilation for kitchen installed and commissioned
3.11	Energy management system (Smart metering)	33%	33%	66%	Heat and water meters installed
4	SECTION 4, Theoretical Lyceum B.P.Hasdeu				
4.7	Replacement of the heating system	95%	5%	100%	Works were commissioned
4.8	Installation of an individual heating substation	0%	100%	100%	Works were commissioned
4.12	Installation new kitchen equipment	0%	100%	100%	Equipment delivered
4.13	Energy management system (Smart metering)	0%	66%	66%	Heat and water meters installed
5	SECTION 5, Lyceum "V. Lupu"				
5.10	Energy Management System (Smart metering)	33%	33%	66%	Heat and water meters installed
6	SECTION 6, Lyceum "Natalia Dadiani 1"				
6.6	Modernisation of heating distribution system	90%	10%	100%	Works were commissioned
7	SECTION 7, Lyceum "Natalia Dadiani 2"				
7.6	Heat distribution system rehabilitation	95%	5%	100%	Works were commissioned
8	SECTION 8, Lyceum "Vasile Vasilache"				
8.7	Ventilation system rehabilitation	0%	10%	10%	Ventilation in 4 classrooms installed
8.10	Energy management system (Smart metering)	33%	33%	66%	Heat and water meters installed

Engineer: Joint Venture of EPTISA

Technical supervisor HVAC / Julian Tovarnitchi

Stamp if applicable



Contractor: Techno Test S.R.L.

Director: Gh. Burdila


Manager Contract: Iulian Zanku

Stamp

Liceul Teoretic Nicolae Sulac
Lucrări de termoizolare fațade

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Zona D	100%
Zona E	100%
Zona F	100%
Zona G	100%
Zona H	100%
Zona I	100%
Zona J	100%
Zona K	100%
Zona L	100%
Zona M	100%
Zona N	100%
Zona O	100%
Zona P	100%
Zona Q	100%
Zona R	100%
Zona S	100%
Zona Ș	100%
Zona T	100%
Total	100%



Responsabil Tehnic Epifania Vascan  Grigore Vascan

Liceul Teoretic Nicolae Sulac

Lucrări de termoizolare acoperiș șarpant

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Zona D	100%
Zona E	100%
Zona F	100%
Zona G	100%
Zona H	100%
Total	100%



Responsabil Tehnic Epitisa I. Epitisa Grigore Vascan

Liceul Teoretic Nicolae Sulac
Lucrări de termoizolare subsol

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Zona D	100%
Zona E	100%
Zona F	100%
Zona G	100%
Zona H	100%
Total	100%



Responsabil Tehnic Eptisa _____ Grigore Vascan



Liceul Teoretic Nicolae Sulac

Lucrări de termoizolare și hidroizolare acoperiș plat

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Total	100%



Responsabil Tehnic Eptisa Grigore Vascan

Liceul Teoretic Elena Alistar

Lucrări de termoizolare acoperiș șarpanta

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Zona D	100%
Total	100%



Responsabil Tehnic Eptisa *Grigore Vascan* Grigore Vascan

Liceul Teoretic Vasile Lupu

Lucrări de termoizolare și hidroizolare acoperiș plat

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Total	100%



Grigore Vascan

Responsabil Tehnic Eptisa _____ Grigore Vascan

Liceul Teoretic Vasile Lupu

Lucrări de termoizolare fațade

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Zona D	100%
Zona E	100%
Zona F	100%
Zona G	100%
Zona H	100%
Zona I	100%
Zona J	100%
Zona K	100%
Zona L	100%
Total	100%



Responsabil Tehnic Epitisa 1622 Grigore Vascan

Liceul Teoretic Vasile Vasilache
Lucrări de termoizolare fațade

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Zona D	100%
Zona E	100%
Zona F	100%
Zona G	100%
Zona H	100%
Zona I	100%
Zona J	100%
Zona K	100%
Zona L	100%
Zona M	100%
Total	100%



Grigore Vascan
Responsabil Tehnic Eptisa Grigore Vascan

Liceul Teoretic Vasile Vasilache

Lucrări de termoizolare acoperiș șarpanta

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Zona D	100%
Total	100%



Responsabil Tehnic Eptisa *Grigore Vascan* Grigore Vascan

Liceul Teoretic Vasile Vasilache

Lucrări de termoizolare acoperiș plat

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Total	100%



Responsabil Tehnic Eptisa *Grigore Vascan* Grigore Vascan

Liceul Teoretic Vasile Alecsandri

Lucrări de termoizolare fațade

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Zona D	100%
Zona E	100%
Zona F	100%
Zona G	100%
Zona H	100%
Total	100%




Responsabil Tehnic Știință Grigore Vascan

Liceul Teoretic Vasile Alecsandri

Lucrări de termoizolare acoperiș

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Total	100%

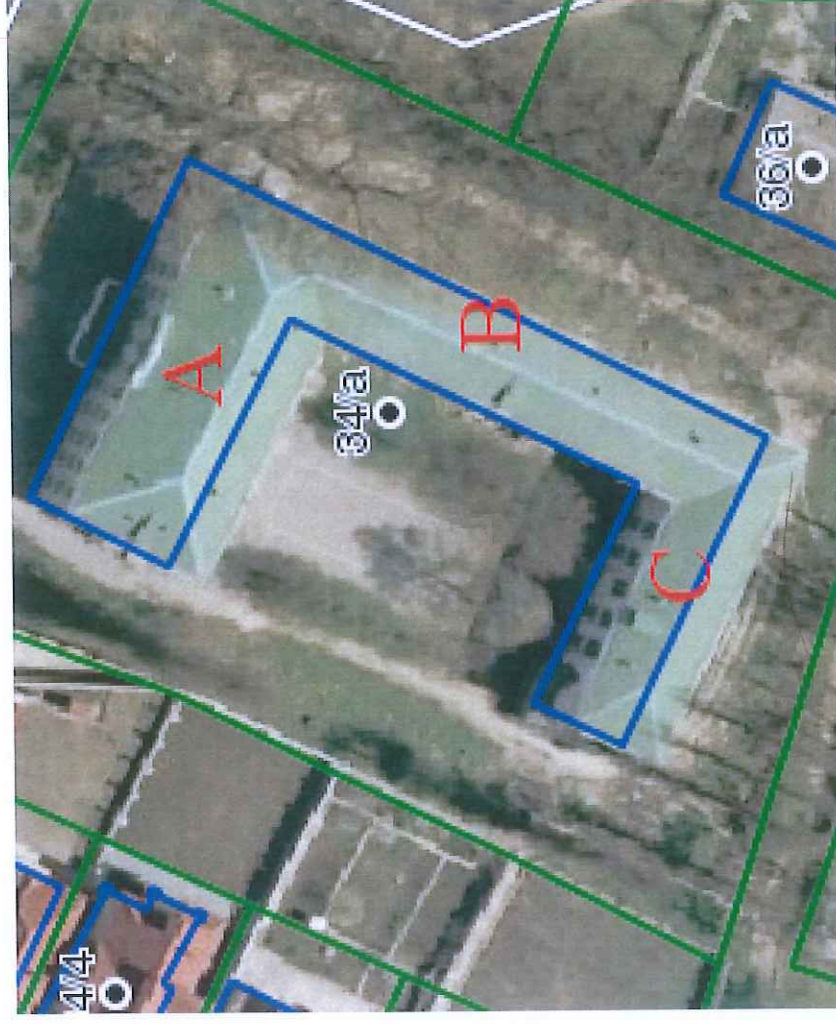

Grigore Vascan

Responsabil Tehnic Eptisa Grigore Vascan

Liceul Teoretic B.P. Hașdeu

Lucrări de termoizolare fațade

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Zona D	100%
Zona E	100%
Zona F	100%
Zona G	100%
Zona H	100%
Zona I	100%
Zona J	100%
Zona K	100%
Zona L	100%
Zona M	100%
Total	100%



Responsabil Tehnic Eptisa Grigore Vascan



Liceul Teoretic Natalia Dadiani 1

Lucrări de termoizolare acoperiș șarpanta

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Total	100%



Responsabil Tehnic Eptisa Grigore Vascan

Liceul Teoretic Natalia Dadiani 1

Lucrări de termoizolare acoperiș plat

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Total	100%



Responsabil Tehnic Eptisa _____ Grigore Vascan

Liceul Teoretic Natalia Dadiani 2

Lucrări de termoizolare acoperiș

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Zona D	100%
Total	100%



Responsabil Tehnic Eptisa _____ Grigore Vascan



Liceul Teoretic Natalia Dadiani 2
Lucrări de termoizolare fațadă

Zona	Procent Execuție
Zona A	100%
Zona B	100%
Zona C	100%
Zona D	100%
Zona E	100%
Zona F	100%
Zona G	100%
Zona H	100%
Zona I	100%
Zona J	100%
Zona K	100%
Zona L	100%
Zona M	100%
Total	100%



Responsabil Tehnic Eptisa *Grigore Vascan* Grigore Vascan

Proces verbal nr. 257 de predare -primire a documentației de proiect Lot 3

Data procesului verbal: 02.11.2021
Contract: Contract 47899/W/02/2 Lot 3 Măsurile de eficiență energetică la 8 licee
Părți contractante: „TECHNO TEST” S.R.L. și Primăria Municipiului Chișinău

Noi subsemnații:

„TECHNO TEST” S.R.L., în persoana domnului Gheorghe BURDILA, director, a predat și

„JV Eptisa Romania SRL – Eptisa Servicios de Ingeniería” în persoana domnului Grigore VASCAN, în calitate de reprezentat „JV Eptisa Romania SRL – Eptisa Servicios de Ingeniería”

a primit documentația de proiect elaborată conform contractului 47899/W/02/2 Lot 3 .

Volumul documentației de proiect predate-primate este prezentat în următorul tabel:

Nr. d/o	DENUMIREA	U.M.	Cant.	Nota
LOT 3 part 2.3. Obiect 20/2021 Instituția Publică „Liceul Teoretic cu profil teatral „Elena Alistar”				
1.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Materiale grafice:			
2.	Album I			
	– Plan general „PG” – Soluții arhitecturale. Soluții cromatice „SA”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
3.	Album II			
	– Încălzire. Ventilație.	album	1	“-”
4.	Album III			
	– Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”	album	1	“-”
LOT 3 part 2.5 Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Lupu”				
5.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Materiale grafice:			
6.	Album I			
	– Plan general „PG” – Soluții arhitecturale. Soluții cromatice „SA”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
	– Elemente de construcție „C”			
7.	Album II			
	– Încălzire. Ventilație.	album	1	“-”

8.	Album III			
	– Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”	album	1	”-”
LOT 3 part 2.8 Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”				
9.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Materiale grafice:			
10.	Album I			
	– Plan general „PG”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
	– Soluții arhitecturale. Soluții cromatice „SA”			
11.	Album II			
	– Încălzire. Ventilație.	album	1	”-”
12.	Album III			
	– Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”	album	1	”-”
LOT 3 part 2.5 Instituția Publică Liceul Teoretic cu profil de arte „Nicolae Sulac”.				
13.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Materiale grafice:			
14.	Album I			
	– Plan general „PG”, Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”, Soluții Cromatice „SC”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
	Album II			
15.	Soluții arhitecturale. Soluții cromatice „SA, Bloc A, Bloc B, Bloc C, Bloc D	album	1	”-”
LOT 3 part 2.5 Instituția Publică Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”				
16.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Materiale grafice:			
17.	Album			
	– Soluții arhitecturale „SA”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
18.	Album			

	– Plan general „PG”. Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”, Soluții arhitecturale și constructive „SAC”	album	1	“-”
19.	Album			
	– Încălzire. Ventilație. Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” 1	album	1	“-”
20.	Album			
	– Încălzire. Ventilație. Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” 2	album	1	“-”
LOT 3 part 2.5 Instituția Publică Liceul Teoretic „Bogdan Petricescu Hașdeu”				
21.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Materiale grafice:			
22.	Album			
	– Plan general „PG”. Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”, Soluții arhitecturale și constructive „SAC”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
	Album			
23.	– Încălzire. Ventilație.	album	1	“-”
LOT 3 part 2.5 Instituția Publică Liceul Teoretic „V. Alexandri”				
24.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Album			
25.	– Plan general „PG”. Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”, Soluții arhitecturale și constructive „SAC”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
	Album			
26.	– Încălzire. Ventilație.	album	1	“-”

PREDAT

„Techno Test” S.R.L.

MD-2012 or. Chișinău, str. M. Eminescu, 66

Tel/fax: +373 22 22 83 13

Gheorghe BURDILA
director



PRIMIT

„JV Eptisa Romania SRL – Eptisa Servicios de Ingeniería”

Grigore VASCAN
reprezentant

Proces verbal nr. 256 de predare -primire a documentației de proiect Lot 3

Data procesului verbal: 02.11.2021

Contract: Contract 47899/W/02/2 Lot 3 Măsurile de eficiență energetică la 8 licee

Părți contractante: „TECHNO TEST” S.R.L. și Primăria Municipiului Chișinău

Noi subsemnații:

„TECHNO TEST” S.R.L., în persoana domnului Gheorghe BURDILA, director, a predat

și

„Unitatea de Implementare a Proiectelor Investiționale,” în persoana domnului Serghei BEJENARI, în calitate de manager proiect, Primăria mun. Chișinău

a primit documentația de proiect elaborată conform contractului sus menționat.

Volumul documentației de proiect predate-primate este prezentat în următorul tabel:

Nr. d/o	DENUMIREA	U.M.	Cant.	Nota
LOT 3 part 2.3. Obiect 20/2021 „Liceul Teoretic cu profil teatral „Elena Alistar”				
1.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Materiale grafice:			
2.	Album I			
	– Plan general „PG” – Soluții arhitecturale. Soluții cromatice „SA”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
3.	Album II			
	– Încălzire. Ventilație.	album	1	“-”
4.	Album III			
	– Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”	album	1	“-”
LOT 3 part 2.5 Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Lupu”				
5.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Materiale grafice:			
6.	Album I			
	– Plan general „PG” – Soluții arhitecturale. Soluții cromatice „SA”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
	– Elemente de construcție „C”			
7.	Album II			
	– Încălzire. Ventilație.	album	1	“-”

8.	Album III			
	– Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”	album	1	”-
LOT 3 part 2.8 Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”				
9.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Materiale grafice:			
10.	Album I			
	– Plan general „PG”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
	– Soluții arhitecturale. Soluții cromatice „SA”			
11.	Album II			
	– Încălzire. Ventilație.	album	1	”-
12.	Album III			
	– Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”	album	1	”-
LOT 3 part 2.5 Instituția Publică Liceul Teoretic cu profil de arte „Nicolae Sulac”				
13.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Materiale grafice:			
14.	Album I			
	– Plan general „PG”, Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”, Soluții Cromatice „SC”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
15.	Album II			
	– Soluții arhitecturale. Soluții cromatice „SA, Bloc A, Bloc B, Bloc C, Bloc D	album	1	”-
LOT 3 part 2.5 Instituția Publică Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”				
16.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Materiale grafice:			
17.	Album			
	– Soluții arhitecturale „SA”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
18.	Album			

	– Plan general „PG”. Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”, Soluții arhitecturale și constructive „SAC”	album	1	–”-
19.	Album			
	– Încălzire. Ventilație. Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” 1	album	1	–”-
20.	Album			
	– Încălzire. Ventilație. Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” 2	album	1	–”-
LOT 3 part 2.5 Instituția Publică Liceul Teoretic „Bogdan Petricescu Hașdeu”				
21.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Materiale grafice:			
22.	Album			
	– Plan general „PG”. Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”, Soluții arhitecturale și constructive „SAC”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
	Album			
23.	– Încălzire. Ventilație.	album	1	–”-
LOT 3 part 2.5 Instituția Publică Liceul Teoretic „V. Alexandri”				
24.	Memoriul explicativ general	mapa	1	Pe suport de hârtie format A4
	Album			
25.	– Plan general „PG”. Organizarea lucrărilor de construcție „OLC”, Soluții arhitecturale și constructive „SAC”	album	1	Pe suport de hârtie format A3
	Album			
26.	– Încălzire. Ventilație.	album	1	–”-

PREDAT

„Techno Test” S.R.L.

MD-2012 or. Chișinău, str. M. Eminescu, 66

Tel/fax: +373 22 22 83 13

Gheorghe BURDILA
director



PRIMIT

„Unitatea de Implementare a Proiectelor Investitionale”

Serghei BEJENARI
manager proiect, Primăria mun. Chișinău

Proces verbal nr. 312 de predare -primire a documentației de proiect Lot 3

Data procesului verbal: 08.12.2021
Contract: Contract 47899/W/02/2 Lot 3 Măsuri de eficiență energetică la 8 licee
Părți contractante: „TECHNO TEST” S.R.L. și Primăria Municipiului Chișinău

Noi subsemnații:

„TECHNO TEST” S.R.L., în persoana domnului Gheorghe BURDILA, director, a predat
și

„JV Eptisa Romania SRL – Eptisa Servicios de Ingeniería” în persoana domnului Grigore VASCAN, în calitate
de reprezentat „JV Eptisa Romania SRL – Eptisa Servicios de Ingeniería”

a primit documentația de proiect elaborată conform contractului 47899/W/02/2 Lot 3 .

Volumul documentației de proiect predate-primate este prezentat în următorul tabel:

Nr. d/o	DENUMIREA	U.M.	Cant.	Nota
LOT 3 part 2.5 Instituția Publica Liceul Teoretic cu profil de arte „Nicolae Sulac”.				
1.	Materiale grafice			
	Album I			
	– Sisteme interioare de incalzire, ventilație	album	1	Pe suport de hârtie format A3

PREDAT

„Techno Test” S.R.L.

MD-2012 or. Chișinău, str. M. Eminescu, 66

Tel/fax: +373 22 22 83 13

Gheorghe BURDILA
director



PRIMIT

„JV Eptisa Romania SRL – Eptisa
Servicios de Ingeniería”

Grigore VASCAN
reprezentant

Proces verbal nr. 327 de predare -primire a documentației de proiect Lot 3

Data procesului verbal: 24.12.2021
Contract: Contract 47899/W/02/2 Lot 3 Măsuri de eficiență energetică la 8 licee
Părți contractante: „TECHNO TEST” S.R.L. și Primăria Municipiului Chișinău

Noi subsemnații:

„TECHNO TEST” S.R.L., în persoana domnului Gheorghe BURDILA, director, a predat

și

„Unitatea de Implementare a Proiectelor Investiționale” în persoana domnului Serghei UNGUREANU, în calitate de manager interimar, Primăria mun. Chișinău

a primit documentația de proiect elaborată conform contractului 47899/W/02/2 Lot 3 .

Volumul documentației de proiect predate-primate este prezentat în următorul tabel:

Nr. d/o	DENUMIREA	U.M.	Cant.	Nota
LOT 3 part 2.5 Instituția Publica Liceul Teoretic cu profil de arte „Nicolae Sulac”.				
1.	Materiale grafice			
	Album I			
	– Sisteme interioare de incalzire, ventilație	album	1	Pe suport de hârtie format A3

PREDAT

„Techno Test” S.R.L.

MD-2012 or. Chișinău, str. M. Eminescu, 66

Tel/fax: +373 22 22 83 13

Gheorghe BURDILA
director



PRIMIT

„Unitatea de Implementare a Proiectelor Investiționale”

Serghei UNGUREANU
manager interimar, Primăria mun. Chișinău
