



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 10/11 din 20.01.2025

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului: Serghei Josan, Șef adjunct interimar al Direcției supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile.

2. Temeiul efectuării inspectării: conform cererii nr. 531/25 din 16.01.2025.

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu la recepția finală a sistemului automat de stingere cu gaze montată în arhivele de date cu caracter personal din str. Mesager, nr.5/5 și str. Mihai Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: Încăperile arhivelor de date cu caracter personal din str. Mesager, nr.5/5 și str. Mihai Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău

5. Timpul efectuării inspectării: 20.01.2025, ora 10:00

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova.

7. Antreprenor/Subantreprenor: SRL „ABI-GRUP”

8. Proiectant:

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Sistemele automate de stingere cu gaze montată în încăperile arhivelor de date cu caracter personal din str. Mesager, nr.5/5 și str. Mihai Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău

10. Constatările și rezultatele inspectării:

În urma controlului desfășurat s-a constatat cu sistemele automate de stingere cu gaze montată în încăperile arhivelor de date cu caracter personal din str. Mesager, nr.5/5 și str. Mihai Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău corespund cerințelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.

11. Declarație persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

_____ (numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

_____ (semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____

2. _____

_____ (numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

_____ (semnătura)

13. Propuneri:

14. Anexe

15. Semnăturile inspectorilor:

Serghei Josan

(numele, prenumele)

Digitally signed by Josan Serghei
Date: 2025.01.20 15:37:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



Digitally signed by Stratan Sergiu
Date: 2025.01.20 16:13:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



16. Copia Actului de inspectare am primit:

_____ (funcția, numele, prenumele reprezentantului)

_____ (semnătura)

_____ (data)

Obiect: «Incaperea arhivelor»
mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar:

«AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor:

«ABI GRUP» SRL

**DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ
DE PRIMIRE PREDARE A LUCRARILOR DE MONTARE
ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE**

SECȚIUNEA: III. ACTE, PROTOCOLI.

ЗДАНИЕ / CONSTRUCȚIA: INCAPERE PENTRU ARHIVE

SISTEM:

«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»

**LUCRĂRI DE INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE REALIZATE PE BAZA PROIECTULUI:
INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE - capitol: 009/10-23-SIn**

Obiect: «Incaperea arhivelor»
mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor: «ABI GRUP» SRL

PROCES VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE INSTALARE
SISTEM
«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»
din «26» decembrie 2024.

Membrii comisiei:
Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:
Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate, Ceban Igor
Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica, Leu Vasile

Reprezentantul Antreprenor: Director «ABI GRUP» SRL, Alexei Blaja.
Diriginte lucrari speciale, Andrei Constantinov.
a inspectat echipamentul instalat și cablarea.

- 1. Compania de instalare efectuează următoarele lucrări:
 - 1.1. Instalarea de cabluri electrice, dispozitive de control, detectoare manuale de incendiu, dispozitive sirene, dispozitive de automatizare etc.
- 2. Lucrările de instalare sunt efectuate în conformitate cu documentația de lucru capitol: 009/10-23-SIn «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»
- 3. Abateri de la documentația proiectului: nu sunt
- 4. Comisia a verificat documentația tehnică prezentată la cerințele de volum ПУЭ, СНиП 3.05.07-85 și altele directive în vigoare în Republica Moldova.
- 5. Încercări electrice individuale: Realizate de compania instalatoare «ABI GRUP» S.R.L.
- 6. Deficiențele care nu interferează cu testarea individuală și testarea cuprinzătoare ar trebui eliminate înainte de testarea complexă.
- 7. Concluzie:
 - 7.1. Lucrările de instalare se efectuează conform documentației de lucru în baza cerințelor ПУЭ, СНиП 3.05.06-85
 - 7.2. Acest act este bază pentru efectuarea măsurărilor și testării individuale și punerea în funcțiune și pentru organizarea lucrărilor de testare integrală a sistemelor.

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,


Reprezentantul Antreprenor:

Director «ABI GRUP» SRL

Diriginte lucrari speciale

\ Ceban Igor \ 
Semnătura/Ștampila

\ Leu Vasile \ 
Semnătura/Ștampila

\ Alexei Blaja \ 
Semnătura/Ștampila

\ Andrei Constantinov \ 
Semnătura/Ștampila



Obiect: «Incaperea arhivelor»
mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor: «ABI GRUP» SRL

PROCES VERBAL A EFECTUĂRII INCERCĂRIILOR CONDUCTELOR
SISTEM
«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»

din «26» decembrie 2024.

Membrii comisiei:
Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:
Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate, Ceban Igor
Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica, Leu Vasile

Reprezentantul Antreprenor: Director «ABI GRUP» SRL, Alexei Blaja.
Diriginte lucrari speciale, Andrei Constantinov.

a inspectat lucrarile efectuate companiei instalatoare și au stabilit:

1. Au fost prezentate pentru inspecție și acceptare Testele hidraulice
conducte testate pentru rezistență și etanșeitate și enumerate în tabel, în zona de la stația de stingere a incendiilor.

Conductă	Test de presiune, MPa (kgf / cm2)	Durată, min	Examinare externă sub presiune, MPa (kgf / cm2)
Ø114x7.0 MM (4")	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm2)	4320 min	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm2)
Ø76x5 MM (2 1/2")	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm2)	4320 min	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm2)
Ø60.3x5.6 MM (2")	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm2)	4320 min	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm2)
Ø48.3x3.5 MM (1 1/2")	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm2)	4320 min	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm2)
Ø42.4x3.5 MM (1 1/4")	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm2)	4320 min	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm2)
Ø33.7x3.2 MM (1")	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm2)	4320 min	0,85 MPa (8,66758781 kgf /cm2)

Lucrarea a fost realizată conform documentației de proiect Compania «Parmatus» SRL
capitol: 009/10-23-SIn «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»
(numele organizației de proiectare, numerele desenului și data pregătirii acestora)

Decizia Comisiei:
Lucrările au fost efectuate în conformitate cu documentația de proiectare, standarde, coduri de construcții și reglementări și îndeplinesc cerințele de acceptare a acestora.
Pe baza celor de mai sus, considerați finalizate testele pentru rezistența și etanșeitatea conductelor enumerate în act.

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

\ Ceban Igor \
Semnătura/Ștampila

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,

\ Leu Vasile \
Semnătura/Ștampila

Reprezentantul Antreprenor:

Director «ABI GRUP» SRL

«ABI GRUP»
Alexei Blaja
Semnătura/Ștampila

CONSTANTINOV ANDREI
DLS-2024
Nr.0850
1e; 2h; 3c.7
DIRIGINTE
LUCRARI SPECIALE
Andrei Constantinov
Semnătura/Ștampila

Diriginte lucrari speciale

Obiect: «Incaperea arhivelor»
mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor: «ABI GRUP» SRL

SPECIFICAȚIA ECHIPAMENTELOR INSTALATE, DISPOZITIVE ȘI MIJLOACE

SISTEM
«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»

din «26» decembrie 2024.

No	Denumirea echipamentului electric	unitate de măsură.	Cantitatea
1	Panou de control stingere incendii Teletek IVY	buc	4
2	Sursă de alimentare de rezervă 24B РИП-4А	buc	1
3	Acumulator 12В 12А/ч	buc	4
4	Detector de fum de incendiu SensoMAG S30	buc	222
5	Buton pornire stingere incendiu culoare galben	buc	9
6	Buton blocare stingere incendiu culoare albastru	buc	5
7	Dispozitiv de semnalizare optică la distanță	buc	35
8	Afișaj de lumină și sunet „Automatizare dezactivată” 24V DC	buc	8
9	Afișaj lumini și sunet „Gaze! Nu intrați” 24V DC	buc	8
10	Afișaj de lumină și sunet „Gas! Evacuare” 24V DC	buc	8
11	Afișaj de lumină și sunet „Secțiunea de incendiu nr. ____” 24V DC	buc	4
12	Afișaj de lumini și sunet „Secțiunea de stingere nr. ____” 24V DC	buc	4
13	Sirena cu stroboscop 24V DC	buc	8
14	Detector de contact magnetic	buc	24
15	Închiderea ușii mecanică	buc	7
16	Sursă de alimentare de rezervă 12В РИП-2.5А	buc	1
17	Acumulator 12В 7А/ч	buc	3
18	Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire electrica. МГП.-180.2.РЕ	buc	2
19	Modul de stingere a incendiilor cu gaz V=180 l cu pornire pneumatica. МГП.-180.2.ПН	buc	6
20	Presostat universal CTY-150	buc	4
21	Aparatură de comutare PY-100-E	buc	4
22	Dispozitiv de control al presiunii ПКТ.1	buc	1
23	Dispozitiv de suflare și sertizare ППО-150	buc	1
24	Cilindru de testare БВ-40	buc	1

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,

Reprezentantul Antreprenor:
Director «ABI GRUP» SRL

Diriginte lucrari speciale

\ Ceban Igor \
Semnătura/Ștampila

\ Leu Vasile \
Semnătura/Ștampila

\ Alexei Blaga \
Semnătura/Ștampila

\ Andrei Constantinov \
Semnătura/Ștampila



Obiect: «Incaperea arhivelor»
mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor: «ABI GRUP» SRL

**PROCES VERBAL DE ÎNCERCARE INDIVIDUALĂ
INSTALAȚII DE EXTINDIRE A INCENDIILOR AUTOMATICE**

**SISTEM
«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»**

din «26» decembrie 2024.

Completat de reprezentanții:

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate, Ceban Igor

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica, Leu Vasile

Reprezentantul Antreprenor: Director «ABI GRUP» SRL, Alexei Blaja.

Diriginte lucrari speciale, Andrei Constantinov.

Verificarea funcționării instalației efectuată în conformitate cu cerințele "Правил производства и приемки работ Автоматические установки пожаротушения".

Pentru verificare, a fost emisă o sursă de incendiu (sub formă de fum în pragul detectorului de fum).

Rezultatele testelor:

Simularea sursei de aprindere, sub formă de fum, până la pragul detectorului de fum (pentru zona calculată), a fost efectuată la două puncte de control (1BTH2/2; 1BTH1/1 (et.3), si 4BTH1/2; 4BTH2/1 (et.4)).

Volumul alarmei în modul de așteptare și stingerea incendiilor corespund documentației de proiectare și NCM E.03.05-2004; NCM E.03.03-2003; CTO 7.3-02-2011.

Concluzie:

1. Încercări individuale sunt efectuate conform documentației de lucru, în conformitate cu cerințele instrucțiunilor, punerii în funcțiune și funcționarea sistemului.
2. Instalarea funcționează într-un mod stabil, cu executarea algoritmului complet.
3. Instalarea poate fi exploatată în continuare.

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

\ Ceban Igor \

Semnătura/Ștampila

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,

\ Leu Vasile \

Semnătura/Ștampila

Reprezentantul Antreprenor:

Director «ABI GRUP» SRL

\ Alexei Blaja \

Semnătura/Ștampila

Diriginte lucrari speciale

\ Andrei Constantinov \

Semnătura/Ștampila



Obiect: «Incaperea arhivelor»
mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor: «ABI GRUP» SRL

**PROCES VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE REGLARE
ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
SISTEM
«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»**

din «26» decembrie 2024.

Membrii comisiei:

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate, Ceban Igor

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica, Leu Vasile

Reprezentantul Antreprenor: Director «ABI GRUP» SRL, Alexei Blaja.

Diriginte lucrari speciale, Andrei Constantinov.

a inspectat și au stabilit

1. Compania instalatoare si de punere în funcțiune a efectuat următoarele lucrări: Punerea în funcțiune și testarea dispozitivelor control de stingere a incendiilor, detectoare manuale de incendiu, dispozitive de sunet, ventilator de evacuare a fumului, dispozitive de automatizare, reglarea și programarea logicii sistemului etc.
2. Sistemul de a evacuării fumului a fost testat împreună cu orificiul de aerisire, sisteme de evacuare a fumului:
- 2.1. În momentul testării sistemelor de stingere a incendiilor și sistemelor de evacuare a fumului, au funcționat într-un mod prestabilit.
3. Punerea în funcțiune se efectuează în conformitate cu documentația de lucru.
4. Abateri de la logica proiectului: nu sunt
5. Comisia a verificat documentația tehnică prezentată în cadrul cerințelor documentației de proiectare și alte directive în vigoare în Republica Moldova.
6. Încercări individuale ale echipamentelor electrice: efectuate de compania instalatoare.
7. Deficiențele care nu interferează cu testarea complexă ar trebui eliminate înainte de testarea completă.

Concluzie:

1. Punerea în funcțiune se efectuează conform documentației de lucru, în conformitate cu cerințele instrucțiunilor, reglarilor și de operare.
2. Acest act este bază: pentru organizarea lucrărilor de testare punerea în funcțiune a sistemului.

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

\ Ceban Igor \

Semnătura/Ștampila

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,

\ Leu Vasile \

Semnătura/Ștampila

Reprezentantul Antreprenor:

Director «ABI GRUP» SRL

\ Alexei Blaja \

Semnătura/Ștampila

Diriginte lucrari speciale

\ Andrei Constantinov \

Semnătura/Ștampila



Obiect: «Incaperea arhivelor»
mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar: «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor: «ABI GRUP» SRL

**PROCES VERBAL DE ÎNCERCARE COMPLETĂ
INSTALAȚII DE EXTINDIRE A INCENDIILOR AUTOMATICE**

**SISTEM
«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»**

din «26» decembrie 2024.

Membrii comisiei de lucru:

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:
Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate, Ceban Igor
Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica, Leu Vasile

Reprezentantul Antreprenor: Director «ABI GRUP» SRL, Alexei Blaja.
Diriginte lucrari speciale, Andrei Constantinov.

Reprezentantul secție supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor: _____

Au inspectat «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE» montă în conformitate cu proiectul 009/10-23-Sin. Inspectia a constatat că instalația «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE» a fost montată complet în conformitate cu proiectul și "Правилами производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения". Pentru a verifica operativitatea instalației montate, comisia a efectuat un test cuprinzător al instalației. Simularea sursei de aprindere, sub formă de fum, până la pragul detectorului de fum (pentru zona calculată), a fost efectuată la două puncte de control (1BTH2/2; 1BTH1/1 (et.3), si 4BTH1/2; 4BTH2/1 (et.4)).

În urma încercări, s-a stabilit: Instalarea funcționează într-un mod prestabilit, cu dezvoltarea unui algoritm complet.

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

\ Ceban Igor \ 
Semnătura/Ștampila

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,

\ Leu Vasile \ 
Semnătura/Ștampila

Reprezentantul Antreprenor:
Director «ABI GRUP» SRL


S.R.L.
Alexei Blaja
Semnătura/Ștampila

Diriginte lucrari speciale


CONSTANTINOV ANDREI
DLS-2024
Nr.0850
1e, 2h, 3c, 7
DIRIGINTE
LUCRARI SPECIALIZATE
Semnătura/Ștampila

Obiect: «Incaperea arhivelor»

mun. Chisinau, str. M. Viteazul 11

Beneficiar:

«AGENȚIA SERVICII PUBLICE»

Antreprenor:

«ABI GRUP» SRL

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A MIJLOACELOR TEHNICE DE STINGERE ÎN EXPLOATARE

SISTEM

«INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE»

din «__» decembrie 2024.

Scop: pentru punerea în funcțiune a sistemului «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE».
Instalarea și punerea în funcțiune de lucru efectuată în conformitate cu documentația de exploatare,
capitol: 009/10-23-Sin - «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE».

Abateri de la documentația de proiect: nu sunt

Membrii comisiei:

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:


Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate, Ceban Igor

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica, Leu Vasile

Reprezentantul Antreprenor: Director «ABI GRUP» SRL, Alexei Blaja.

Diriginte lucrari speciale, Andrei Constantinov.

Reprezentantul secție supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor:



Au inspectat «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE».

Și au stabilit:

- Sistemul «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE», este functional
- Este asigurată funcționarea neîntreruptă a sistemului «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE» în modul setat în timpul testării complexe cu rezultat pozitiv;
- Sistemul corespunde cerințelor tehnice: Documentația de lucru Capitol: 009/10-23-Sin - «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE».

Pe baza datelor primite, comisia constată:

- Evaluarea lucrărilor de instalare efectuate - satisfăcătoare;
- Evaluarea lucrărilor de punere în funcțiune efectuate - satisfăcătoare;
- De a primi în exploatare sistemul inspectat «INSTALATIA DE STINGERE INCENDIU CU GAZE».

Reprezentanții:

Reprezentantul Beneficiarului «AGENȚIA SERVICII PUBLICE»:

Sef Sectia securitate tehnica a Directiei Securitate

\ Ceban Igor

Semnătura/Ștampila

Inginer coordonator al Sectiei securitate tehnica,

\ Leu Vasile

Semnătura/Ștampila

Reprezentantul Antreprenor:

Director «ABI GRUP» SRL

\ Alexei Blaja

Semnătura/Ștampila

Diriginte lucrari speciale




\ Andrei Constantinov

Semnătura/Ștampila

Reprezentantul

Secție supraveghere de stat a măsurilor contra incendiilor

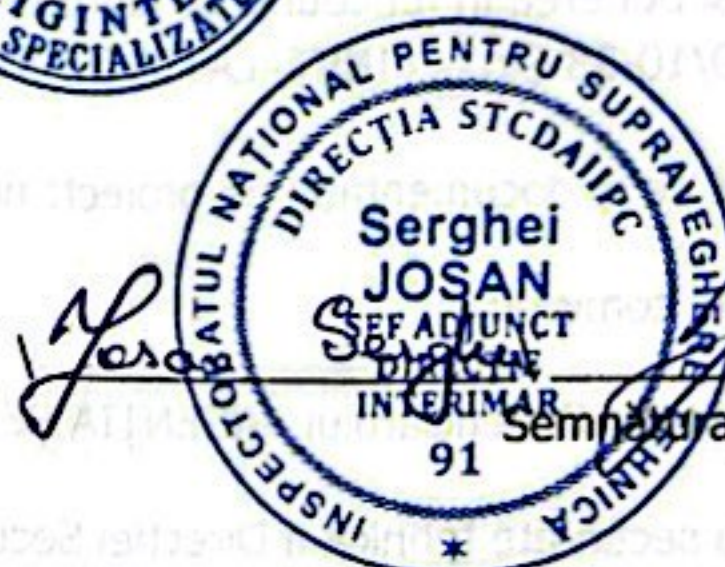

\ Josan Serghei

Semnătura/Ștampila

Semnătura/Ștampila
