

Polina Lupa

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Iunie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Tranşa 1.”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	96 919.88	96 919.88	
Total	96 919.88	96 919.88	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	19 383.98	19 383.98	
Total	116 303.86	116 303.86	

Antreprenor


S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria or.Drochia

Cereteu Nina

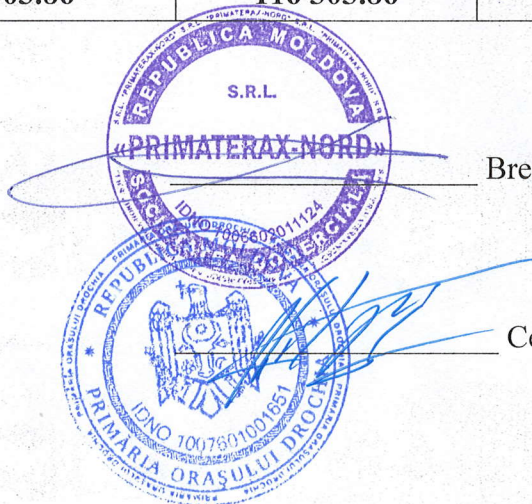

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor Primăria or.Drochia
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a
drumurilor locale or.Drochia,
tranșa 1**

Valoarea lucrarilor executate

116 303,86 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cai de acces 1.1. Bulevardul Mitropolit Varlaam, 11				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,000	249,63 25,10	5 491,90 552,12
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	148,000	4,82 4,82	712,84 712,84
3	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	39,000	16,38 0,00	639,00 0,00
4	DE10C	Borduri de drum prefabricate din beton vibropresat de calitate superioara cu dimensiunile in sectiune 150x300 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila	m	160,000	166,25 16,98	26 600,39 2 717,52
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosimea 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2	345,000	164,63 15,11	56 796,36 5 212,47

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		Total capital:				
						90 240,49
						9 194,95

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?	90 240,49
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	2 206,79
		Total ПЗ+CASM	100,00 +	92 447,28
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	3 513,00
		Total Total+CR	100,00 +	95 960,28
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	959,60
		Total Total+B	100,00 +	96 919,88
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	19 383,98
				116 303,86
		TOTAL:		9 194,95

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC Primaterax-Nord SRL

Primăria or.Drochia

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Iulie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Tranşa 1.”

Denumirea obiectelor Categorie de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	66 691.43	66 691.43	
Total	66 691.43	66 691.43	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	13 338.29	13 338.29	
Total	80 029.72	80 029.72	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Primaria or.Drochia



Cereteu Nina

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor Primăria or.Drochia,r-nul Drochia
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a drumurilor
locale orașul Drochia.Tranșa 1**

Valoarea lucrarilor executate

80 029,72 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe ie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminoși				
		1.1. Strada Cecal. Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	370,000	168,38 14,78	62 301,42 5 468,25
		Total capitul:				
						62 301,42 5 468,25

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?		62 301,42
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %		1 312,38
		Total ПЗ+CASM	100,00 +		63 613,80
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %		2 417,32
		Total Total+CR	100,00 +		66 031,12
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %		660,31
		Total Total+B	100,00 +		66 691,43
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %		13 338,29
					80 029,72
		TOTAL:			5 468,25

INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

APROBAT:

Investitor
Primăria orașului Drochia
(denumirea)

Administrator Brenișter D.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

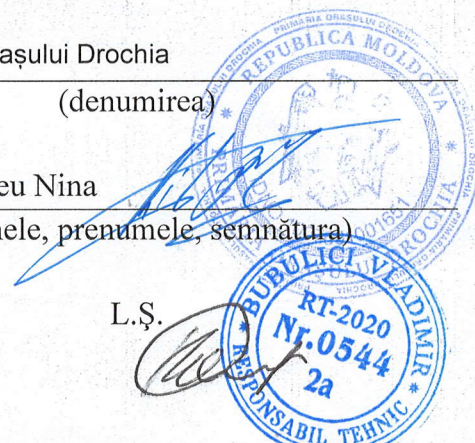

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1.”

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	89 450.88	89 450.88	
Total	89 450.88	89 450.88	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	17 890.18	17 890.18	
Total	107 341,06	107 341,06	



Antreprenor


S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Beneficiar

Primaria orasul Drochia

 Brenister Dumitru



 Cereteu Nina

Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria or. Drochia, r-nul Drochia
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a
 drumurilor locale orașul Drochia
 Tranșa 1**

Valoarea lucrarilor executate
107 341,06 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		1.1. Strada Grigorescu, 27				
		August. Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	496,000	168,48 14,78	83 563,65 7 330,46
		Total capitul:				
						83 563,65 7 330,46

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?	83 563,65
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 759,31
		Total ПЗ+CASM	100,00 +	85 322,96
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	3 242,27
		Total Total+CR	100,00 +	88 565,23
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	885,65
		Total Total+B	100,00 +	89 450,88
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	17 890,18
				107 341,06
		TOTAL:		7 330,46

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
 (denumirea)

APROBAT:

Investitor
Primăria or. Drochia, r-nul Drochia
 (denumirea)

Administrator Brenișter Dumir
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contractul Nr. 67 din 29.04.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

„Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1.”

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	59 517,25	59 517,25	
Total	59 517,25	59 517,25	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	11 903,45	11 903,45	
Total	71 420,70	71 420,70	



Antreprenor
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Beneficiar
Primaria orasul Drochia

Brenister Dumitru



Cereteu Nina

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
(denumirea)

Investitor Primaria or. Drochia
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor
locale or. Drochia, tranșa 1

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate pe luna august 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		1.1. Strada Mircea cel Batrin. Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,000	168,49 14,78	55 600,18 4 877,09
		Total capitul:				
						55 600,18 4 877,09
		Total capitul:				
						55 600,18 4 877,09

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	55 600,18
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 170,50
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	56 770,68
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	2 157,29
	Total Total+CR	100,00 +	58 927,97
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	589,28
	Total Total+B	100,00 +	59 517,25
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	11 903,45
			71 420,70
	TOTAL:		4 877,09

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor


(denumirea)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.



()


(denumirea)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

()

NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna august 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	561 409,73	30 631,82	
Total	561 409,73	30 631,82	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	112 281,94	6 126,36	
Total	673 691,67	36 758,18	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru


(semnătura)

LȘ

Beneficiar: Primaria or.Drochia

Primar Cereteu Nina

(semnătura)



Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
(denumirea)

Investitor Primaria or. Drochia
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor
locale or. Drochia, tranșa 1

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate pe luna august 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		1.1. Strada 31 August.				
		Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	170,000	168,32 14,78	28 615,25 2 512,44
		Total capitul:				
						28 615,25 2 512,44
		Total capitul:				
						28 615,25 2 512,44

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	28 615,25
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	602,99
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	29 218,24
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	1 110,29
	Total Total+CR	100,00 +	30 328,53
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	303,29
	Total Total+B	100,00 +	30 631,82
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	6 126,36
	TOTAL:		36 758,18 2 512,44

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL
(denumirea)

Investitor
Primăria or. Drochia
(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Lucrări de reparație a drumurilor locale or. Drochia, tranșa 1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 36 758,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	99,11	25,35	2 512,44
		Total manopera				2 512,44

Materiale:

1.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	19,55	1 080,00	21 114,00
2.	23203226001101	Bitum	t	0,10	9 000,00	900,00
3.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,02	0,30	0,31
		Total materiale de construcții				22 014,31

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	8,50	17,00	144,50
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,20	300,00	3 060,00
3.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	10,20	50,00	510,00
4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,36	50,00	68,00
5.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	1,36	100,00	136,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,85	200,00	170,00
		Total utilaje de construcții				4 088,50

Прямые затраты	?	28 615,25
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	602,99
Total ПЗ+CASM	100,00 +	29 218,24
Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	1 110,29
Total Total+CR	100,00 +	30 328,53
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	303,29
Total Total+B	100,00 +	30 631,82
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	6 126,36

Total deviz:

36 758,18

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor
Primăria or. Drochia

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Obiect Lucrări de reparație a drumurilor locale
or.Drochia. Tranșa 1

Investitor Primăria or.Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		1.1. Strada 31 August. Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			168,32
						14,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	25,35	14,78
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,30	0,00
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 080,00	124,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 000,00	5,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	300,00	18,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	17,00	0,85
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	100,00	0,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primăria or.Drochia

(denumirea)

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC Primaterax-Nord SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria or.Drochia
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a
 drumurilor locale or.Drochia,
 tranșa 1**

Valoarea lucrarilor executate

136 047,66 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cai de acces				
		1.1. Bulevardul				
		Independentei, 60/2				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	27,900	249,63 25,10	6 964,00 700,17
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	348,000	17,49 17,49	6 087,04 6 087,04
3	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	154,000	4,82 4,82	741,74 741,74
4	Ts150A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	47,220	16,36 0,00	774,00 0,00
5	DE10C	Borduri de drum prefabricate din beton vibropresat de calitate superioara cu dimensiunile in sectiune 150x300 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila	m	195,000	166,23 16,98	32 422,47 3 311,98

1	2	3	4	5	6	7
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosimea 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	348,000	164,62 15,11	57 288,22 5 257,85
		Total capital:				
						104 277,47
						16 098,78
		Total capital:				
						104 277,47
						16 098,78

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	104 277,47
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	3 863,71
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	108 141,18
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	4 109,36
	Total Total+CR	100,00 +	112 250,54
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	1 122,51
	Total Total+B	100,00 +	113 373,05
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	22 674,61
			136 047,66
	TOTAL:		16 098,78

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

Investitor

Primăria or.Drochia


(denumirea)

Administrator Brenister Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 009 629,79	337 973,14	
Total	1 009 629,79	337 973,14	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	201 925,95	67 594,63	
Total	1 211 555,74	405 567,77	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)



Beneficiar: Primaria or.Drochia

Primar Cereteu Nina

(semnătura)

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Repratia imbracamintelor cu lianti bituminosi				
		1.1. Bulevardul Independentei. Plombarea gropilor				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2, inclusiv de-a lungul bordurelor cu freza asimetrica: grosime 5 cm	m2	1 385,000	165,43 14,78	229 117,00 20 468,86
		Total capitol:				
						229 117,00 20 468,86
		1.2. Bulevardul Mitropolit Varlaam. Plombarea gropilor				
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2, inclusiv de-a lungul bordurelor cu freza asimetrica: grosime 5 cm	m2	523,000	165,38 14,78	86 491,96 7 729,47
		Total capitol:				
						86 491,96 7 729,47
		Total capitol:				
						315 608,96 28 198,33

1	2	3	4	5	6	7
Total proces-verbal:						
		Прямые затраты	?			315 608,96
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %			6 767,60
		Total ПЗ+CASM	100,00 +			322 376,56
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %			12 250,31
		Total Total+CR	100,00 +			334 626,87
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %			3 346,27
		Total Total+B	100,00 +			337 973,14
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			67 594,63
						405 567,77
		TOTAL:				28 198,33

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor


Primăria or. Drochia

(denumirea)

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a drumurilor locale în or.Drochia.Transa1

2. Numărul și data contractului Nr 67 din 29 aprilie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Drochia, r-nul Drochia

4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia, or.Drichia

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 581 073,81 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 571 086,61 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 60 zile
- efectiv realizată 60 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 67 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“29” aprilie 2021

orașul Drochia

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1617704375975 din 19 aprilie 2021, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15 A, telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar dna Nina Cereteu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în orașul Rîșcani, r-nul Rîșcani str. Eternității, 3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0059474 din “25” ianuarie 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările „Lucrări de reparație a drumurilor locale orașul Drochia. Tranșa 1.”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 581 073,81 lei MD (un milion cinci sute optzeci și unu mii șaptezeci și trei lei și optzeci și unu bani)** inclusiv TVA.

(suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 29 aprilie 2021.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL Primaterax-Nord

Adresa poștală: str. Eternității, 3/9, or. Rîșcani

Telefon: 079394309

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X779

IBAN: MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL

Primăria orașului Drochia

Adresa poștală: str. Independenței 15 A

Telefon: 0252 2 23 09

Cod fiscal: 1007601001651

Banca: Trezoreria Regională Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD26TRPDBE222500L11030AB.


1 581 073,81

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna Septembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	1 309 238,84	238 399,47	
Total	1 309 238,84	238 399,47	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	261 847,77	47 679,89	
Total	1 571 086,61	286 079,39	

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)

Beneficiar: Primaria or.Drochia

Primar Cereteu Nina

(semnătura)

Antreprenor SC„Primaterax-Nord”SRL
(denumirea)

Investitor Primăria or.Drochia
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație a
drumurilor or.Drochia, tranșă1**

Valoarea lucrarilor executate

286 079,39 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Impietruire				
		1.1. Reparatia strazii Vasile Alecsandri, sector str. Hatman Svercevschi - str. Petru Movila				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	18,070	527,45 0,00	9 532,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,070	4 750,80 125,23	85 847,94 2 262,99
		Total capitul:				
						95 380,44 2 262,99
		1.2. Reparatia strazii D. Furtuna, sector str. Tamara Ciobanu - str. V. Alecsandri + sector str. Dorohoi - str. Burebista				
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,920	527,17 0,00	485,00 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	9,200	4 750,80	43 707,38

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			125,23	1 152,16
		Total capitol:				
						44 192,38
						1 152,16
		1.3. Reparatia strazii Suceava				
5	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,800	527,78 0,00	950,00 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	4 750,59 125,23	85 514,52 2 254,12
		Total capitol:				
						86 464,52
						2 254,12
		Total capitol:				
						226 037,34
						5 669,27

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	?	226 037,34
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 360,62
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	227 397,96
	Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	8 641,12
	Total Total+CR	100,00 +	236 039,08
	Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	2 360,39
	Total Total+B	100,00 +	238 399,47
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	47 679,89
			286 079,36
	TOTAL:		5 669,27

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC,,Primaterax-Nord”SRL
(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primăria or.Drochia

(denumirea)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Primaria or.Drochia

c/f 1007601001651

Contract Nr.67 din 29.4.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Lucrari de reparatii a drumurilor locale in or.Drochia.Transa 1."

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	729 740,08	58 083,43	
Total	729 740,08	58 083,43	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	145 948,01	11 616,69	
Total	875 688,09	69 700,12	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)



Beneficiar: Primaria or.Drochia

Cereteu Nina

(semnătura)

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Drochia
 (denumirea)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor
locale or. Drochia, tranșa 1

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate pe luna august 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cai de acces				
		1.1. Strada Ghica Voda, 5				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,400	249,64 25,10	4 094,02 411,68
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	164,000	17,49 17,49	2 868,61 2 868,61
3	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	104,000	4,82 4,82	500,92 500,92
4	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	22,080	16,39 0,00	361,80 0,00
5	DE10C	Borduri de drum prefabricate din beton vibropresat de calitate superioara cu dimensiunile in sectiune 150x300 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm dinspre partea carosabila	m	112,000	166,26 16,98	18 620,66 1 902,26
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat grosimea 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de	m2	164,000	164,62 15,11	26 998,34 2 477,71

1	2	3	4	5	6	7
		ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		Total capitol:				
						53 444,35
						8 161,18
		Total capitol:				
						53 444,35
						8 161,18

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	?	53 444,35
		CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 958,68
		Total ПЗ+CASM	100,00 +	55 403,03
		Cheltuieli de regie (Total) * 3,8 %	3,80 %	2 105,32
		Total Total+CR	100,00 +	57 508,35
		Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	575,08
		Total Total+B	100,00 +	58 083,43
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	11 616,69
				69 700,12
		TOTAL:		8 161,18

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

SC Primaterax-Nord " SRL

Primăria or. Drochia

(denumirea)

(denumirea)

Administratie Breiștor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR
Nr. 1 din 22.10.2021**

Privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale orasul Drochia. Transa 1. executată la Lucrari de reparatie a drumurilor locale orasul Drochia. Transa 1. în cadrul contractului Nr. 67 din 29.03.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Primaria orasul Drochia privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale orasul Drochia. Transa 1.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **18 – 22 Octombrie** fiind formată din:

- **Presedintele comisiei:**

1. Cereteu Nina – primar al orasului Drochia

- **Membrii comisiei**

2. Rusu Pavel – secretar al Consiliului Orasenesc

3. Alexeev Victoria – specialist din cadrul primariei

4. Foalea Ion- specialist

5. Kalinovski Nicolai – specialist

6. Bîrnaz Nicolae – specialist

7. Grigorita Nicolae – specialist

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **1 581 073,81 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Lucrari de reparatie a drumurilor locale orasul Drochia. Transa 1. in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ 1 _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ 22.10.21 _____ în _____ 5 _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: 1. Cereteu Nina – primar al orașului Drochia

Membrii:

2. Rusu Pavel – secretar al Consiliului Orasenesc

3. Alexeev Victoria – specialist din cadrul primariei

4. Foalea Ion- specialist

5. Kalinovski Nicolai – specialist

6. Bîrnaz Nicolae – specialist

7. Grigorita Nicolae – specialist
(numele, prenumele)

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)



