

PROIECT DE EXECUȚIE


Finalizarea și punerea în funcțiune
a sistemului de apeduct Prut-Fălești

Albumul 004

Proiect nr.: 320/S/20.01.2025

Exemplar nr.: 1

Platforma A. Stația de pompare Sculeni. Planul general – A-PG

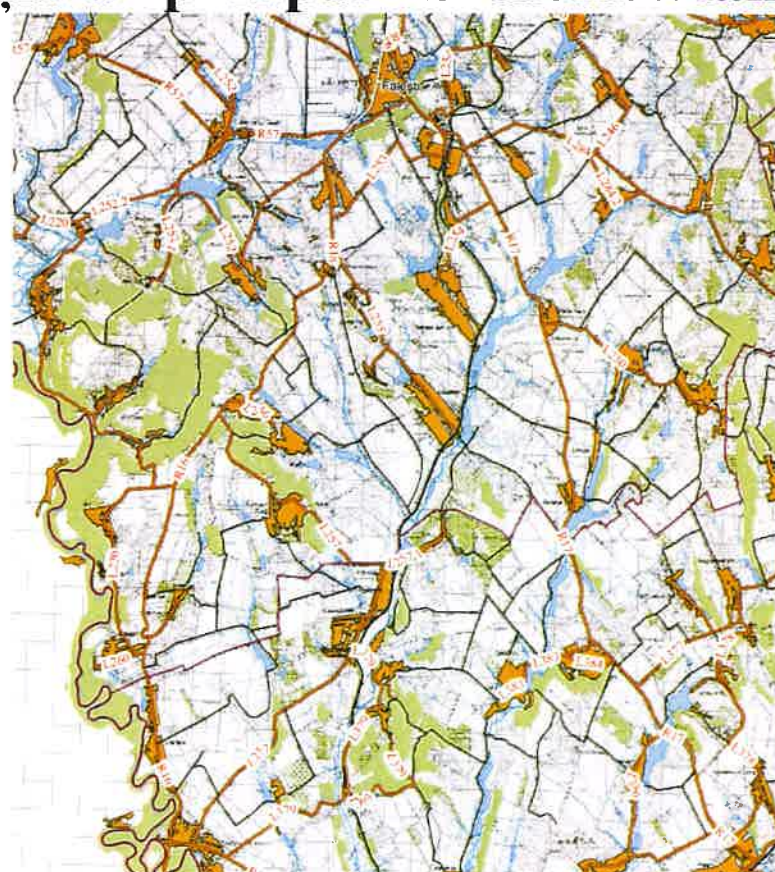


Chișinău, 2025

The map displays the project area in the Râul Falești and Râul Ungheni regions. The proposed project location (Obiectivul proiectat) is marked with a blue dot near the village of Falești. The map includes labels for various settlements such as Glodeni, Bălți, Râul Falești, Râul Ungheni, Iași, and Mogoșești. It also shows the E583 and E581 roads and the Google logo.

5. Predarea în exploatare a construcției.

verificator de proiecte 686
Isac Vasile
Domenile A.1 2.3.4
Nr. de înregistrare a avizului 41
Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2024



BORDEROUL DESENELOR DE EXECUTIE A SETULUI 320/S/20.01.2025 - A - PG											
INDICE		DENUMIREA						NOTA			
1		PLAN INCADARAREA IN TERITORIU R-NUL FALESTI; PLAN SITUATIE									
2		PLAN GENERAL									
3		PLAN TRASARE									
4		PLAN AMENAJARE									
5		ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE									
6		EXPLICATIE, LEGENDA SI SIMBOLURI; ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE									
7		EXPLICATIE, LEGENDA SI SIMBOLURI; ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE									
8		DATE GENERALE (început)									
9		DATE GENERALE (sfîrsit)									
REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Falesti						320/S/20.01.2025 - A - PG					
						Finalizarea si punerea în functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti					
Mod	Nr.par.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data	Retele exterioare de alimentare cu apa			Etapa	Coala	Coli
									PE	1	9
ASP		Prescureanu Gr.				Plan incadararea in teritoriu r-nul Ungheni Plan situatie			"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chisinau, 2025		
Arh.		Ojog A.									



PLAN GENERAL Sc 1:500

LEGENDA PLAN GENERAL

POZ.	POZ., conf. PG	DENUMIREA	CANTITATE
	1	STATIE DE POMPAREA	Proiect
	2	CAMIN PENTRU CONTOR	Proiect
	3	STATIE DE POMPAREA	Existent
	4	SONDA ARTEZIANA	Existent
	5	SONDA ARTEZIANA	Existent
	6	SONDA ARTEZIANA	Existent
	7	SONDA ARTEZIANA	Existent
	8	SONDA ARTEZIANA	Existent

	- GARD EXISTENT		- STATIE EXISTENTA
	- STATII PROIECTATE		- SPATII VERZI
	- SONDE ARTEZIANE EXISTENTE	0.000	- COTA ROSIE (proiectata)
	- ÎMBRACAMINE CU PRUNDIS	0.000	- COTA NEAGRA (existenta)

Proiectul este elaborat în conformitate cu normele în vigoare și asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor conform CUC 434/2023:

- Cerinta 1 - Integritatea structurala a construcțiilor;
Cerinta 2 - Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
Cerinta 3 - Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
Cerinta 4 - Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vatamărilor corporale, determinate de construcții;
Cerinta 5 - Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
Cerinta 6 - Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
Cerinta 7 - Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
Cerinta 8 - Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile

ASP: Prescureanu Gr.

ISP: Jelamschi E.

ASP - certificat pentru proiectare Nr. 1016 din 21.06.2023

ISP - certificat pentru proiectare Nr. 1176 din 29.05.2024

Certificat de urbanism
nr.1 din 29.01.2025, Primaria r-nul. Falesti.

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Falesti

320/S/20.01.2025 - A - PG

Finalizarea și punerea în funcțiune
a sistemului de apeduct Prut-Falesti

Mod	Nr. par.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data
ASP		Prescureanu Gr.			
Arh.		Ojog A.			

Retele exterioare de alimentare cu apa	Etapa		
	Coala	Coli	
	PE	2	
Plan General 1:500.			"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chisinau, 2025



PLAN TRASARE Sc 1:500

LEGENDA PLAN TRASARE

POZ.	POZ, conf. PG	DENUMIREA	CANTITATE
	1	STATIE DE POMPAREA	Proiect
	2	CAMIN PENTRU CONTOR	Proiect
	3	STATIE DE POMPAREA	Existent
	4	SONDA ARTEZIANA	Existent
	5	SONDA ARTEZIANA	Existent
	6	SONDA ARTEZIANA	Existent
	7	SONDA ARTEZIANA	Existent
	8	SONDA ARTEZIANA	Existent

	- GARD EXISTENT		- PRUNDIS
	- STATII PROIECTATE		- DIMENSIUNI GABARIT
	- SONDE ARTEZIANE EXISTENTE		

NOTA:

- Racordarea/ bransarea la rețelele tehnico-edilitare publice va fi efectuată în baza avizelor tehnice eliberate de serviciile de resort.

NOTA:

Coordonatele de trasare a construcției sunt indicate conform sistemului de coordonate MOLDREF 99.

Trasarea în natura a axelor principale și de baza a clădirii se va realiza conform documentației de proiect și se va verifica prin minim două metode :

I. după coordonate;

II. după dimensiuni, cote și forma în plan.

Înainte de a începe executarea lucrărilor geodezice pe șantierul de construcție, desenele de lucru utilizate la lucrările de trasare, trebuie verificate în ceea ce privește coordonarea reciprocă a dimensiunilor, coordonatelor și cotelor și permise spre executare de responsabilul tehnic.

Neconformitățile constatate se vor clarifica cu arhitectul și ulterior modificările vor fi permise doar cu aprobarea acestuia.

- Toate cotele și dimensiunile se vor verifica de către executanți la începutul și în timpul lucrărilor de execuție, în prezența arhitectului șef de proiect și/ sau a inginerului șef de proiect ;

- Modificările sunt permise numai cu aprobarea proiectantului general ;

Verificat de ing. Vasile Dobrenile A.1,2,3,4
Nr. de înregistrare a avizului
V. 11.05.2021 până la 12.05.2026



Republica Moldova
Consiliul raional Falești

Mod	Nr. par.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data
ASP		Prescureanu Gr.			
Arh.		Ojog A.			

320/S/20.01.2025 - A - PG

Finalizarea și punerea în funcțiune
a sistemului de apeduct Prut-Falești

Retele exterioare de alimentare cu apă	Etapă	Coala	Coli
	PE	3	
Plan trasare Sc 1:500		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chisinau, 2025	



PLAN AMENAJARE Sc 1:500

IMBRACAMINTE CU PIETRIS

pietris (balast fr.10-20)	-100mm
geotextil 150 gr./m ²	- 1 strat
pietris usor compactat in sol (fractia 20-40mm)	- 40mm
sol existent	

Piatra de bordura
din beton PB 100.30.15
STST 6665-82

GARD EXISTENT

Beton B10
STAT 26633-82

CA-??

1 2

2

+0.500
44.10

3

0.000
43.60

5

6

Verificator de proiectare
Isaie Vasile
Domeniile A.1.2.3.4
Nr. de autorizare a avizului
V. 2.1 de la 10.05.2021 până la 12.05.2026



- GARD EXISTENT
- STATII PROIECTATE
- SONDE ARTEZIANE EXISTENTE


LEGENDA PLAN AMENAJARE

POZ.	POZ., conf. PG	DENUMIREA	CANTITATE
	1	STATIE DE POMPAREA	Proiect
	2	CAMIN PENTRU CONTOR	Proiect
	3	STATIE DE POMPAREA	Existent
	4	SONDA ARTEZIANA	Existent
	5	SONDA ARTEZIANA	Existent
	6	SONDA ARTEZIANA	Existent
	7	SONDA ARTEZIANA	Existent
	8	SONDA ARTEZIANA	Existent
A		ÎMBRACAMINTE CU PRUNDIS	84,0 m ²
B		BORDURA DIN BETON	41,0 m.l.
C		EVACUAREA MASELOR DE PAMANT VEGETAL	13,0 m.c.

IMBRACAMINTE CU PIETRIS

prundis (balast fr.10-20)	-100mm
geotextil 150 gr./m ²	- 1 strat
pietris usor compactat in sol (fractia 20-40mm)	- 40mm
sol existent	

Prundis (balast




Gazon natural



Piatra debordura



Piatra de bordura
din beton PB 100.30.15
STST 6665-82

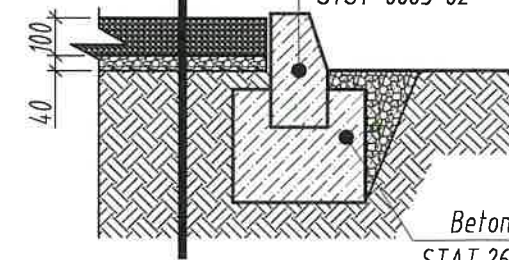

Beton B10
STAT 26633-82

- STATIE EXISTENTA
- SPATII VERZI
- ÎMBRACAMINTE CU PRUNDIS
- ARTAR - 18 buc.
- TEI - 18 buc.

Indicatii de executare a lucrarilor

- Solul excedent (surplus) la realizarea albiei pentru îmbracăminte rutiera și construcțiilor, nivelarea terenului în volum de 13,0 mc este excavat cu buldozerul și mutat la o distanță de până la 10m.
- Surplusul de sol în volum de 13,0 mc se va duce cu autobasculante la distanța de minim 1km.
- La lucrările de excavare și batătorire a solului se va ține cont de normativul SNIP 3.01.01-85, SNIP 3.02.01-87, SNIP 111-4-80.

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Falesti

320/S/20.01.2025 - A - PG

Finalizarea și punerea în funcțiune
a sistemului de apeduct Prut-Falesti

Mod	Nr. par.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data
ASP		Prescureanu Gr.			
Arh.		Ojog A.			

Retele exterioare de alimentare cu apa

Plan amenajare 1:500.

Etapă	Coala	Coli
PE	4	
"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chisinau, 2025		

ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE Sc 1:500

Verificator de proiect
Isac Vasile
Domeniile A.1.2.3.4
Nr. de inregistrare a avizului 41/25
Valabil de la 12.05.2025 până la 12.05.2026

MARCAJE CONVENTIONALE PENTRU OLC

SIMBOL	EXPLICATIE	SIMBOL	EXPLICATIE
	ÎNGRADIRE PROVIZORIE		ÎNCAPERE PT PERSONAL SI DIRIGINTE DE SANTIER
	REZERVOR/STATIE PROIECTATE		ACCES AUTO CATRE AMPLASAMENT
	LOC PENTRU DEPOZITAREA MATERIALELOR		POARTA DE ACCES AUTO
	PANOU ANTIINCENDIAR		PROIECTOR NOCTURN LED
	PANOU INFORMATIV		WC (mobil)

INDICI TEHNICO-ECONOMICI

Nr.	DENUMIREA INDICILOR	UNIT. DE MASURA	INDICI
1	STATIE DE POMPAREA	m ²	7.5
2	CAMIN PENTRU CONTOR	m ²	4.2
3	ÎNGRADIRE PROVIZORIE	m.l.	440.0
4	LOC PENTRU DEPOZITAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE	m ²	100.0
5	ÎNCAPERE PENTRU PERSONAL SI DIRIGINTE DE SANTIER	m ²	18.0
6	PANOU ANTIINCENDIAR	buc.	1
7	PANOU INFORMATIV	buc.	1



REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Falesti

Mod	Nr. par.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data
ASP		Prescureanu Gr.			
Arh.		Ojog A.			

320/S/20.01.2025 - A - OLC

Finalizarea si punerea în functiune
a sistemului de apeduct Prut-Falesti


Retele exterioare de alimentare cu apa	Etapa	Coala	Coli
	PE	5	
Organizarea lucrarilor de constructie Sc 1:500	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chisinau, 2025		

GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR



Nr. de ord.	Denumirea lucrarilor	Perioada de luni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
			1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
1	Lucrari de pregatire	0,5																					
2	Groapa de fundatie	0,5																					
3	Executarea fundatiilor	0,5																					
4	Montarea utilajului	0,5																					
5	Lucrari de terasament	0,5																					
6	Montarea retelelor exterioare	0,5																					
7	Amenajarea teritoriului	0,5																					



SECTIUNE TRANSVERSALA ACCES/DRUMURI PROVIZORII

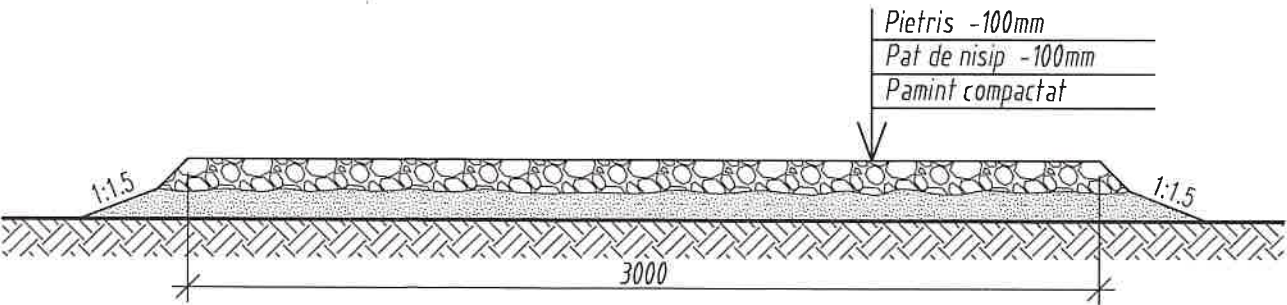


INGRADIRE PROVIZORIE A SANTIERULUI DE CONSTRUCTIE SC.1:50

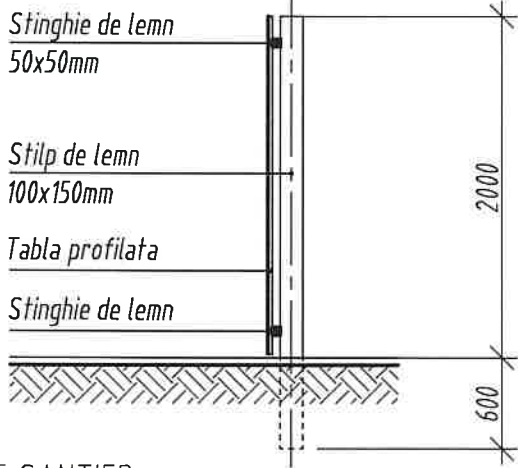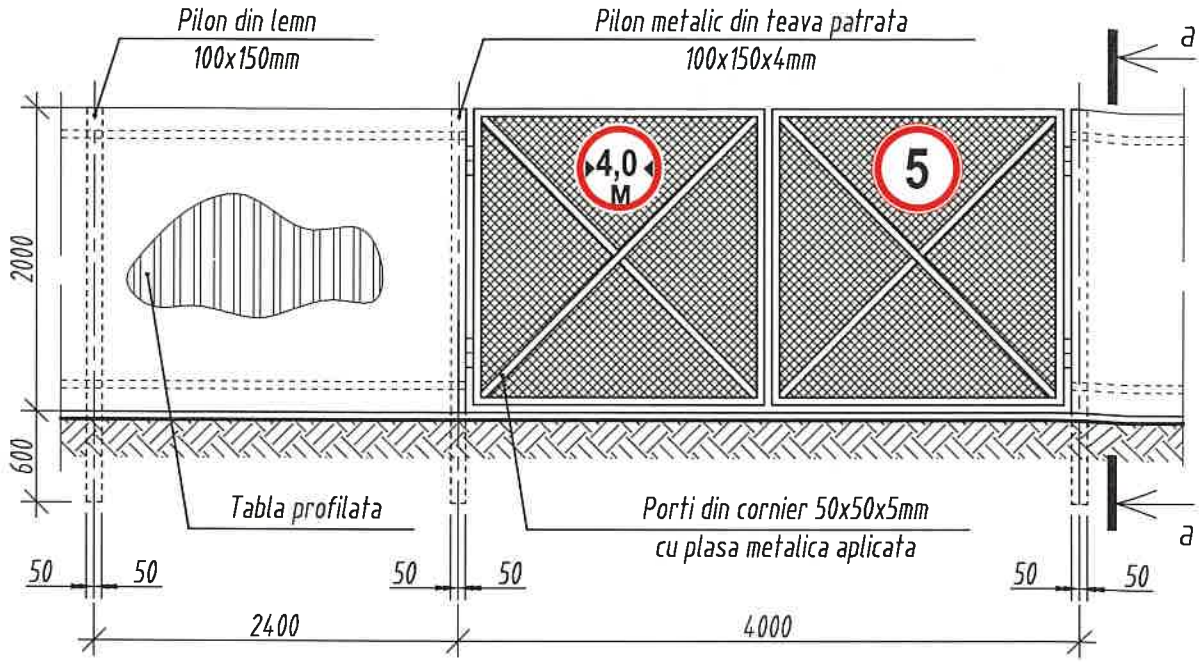

EXPLICATIE UTILAJ DE SANTIER

POZ.	DENUMIREA CLADIRI (CONSTRUCTII)	NOTA
1	Autocamion	
2	Excavator universal 30-4321B	3
3	Autobetoniera 69361H (AEC-7DA)	3
4	Autopompa de beton Putzmeister M 28-4 (BSF 28.09 H)	3

Verificator de proiect
Isac Vasile
Domeniile A.1, 2, 3, 4
Nr. de inregistrare a avizului 47/25
Val. de la 12.05.2023 pana la 12.05.2026



REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Falesti

320/S/20.01.2025 - A - OLC

Finalizarea si punerea în functiune
a sistemului de apeduct Prut-Falesti

Mod	Nr.par.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data
ASP		Prescureanu Gr.			
Arh.		Ojog A.			



Retele exterioare de alimentare cu apa

Etapa	Coala	Coli
PE	6	


EXPLICATIE, LEGENDA SI SIMBOLURI;
ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE

"APCAN PROIECT" S.R.L.
mun. Chisinau, 2025

AUTOPOMPA DE BETON PUTZMEISTER M 28-4 (BSF 28.09 H) PE SASIU MAN

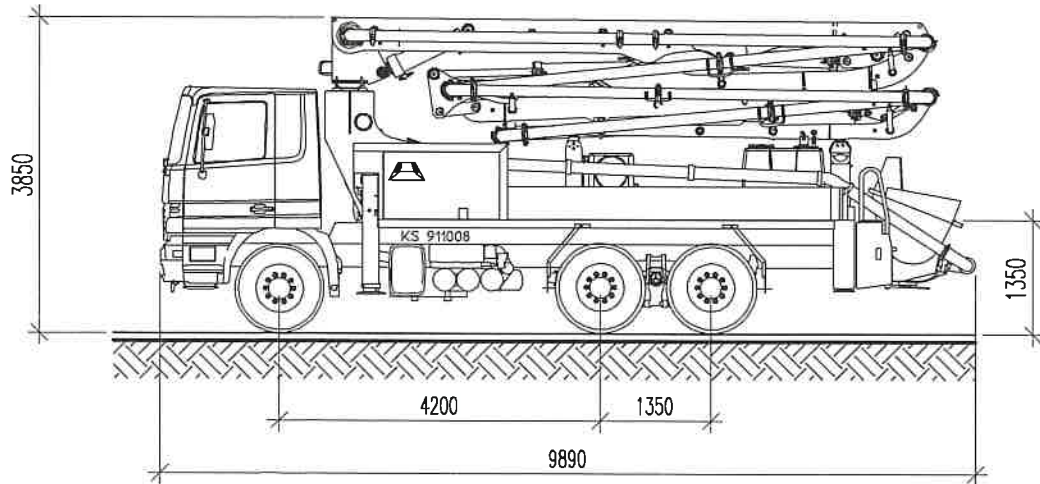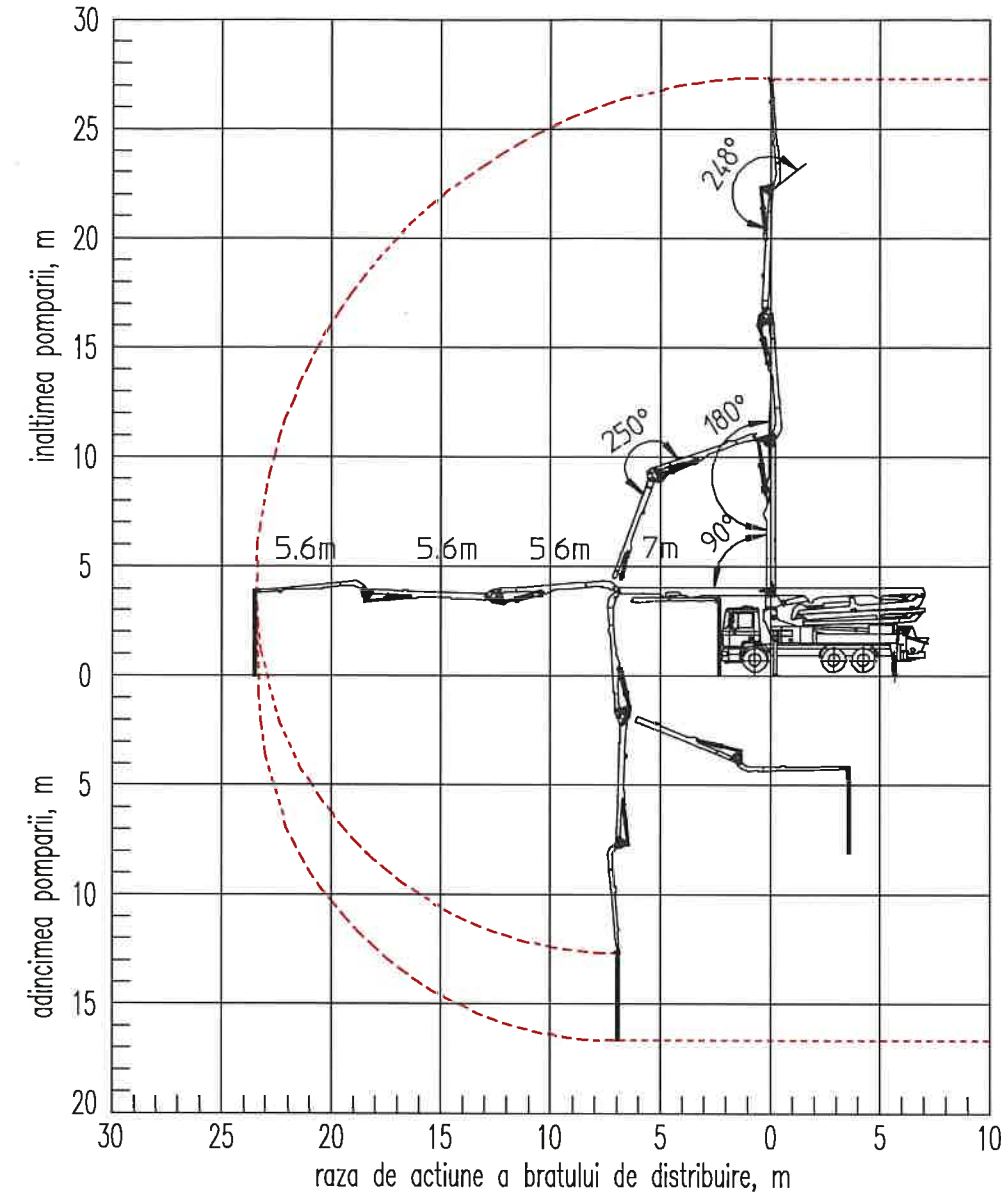

EXCAVATOR UNIVERSAL 30-4321 B

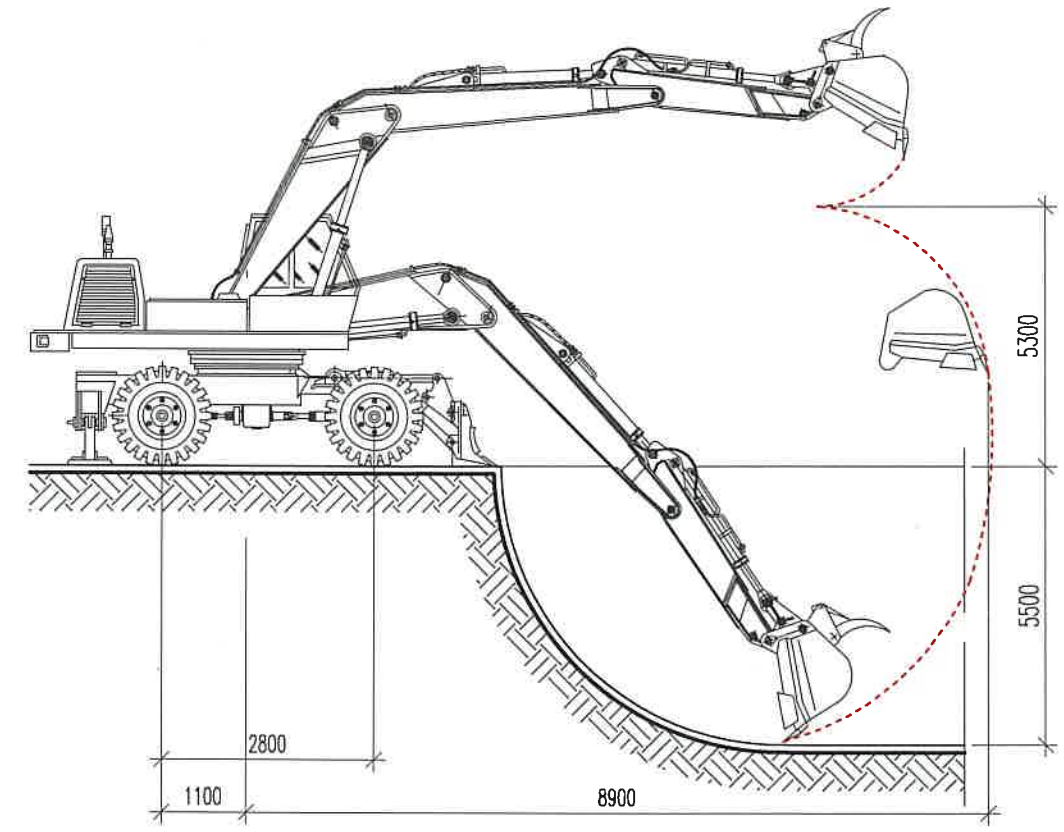

EXCAVATOR UNIVERSAL 30-4321 B CARACTERISTICI TEHNICE

1. Volumul geometric (nominal) a cupei - 0.8m.cub
2. Adincimea de sapare - 5.5m
3. Raza de actiune - 8.9m
4. Inaltimea maxima de descarcare - 5.3m
5. Sarcina de sapare - 150kH

Verificator de proiectare
Isac Vasile
Domeniile A,1,2,3,4
Nr. de inregistrare a avizului 44/25
CS 2021 până la 12.05.2026

AUTOPOMPA DE BETON PUTZMEISTER M 28-4 (BSF 28.09 H) CARACTERISTICI TEHNICE

1. Rata de alimentare - 90m.cub/h
2. Inaltimea maxima a pomarii betonului prin intermediul bratului de distribuție - 27.3m
3. Adincimea maxima a pomarii betonului prin intermediul bratului de distribuție - 16.6m
4. Raza de actiune a bratului de distribuție - 23.4m
5. Lungimea furtunului de distribuție - 4m

PRESCUREANU GRIGORE
P-2023
Nr.1016
3a,b
PROIECTANT

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Falesti						320/S/20.01.2025 - A - OLC		
						Finalizarea si punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti		
Mod	Nr.par.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data	Retele exterioare de alimentare cu apa	Etapa	Coala
							PE	7
ASP		Prescureanu Gr.				EXPLICATIE, LEGENDA SI SIMBOLURI; ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chisinau, 2025	
Arh.		Ojog A.						

A. SUCCESIUNEA TEHNOLOGICĂ DE EXECUȚIE A LUCRARILOR

1. Lucrarile se vor executa în urmatoarele succesiuni:

- saparea gropii de fundatie
- executia fundatiei
- betonarea coloanelor, grinzilor si planseului.
- executarea acoperisului
- montarea retelelor interioare si exterioare
- executia lucrarilor de finisaj
- amenajarea teritoriului

B. ORGANIZAREA ÎNCAPERILOR TEMPORARE PE SANTIERUL DE CONSTRUCTIE

În cadrul santierului de amplasat câte o încăpere temporara pentru personalul ingineresc si muncitori.
Încaperea pentru muncitori de prevazut cu vestiar si sala pentru masa separata.
Pentru necesitatea sanitara de amplasat o încăpere pentru dus cu lavoar si veceu. Locul de instalare a încăperilor provizorii sunt indicate pe plan oragnizare a lucrarilor de constructie.

C. SUPRAFATA PENTRU DEPOZITAREA MATERIALELOR

Pentru depozitarea materialelor trebuie de organizat un teren cu suprafata de 40 m².
Amplasarea terenului vezi plan oragnizare a lucrarilor de constructie.

D. ASIGURAREA VERIFICĂRII CALITĂȚII MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE SI A LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.

1. Toate materialele de constructie la intrare în santier vor fi verificate în corespundere cu cerintele normative, certificate de calitate si standarte nationale.
2. Principalele lucrari de constructie sunt supuse proceselor verbale de verificare a lucrarilor ascunse, si astfel se permite efectuarea urmatoarelor lucrari conform succesiunilor tehnologice, asigurându-se calitatea.
3. Controlul calitatii se efectueaza de urmasorii participanti la procesul de edificare a constructiei :
 - beneficiarul va desemna un responsabil tehnic atestat pentru urmarirea proceselor de constructie
 - biroul de proiectare efectueaza controlul de autor
 - inspectia de stat în Constructie exercita controlul calitatii lucrarilor efectuate.

E. ASIGURAREA SERVICIULUI DE CONTROL GEODEZIC

1. În perioada lucrarilor de pregatire beneficiarul va organiza pregatirea geodezica a terenului.
2. Executarea lucrarilor, pe baza documentatiei de proiect va pregati schema amplasarii axelor principale a cladirii si a reperelor.

F. ASIGURAREA CERINTELOR NORMATIVE DE SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA

1. La executarea lucrarilor, trebuie de asigurat cerintele urmatoarelor acte normative
 - codul muncii al Republicii Moldova
 - NRS 35-03-96 2008
 - NCM A.08.02:2014
 - CP AA.05.02:20
2. Toti muncitorii de dotat cu echipament individual de protectie a muncii.



G. SCHEMA TEHNOLOGICA ORGANIZATORICA

Înainte de începutul fiecarui schimb de lucru maistrul sau sefi de echipa verifica starea tehnica a schelelor

1. Constructia obiectivului se efectueaza in doua perioade:
 - pregatitoare (organizarea santierului)
 - de baza (lucrari de constructie)
2. Perioada pregatitoare include:
 - îngradirea santierului cu gard temporar conform FOCT 23407-78 si organizarea cailor de acces cu porti, latimea de 4,0 m
 - elaborarea si aprobarea proiectului de executie a lucrarilor
 - oformarea autorizatiilor si permiselor de executie a lucrarilor
 - pregatirea geodezica (trasarea axelor principale)
 - defrisarea stratului vegetal, executia drumurilor provizorii si organizarea scurgerii apelor meteorice
 - montarea încăperilor provizorii
 - montarea panoului informativ cu date despre constructia proiectata si schema de deplasare a transportului în cadrul santierului, si amplasare indicatoarelor rutiere.
3. Perioada de baza cuprinde toate lucrarile de constructie, montaj începând de la lucrarile de terasament pâna la amenajarea teritoriului. Lucrarile de betonare de executat cu ajutorul autopompei.
Montarea acoperisului de efectuat cu ajutorul macaralei pe pneuri.

H. LISTA LUCRARILOR SUPUSE PROCESELOR VERBALE DE VERIFICARE

1. Lucrari de terasament:
 - defrisarea si recultivarea stratului vegetal
 - pregatirea terenului pentru fundatii
 - saparea gropii de fundatie si determinarea straturilor de pamânt.
2. Lucrari de betonare:
 - armarea elementelor din beton armat monolit
 - montarea cofrajului si verificarea dimensiunilor.
4. Montarea constructiilor usoare de îngradire:
 - montarea panourilor de perete si acoperis izolatoare
 - montarea blocurilor de usi si ferestre
 - ermetizarea pe perimetru a blocurilor de usi si ferestre
 - montarea ferestrelor si a sticlei.
5. Lucrari de izolare:
 - pregatirea suprafetei pentru hidroizolare si vopsire
 - Hidroizolarea verticala si orizontala



REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Falesti						320/S/20.01.2025 - A - OLC		
						Finalizarea si punerea în functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti		
Mod	Nr.par.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data	Retele exterioare de alimentare cu apa	Etapa	Coala
							PE	8
ASP		Prescureanu Gr.				DATE GENERALE (început)	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chisinau, 2025	
Arh.		Ojag A.						

MASURI DE PRVENIRE A CADERII DE LA ÎNALTÎME

1. Organizarea locurilor de munca trebuie sa asigure securitatea executarii lucrarilor. Locurile de munca dupa necesitate trebuie sa posede îngradire.
2. Locurile de munca, amplasate mai sus de înaltimea de 1.30 m trebuie sa fie îngradite, înaltimea îngradirii minim 1.10 m.
3. La imposibilitatea amplasarii îngradirii, muncitorii trebuie asigurati cu centuri de siguranta
5. Pentru deplasarea montatorilor de la o constructie la alta trebuie de utilizat scari, podeste, schele.
6. Deplasarea montatorilor peste elementele ce se monteaza fara elemente de îngradire este interzisa.
7. Nu se permite efectuarea lucrarilor de montaj la înaltime în câmp deschis la viteza vantului de 15m/s si mai mult, cât si pe timp de ceata sau furtuna.
8. Lucrarile de manipulare a panourilor verticale nu vor fi efectuate în cazul conditiilor nefavorabile a timpului, mai ales pe timp de vijelei sau cu viteza vântului mai mare de 10 m/s.
9. La efectuarea lucrarilor de montare a parapetelor, montatorii trebuie asigurati cu centura.

ELECTROSECURITATEA CONSTRUCTIEI

1. Personalul desemnat pentru lucrarile de deservire si dirijare a instalatiilor de electrificare trebuie sa fie în vârsta de minim 18 ani, si sa posede calificarea necesara.
2. Persoanele admise la dirijarea cu masinile de constructie si utilajul electric trebuie sa posede calificarea necesara pentru tehnica securitatii.
3. În organizarea de constructie-montaj trebuie sa fie desemnat un inginer, care va fi responsabil de utilajele electrice de pe santier.
4. Lucrarile ce tin de conectarea, reparatia si profilactica retelelor electrice trebuie efectuate de catre personalul care este atestat conform tehnicii securitatii.
5. Întrerupatoarele si aparatele electice dau comutare utilizate la santierul de constructie sau instalate în masinile de constructie trebuie sa fie protejate.
6. Retelele electice temporare trebuie sa fie din cabluri izolate si sa fie instalate pe suporturi în înaltimea de 4.50 m peste lucurile de munca si 6.00 m deasupra drumurilor.
7. Lampile de iluminare, care sunt conectate la sursa de electircitate cu tensiunea de 127 si 220V, trebuie instalate la înaltimea de 2.50 m fata de cota terenului sau pardoselei temporare, la înaltimea de mai putin de 2.50 m lampile trebuie conectate la tensiunea nu mai mare de 42 V. La efectuarea lucrarilor în conditiile deosebit de periculoase se vor utiliza lampi conectate la tensiunea nu mai mare de 12 V.


DEPOZITAREA MATERIALELOR ÎN CADRUL SANTIERULUI

1. Organizarea locurilor de depozitare a materialelor pe terenul santierului trebuie efectuate cu respectarea normelor prevazute în NCM A.08.02 si cerintele antiincendiare.
2. Livrarea materialelor de constructie la santier se face numai dupa pregatirea terenului pentru depozitare prevazute pe proiectul de executie a lucrarilor.
3. Depozitarea materialelor de constructie si utilajelor de efectuat în corespundere cu standartele si parametrii tehnici a elementelor depozitate.
4. Materialele, articolele si utilajele trebuie amplasate pe terenuri compactate si drepte (panta maxima 5 grade), iar în perioada rece a anului curatita de zapada si gheata. Trebuie luate masuri împotriva deplasarii posibile a încarcaturilor.
5. Garnitura si paneele din stivele materialelor depozitate trebuie aranjate în plan vertical. Înaltimea lor trebuie sa fie cu minim 20 mm mai mare decât înaltimea de montaj a urechișelor.
6. Rezemarea materialelor de garnituraa si constructiile temporare sau permanente este inezisa. Amplasarea încarcaturilor pe treceri si drumuri este interzisa.
7. Materialele si articolele se depoziteaza în corespundere cu masa si capacitatea de a se deforma sub greutatea materialelor amplasate deasupra.

8. Metodele de depozitare si asezare a materialelor si detaliilor trebuie sa asigure stabilitatea stivelor. Ele se marcheaza cu tichete în care se indica sortimentul, cantitatea si detaliile tehnice. În fiecare stiva de pastrat numai un singur tip de element.
9. Pe teritoriul santierului trebuie de rezervat teren pentru materialele scoase din folosinta.
10. Materialele prafoase trebuie pastrate în vase închise.
11. Materialele explozive si chimice trebuie pastrate în vase închise ermetic, în locuri special amenajate.
12. La locurile de munca unde se utilizeaza cleiuri, vopsele si alte substante chimice usor inflamabile nu se permite lucrul cu focul sau aparitia scânteilor.

LUCRARILE DE ÎNCARCARE- DESCARCARE

1. Pentru lucrarile de legare, agatare si deplasare a încarcaturilor cu ajutorul macaralei pot fi desemnati agatatorii în vârsta de la 18 ani si care poseda legitimitatile de agatator.
2. Descarcarea elementelor constructiei din unitatea de transport trebuie efectuate cu ajutorul dispozitivelor de manipulare prevazute dupa proiectul de executie a lucrarilor.
3. Lucrarile de încarcare- descarcare trebuie executate sub conducerea maistrului, care poseda pregatire speciala.
4. Agatatorul trebuie sa posede manusi.
5. La ridicarea si deplasarea încarcaturilor se interzice:
 - manipularea elementelor daca pe încarcatura se afla persoane sau obiecte sanitare
 - manipularea manuala a încarcaturilor în timpul de ridicare, deplasare si coborâre a încarcaturii
 - aflarea persoanelor în salonul sau caroseria autovehicolelor în timp de ridicare si coborâre a încarcaturii.
6. Pentru urcarea în caroserie autovehicolelor mai înalte de 1.50 m trebuie utilizata scara.
7. Încarcarea si descarcarea autovehicolelor trebuie realizate cu mentinerea echilbrului unitatii de transport.
8. Aflarea persoanelor straine si celor care nu au legatura cu lucrarile de încarcare- descarcare în zona de lucru este interzisa.



REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Falesti						320/S/20.01.2025 - A - OLC		
						Finalizarea si punerea în functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti		
Mod	Nr.par.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data	Retele exterioare de alimentare cu apa	Etapa	Coala
							PE	9
ASP		Prescureanu Gr.				DATE GENERALE (sfirsit)	"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chisinau, 2025	
Arh.		Ujog A.						
