



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Qtr 1, 2025		Qtr 2, 2025			Qtr 3, 2025			Qtr 4, 2025			Qtr 1, 2026	
							Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1		<b>Activitati prestate de Ofertant conform metodologiei intocmite in cadrul Propunerii tehnice</b>	<b>260 days</b>	<b>Wed 1/22/25</b>	<b>Tue 1/20/26</b>														
2		<b>Analiza preliminara</b>	<b>76 days</b>	<b>Wed 1/22/25</b>	<b>Wed 5/7/25</b>														
3		Activități 1: Semnarea contractului	2 days	Wed 1/22/25	Thu 1/23/25														
4		Activitatea 2: Emiterea ordinului de începere	1 day	Fri 1/24/25	Fri 1/24/25	3													
5		<b>Jalon 1: Începerea oficială a proiectului</b>	0 days	Fri 1/24/25	Fri 1/24/25	3,4													
6		Activitatea 3: Întâlnire internă pentru alocarea resurselor umane și materiale	1 day	Mon 1/27/25	Mon 1/27/25	5													
7		Activitatea 4: Analiza legislației și a reglementărilor în vigoare	10 days	Tue 1/28/25	Mon 2/10/25	6													
8		Activitatea 5: Întâlnire internă de coordonare pentru demararea serviciilor de proiectare	1 day	Tue 2/11/25	Tue 2/11/25	6,7													
9		<b>Jalon 2: Organizarea inițială a echipei și a resurselor</b>	0 days	Tue 2/11/25	Tue 2/11/25	8													
10		Activitatea 6: Analiza detaliată a studiului de fezabilitate	3 days	Wed 2/12/25	Fri 2/14/25	8,9,7													
11		Activitatea 7: Discuție cu beneficiarul pentru alinierea viziunilor	3 days	Mon 2/17/25	Wed 2/19/25	7,10													
12		Activitatea 8: Inspectia amplasamentului pentru validarea datelor tehnice	2 days	Thu 2/20/25	Fri 2/21/25	11													
13		Activitatea 9: Întocmirea documentației necesare obținerii certificatului de urbanism	2 days	Mon 2/24/25	Tue 2/25/25	10,11,12													
14		Activitatea 10: Depunerea documentației pentru emiterea certificatului de urbanism	2 days	Wed 2/26/25	Thu 2/27/25	13													
15		Activitatea 11: Emiterea certificatului de urbanism	30 days	Fri 2/28/25	Thu 4/10/25	14													
16		<b>Jalon 3: Certificatul de urbanism emis</b>	0 days	Thu 4/10/25	Thu 4/10/25	15													
17		Activitatea 12: Întâlnire internă	1 day	Fri 4/11/25	Fri 4/11/25	16													
18		Activitatea 13: Demararea studiilor de teren	1 day	Mon 4/14/25	Mon 4/14/25	17													
19		Activitatea 14: Investigație topografică detaliată și generarea modelelor digitale ale terenului	5 days	Tue 4/15/25	Mon 4/21/25	18													
20		Activitatea 15: Elaborarea Studiului Geotehnic de De	12 days	Tue 4/15/25	Wed 4/30/25	18													
21		Activitatea 16: Studiu hidrogeologic detaliat pentru caracterizarea condițiilor subterane	12 days	Tue 4/15/25	Wed 4/30/25	18													
22		Activitatea 17: Întocmirea Expertizei Tehnice pentru Demolarea Clădirilor Existente	10 days	Tue 4/15/25	Mon 4/28/25	18													
23		<b>Jalon 4: Studiile de teren și analizele tehnice preliminare sunt finalizate</b>	0 days	Wed 4/30/25	Wed 4/30/25	19,20,21,22													
24		Activitatea 18: Analiza studiilor realizate de către membrii echipei de proiectare	2 days	Thu 5/1/25	Fri 5/2/25	23													
25		Activitatea 19: Analiza tuturor soluțiilor pentru optimizarea consumului de energie, reducerea costurilor și respectarea reglementărilor de eficiență energetică, cum ar fi cerințele nZEB	12 days	Tue 4/15/25	Wed 4/30/25	18													
26		Activitatea 20: Intocmirea raportului de sinteza si sustinerea in cadrul intalnirii cu beneficiarul	3 days	Mon 5/5/25	Wed 5/7/25	7,10,12,23,24,													
27		<b>Concept arhitectural</b>	<b>72 days</b>	<b>Thu 5/8/25</b>	<b>Fri 8/15/25</b>														

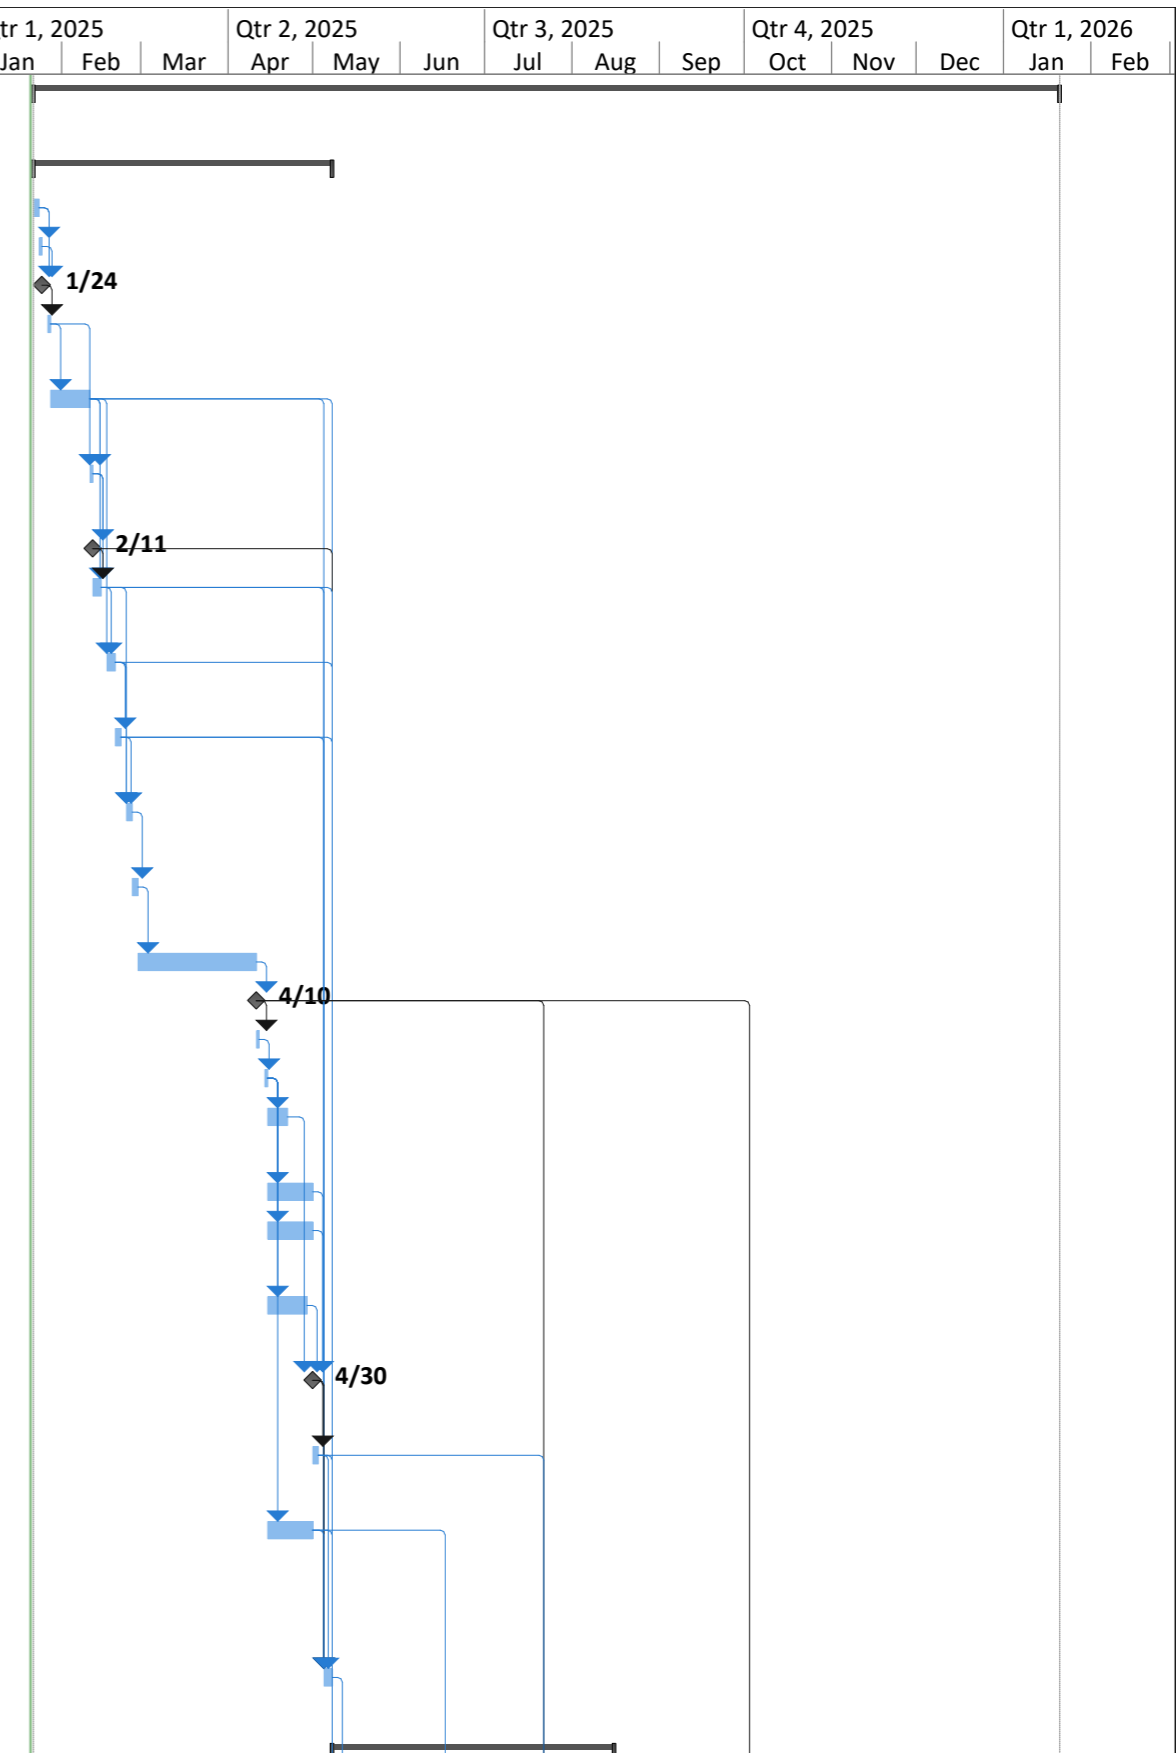

Project: msproj11 Date: Tue 1/21/25	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Progres manual	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Qtr 1, 2025		Qtr 2, 2025			Qtr 3, 2025			Qtr 4, 2025			Qtr 1, 2026	
							Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
28		Activitatea 20: Elaborarea și prezentarea conceptului preliminar de proiectare în trei variante	25 days	Thu 5/8/25	Wed 6/11/25	7,9,10,11,12,2													
29		Activitatea 21: Consultări și decizie finală asupra conceptului preliminar	3 days	Thu 6/12/25	Mon 6/16/25	28													
30		<b>Jalon 5: Conceptul preliminar aprobat de beneficiar</b>	0 days	Mon 6/16/25	Mon 6/16/25	29													
31		Activitatea 22: Elaborarea studiului privind utilizarea sistemelor alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice	7 days	Tue 6/17/25	Wed 6/25/25	25,30													
32		Activitatea 23: Studiul de Impact Asupra Mediului și Studiul de Evaluare Adecvată	9 days	Thu 6/26/25	Tue 7/8/25	30,31													
33		Activitatea 24: Studiul de Impact asupra Sănătății Publice (SISP)	9 days	Wed 7/9/25	Mon 7/21/25	30,32													
34		<b>Jalon 6: Studiile suplimentare finalizate</b>	0 days	Mon 7/21/25	Mon 7/21/25	31,32,33													
35		Activitatea 25: Întocmire proiect de tehnologie medi	7 days	Tue 6/17/25	Wed 6/25/25	30													
36		Activitatea 26: Studiu de protecție radiologică pentru activități de diagnostic și radiologie	3 days	Thu 6/26/25	Mon 6/30/25	30,35													
37		Activitatea 27: Studiu tehnic privind protecția radiologică în radioterapie	3 days	Thu 6/26/25	Mon 6/30/25	30,35													
38		Activitatea 28: Studiu tehnic privind protecția radiologică în medicina nucleară	3 days	Thu 6/26/25	Mon 6/30/25	30,35													
39		Activitatea 29: Finalizarea Conceptului de Proiectare	15 days	Tue 7/22/25	Mon 8/11/25	34,16,24,31,32													
40		Activitatea 30: Notificarea Autorității Contractante despre finalizarea conceptului	1 day	Tue 8/12/25	Tue 8/12/25	39													
41		Activitatea 31: Consultări și feedback	3 days	Wed 8/13/25	Fri 8/15/25	40													
42		<b>Jalon 7: Conceptul complet validat pentru proiectarea detaliată</b>	0 days	Fri 8/15/25	Fri 8/15/25	41													
43		<b>Faza proiect</b>	<b>112 days</b>	<b>Mon 8/18/25</b>	<b>Tue 1/20/26</b>														
44		Activitatea 31: Detalierea arhitecturală, structurală și tehnică	34 days	Mon 8/18/25	Thu 10/2/25	42													
45		Activitatea 32: Elaborarea documentațiilor tehnice necesare obținerii avizelor și acordurilor	4 days	Fri 10/3/25	Wed 10/8/25	16,34,44													
46		Activitatea 33: Verificarea Documentațiilor de către Verificatori Tehnici Atestați	6 days	Thu 10/9/25	Thu 10/16/25	45													
47		Activitatea 34: Depunerea, Susținerea și Revizuirea Documentațiilor pentru Obținerea Avizelor și	3 days	Fri 10/17/25	Tue 10/21/25	46													
48		Activitatea 35: Obținerea Avizelor și Acordurilor	30 days	Wed 10/22/25	Tue 12/2/25	47													
49		<b>Jalon 8: Avizele și acordurile obținute</b>	0 days	Tue 12/2/25	Tue 12/2/25	48													
50		Activitatea 36: Întocmirea Proiectului Tehnic și verificarea documentatiei de către verificatori	20 days	Wed 12/3/25	Tue 12/30/25	44,49													
51		Activitatea 37: Consultări și feedback	3 days	Wed 12/31/25	Fri 1/2/26	50													
52		<b>Jalon 9: Proiectul tehnic validat</b>	0 days	Fri 1/2/26	Fri 1/2/26	51													
53		Activitatea 38: Elaborarea Caietului de Sarcini pentru faza Design-Build	7 days	Mon 1/5/26	Tue 1/13/26	52													
54		Activitatea 39: Întocmirea Raportului de Activitate la Terminarea Serviciilor de Proiectare	1 day	Wed 1/14/26	Wed 1/14/26	52,53													

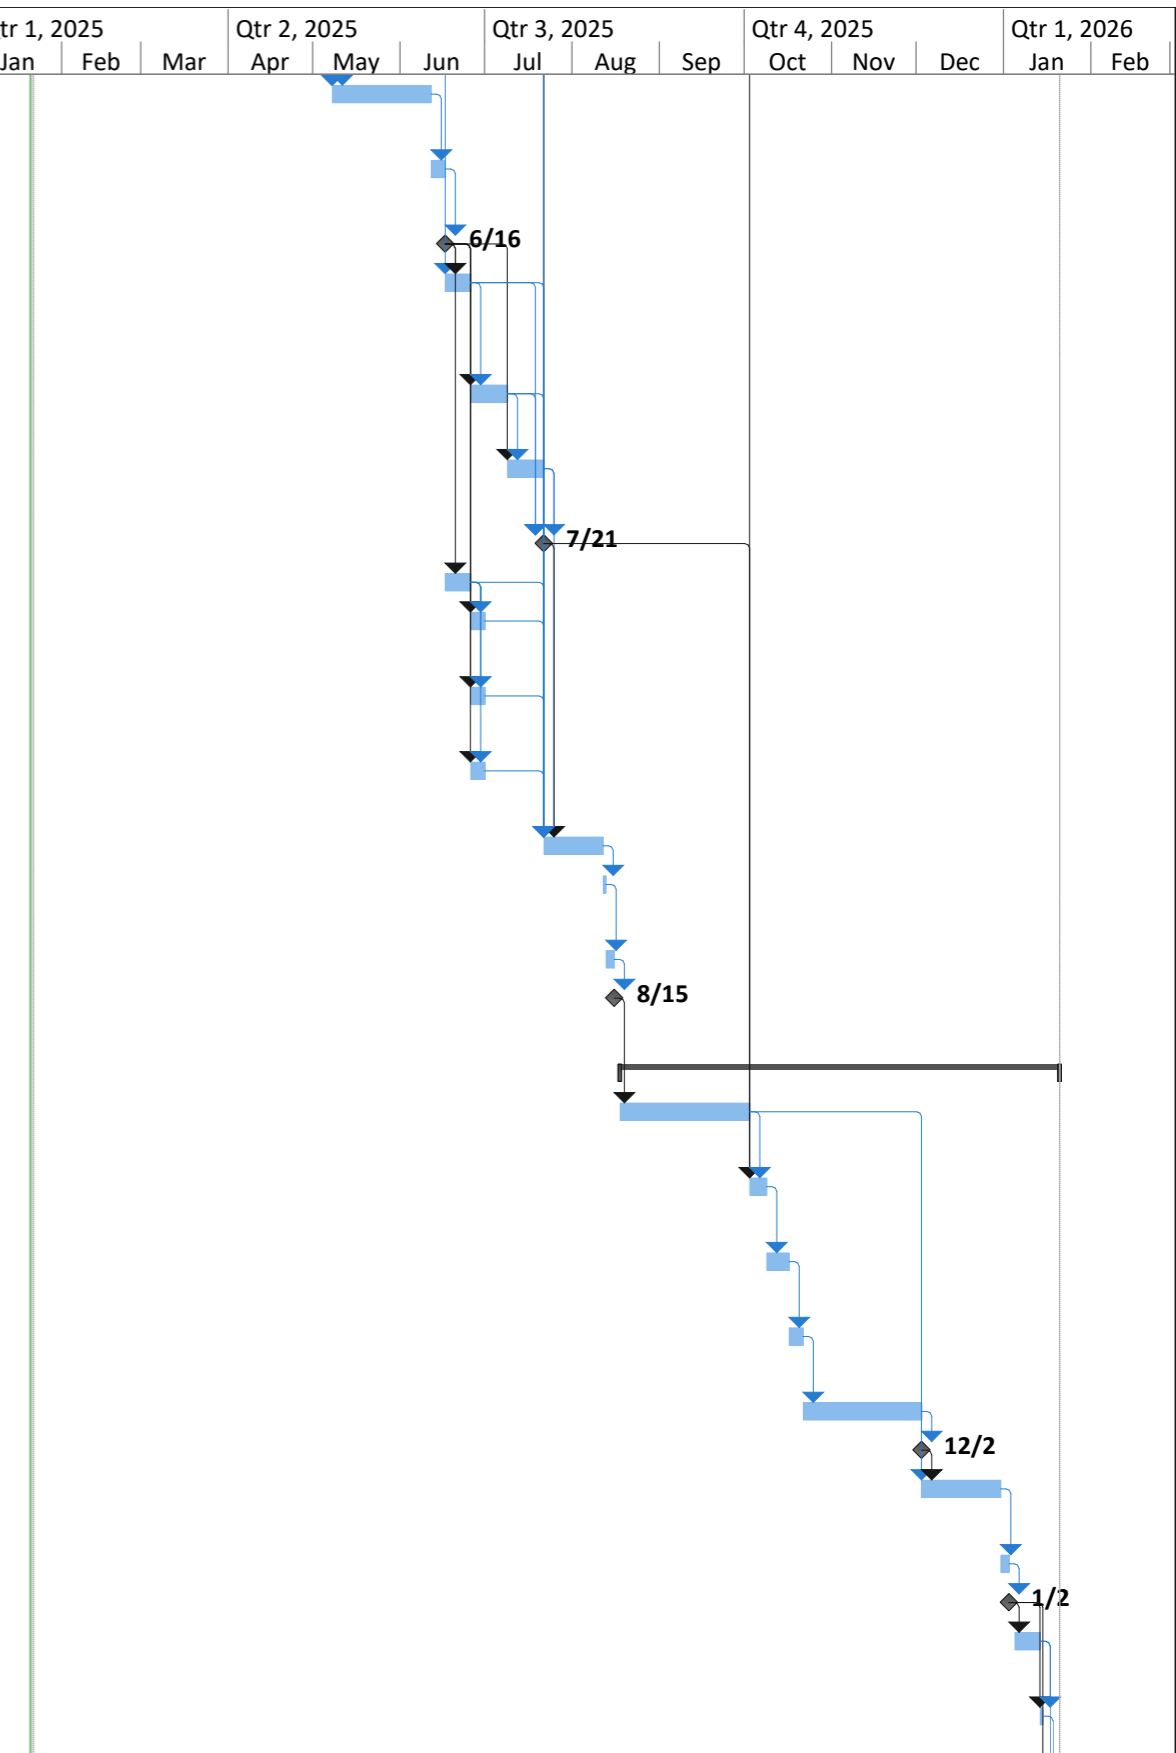

Project: msproj11 Date: Tue 1/21/25	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Progress manual	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Dec	Qtr 1, 2025			Qtr 2, 2025			Qtr 3, 2025			Qtr 4, 2025			Qtr 1, 2026			
								Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb		
55		Activitatea 40: Predarea Proiectului și Studiilor Realizate în Cadrul Întâlnirii de Lucru	2 days	Thu 1/15/26	Fri 1/16/26	52,53,54																	1/20
56		Activitatea 41: Recepția Oficială a Proiectului de Către Autoritatea Contractantă	2 days	Mon 1/19/26	Tue 1/20/26	55																	1/20
57		<b>Jalon 10: Documentația este predată și recepționată</b>	0 days	Tue 1/20/26	Tue 1/20/26	56																	1/20
58		<b>Servicii de asistenta tehnica si supraveghere de autor</b>	0 days	<b>Tue 1/20/26</b>	<b>Tue 1/20/26</b>																		1/20
59		Activitatea 42: Asistență pentru Beneficiar în cadrul procedurilor de achiziție pentru faza Design-Build	0 days	Tue 1/20/26	Tue 1/20/26	57																	1/20
60		Activitatea 43: Elaborarea și Implementarea Planului de Contingent	0 days	Tue 1/20/26	Tue 1/20/26	59																	1/20
61		Activitatea 44: Organizarea Workshop-ului Strategic pentru Alinierea Echipelor înainte de Execuție	0 days	Tue 1/20/26	Tue 1/20/26	59,60																	1/20
62		<b>Jalon 11: Pregătirea completă pentru execuție</b>	0 days	Tue 1/20/26	Tue 1/20/26	60,61																	1/20
63		Activitatea 45: Asigurarea Supravegherii de Autor și Colaborarea cu Compania de Construcție	0 days	Tue 1/20/26	Tue 1/20/26	62																	1/20
64		Activitatea 46: Finalizarea și Închiderea Contractului pentru Supravegherea de Autor	0 days	Tue 1/20/26	Tue 1/20/26	63																	1/20
65		<b>Jalon 12: Închiderea oficială a proiectului</b>	0 days	Tue 1/20/26	Tue 1/20/26	63,64																	1/20

Project: msproj11 Date: Tue 1/21/25	Task		Project Summary		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		Deadline	
	Split		External Tasks		Inactive Summary		Manual Summary		Progress	
	Milestone		External Milestone		Manual Task		Start-only		Progres manual	
	Summary		Inactive Task		Duration-only		Finish-only			
