


# Lucrari de reconstructie a scuarului din str. Maria Dragan

## GanttChart

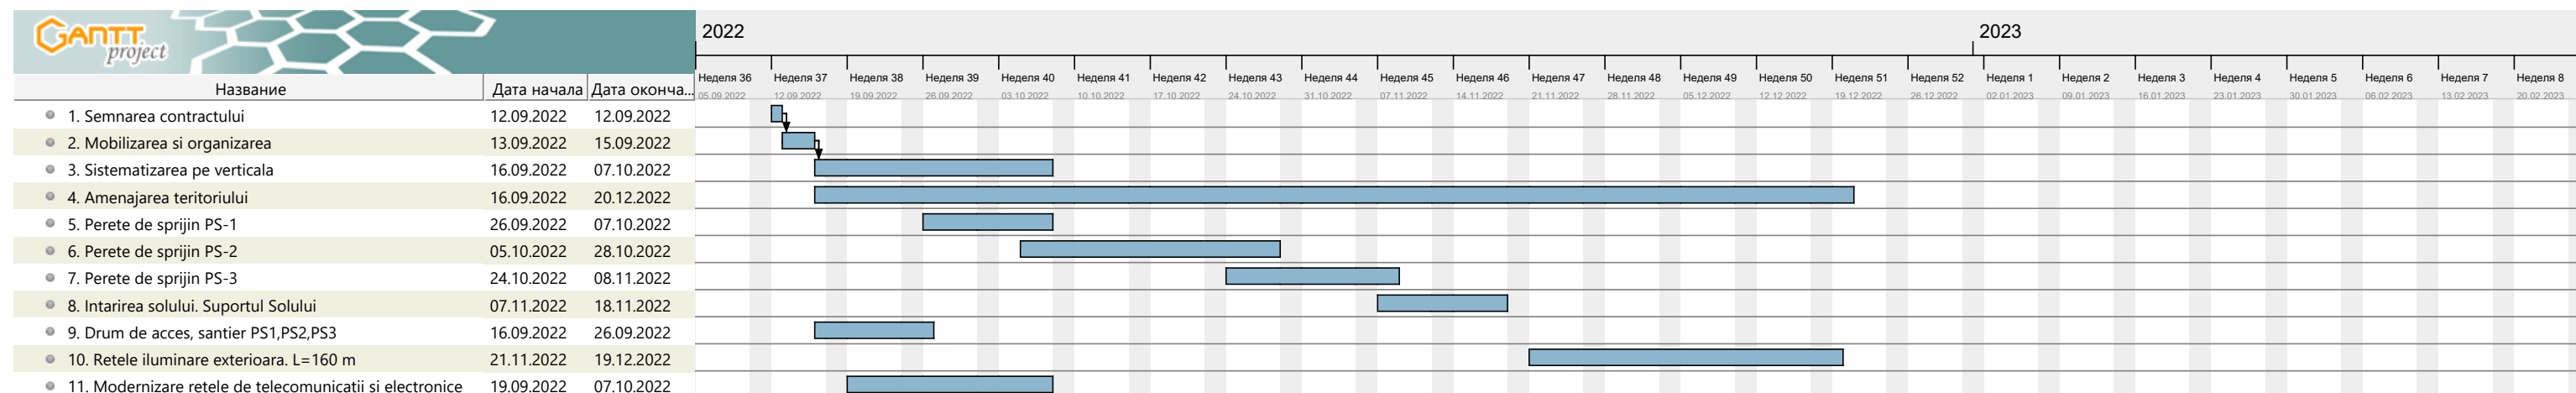

# Lucrari de reconstructie a scuarului din str. Maria Dragan.

## Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
1. Semnarea contractului	12.09.2022	12.09.2022
2. Mobilizarea si organizarea	13.09.2022	15.09.2022
3. Sistematizarea pe verticala	16.09.2022	07.10.2022
4. Amenajarea teritoriului	16.09.2022	20.12.2022
5. Perete de sprijin PS-1	26.09.2022	07.10.2022
6. Perete de sprijin PS-2	05.10.2022	28.10.2022
7. Perete de sprijin PS-3	24.10.2022	08.11.2022
8. Intarirea solului. Suportul Solului	07.11.2022	18.11.2022
9. Drum de acces, santier PS1,PS2,PS3	16.09.2022	26.09.2022
10. Retele iluminare exterioara. L=160 m	21.11.2022	19.12.2022
11. Modernizare retele de telecomunicatii si electronice	19.09.2022	07.10.2022

Data completării: 25.08.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.
