


# Lucrari de reparatia drumului pe strada Veniamin Zarzare din orasul Ialoveni.

## GanttChart

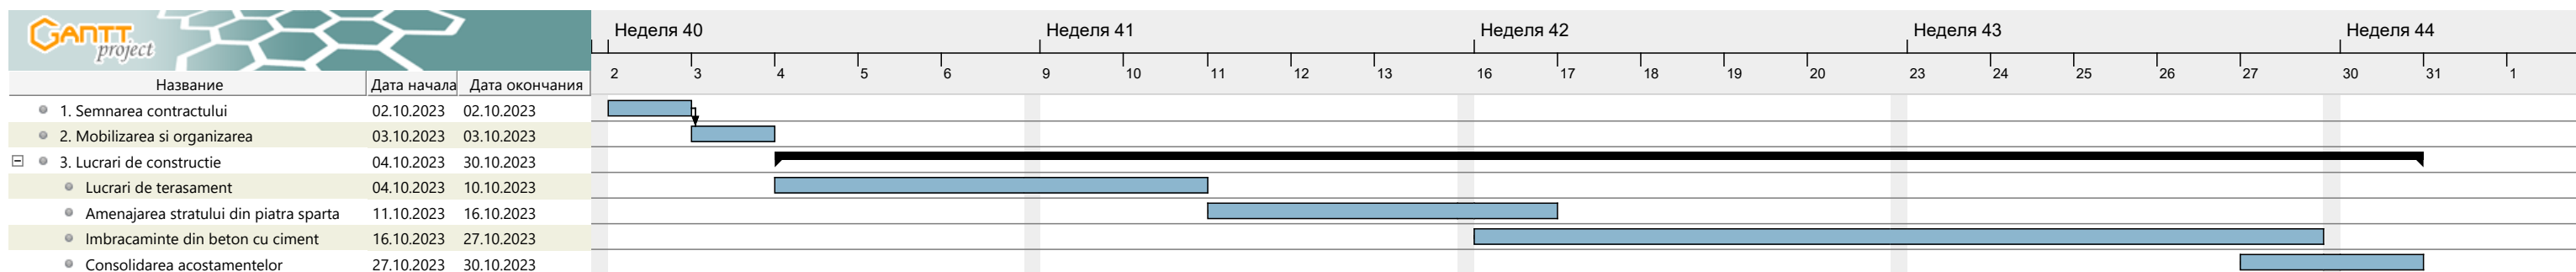

Название	Дата начала	Дата окончания
1. Semnarea contractului	02.10.2023	02.10.2023
2. Mobilizarea si organizarea	03.10.2023	03.10.2023
3. Lucrari de constructie	04.10.2023	30.10.2023
Lucrari de terasament	04.10.2023	10.10.2023
Amenajarea stratului din piatra sparta	11.10.2023	16.10.2023
Imbracaminte din beton cu ciment	16.10.2023	27.10.2023
Consolidarea acostamentelor	27.10.2023	30.10.2023

Data completării: 15.09.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L
