

**Construcția apeductelor magistrale
largara – Borogani, largara – Tigheci și
a rețelilor de apeduct interioare în
localitățile Băiuș, Cociulia Nouă,
Tigheci și Cuporani din raionul Leova**

10.12.2022

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Управляющий проектом

Сроки проекта

30.12.2022 - 05.09.2023

Выполнено

0%

Задачи

36

Исполнители

0

Задачи

2

Название	Дата начала	Дата окончания
Construcția apeductelor magistrale largara – Borogani, largara – Tigheci și a rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova	30.12.22	04.09.23
Atribuirea si semnarea contractului	30.12.22	04.01.23
Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si transmiterea santierului	04.01.23	05.01.23
Mobilizarea si organizarea santierului	06.01.23	16.01.23
Apeduct magistral largara - Borogani cu conectarea s. Meseni	11.02.23	30.08.23
Amenajarea teritoriului "Platforma A". Statia de pompare a apei	12.06.23	01.08.23
Amenajarea teritoriului "Platforma B". Castel de apa V=25 m3	12.06.23	01.08.23
Amenajarea teritoriului "Platforma C". Rezervor din panouri metalice cu membrana din EPDM	12.06.23	31.07.23
Rezervor N1 din panouri metalice cu membrana din EPDM V=150m3 Rezistentă (marca CBA)	27.02.23	13.06.23
Rezervor N2 din panouri metalice cu membrana din EPDM V=150m3 Rezistentă (marca CBA)	06.03.23	17.06.23
Statia de pompare a apei. Rezistentă (marca CBA)	17.02.23	21.06.23
Rețele exterioare de alimentare cu apa	11.02.23	04.07.23
Castel de apa V=25m3, H=15m. Pl. B	09.03.23	27.06.23
Rezervoare din panouri metalice cu membrana din EPDM V=150 m3 (2 buc). Utilaj (cu TVA) Pl.C	26.04.23	21.06.23
Rezervoare din panouri metalice cu membrana EPDM V=150 m3 (2 buc) TH. Pl C	08.05.23	08.07.23
Rețele electrice exterioare AEE-10 kV, Iluminare exterioara. Montarea transformatorului electric	22.05.23	01.07.23
Statia de pompare a apei TH (Platf .A)	27.06.23	19.08.23
Testarea si punerea in functiune a tronsonului de alimentare cu apa	21.08.23	30.08.23
Construcția rețelelor de alimentare cu apă din com. Baius (s. Baius, s. Cociulia Noua) r-l Leova	07.03.23	30.08.23
Castel de apa V=50m3, H=18m (2 buc). Platforma A1	20.03.23	08.07.23
Rețele exterioare de alimentare cu apa	07.03.23	21.07.23
Amenajarea teritoriului «Platforma A». (Stația de pompare a apei)	22.07.23	16.08.23
Statie de pompare a apei (SPR-1). Lucrari de constructii Pl. B1	28.06.23	29.07.23
Statie de repompare a apei (SPR-1). TH (P1-B1)	23.03.23	10.07.23
Statie de repompare a apei (SPR-1).Utilaj (P1.B1)	24.04.23	21.07.23
Rețele electrice ВЛ-0.4 кВ. Iluminarea exterioara	20.04.23	28.06.23
Sistemul de alimentare cu apa (bransamente)	10.05.23	19.08.23

Задачи

3


Название	Дата начала	Дата окончания
Testarea si punerea in functiune a tronsonului de apa	21.08.23	30.08.23
Constructia sistemului de apeduct pentru alimentarea cu apa a comunei Tigheci r-l Leova N 05/22-AE .SU	13.02.23	30.08.23
Sistemul de alimentare cu apa	13.02.23	19.08.23
Sistemul de alimentare cu apa (bransamente)	20.05.23	18.08.23
Testarea si punerea in functiune a tronsonului de apa	21.08.23	30.08.23
Apeduct magistral largara - Tigheci cu conectarea satului Cuporani,r-l Liova(Actualizare 2022 sim.1)	02.03.23	30.08.23
Reateaua A1	02.03.23	27.07.23
Testarea si punerea in functiune a tronsonului de apa A1	28.07.23	30.08.23
Finalizarea si receptia obiectului	26.08.23	04.09.23

**Derogări, largăra și gheci și a rețetelor de
apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia
Nouă, Tigheci și Cuporani din raionul Leova**

10.12.2022

GanttChart

4

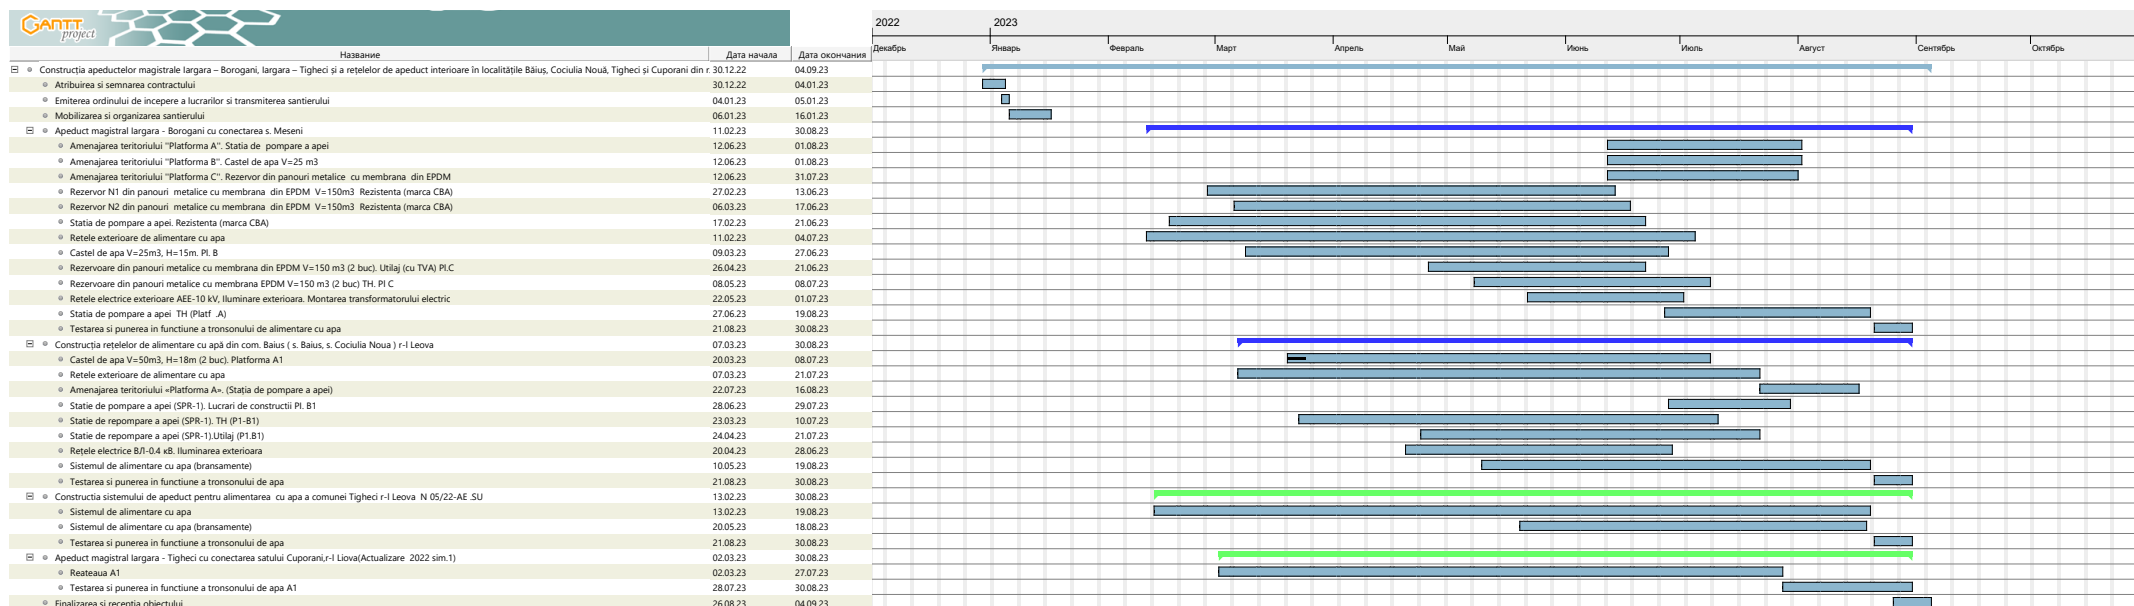

Занятость ресурсов

		2022		2023									
Имя	Стандартная ...	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	
