

ID		Mod activitate	Task Name	Durată	Început	Sfârșit	Decembrie Dec	Ianuarie Ian	Februarie Feb
1			Pregătirea terenului pentru construcția obiectului	12 zile	Vineri 10.12.21	S 25.12.21			
2			1.Lucrari de demolare	19 zile	Mc 15.12.21	L 10.01.22			
3			2-1. Blocul de regim (85/24,06/2013-1)						
4			№ 2-1-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-1-AP)						
5			1.1. Lucrari de demontare interioare	28 zile	M 04.01.22	J 10.02.22			
6			1.2. Lucrari de demontare exterioare	23 zile	M 01.03.22	J 31.03.22			
7			2. Inchideri si compartimentari	19 zile	L 06.06.22	J 30.06.22			
8			3 Finisarea interioara						
9			3.1. Tavane	246 zile	L 05.09.22	L 14.08.23			
10			3.2. Pereti	143 zile	Mc 01.03.23	Vineri 15.09.23			
11			3.3. Pardosele	361 zile	Mc 08.06.22	Mc 25.10.23			
12			4. Acoperis	41 zile	M 05.04.22	M 31.05.22			
13			5. Fatada	104 zile	L 10.04.23	J 31.08.23			
14			6. Timplarie	45 zile	L 01.08.22	Vineri 30.09.22			
15			6.1 Usi	65 zile	L 03.04.23	Vineri 30.06.23			
16			6.2. Ferestre	57 zile	L 08.08.22	M 25.10.22			
17			№ 2-1-2 Solutii constructive (85/24.06/2013-1-R)						
18			1. Lucrari de demolare si terasament	19 zile	L 06.06.22	J 30.06.22			
19			2. Fundatii si scari exterioare	19 zile	Mc 01.06.22	S 25.06.22			
20			3 Pereti,plansee ,rame monolite	98 zile	L 07.03.22	Mc 20.07.22			
21			4 Consolidari	112 zile	L 07.03.22	M 09.08.22			
22			5.Pereti interiori din beton armat	65 zile	L 02.05.22	Vineri 29.07.22			

Project: Grafic Penicentiarul Cah
Date: Vineri 08.10.21

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID		Mod activitate	Task Name	Durată	Început	Sfârșit	Decembrie Dec	Ianuarie Ian	Februarie Feb
23			№ 2-1-3 Inclazire, ventilare (85/24.06/2013-1-OB)	239 zile	L 03.10.22	J 31.08.23			
24			№ 2-1-4 Retele de apeduct si canalizare (85/24.06/2013-1-BK)	241 zile	Mc 22.06.22	Mc 24.05.23			
25			№ 2-1-5 Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (85/24.06/2013-1-EEF/IEI)	296 zile	L 14.11.22	S 30.12.23			
26			№ 2-1-6 Semnalizare de paza automata (85/24.06/2013-1-SPA)	276 zile	L 12.12.22	S 30.12.23			
27			№ 2-1-7 Semnalizare de incendiu (85/24.06/2013-1-SI)	265 zile	Vineri 25.11.22	J 30.11.23			
28			№ 2-1-8 Comunicatii radio (85/24.06/2013-1-TS)	41 zile	L 02.01.23	S 25.02.23			
29			№ 2-1-9 Solutii tehnologice (85/24.06/2013-1-TX)	97 zile	M 08.08.23	Mc 20.12.23			
30			№ 2-1-10 Sistem control acces (85/24.06/2013-1-TS)	14 zile	Vineri 10.02.23	Mc 01.03.23			
31			№ 2-1-11 Comunicatii telefonice si de semnalizare (85/24.06/2013-1-TS)	260 zile	M 04.10.22	S 30.09.23			
32			№ 2-1-12 Comunicatii telefonice si de semnalizare. Interfon (85/24.06/2013-1-TS)	240 zile	M 04.10.22	L 04.09.23			
33			№ 2-1-13 Televiziunea (85/24.06/2013-1-TV)	239 zile	M 04.10.22	Vineri 01.09.23			
34			Capitolul 3. Obiective auxiliare și de deservire.						
35			3-1. Teren sportiv acoperit. Sustația de transformare (85/24.06/2013-3)						
36			№ 3-1-1 Solutii arhitectural-constructive (85/24.06/2013-3-AC)	214 zile	Mc 05.01.22	D 30.10.22			
37			№ 3-1-2 Retele de apeduct si canalizare (85/24.06/2013-3-BK)	158 zile	L 14.03.22	Mc 19.10.22			
38			№ 3-1-3 Echipament electric de forta (85/24.06/2013-2-EEF)	149 zile	L 04.04.22	J 27.10.22			

Project: Grafic Penicentiarul Cah
Date: Vineri 08.10.21

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID		Mod activitate	Task Name	Durată	Început	Sfârșit	Decembrie Dec	Ianuarie Ian	Februarie Feb
39			Nº 3-1-4 Inclazire, ventilare (85/24.06/2013-3-OB)	147 zile	L 04.04.22	M 25.10.22			
40			Nº 3-1-5 Semnalizare de incendiu (85/24.06/2013-3-SI)						
41			Nº 3-1-6 Comunicatii telefonice si de semnalizare (85/24.06/2013-3-TS)	109 zile	M 03.05.22	Vineri 30.09.22			
42			3.2. Curți de plimbare						
43			Nº 3-2-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-3-AP)	196 zile	L 06.03.23	L 04.12.23			
44			Nº 3-2-2 Solutii constructive (85/24.06/2013-3-R)	63 zile	Mc 06.07.22	Vineri 30.09.22			
45			Nº 3-2-3 Comunicatii telefonice si de semnalizare (85/24.06/2013-3-TS)	21 zile	L 06.02.23	L 06.03.23			
46			3-3. Turnul de gardă						
47			Nº 3-3-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-5a,b,c-AP)	47 zile	M 05.07.22	Mc 07.09.22			
48			Nº 3-3-2 Solutii constructive (85/24.06/2013--5a,b,c-R)	44 zile	L 02.05.22	J 30.06.22			
49			3-4. Teren sportiv deschis						
50			Nº 3-4-1 Solutii arhitectural-constructive (85/24.06/2013-4-AC)	129 zile	L 03.04.23	J 28.09.23			
51			3-5. Galerie.						
52			Nº 3-5-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-15-AP)	79 zile	L 08.05.23	J 24.08.23			
53			Nº 3-5-2 Solutii constructive (85/24.06/2013-15-R)	49 zile	Mc 01.03.23	L 08.05.23			
54			3-6. Îngrădirea teritoriului.						
55			Nº 3-6-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-9;10;11;14-AP)	140 zile	Vineri 19.05.23	J 30.11.23			
56			Nº 3-6-2 Solutii constructive (85/24.06/2013-9;10;11;14-R)	103 zile	L 06.03.23	Mc 26.07.23			
57			3-7. Cazangeria.						

Project: Grafic Penicentiarul Cah
Date: Vineri 08.10.21

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID		Mod activitate	Task Name	Durăță	Început	Sfârșit	Decembrie Dec	Ianuarie Ian	Februarie Feb
58			№ 3-7-1 Solutii arhitecturale (85/24.06/2013-7-AP)	43 zile	L 04.07.22	Mc 31.08.22			
59			№ 3-7-2 Solutii constructive (85/24.06/2013-7-R)	61 zile	Mc 01.06.22	Mc 24.08.22			
60			№ 3-7-3 Solutii termomecanice (85/24.06/2013-7-TM)	40 zile	L 08.08.22	Vineri 30.09.22			
61			№ 3-7-4 Automatizarea cazangeriei (85/24.06/2013-7-ATM)	22 zile	J 01.09.22	Vineri 30.09.22			
62			№ 3-7-5 Retele de apeduct si canalizare (85/24.06/2013-5-BK)	59 zile	M 12.07.22	Vineri 30.09.22			
63			№ 3-7-6 Echipament electric de forta (85/24.06/2013-7-EEF)	65 zile	L 04.07.22	Vineri 30.09.22			
64			№ 3-7-7 Inclazire, ventilare (85/24.06/2013-7-OB)	19 zile	Mc 17.08.22	S 10.09.22			
65			Capitolul 4. Obiecte energetice.						
66			№ 4-1-1 Alimentarea cu energie electrica (85/24.06/2013--0-AEE)	84 zile	L 04.04.22	J 28.07.22			
67			№ 4-2-1 Iluminat electric exterior (85/24.06/2013-0-3H)	98 zile	M 16.05.23	J 28.09.23			
68			№ 4-3-1 Montare generator (85/24.06/2013-2-EEF)	23 zile	M 01.08.23	J 31.08.23			
69			Capitolul 5. Obiecte de comunicații și transport.						
70			№ 5-1-1 Semnalizarea de paza automata (85/24.06/2013-0-SPA)	190 zile	M 04.04.23	L 25.12.23			
71			№ 5-1-2 Supravegherea video (85/24.06/2013-0-SV)	190 zile	M 04.04.23	L 25.12.23			
72			Capitolul 6. Construcții inginerești și rețele exterioare.						
73			№ 6-1-1 Retele termice exterioare (85/24.06/2013-TC.C3)	48 zile	Mc 24.08.22	Vineri 28.10.22			
74			№ 6-1-2 Retele termice exterioare. Solutii de rezistenta (85/24.06/2013-RT.R)	30 zile	Mc 24.08.22	M 04.10.22			

Project: Grafic Penicentiarul Cah
Date: Vineri 08.10.21

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID		Mod activitate	Task Name	Durată	Început	Sfârșit	Decembrie Dec	Ianuarie Ian	Februarie Feb
75			6-2. Rețele gaz.						
76			№ 6-2-1 Rețele de gaze exterioare (85/24.06/2013-RGE)	34 zile	Mc 14.09.22	D 30.10.22			
77			№ 6-2-2 Alimentarea cu energie electrica RGE (85/24.06/2013-AEE)	41 zile	L 07.03.22	S 30.04.22			
78			№ 6-2-3 Rețele de gaz interioare (85/24.06/2013-7-RGI)	10 zile	D 30.10.22	J 10.11.22			
79			6-3. Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare						
80			№ 6-3-1 Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (85/24.06/2013-0-HBK)	322 zile	Mc 04.05.22	J 27.07.23			
81			6-4. Statia de pompare ape uzate.						
82			№ 6-4-1 Statia de pompare ape uzate (85/24.06/2013-8-BK)	8 zile	Mc 30.08.23	Vineri 08.09.23			
83			Capitolul 7. Amenajarea teritoriului și spații verzi.						
84			№ 7-1-1 Sistematzare pe verticala (85/24.06/2013-0-ГП)	21 zile	M 12.09.23	M 10.10.23			
85			№ 7-2-1Amenajarea teritoriului (85/24.06/2013-0-ГП)	38 zile	M 10.10.23	J 30.11.23			
86			№ 7-3-1 Rezervuar ape pluviale (85/24.06/2013-0-ГП)	13 zile	Mc 14.06.23	Vineri 30.06.23			
87			№ 7-4-1 Perete de sprigin PS1 (85/24.06/2013-13R-PG)	28 zile	Mc 21.06.23	Vineri 28.07.23			
88									
89									
90									
91									


Project: Grafic Penicentiarul Cah
Date: Vineri 08.10.21

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID		Mod activitate	Task Name	Durată	Început	Sfârșit	Decembrie Dec	Ianuarie Ian	Februarie Feb
92									



Project: Grafic Penicentiarul Cah Date: Vineri 08.10.21	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

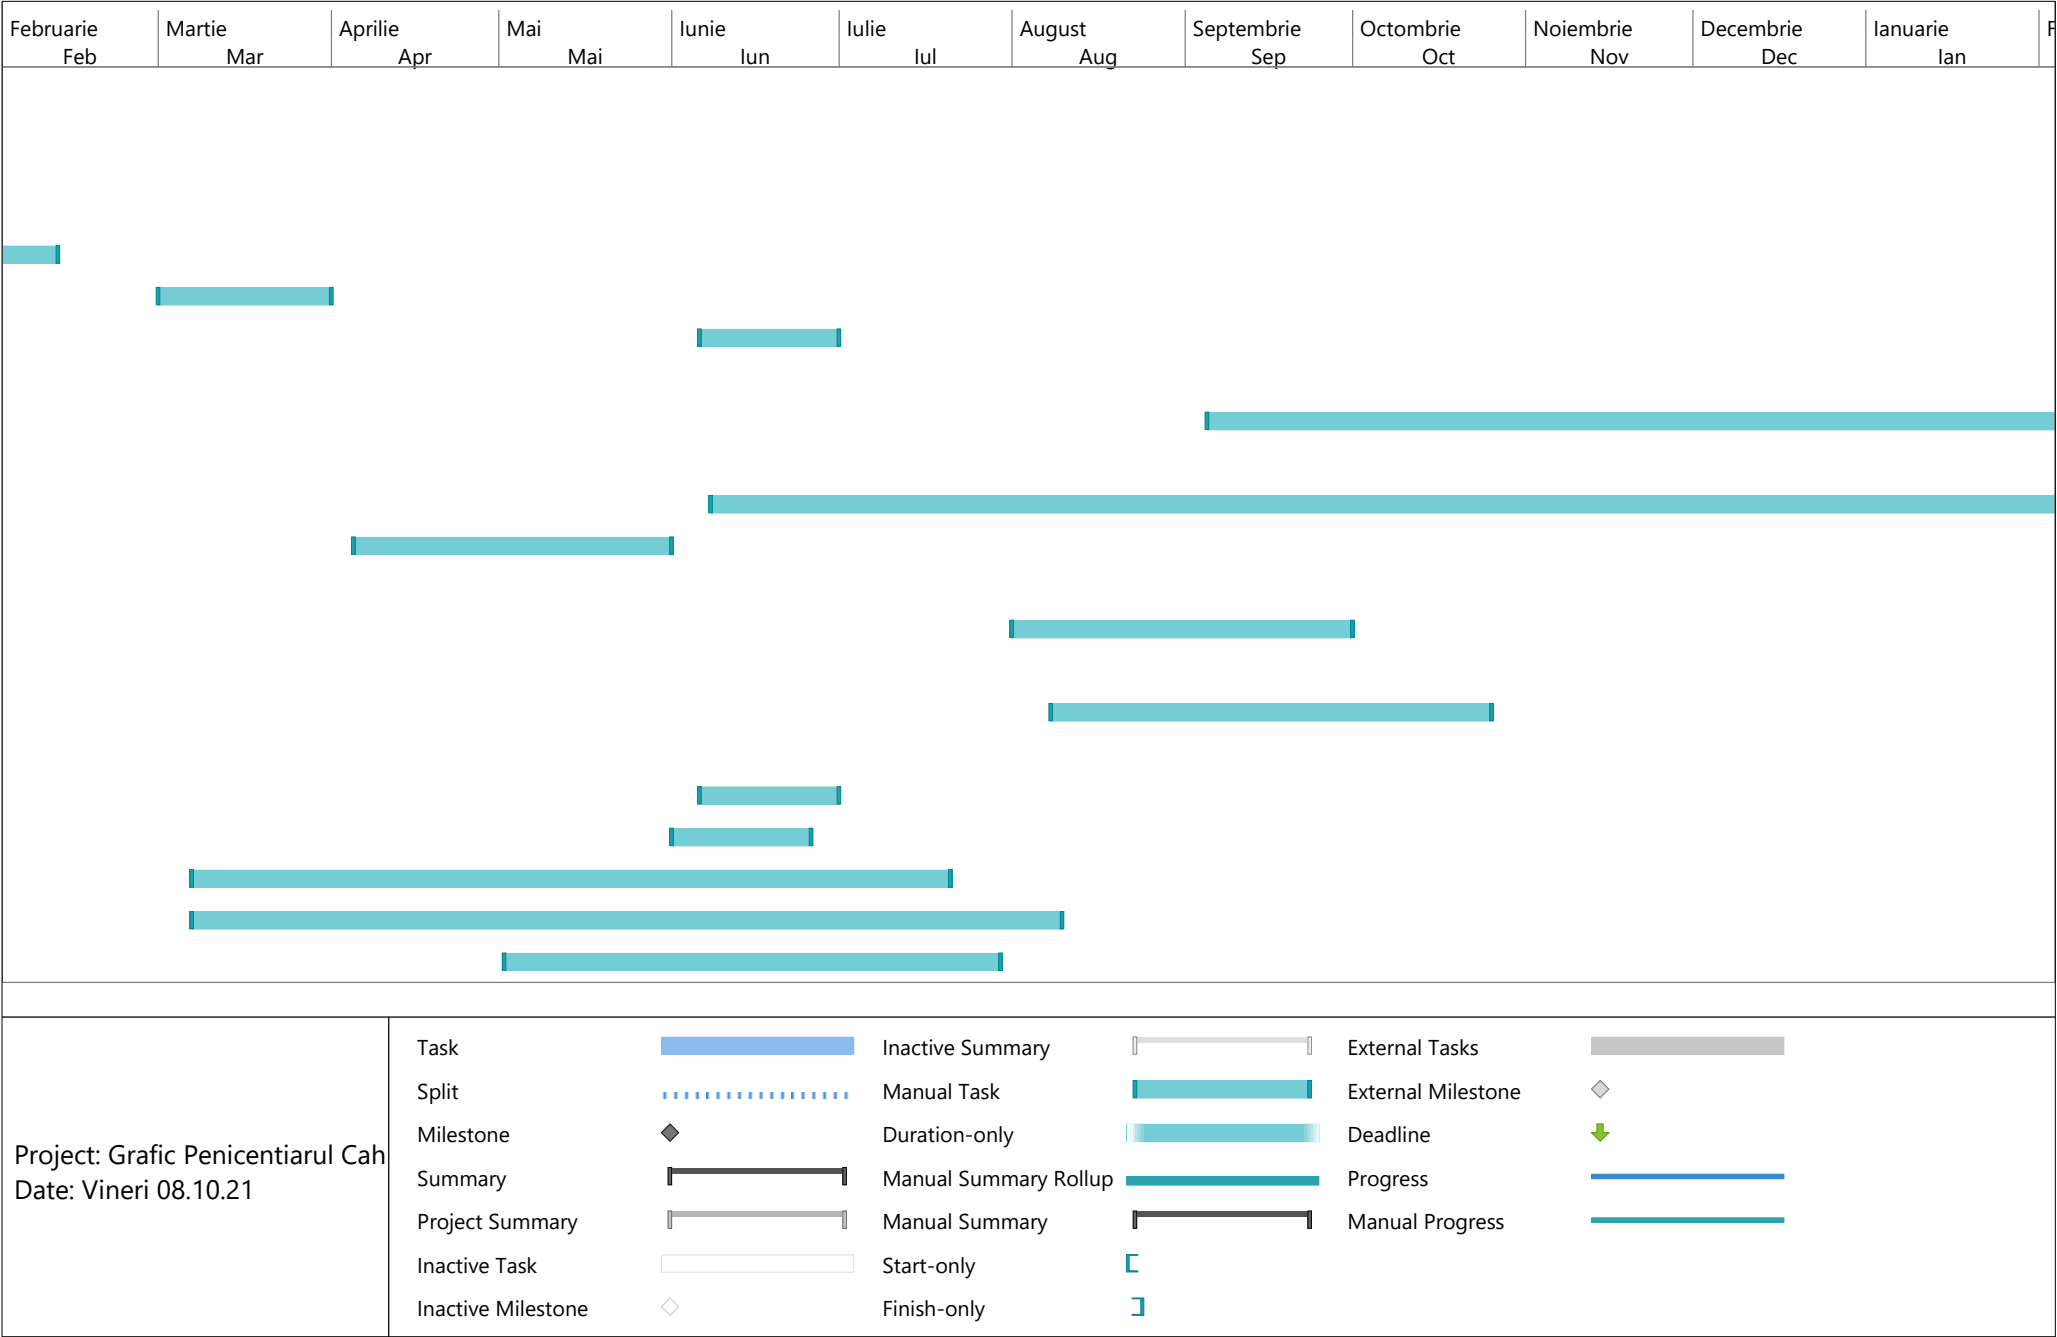


Februarie Feb		Martie Mar		Aprilie Apr		Mai Mai		Iunie Iun		Iulie Iul		August Aug		Septembrie Sep		Octombrie Oct		Noiembrie Nov		Decembrie Dec		Ianuarie Ian		Februarie Feb	
</																									

Februarie Feb		Martie Mar		Aprilie Apr		Mai Mai		Iunie Iun		Iulie Iul		August Aug		Septembrie Sep		Octombrie Oct		Noiembrie Nov		Decembrie Dec		Ianuarie Ian		Februarie Feb	
<																									

Februarie Feb		Martie Mar		Aprilie Apr		Mai Mai		Iunie Iun		Iulie Iul		August Aug		Septembrie Sep		Octombrie Oct		Noiembrie Nov		Decembrie Dec		Ianuarie Ian		Februarie Feb	
<																									

Februarie Feb		Martie Mar		Aprilie Apr		Mai Mai		Iunie Iun		Iulie Iul		August Aug		Septembrie Sep		Octombrie Oct		Noiembrie Nov		Decembrie Dec		Ianuarie Ian		Februarie Feb	
Project: Grafic Penicentiarul Cah Date: Vineri 08.10.21		Task		Inactive Summary		External Tasks																			
		Split		Manual Task		External Milestone																			
		Milestone		Duration-only		Deadline																			
		Summary		Manual Summary Rollup		Progress																			
		Project Summary		Manual Summary		Manual Progress																			
		Inactive Task		Start-only																					
		Inactive Milestone		Finish-only																					
Page 13																									

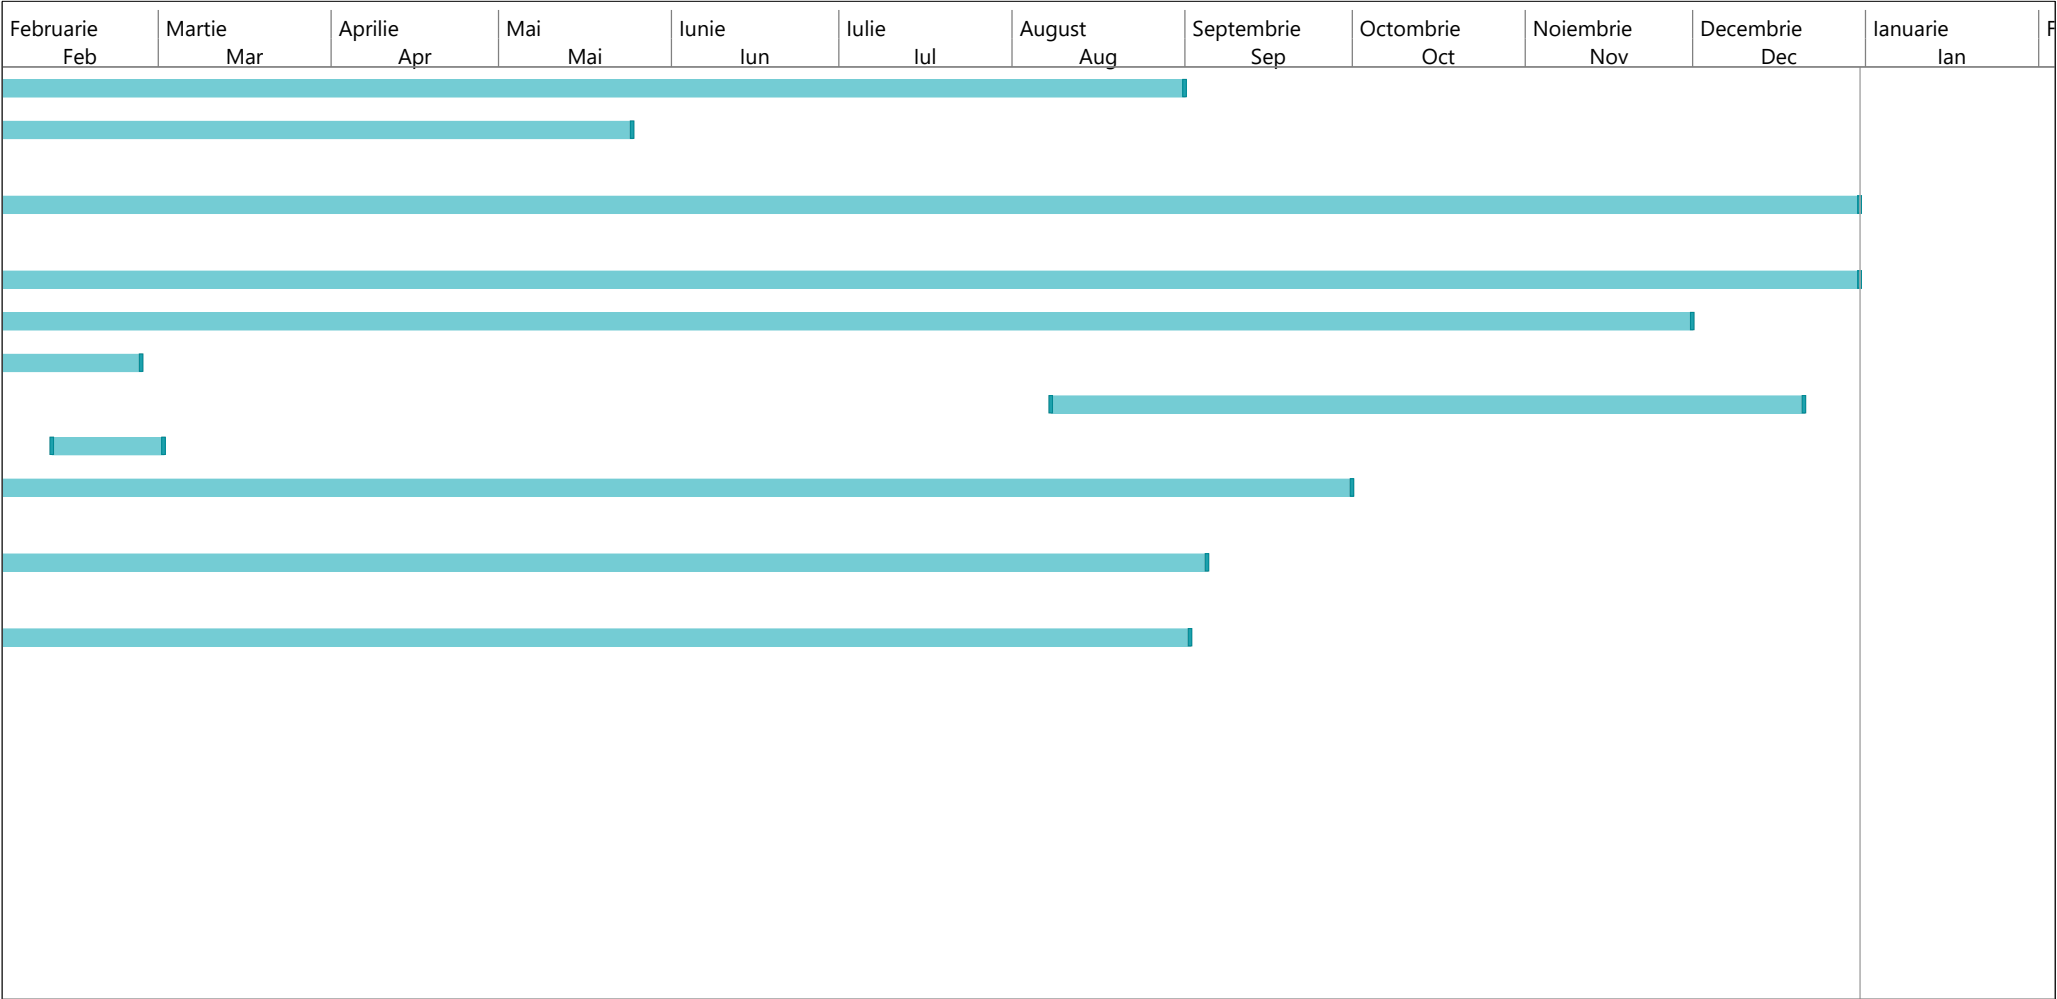

Project: Grafic Penicentiarul Cah
Date: Vineri 08.10.21

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

Februarie Feb		Martie Mar		Aprilie Apr		Mai Mai		Iunie Iun		Iulie Iul		August Aug		Septembrie Sep		Octombrie Oct		Noiembrie Nov		Decembrie Dec		Ianuarie Ian		Februarie Feb			
																								Project: Grafic Penicentiarul Cah Date: Vineri 08.10.21 Task Split Milestone Summary Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only External Tasks External Milestone Deadline Progress Manual Progress			
Page 15																											

Februarie Feb	Martie Mar	Aprilie Apr	Mai Mai	Iunie Iun	Iulie Iul	August Aug	Septembrie Sep	Octombrie Oct	Noiembrie Nov	Decembrie Dec	Ianuarie Ian	F
Project: Grafic Penicientiarul Cah Date: Vineri 08.10.21		Task		Inactive Summary		External Tasks						
		Split		Manual Task		External Milestone						
		Milestone		Duration-only		Deadline						
		Summary		Manual Summary Rollup		Progress						
		Project Summary		Manual Summary		Manual Progress						
		Inactive Task		Start-only								
		Inactive Milestone		Finish-only								
Page 16												

Februarie Feb	Martie Mar	Aprilie Apr	Mai Mai	Iunie Iun	Iulie Iul	August Aug	Septembrie Sep	Octombrie Oct	Noiembrie Nov	Decembrie Dec	Ianuarie Ian	Februarie Feb
Project: Grafic Penicentiarul Cah Date: Vineri 08.10.21		Task		Inactive Summary		External Tasks						
		Split		Manual Task		External Milestone						
		Milestone		Duration-only		Deadline						
		Summary		Manual Summary Rollup		Progress						
		Project Summary		Manual Summary		Manual Progress						
		Inactive Task		Start-only								
		Inactive Milestone		Finish-only								
Page 17												

