

GRAFIC DE EXECUTIE ETAPA I


Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	27	01 Июл '24 30	03	06	08 Июл '24 09	12	15 Июл '24 15	18
1		Lucrări organizatorice și pregătitoare	10 дней	Пн 01.07.24	Пт 12.07.24									
2		Reparatia capitala a str. Rasaritului	169 дней	Пн 15.07.24	Чт 06.03.25									
3		Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat gratate	30 дней	Пн 15.07.24	Пт 23.08.24	1								
4		Constructia rigolei prefabricate L4-8	20 дней	Пн 26.08.24	Пт 20.09.24	3								
5		Constructia rigolei prefabricate Tip R1	10 дней	Пн 23.09.24	Пт 04.10.24	4								
6		Fintini de captare diam.1.5m	10 дней	Пт 25.10.24	Чт 07.11.24	7								
7		Amenajarea tuburilor sistemului de canalizare	14 дней	Пн 07.10.24	Чт 24.10.24	5								
8		Demolarea bordurei	5 дней	Пт 24.01.25	Чт 30.01.25	35								
9		Montarea bordurei	20 дней	Пт 31.01.25	Чт 27.02.25	8								
10		Restabilirea carosabilului	5 дней	Пт 28.02.25	Чт 06.03.25	9								
11		Reparatia stradelei Rasaritului	25 дней	Пт 28.02.25	Чт 03.04.25									
12		Lucrari de terasament	7 дней	Чт 06.03.25	Пт 14.03.25	13								
13		Decaparea structurii rutiere	4 дней	Пт 28.02.25	Ср 05.03.25	9								
14		Montarea bordurei	7 дней	Пн 17.03.25	Вт 25.03.25	12								
15		Ajustarea capacelor la fintini	2 дней	Ср 26.03.25	Чт 27.03.25	14								
16		Sistemul rutier	5 дней	Пт 28.03.25	Чт 03.04.25	15								
17		Reparatia capitala a str. M. Sadoveanu	220 дней	Пт 25.10.24	Чт 28.08.25									
18		Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat gratate	10 дней	Пт 25.10.24	Чт 07.11.24	7								
19		Constructia rigolei prefabricate L4-8	10 дней	Пт 08.11.24	Чт 21.11.24	18								
20		Lucrari de terasament	10 дней	Пт 04.04.25	Чт 17.04.25	16								
21		Montarea bordurei	6 дней	Пт 18.04.25	Пт 25.04.25	20								
22		Ajustarea capacelor la fintini	1 день	Пн 28.04.25	Пн 28.04.25	21								
23		Sistemul rutier	12 дней	Вт 29.04.25	Ср 14.05.25	22								
24		Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere	2 дней	Ср 27.08.25	Чт 28.08.25	39								
25		Reparatia capitala a str. M. Florilor	202 дней	Пт 22.11.24	Пн 01.09.25									
26		Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat gratate	10 дней	Пт 22.11.24	Чт 05.12.24	19								
27		Constructia rigolei prefabricate L4-8	10 дней	Пт 06.12.24	Чт 19.12.24	26								
28		Lucrari de terasament	10 дней	Чт 15.05.25	Ср 28.05.25	23								
29		Montarea bordurei	6 дней	Чт 29.05.25	Чт 05.06.25	28								
30		Ajustarea capacelor la fintini	1 день	Пт 06.06.25	Пт 06.06.25	29								
31		Sistemul rutier	12 дней	Пн 09.06.25	Вт 24.06.25	30								
32		Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere	2 дней	Пт 29.08.25	Пн 01.09.25	24								
33		Reparatia capitala a str. Emilian Bucov	184 дней	Пт 20.12.24	Ср 03.09.25									
34		Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat gratate	10 дней	Пт 20.12.24	Чт 02.01.25	27								
35		Constructia rigolei prefabricate L4-8	15 дней	Пт 03.01.25	Чт 23.01.25	34								
36		Lucrari de terasament	14 дней	Ср 25.06.25	Пн 14.07.25	31								
37		Montarea bordurei	10 дней	Вт 15.07.25	Пн 28.07.25	36								
38		Ajustarea capacelor la fintini	1 день	Вт 29.07.25	Вт 29.07.25	37								
39		Sistemul rutier	20 дней	Ср 30.07.25	Вт 26.08.25	38								
40		Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere	2 дней	Вт 02.09.25	Ср 03.09.25	32								

graficul va fi ajustat în dependentă de data primirii ordinului de începere a lucrărilor


GRAFIC DE EXECUTIE ETAPA I

Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

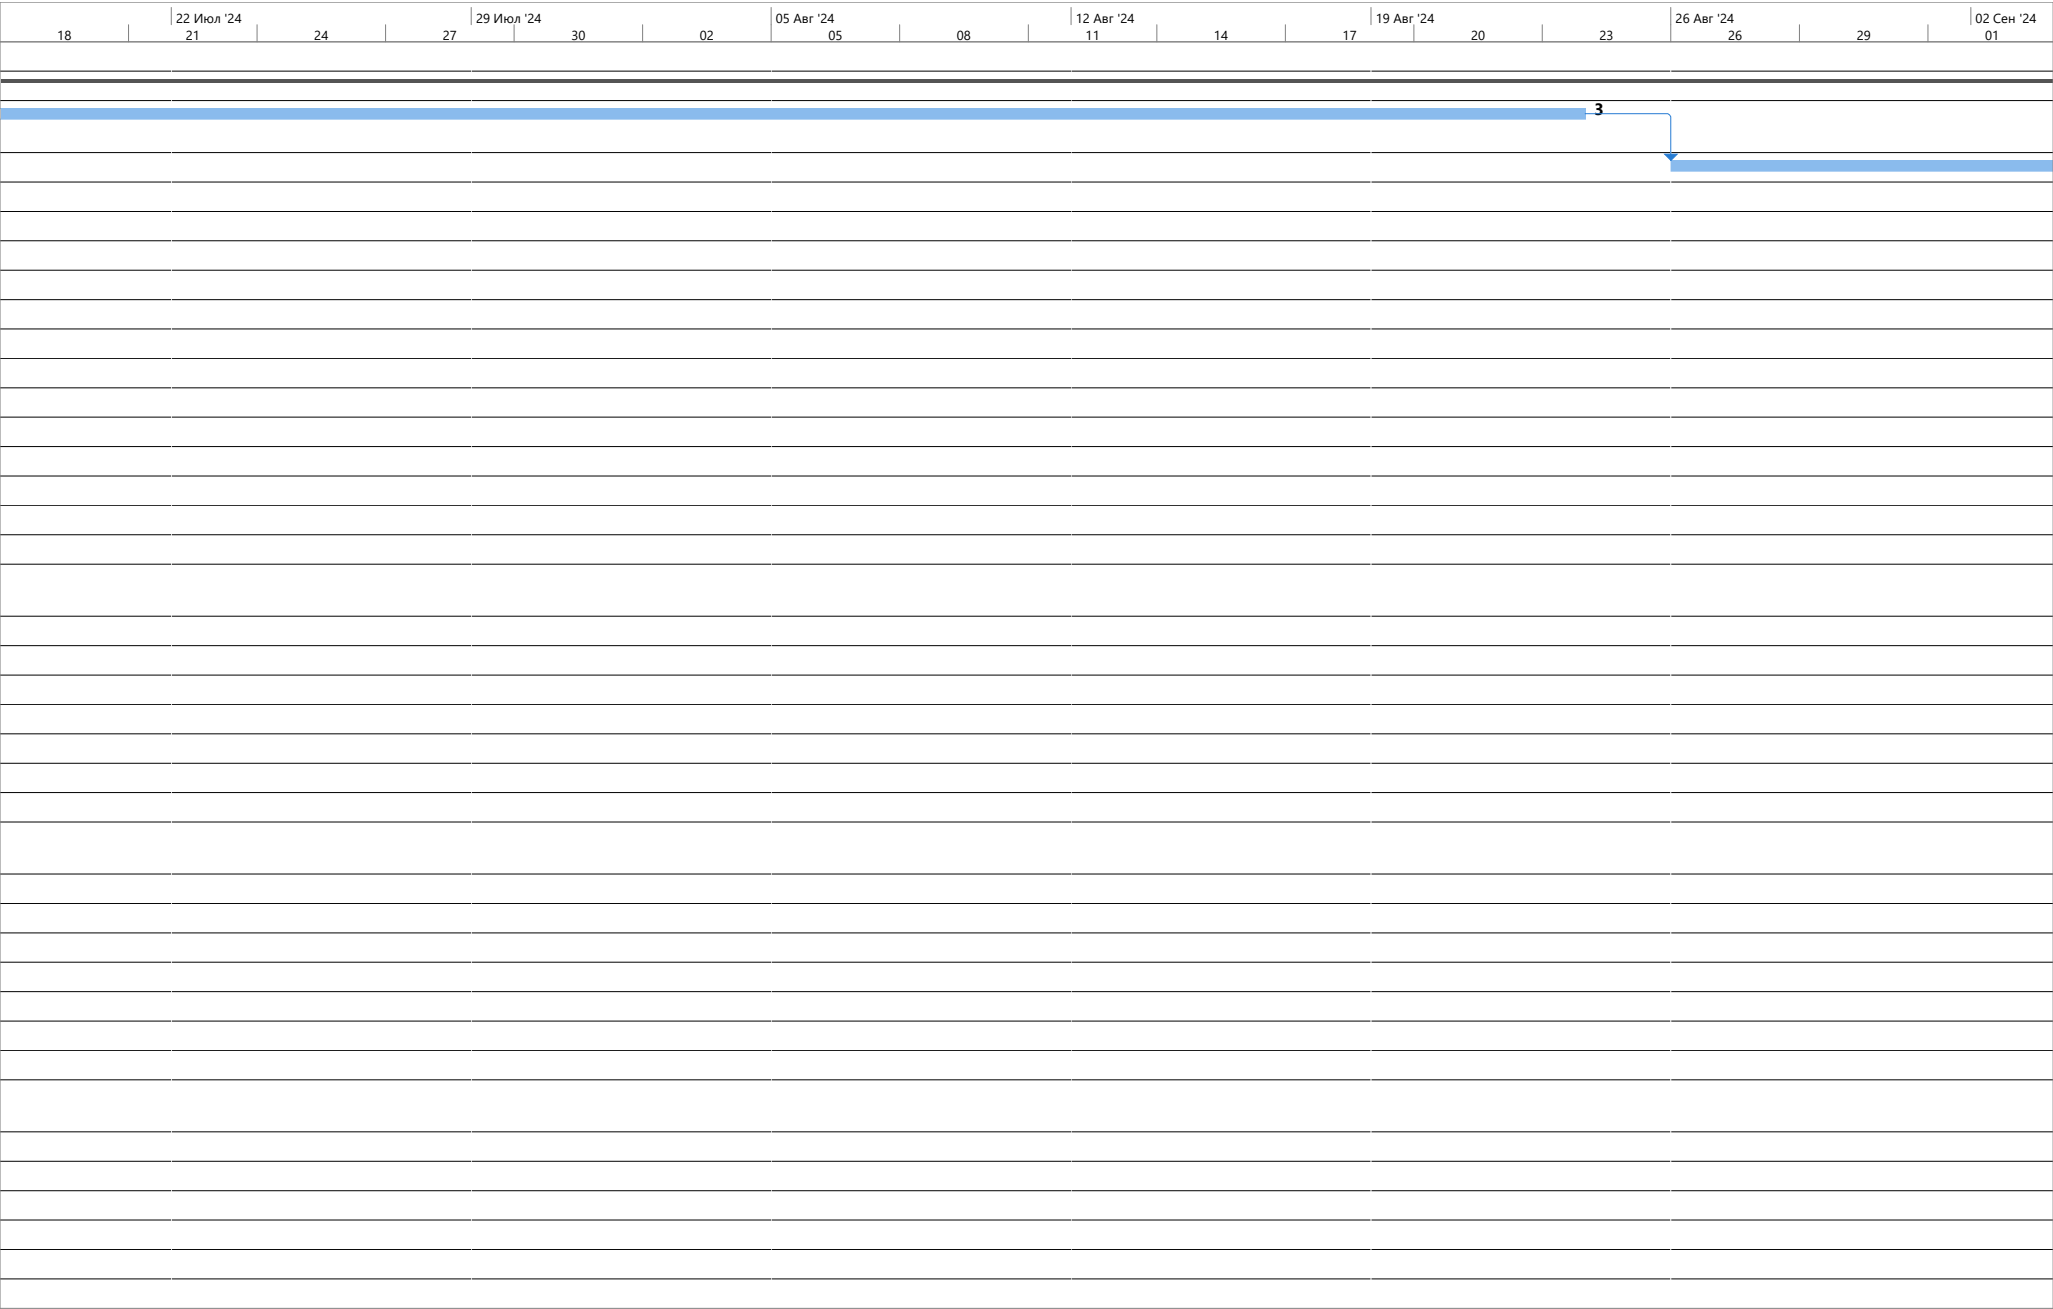

GRAFIC DE EXECUTIE ETAPA I


Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

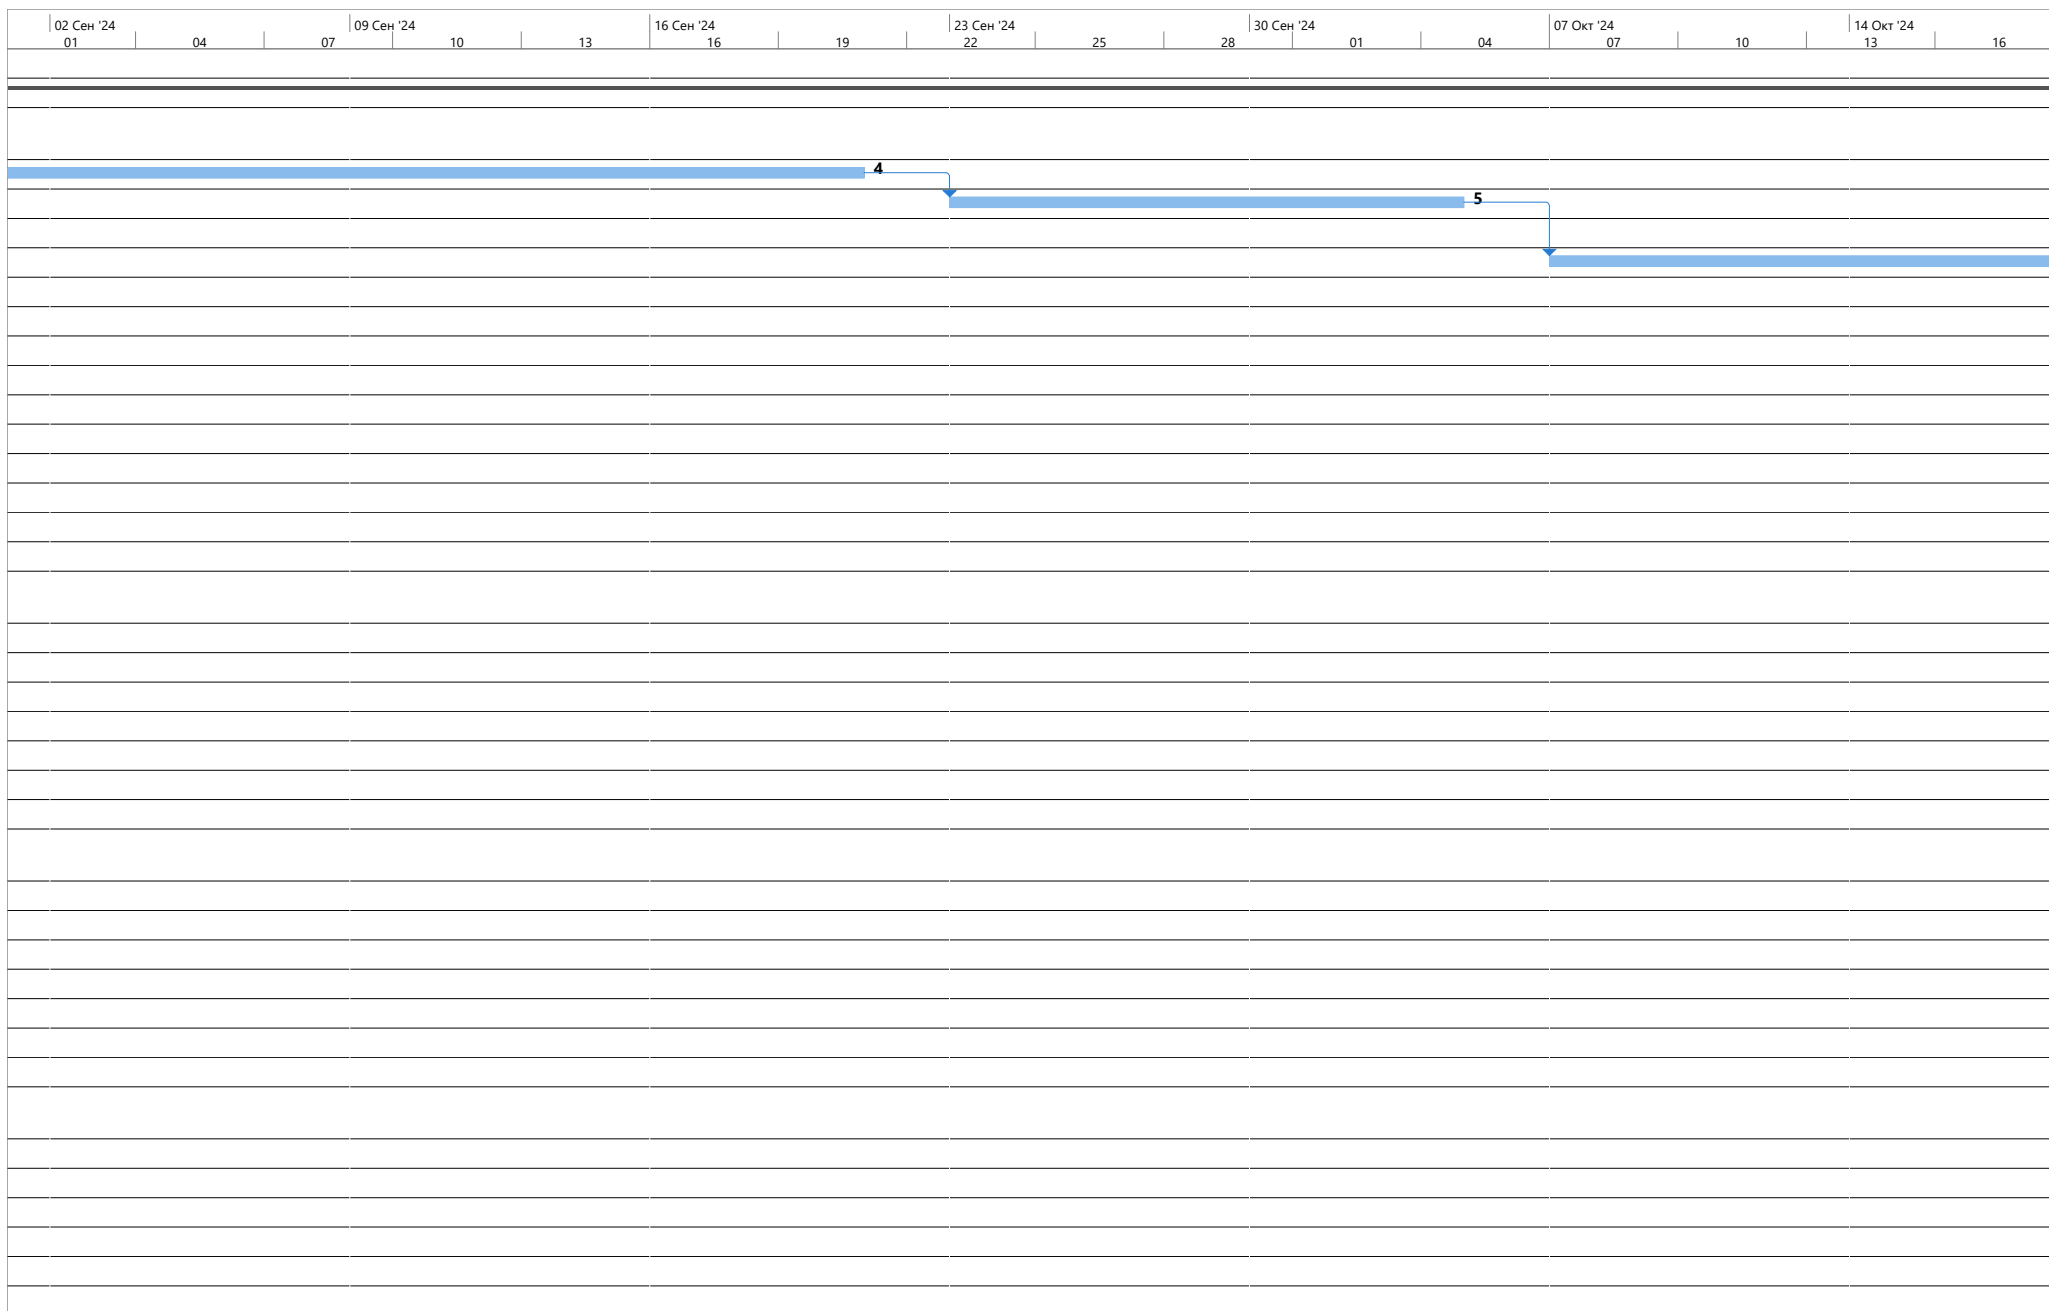

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

GRAFIC DE EXECUTIE ETAPA I

Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

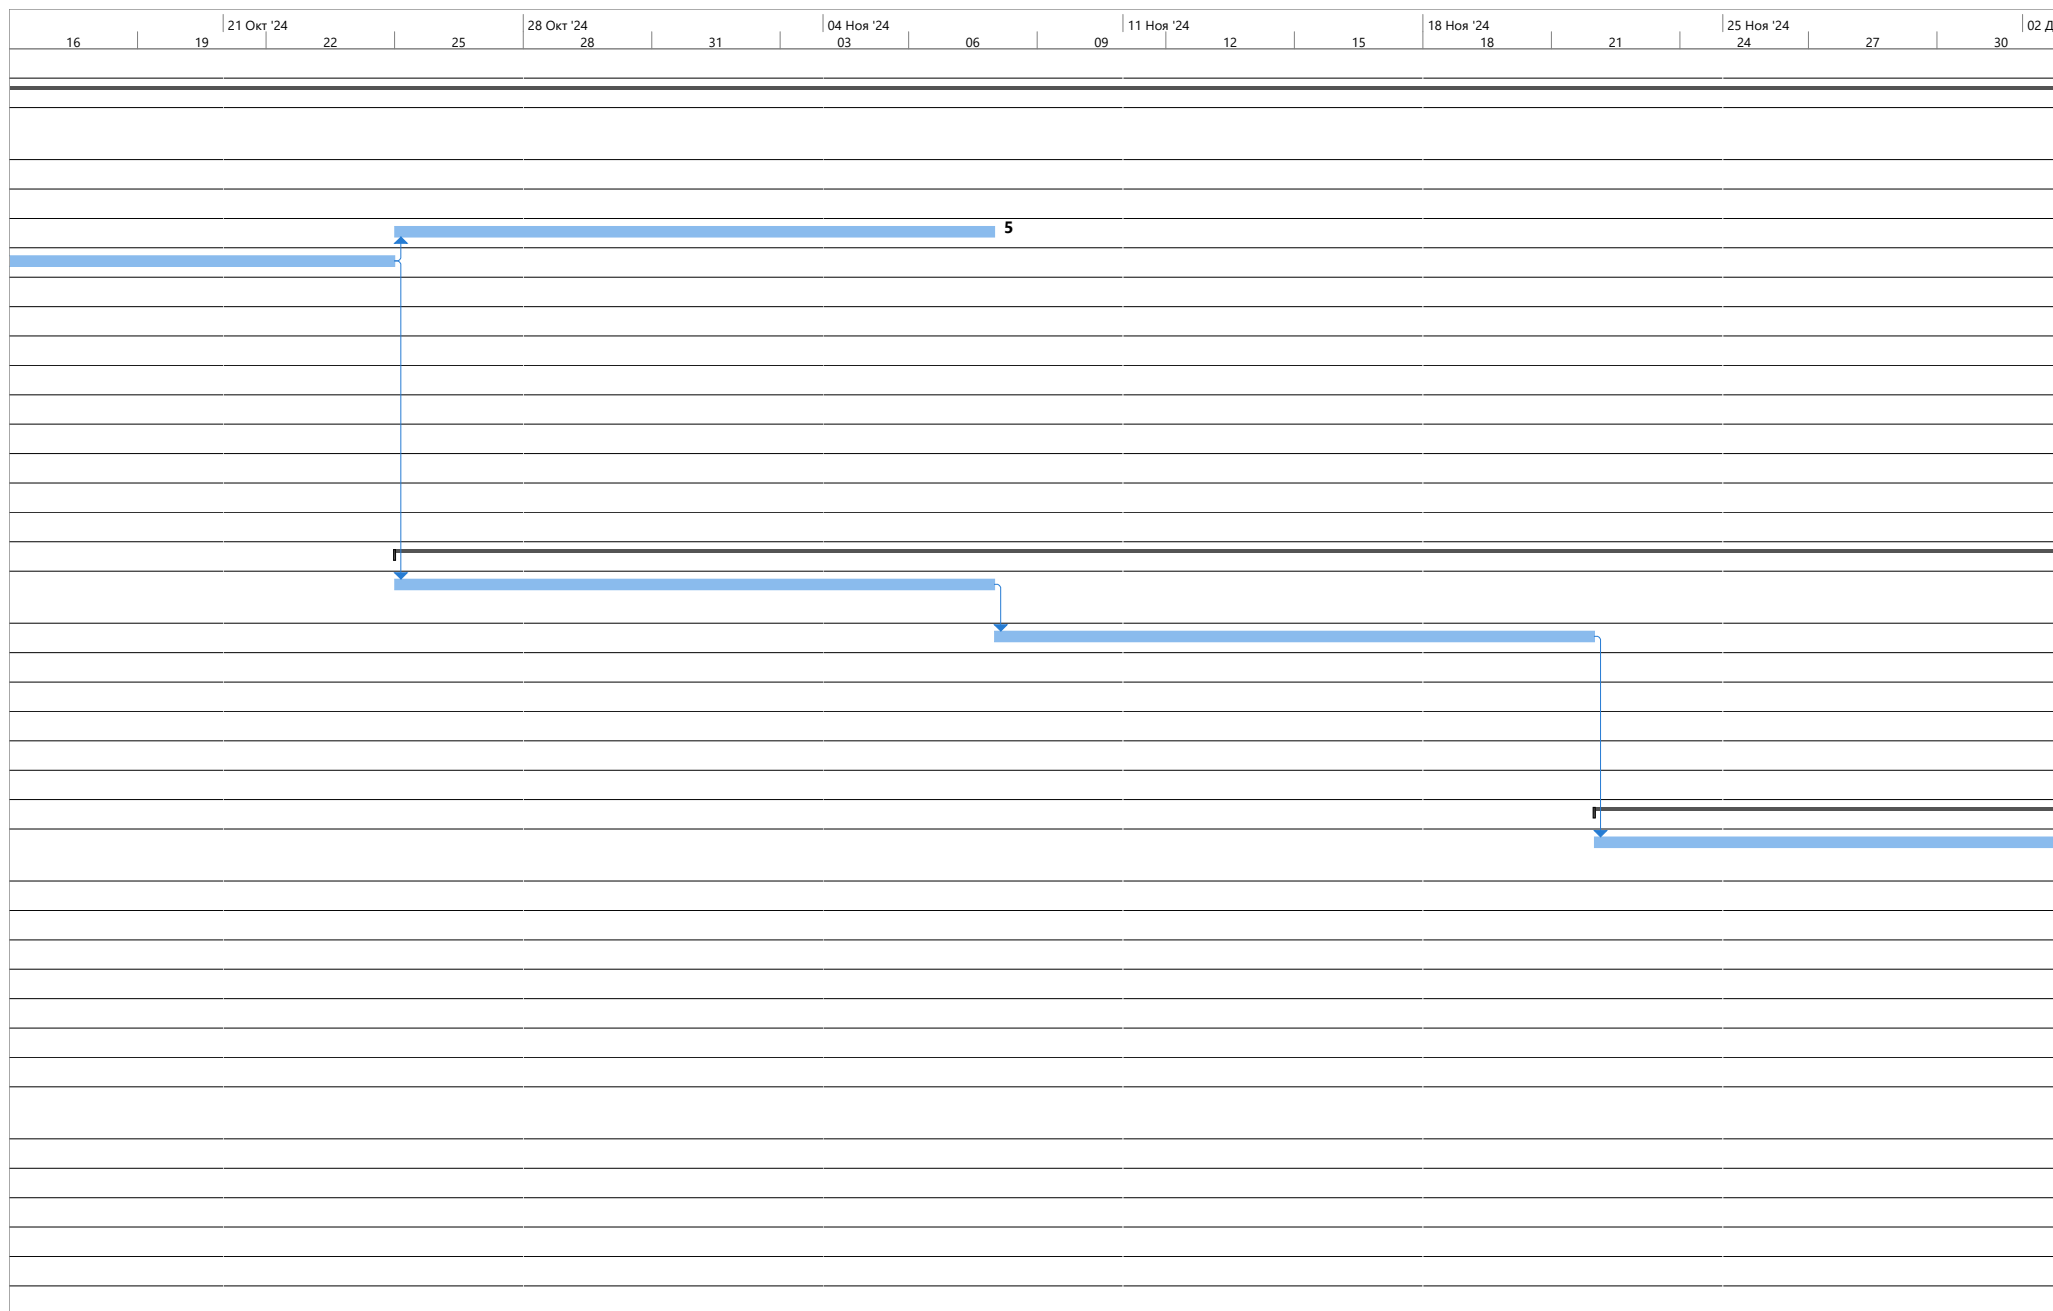


graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau



GRAFIC DE EXECUTIE ETAPA I


Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

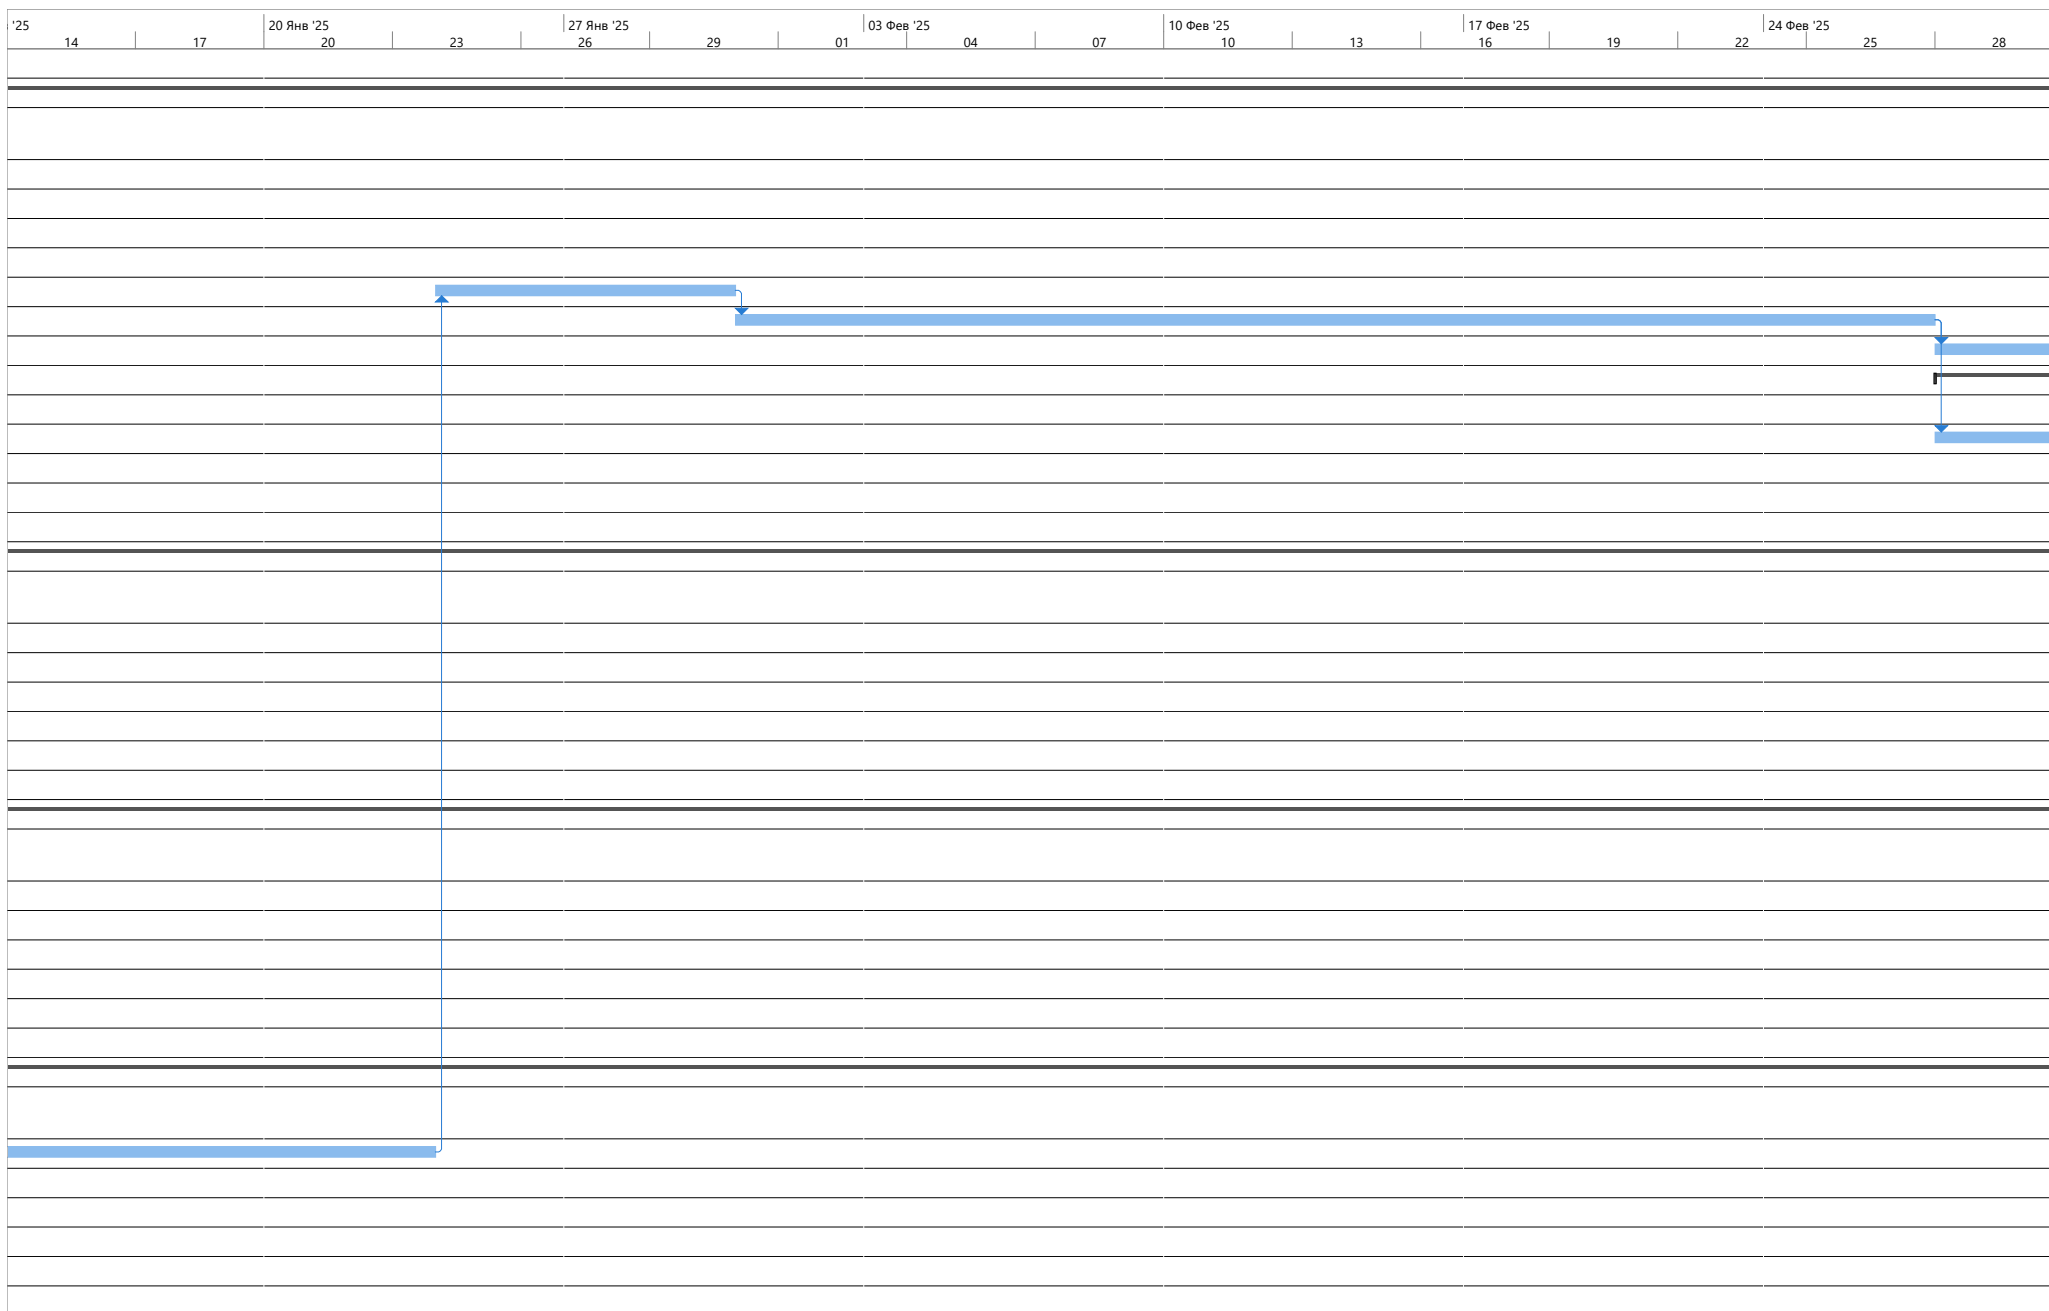

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

GRAFIC DE EXECUTIE ETAPA I


Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

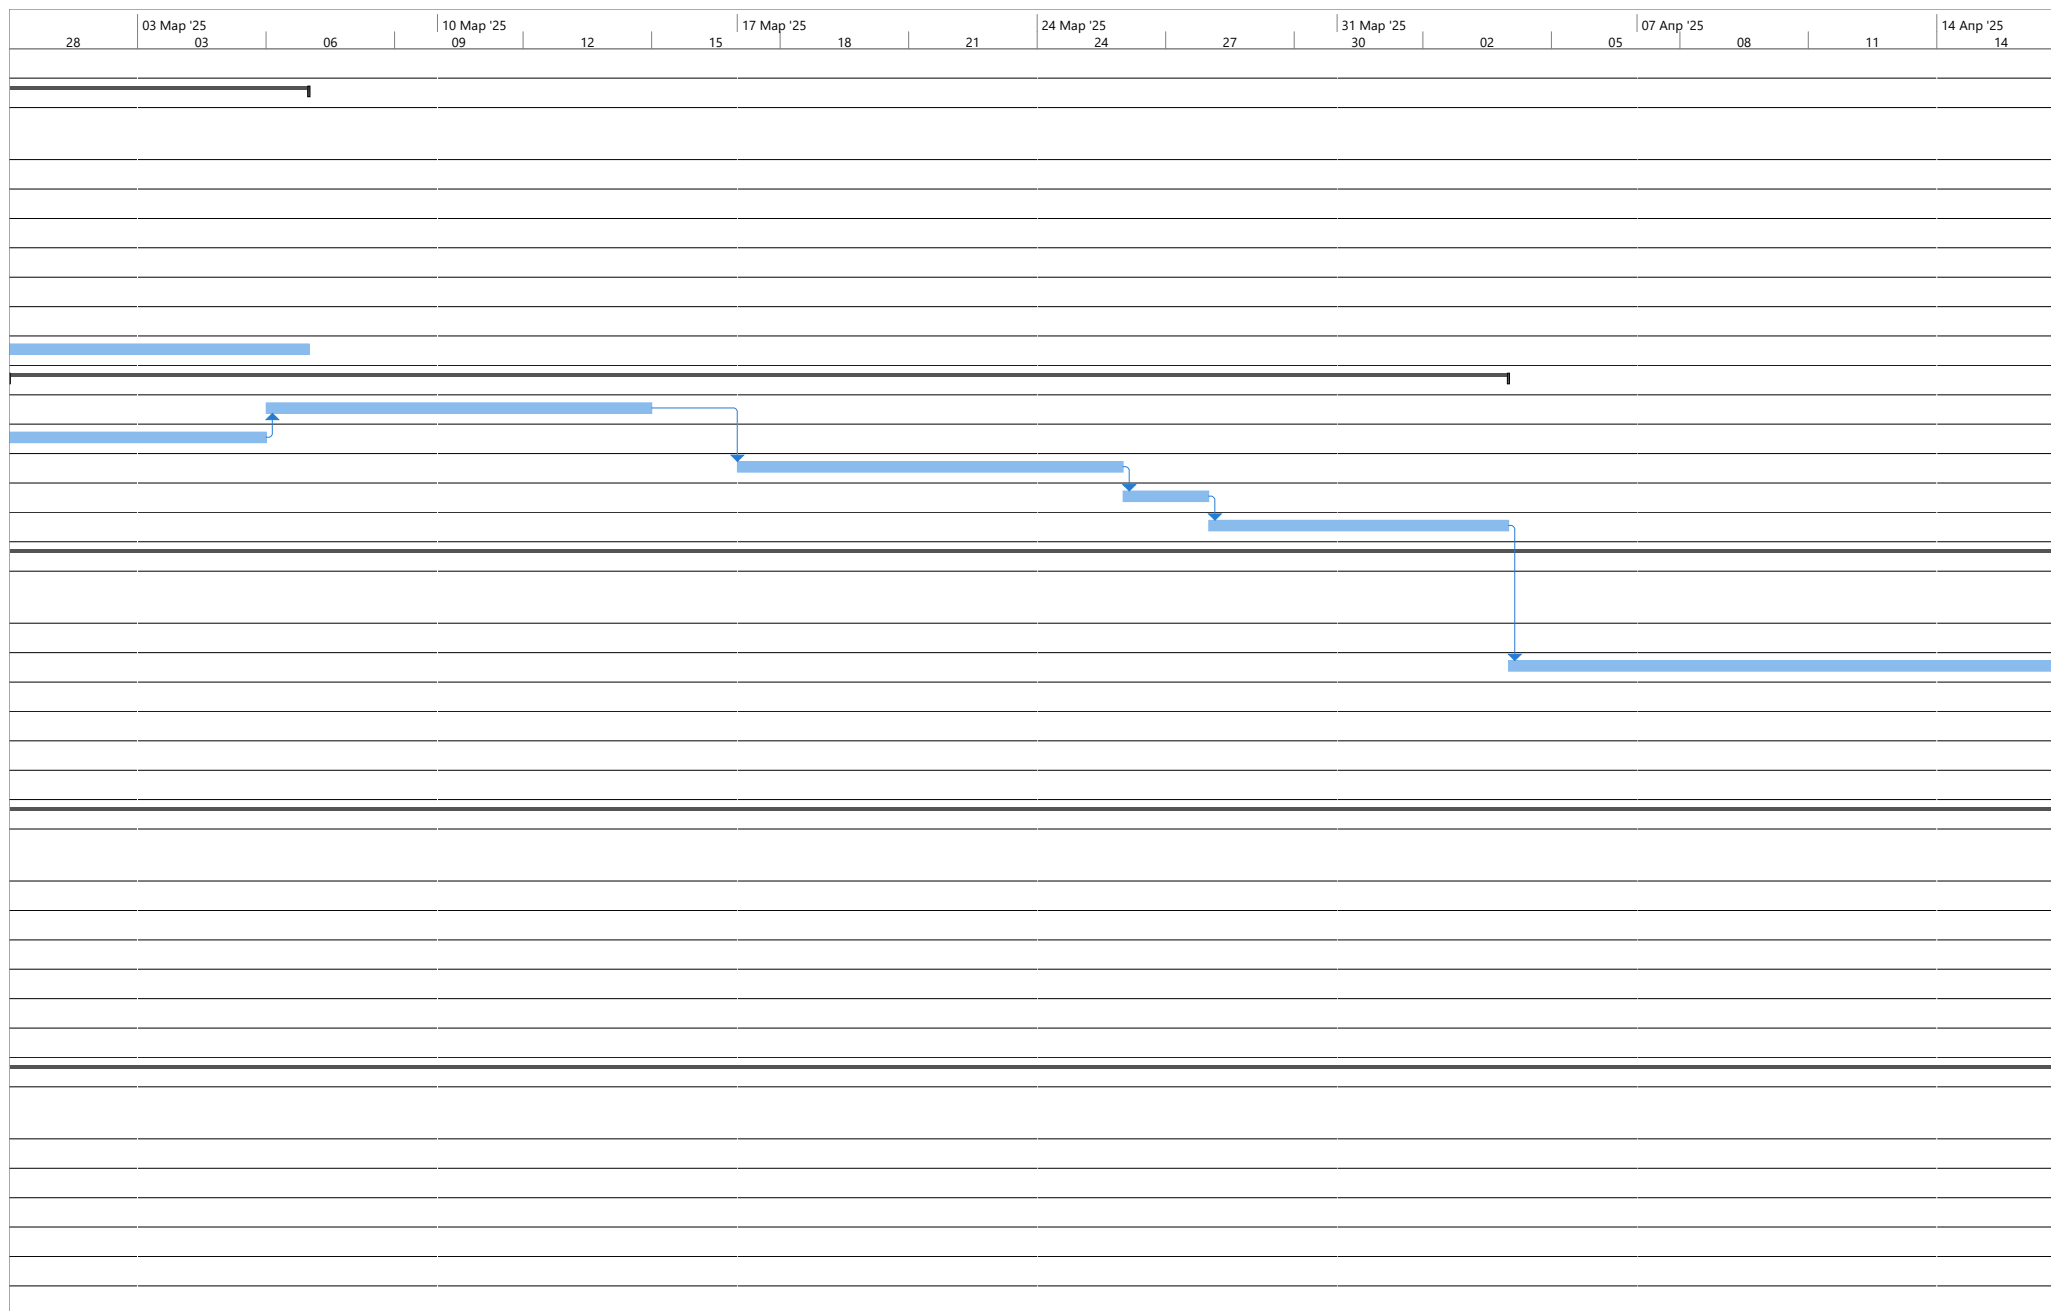

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

GRAFIC DE EXECUTIE ETAPA I


Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

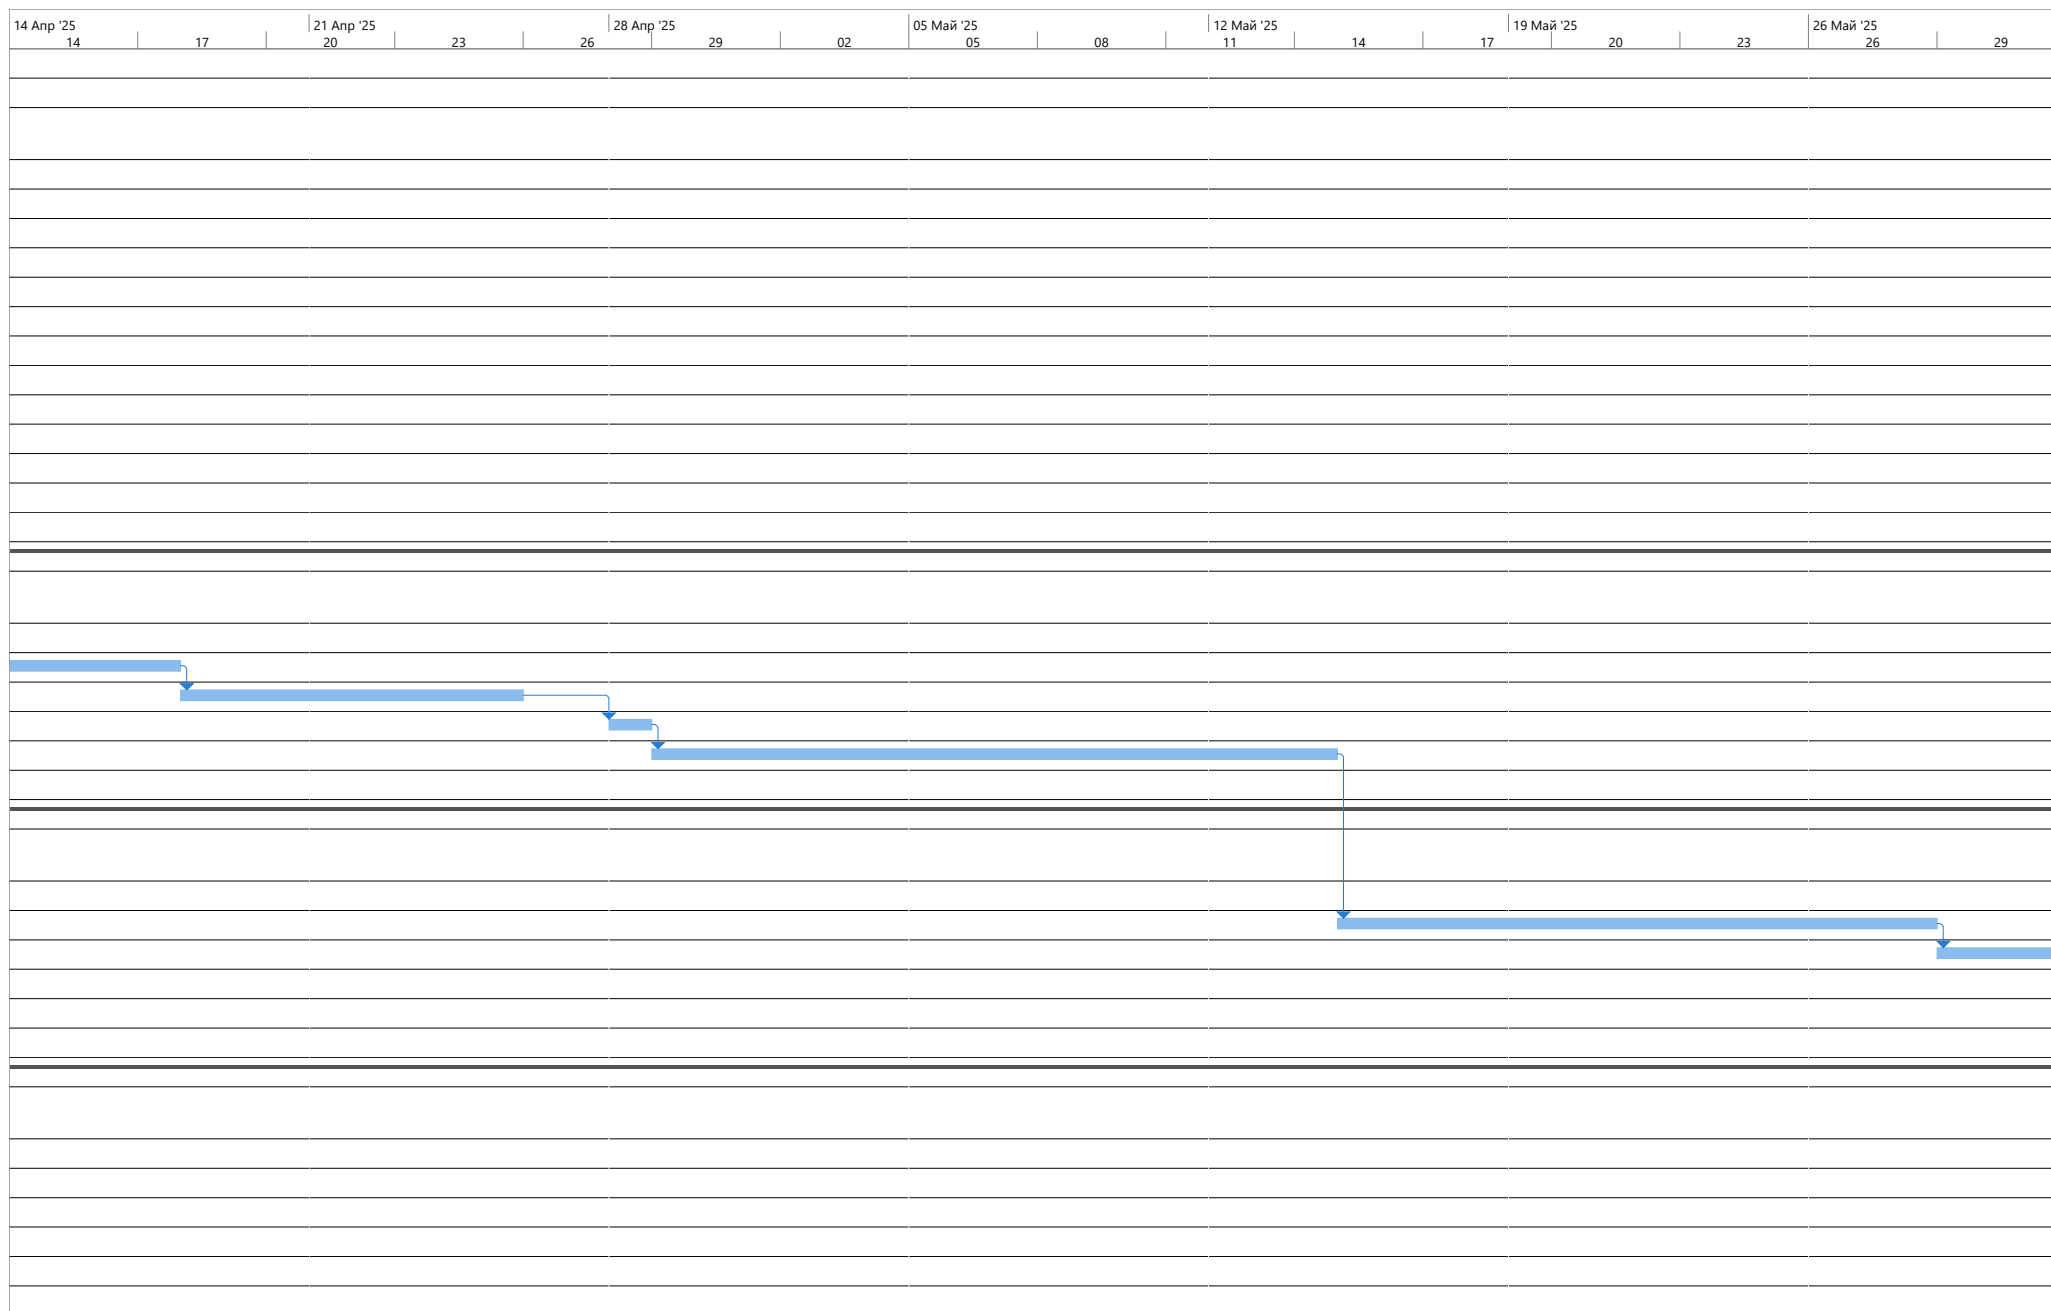

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor


GRAFIC DE EXECUTIE ETAPA I

Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

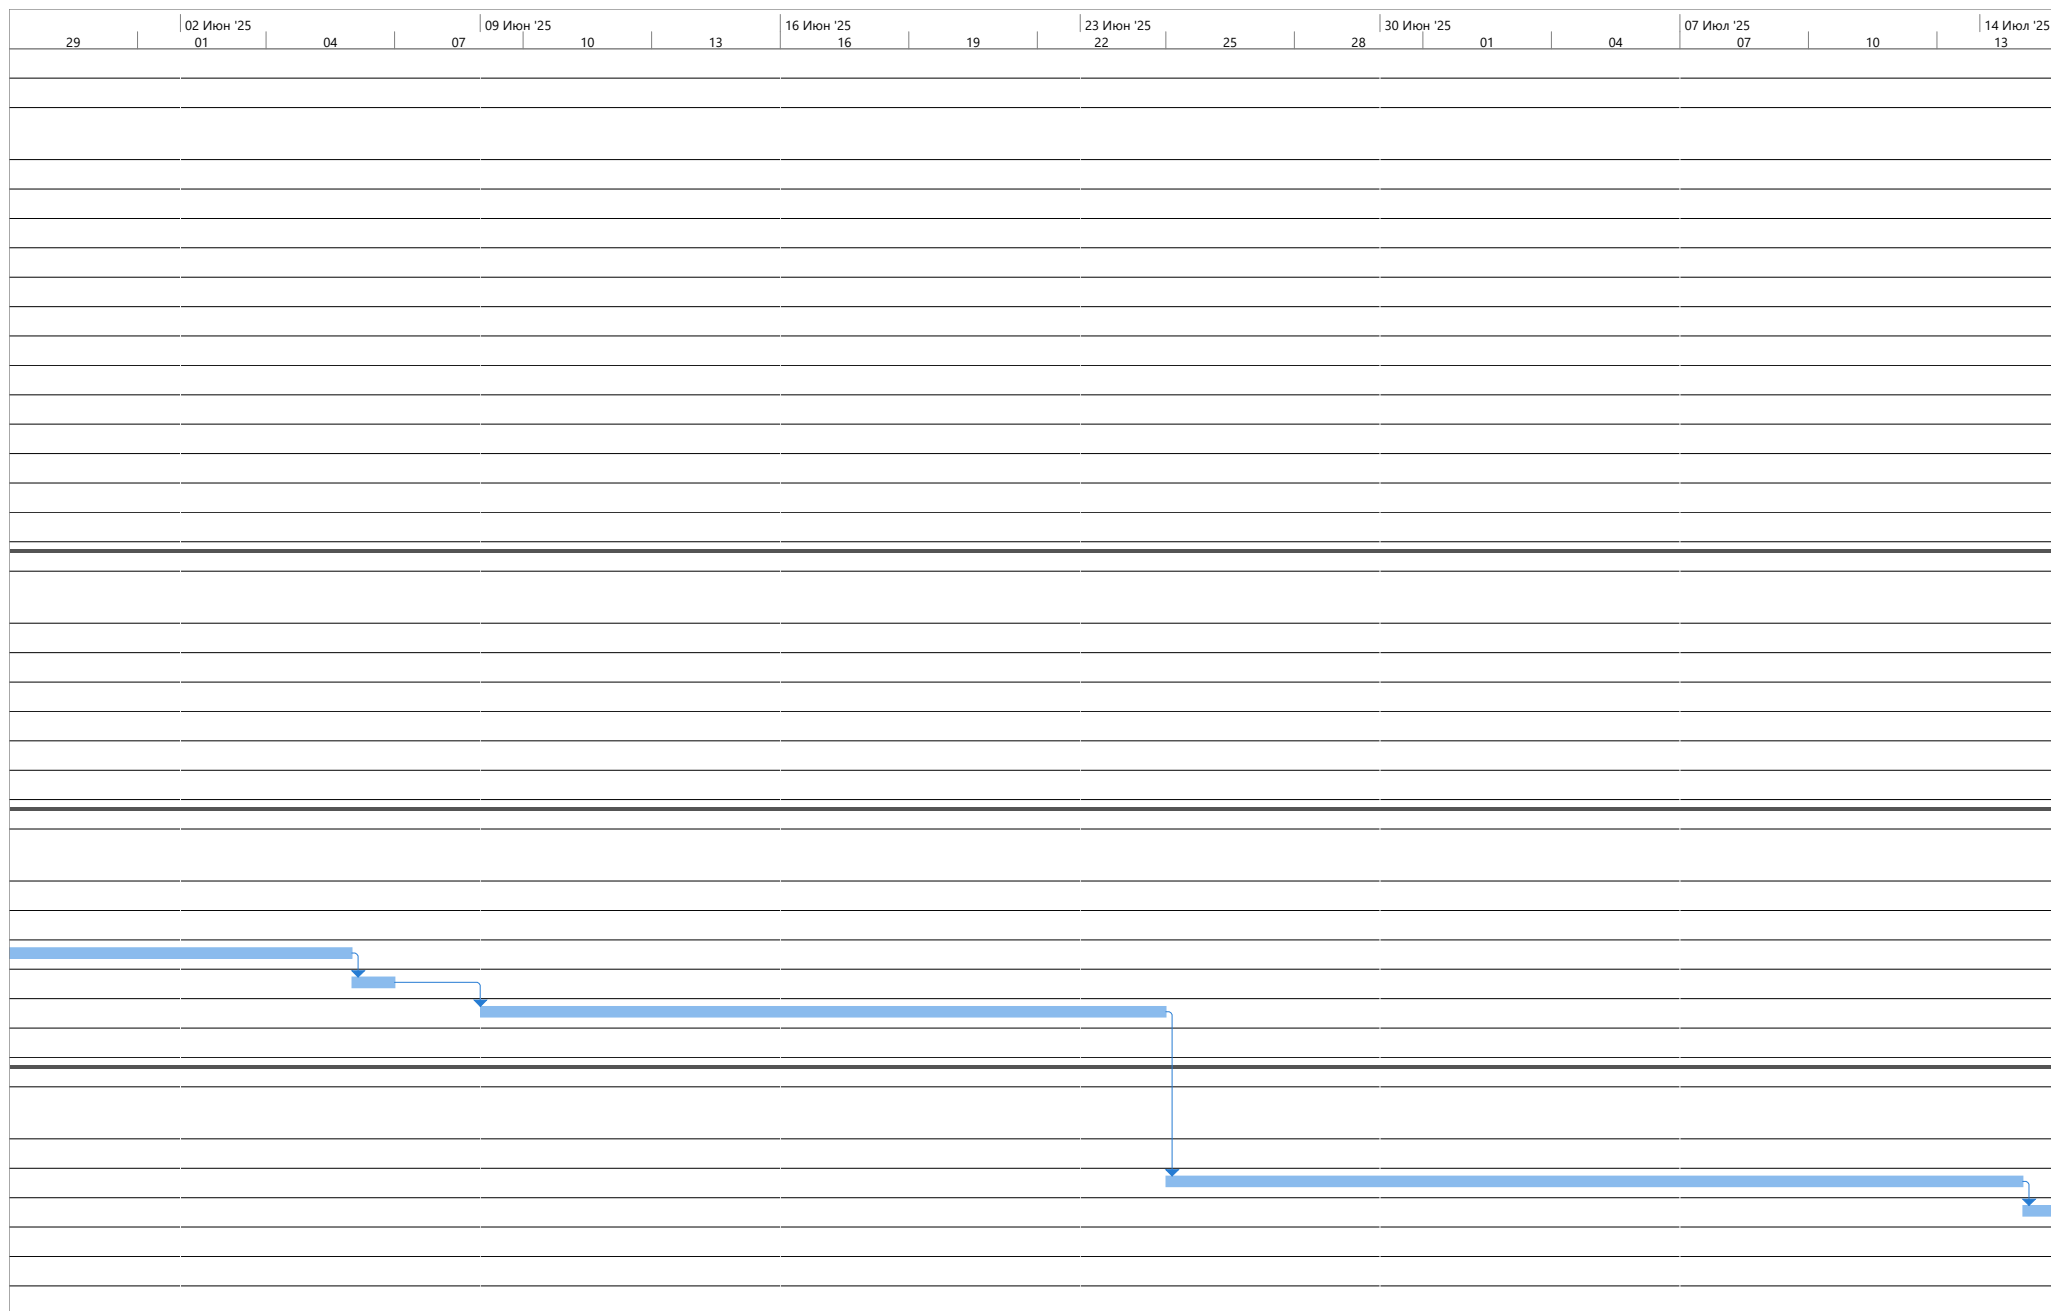


graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau



GRAFIC DE EXECUTIE ETAPA I

Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

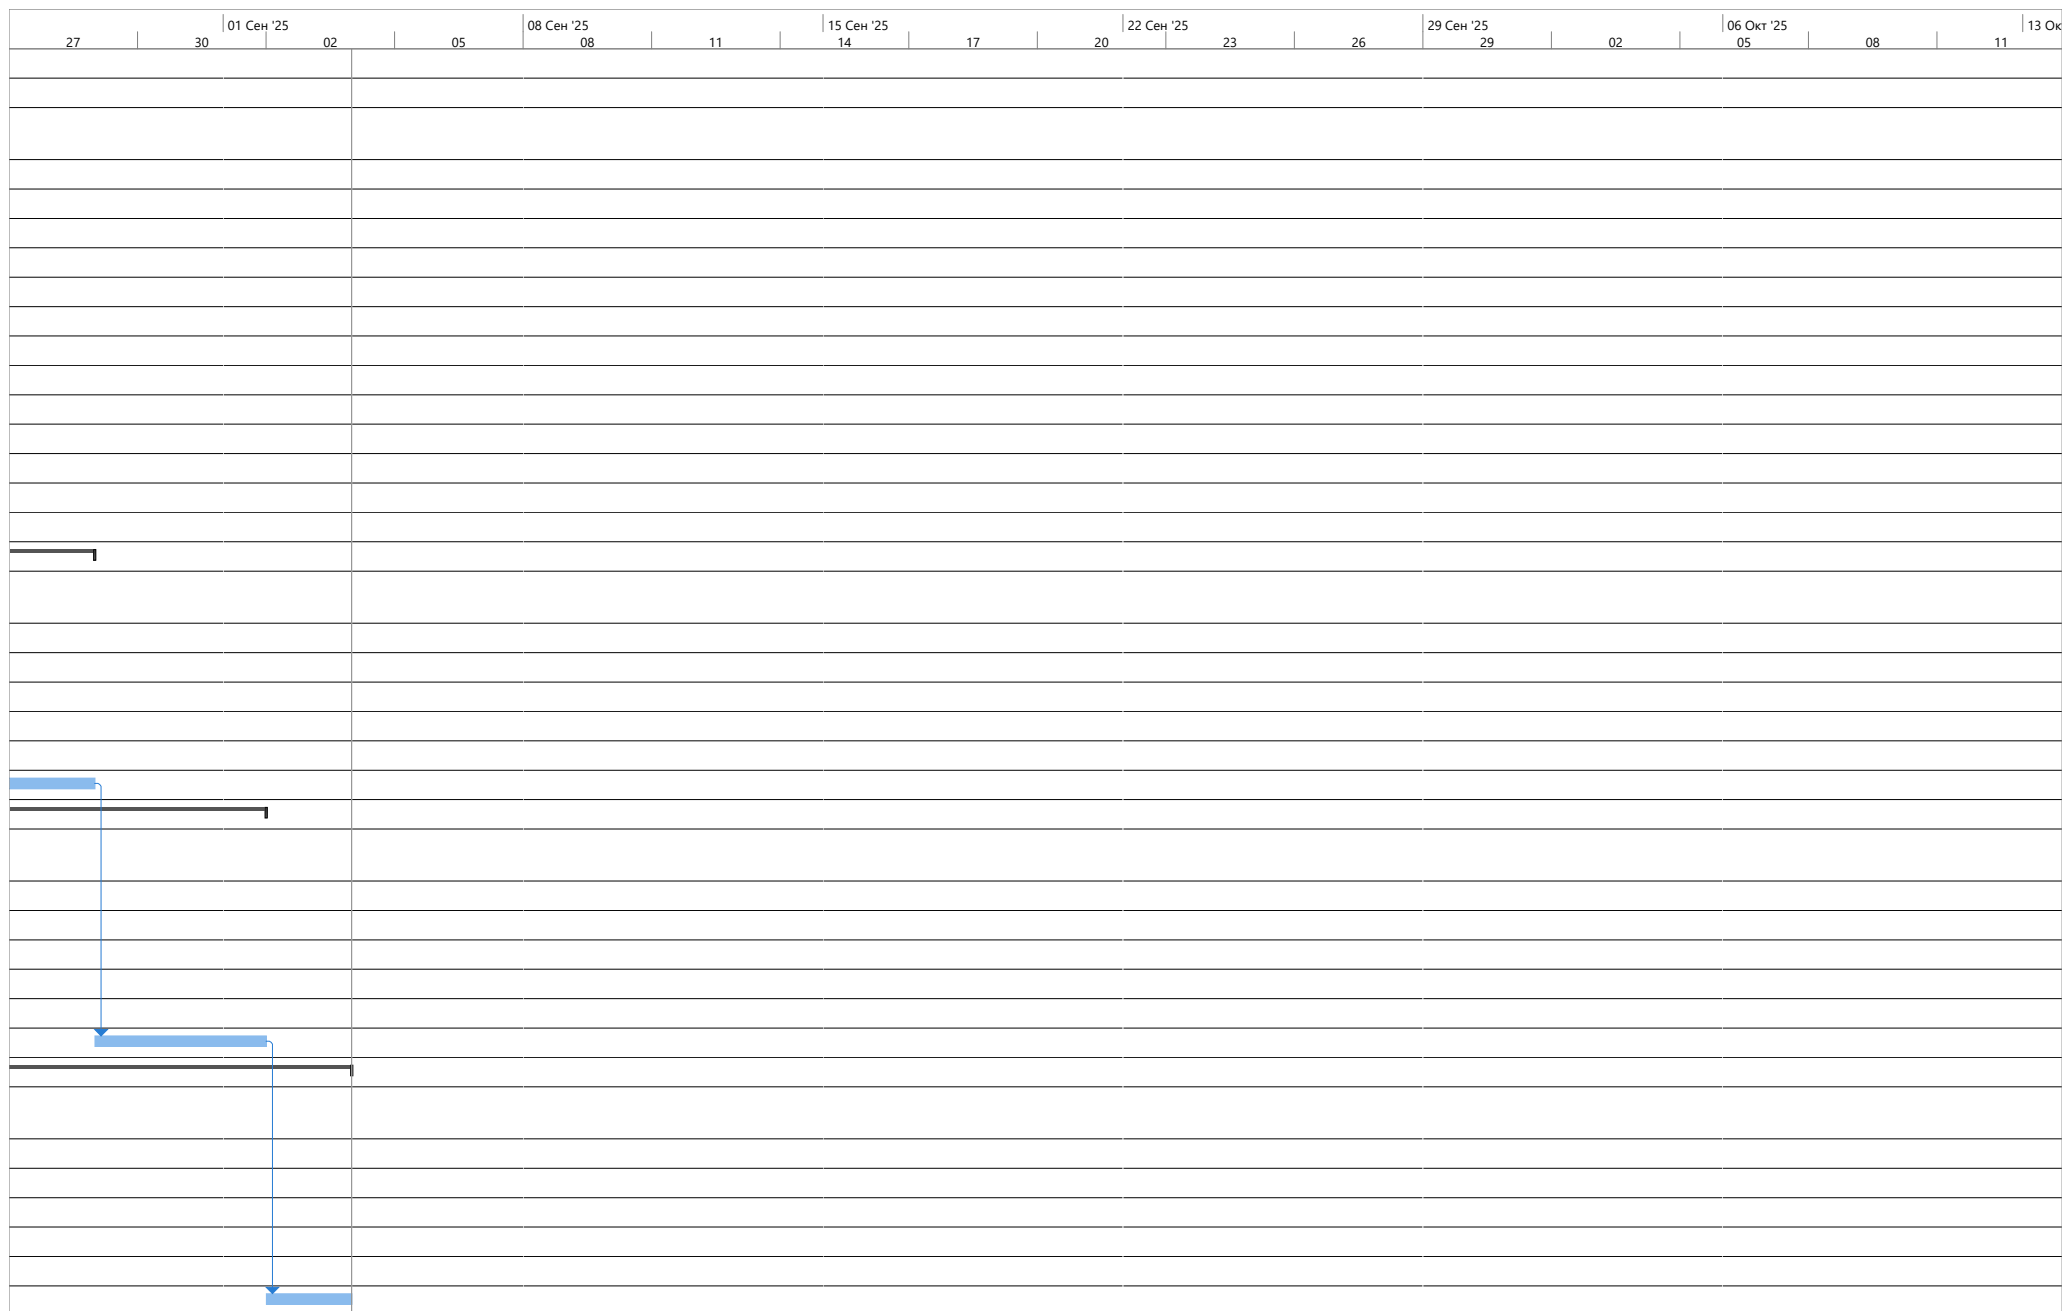

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor
