


Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	U.M.	Cantitatea	Volu mul de munc ă	Com pone n ă	Nr. de
1	Excavarea solului de categoria II cu excavator cu cupă inversă la mal, $V_{cup}=0,65\text{ m}^3$	100 m^3	37.80	11.10	1	1
2	Idem, în transport	100 m^3	2.75	0.89	1	1
3	Transportarea solului cu autobasculante	1 t	404.03	1.55	3	1
4	Săparea manuală a patului tranșeului	1 m^3	140.85	36.27	3	1
5	Pregătirea patului de nisip	1 m^3	130.78	9.97	3	1
6	Pozarea și montarea conductei PE 100 SDR 17 DN 90-180 mm	ml	1895	25.84	3	1
7	Astuparea manuală	1 m^3	1099.11	42.59	4	1
8	Compactarea manuală cu maiul de mână	1 m^3	1099.11	92.05	5	1
9	Montarea cămine $d=2000\text{ mm}$, $d=1500\text{ mm}$, camera 2700x1800	un	15	19.29	3	1
10	Montarea armăturilor cu acționare manuală DN 50-200 mm	un	41	3.18	3	1
11	Montarea hidranților de incendiu subterani cu DN 100	un	6	2.04	3	1
12	Astuparea mecanizată	100 m^3	28.22	3.42	1	1
13	Compactarea manuală cu maiul mecanic	100 m^3	28.22	31.11	2	1
14	Încercări finale a conductei PE 100 SDR 17 DN 90-180 mm	ml	1266	1.36	3	1


graficul calendaristic de execuție a lucrărilor de montare a rețelei exterioare de canalizare

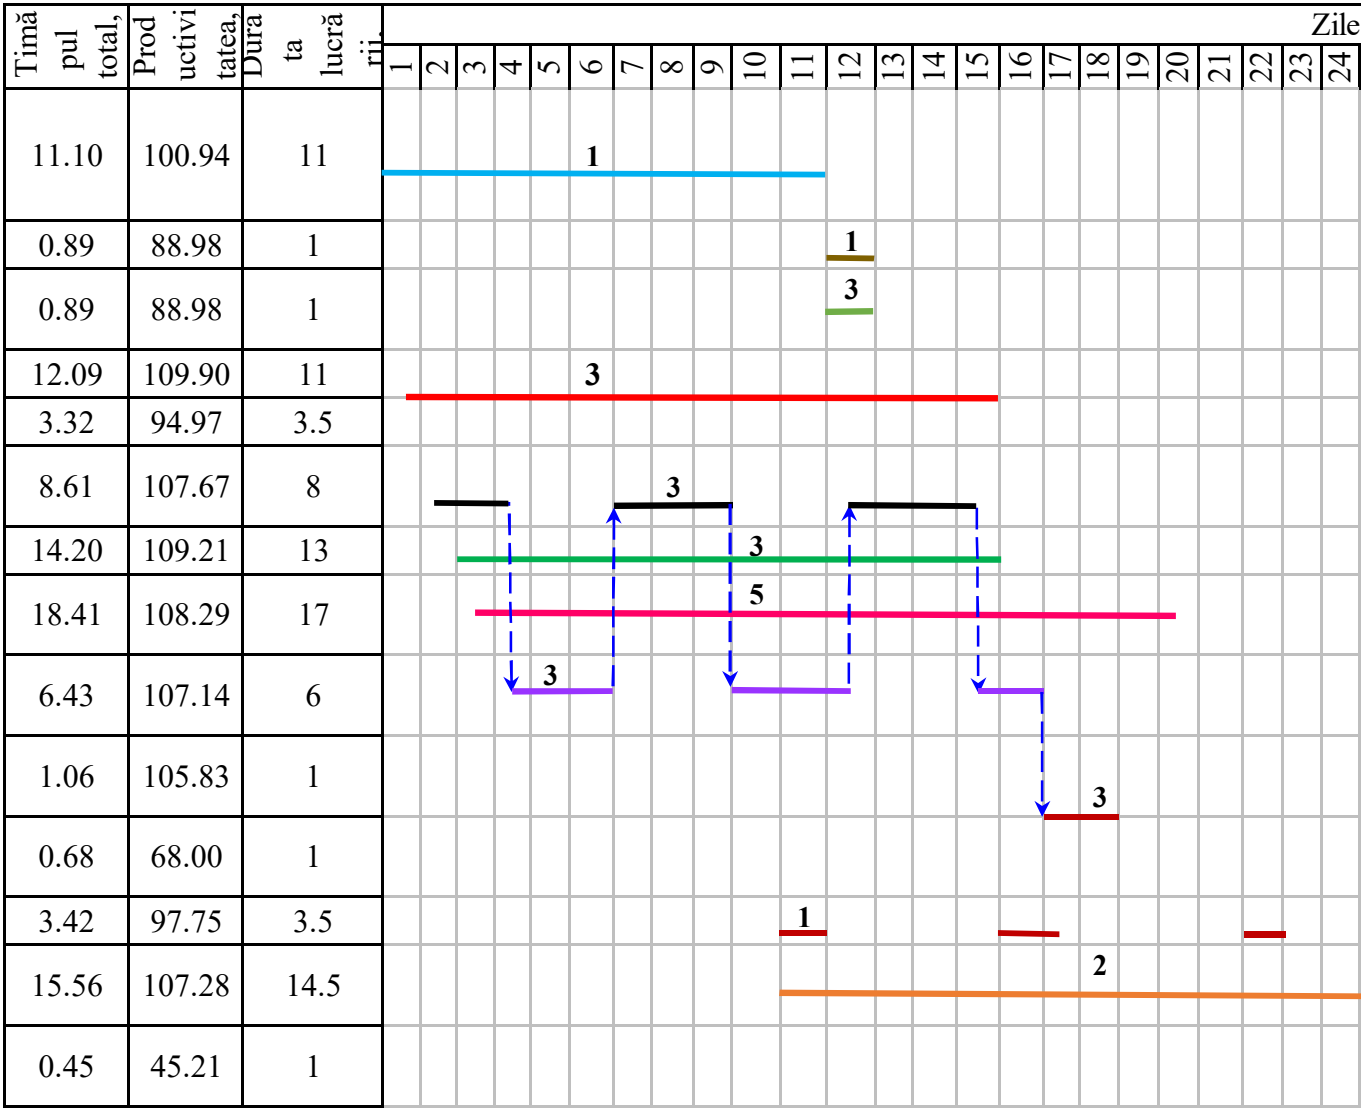

Anexa 2

lucrătoare	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

Graficul calendaristic de execuție a lucrărilor

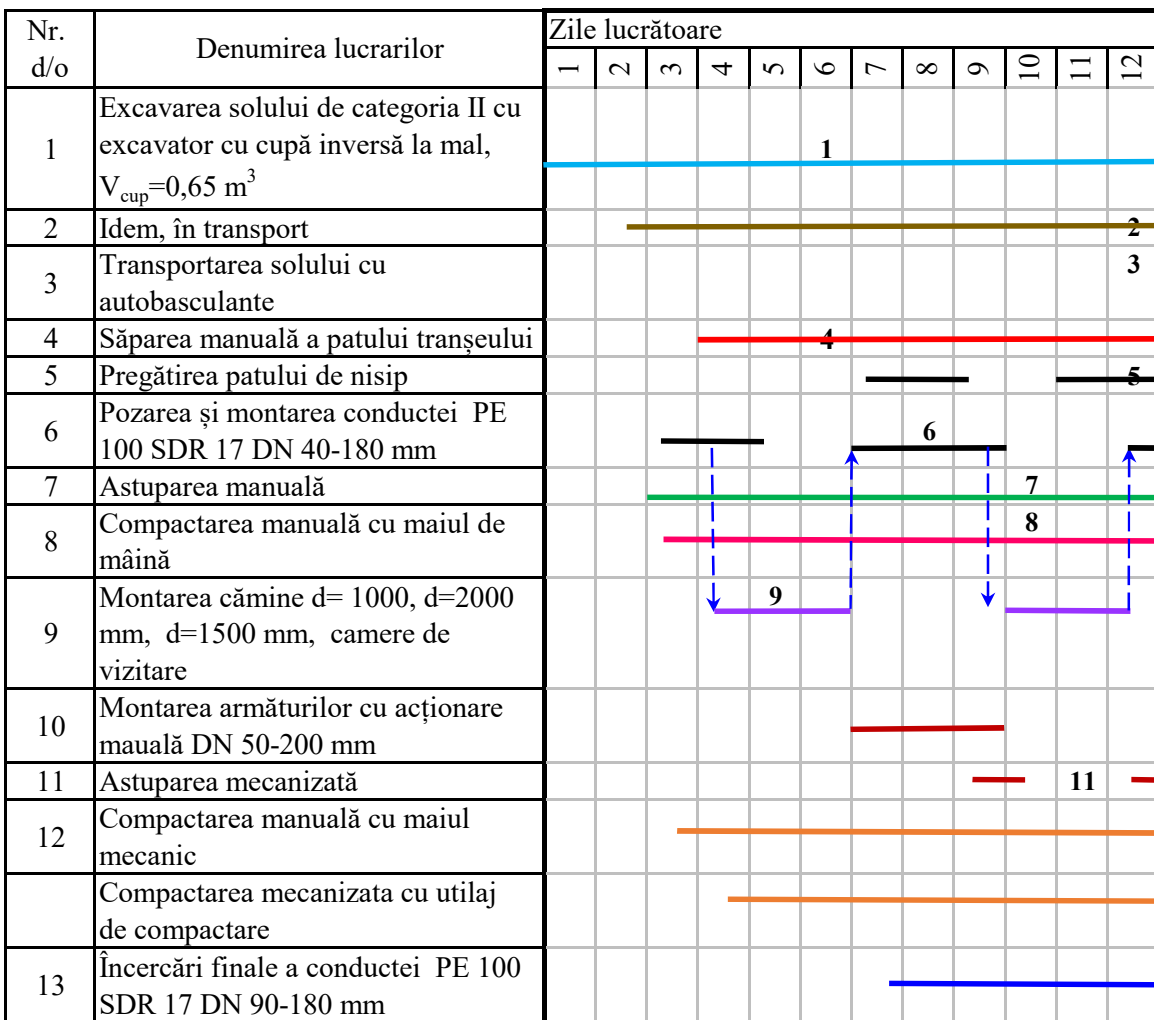

Executor

Hidro Servicii SRL

lor de montare a rețelei exterioare de apeduct din str Tudor Vladimirescu

