


Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	U.M.	Cantitatea	Volu mul de muncă	Componența	Nr. de
1	Excavarea solului de categoria II cu excavator cu cupă inversă la mal, $V_{cup}=0,65 m^3$	100 m <sup>3</sup>	37.80	11.10	1	1
2	Idem, în transport	100 m <sup>3</sup>	2.75	0.89	1	1
3	Transportarea solului cu autobasculante	1 t	404.03	1.55	3	1
4	Săparea manuală a patului tranșeului	1 m <sup>3</sup>	140.85	36.27	3	1
5	Pregătirea patului de nisip	1m <sup>3</sup>	130.78	9.97	3	1
6	Pozarea și montarea conductei PE 100 SDR 17 DN 90-180 mm	ml	1895	25.84	3	1
7	Astuparea manuală	1 m <sup>3</sup>	1099.11	42.59	4	1
8	Compactarea manuală cu maiul de mână	1 m <sup>3</sup>	1099.11	92.05	5	1
9	Montarea cămine d=2000 mm, d=1500 mm, camera 2700x1800	un	15	19.29	3	1
10	Montarea armăturilor cu acționare manuală DN 50-200 mm	un	41	3.18	3	1
11	Montarea hidranților de incendiu subterani cu DN 100	un	6	2.04	3	1
12	Astuparea mecanizată	100 m <sup>3</sup>	28.22	3.42	1	1
13	Compactarea manuală cu maiul mecanic	100 m <sup>3</sup>	28.22	31.11	2	1
14	Încercări finale a conductei PE 100 SDR 17 DN 90-180 mm	ml	1266	1.36	3	1

**graficul calendaristic de execuție a lucrărilor de montare a rețelei exterioare de canalizare**



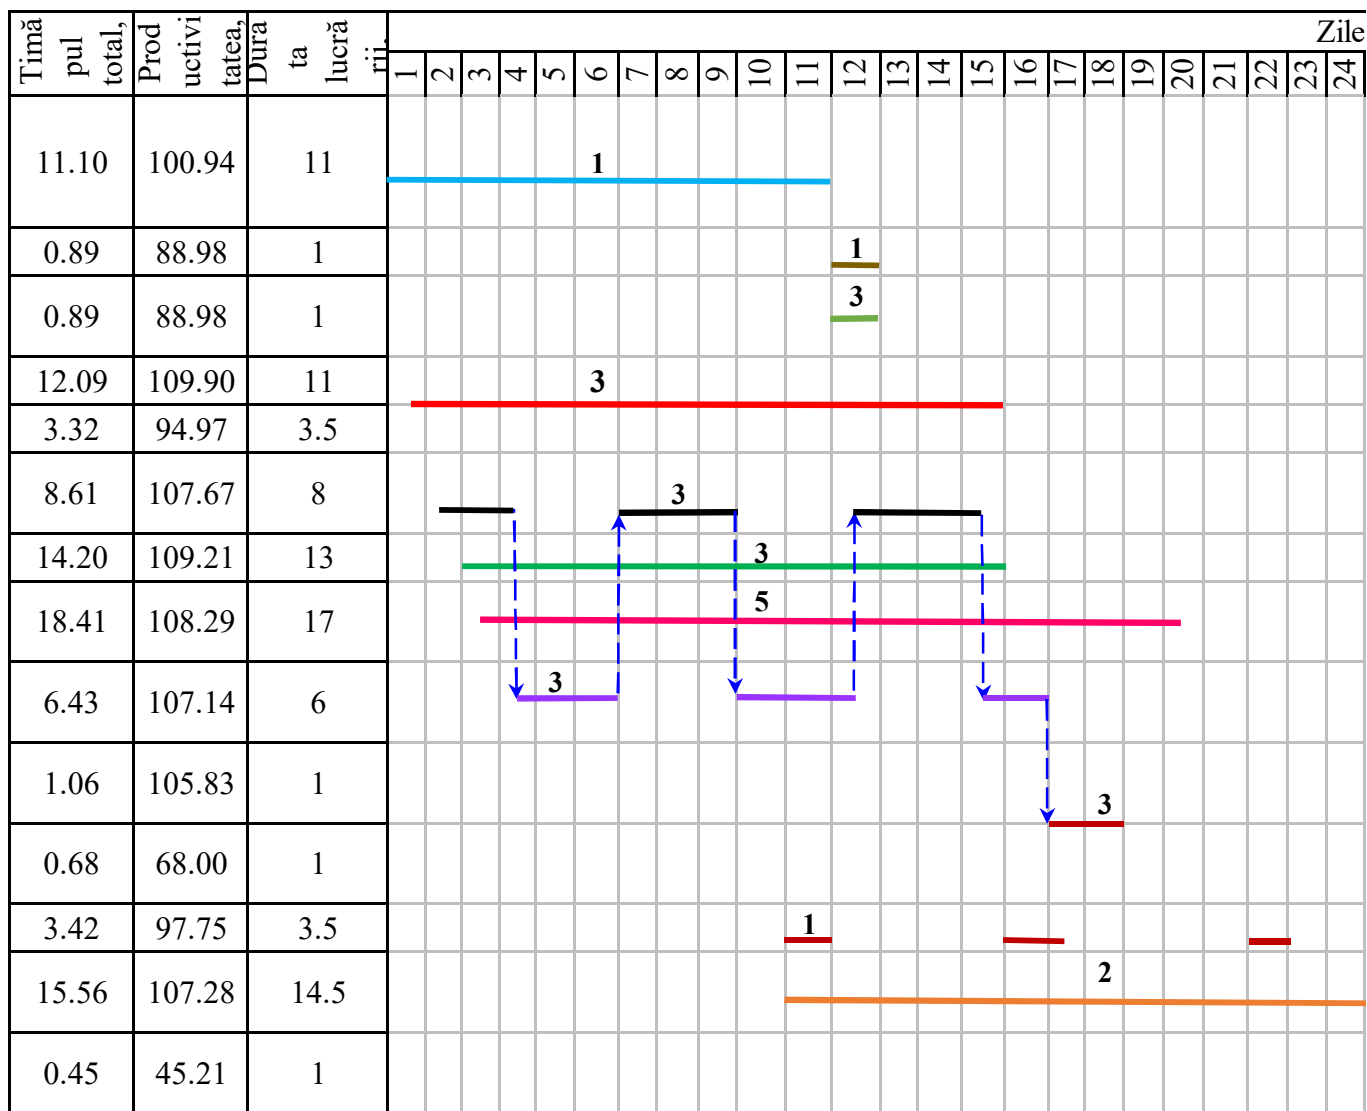

**Graficul calendaristic de execuție a lucrării**

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Zile lucrătoare											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Excavarea solului de categoria II cu excavator cu cupă inversă la mal, $V_{cup}=0,65 m^3$						1						
2	Idem, în transport												2
3	Transportarea solului cu autobasculante												3
4	Săparea manuală a patului tranșeului						4						
5	Pregătirea patului de nisip												5
6	Pozarea și montarea conductei PE 100 SDR 17 DN 40-180 mm												
7	Astuparea manuală												
8	Compactarea manuală cu maiul de mână												
9	Montarea cămine $d= 1000, d=2000$ mm, $d=1500$ mm, camere de vizitare												
10	Montarea armăturilor cu acționare manuală DN 50-200 mm												
11	Astuparea mecanizată												
12	Compactarea manuală cu maiul mecanic												
	Compactarea mecanizata cu utilaj de compactare												
13	Încercări finale a conductei PE 100 SDR 17 DN 90-180 mm												

Executor

Hidro Servicii SRL

lor de montare a rețelei exterioare de apeduct din str Tudor Vladimirescu

