



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 29 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de preț

nr. ocds-b3wdp1-MD-1601292114240 din 07.10.20,

“22” octombrie 2020

satul Coșcalia
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1601292114240 din 07.10.20, între Primăria satului Coșcalia, cu sediul în satul Coșcalia, raionul Căușeni, str. Poleanickin 89, telefon: 024366-2-36, fax: 66-2-38, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. IDNO 1007601005202 reprezentat prin Primarul Eșanu Elena, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC „Foremcons”, SRL, cu sediul în județ - mun. Chișinău, str. Pădurii, 8 of, 308, fizic - mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 1, of. 806 A, telefon 022-73-83-18, 67771111, fax: 022-73-83-18, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1005600001878 din 26.01.2005 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 036803 din “ ” 20, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și rețele tehnico-edilitare reprezentat prin Dumitru Axentii, în calitate de Director, de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s. Coșcalia, raionul Căușeni* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

! Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

! Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: generate de Beneficiar;

datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

1. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
2. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
3. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1178694,40** lei MD (Un milion lei una sută șaptezeci opt mii șase sute nouăzeci patru lei 40 bani) , inclusiv **196449,07** TVA lei MD. (Una sută nouăzeci șase patrusute patruzeci nouă lei 07 bani)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans **10%** anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult **15 zile**.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel: un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

0 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

1 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.

2 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

3 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

4 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

5 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

8 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

9 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.

10 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

11 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

12 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

13 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

14 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

5În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **5 ani**.

Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri

de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;

Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;

Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

Caietul de sarcini;

Propunerea tehnică;

Oferta financiară;

Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;

Garanția de bună execuție.

Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor pînă la data de 15.03.2021

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Chișinău ,
str. V. Alecsandri 1, of. 806 A

Telefon: 022-73-83-18

Cod fiscal: 1005600001878

Banca: BC Moldincombank SA

Cod: MOLDMD2X349

IBAN: MD61ML00000000225124978



Handwritten signature

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Coșcalia ,
raionul Căușeni , str. Poleanikin

Telefon: 024366-2-38, 079290115

Cod fiscal: 1007601005202

Banca: Ministerul Finanțelor
Trezoreria Regională - Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD85TRPDAF313120M11066AC



15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

din 06 aprilie 2021

privind lucrarea Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal din s. Coșcalia, r-nul Căușeni
executată la obiectivul din s. Coșcalia, r-nul Căușeni
în cadrul contractului nr. 29 din 22.10.2020
încheiat între „Foremcons” SRL și Primăria s. Coșcalia, r-nul Căușeni
pentru lucrările de Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal din s. Coșcalia, r-nul Căușeni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06 aprilie 2021.

fiind formată din:

Eșanu Elena – primarul s. Coșcalia

Cebanu Tere

Imeu Gintimile

Biznă Natalia

Bordeianu Rodica

2. Au mai participat

Cernei Ion – inginer „Foremcons” SRL.

Buzhichin V - diriginte de șantier „Foremcons” SRL

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

2) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate.

3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune -- recepționarea lucrărilor în valoarea de 1 178 694,40 lei (un milioane o sută șaptezeci și opt mii șase sute nouăzeci și patru lei,40 bani)

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive, recepționarea lucrărilor în valoarea de (1 178 694,40 lei)

6.Comisia de receptie recomandă urmatoarele: receptionarea lucrarilor

7. Prezentul proces-verbal contine 5 file , cu un total de 5 exemplare.

Comisia de receptie

Au mai participat:

Eşanu Elena

Cernei Ion

Cebanec



Gheorghe Gheorghe

Ghibina Natalia

Prodanescu Rodica

TRANSMISĂ:

Executantul

"Foremcons" SRL



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primăria Coscalia, r-nul Căuşeni




Anexă

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

În cadrul proiectului **Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal din s. Coșcalia, r-nul Căușeni** a fost finalizat.

Lista anexă nr.1. Din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

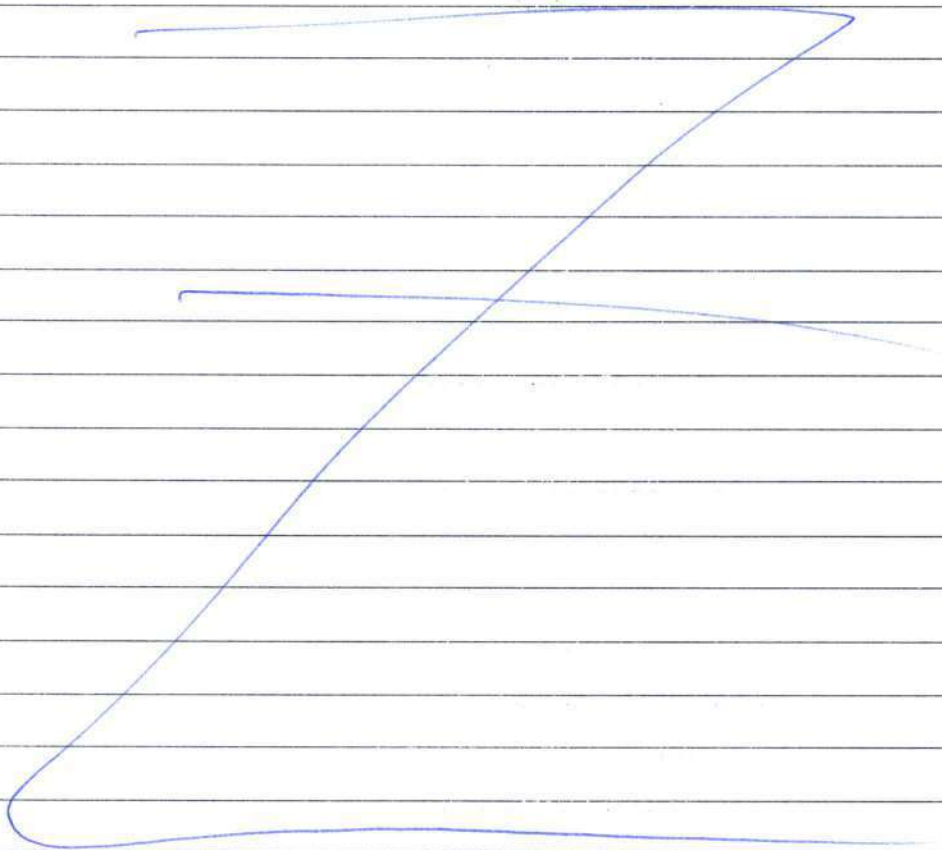


Președintele comisiei

[Handwritten signature]




Lista-anexă nr.2. Lucrări care nu au fost executate

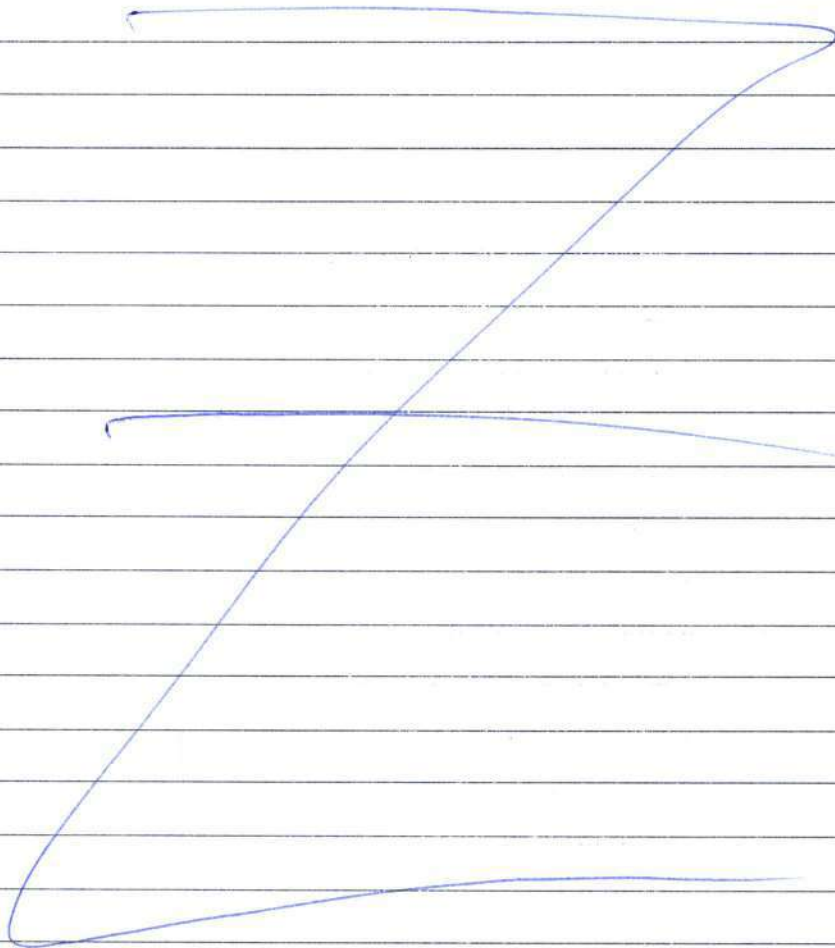

Președintele comisiei



Lista-anexă nr.3. Lucrări la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului

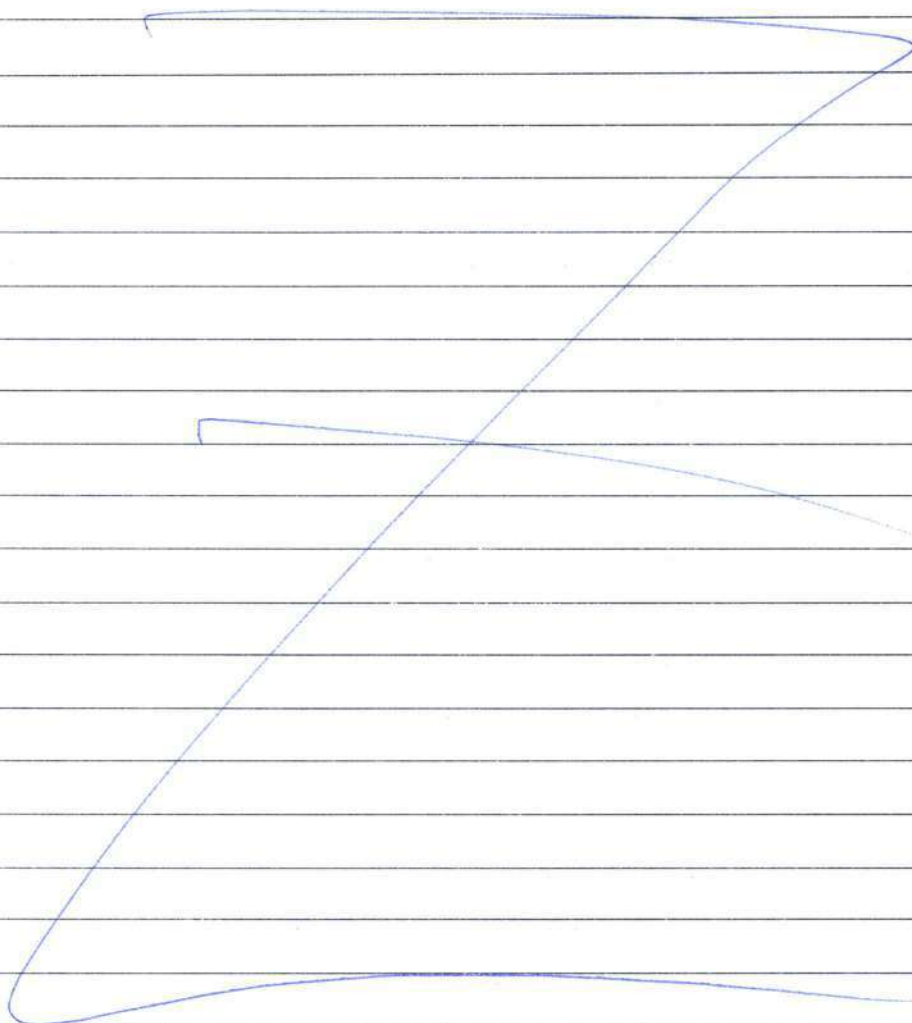

Președintele comisiei





REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUȘENI
PRIMĂRIA SATULUI COȘCALIA

MD -7720 , s.Coșcalia , raionul Căușeni 0243-66-2-38-tel/fax (243) – 66-2-36 , e-mail primariacoscalia@mail.ru

Nr. 183 09.08.2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Colaborarea cu compania SRL „Foremcons „ a fost inițiată odată cu semnarea contractului de execuție a lucrărilor, în urma organizării Concursul ofertelor de preț cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1601292114240 din 07.10.20.

De la bun început SRL „Foremcons „ a dat dovadă de responsabilitate , punctualitate , personal bine instruit și organizarea procesului de executare a lucrărilor conform graficului și cerințelor caietului de sarcini și proiectului tehnic .

Pe parcursul desfășurării lucrărilor atât conducerea cât și personalul au demonstrat responsabilitate , cunoștințe în domeniu de activitate și atenție deosebită la respectarea cerințelor tehnologice.

Anume aceste calități dar și echiparea muncitorilor conform normelor de securitate a muncii a făcut posibilă îndeplinirea lucrărilor fără accidente tehnice , fără neconformități și în termenii stabiliți .

Suntem mulțumiți de lucrările executate de SRL „Foremcons „ și din acest considerent vă recomandăm serviciile acestei companii pentru a vă convinge de lucrări executate calitativ și profesionist.



Primar

Elena Eșanu

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003693498



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Титулярный бланк
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		12.11.2020 / 12.11.2020		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 MOLDINCONBANK SA, MOLDM2X349		9. Transportator Перевозчик		S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1005600001878 / 0304951	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA SATULUI COSCALIA, S.COSCALIA Poleanicikin nr.89		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601005202 /					
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
										Proces verbal de recepție a lucrărilor executate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 pe luna noiembrie 2020	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		or. Chișinău		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		s. Coșcalia, r-nul Căușeni		7. Redirijări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
1. Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal in s. Coșcalia, r-ul Căușeni		un		1		392365,78		392365,78		20	
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						392365,78		X		78473,16	
										470838,94	
										X	
										X	
										0,00	

12. Permis eliberarea:
разрешил: director Dumitru Axentii

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile)
Сдал товары/активы (услуги) director Dumitru Axentii

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
\ Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



17. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					18. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км		
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись			
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя				
Încărcare Погрузка							
Descărcare Разгрузка							
19. Forma de plată Вид оплаты							
20. Mențiuni Отметки							
21. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг							

Antreprenor SRL "Foremcons"
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia si Modernizarea
 Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
 Causeni N03/2020-CO, BP1**

Valoarea lucrarilor executate **79 494.73 lei**

Proces - verbal Nr. 1

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2020

Retele electrice ВЛ-0,23 кВ (линия 1от ТП-472)

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП4 2*25	1000 m	1.300	5 093.188 3 761.738	6 621.145 4 890.260
2	Pretul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	1 380.000	13.800 0.000	19 044.000 0.000
3	136	Banda F2007	m	80.000	8.000 0.000	640.000 0.000
4	137	Screpa A200	buc	80.000	2.000 0.000	160.000 0.000
5	163	Consola CA 2000	buc	30.000	32.500 0.000	975.000 0.000
6	1681	Clema ES 1500	buc	25.000	120.250 0.000	3 006.250 0.000
7	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	40.000	38.718 13.838	1 548.736 553.536
8	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	21.000	26.750 0.000	561.750 0.000
9	162	Curau CSB180	buc	61.000	1.850 0.000	112.850 0.000
10	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	40.000	22.500	900.000

1	2	3	4	5	6	7
					0.000	0.000
11	1628	Clema FIDOS15-10	buc	63.000	14.600	919.800
					0.000	0.000
		<i>Total</i>	lei			34 489.531
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 224.854
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			2 695.365
		<i>Total</i>	100.00 +			38 409.750
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			4 137.285
		<i>Total</i>	100.00 +			42 547.035
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			2 552.822
		Total capitol: Inclusiv salariu				45 099.857 5 443.796
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Corpuri de iluminat c лампой LED 50W	buc	21.000	995.000	20 895.000
					0.000	0.000
		<i>Total</i>	lei			20 895.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			250.740
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 145.740
		<i>Total</i>	lei			66 245.61
		<i>TVA</i>	20.00 %			13 249.12
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				79 494.73 5 443.80

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

APROBAT:

Investitor

SRL "Foremcons"

Primăria s. Coșcalia, r-ul Căușeni



Antreprenor SRL "Foremcons"
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
 (denumirea)

Obiect Reconstructia si Modernizarea
Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
Causeni N03/2020-CO, BP1

Valoarea lucrarilor executate **179 557.22 lei**

Proces - verbal nr. 2

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2020

Retele electrice ВЛ-0,23 кВ линия 1от ПТ-463)

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrice izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП4 2*25	1000 m	3.138	5 093.172 3 761.736	15 982.373 11 804.328
2	Pretul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	3 326.000	13.800 0.000	45 898.800 0.000
3	136	Banda F2007	m	200.000	8.000 0.000	1 600.000 0.000
4	137	Screpa A200	buc	200.000	2.000 0.000	400.000 0.000
5	163	Consola CA 2000	buc	60.000	32.500 0.000	1 950.000 0.000
6	1681	Clema ES 1500	buc	70.000	120.250 0.000	8 417.500 0.000
7	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	100.000	38.718 13.838	3 871.840 1 383.840
8	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	40.000	26.750 0.000	1 070.000 0.000
9	162	Curau CSB180	buc	240.000	1.850 0.000	444.000 0.000
10	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	100.000	22.500	2 250.000

1	2	3	4	5	6	7
					0.000	0.000
11	1628	Clema FIDOS15-10	buc	120.000	14.600	1 752.000
					0.000	0.000
		<i>Total</i>	lei			83 636.513
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			2 967.338
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			6 536.730
		<i>Total</i>	100.00 +			93 140.581
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			10 023.008
		<i>Total</i>	100.00 +			103 163.589
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			6 189.815
		Total capitol: Inclusiv salariu				109 353.404 13 188.168
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Corpuri de iluminat c лампой LED 50W	buc	40.000	995.000	39 800.000
					0.000	0.000
		<i>Total</i>	lei			39 800.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			477.600
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 277.600
		Total	lei			149 631.02
		TVA	20.00 %			29 926.20
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				179 557.22 13 188.17

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

APROBAT:

Investitor

SRL "Foremcons"

Primăria s. Coșcalia, r-ul Căușeni



Antreprenor SRL "Foremcons"
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
 (denumirea)

Obiect Reconstructia si Modernizarea
 Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
 Causeni N03/2020-CO, BP1

Valoarea lucrarilor executate **109 342.38 lei**

P r o c e s - v e r b a l n r . 3

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2020

Retele electrice ВЛ-0,23 кВ линия 1 от ТП-467

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП4 2*25	1000 m	1.750	5 093.190 3 761.738	8 913.082 6 583.042
2	Pretul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	1 855.000	13.800 0.000	25 599.000 0.000
3	136	Banda F2007	m	110.000	8.000 0.000	880.000 0.000
4	137	Screpa A200	buc	110.000	2.000 0.000	220.000 0.000
5	163	Consola CA 2000	buc	50.000	32.500 0.000	1 625.000 0.000
6	1681	Clema ES 1500	buc	30.000	120.250 0.000	3 607.500 0.000
7	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	55.000	38.718 13.838	2 129.512 761.112
8	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	30.000	26.750 0.000	802.500 0.000
9	162	Curau CSB180	buc	140.000	1.850 0.000	259.000 0.000
10	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	55.000	22.500	1 237.500

1	2	3	4	5	6	7
					0.000	0.000
11	1628	Clema FIDOS15-10	buc	90.000	14.600	1 314.000
					0.000	0.000
		<i>Total</i>	lei			46 587.094
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 652.435
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			3 641.625
		<i>Total</i>	100.00 +			51 881.154
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			5 581.557
		<i>Total</i>	100.00 +			57 462.711
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			3 447.763
		Total capitol: Inclusiv salariu				60 910.474 7 344.154
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Corpuri de iluminat c лампой LED 50W	buc	30.000	995.000	29 850.000
					0.000	0.000
		<i>Total</i>	lei			29 850.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			358.200
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 208.200
		Total	lei			91 118.65
		TVA	20.00 %			18 223.73
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				109 342.38 7 344.15

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Foremcons"

(denumirea)



APROBAT:

Investitor

Primăria s. Coșcalia, r-ul Căușeni



Antreprenor SRL "Foremcons"
(denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
(denumirea)

Obiect **Reconstructia si Modernizarea
Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
Causeni N03/2020-CO, BP1**

Valoarea lucrarilor executate **102 444.61 lei**

Proces - verbal nr. 4

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2020

Retele electrice ВЛ-0,23 кВ линия 1 от ТП-468

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП4 2*25	1000 m	1.548	5 093.129 3 761.756	7 884.164 5 823.199
2	Pretul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	1 855.000	13.800 0.000	25 599.000 0.000
3	136	Banda F2007	m	92.000	8.000 0.000	736.000 0.000
4	137	Screpa A200	buc	92.000	2.000 0.000	184.000 0.000
5	163	Consola CA 2000	buc	32.000	32.500 0.000	1 040.000 0.000
6	1681	Clema ES 1500	buc	30.000	120.250 0.000	3 607.500 0.000
7	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	46.000	38.718 13.838	1 781.046 636.566
8	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	28.000	26.750 0.000	749.000 0.000
9	162	Curau CSB180	buc	120.000	1.850 0.000	222.000 0.000
10	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	46.000	22.500	1 035.000

1	2	3	4	5	6	7
					0.000	0.000
11	1628	Clema FIDOS15-10	buc	84.000	14.600	1 226.400
					0.000	0.000
		<i>Total</i>	lei			44 064.110
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 453.447
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			3 512.800
		<i>Total</i>	100.00 +			49 030.357
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			4 909.421
		<i>Total</i>	100.00 +			53 939.778
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			3 236.387
		Total capitol: Inclusiv salariu				57 176.165 6 459.765
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Corpuri de iluminat c лампой LED 50W	buc	28.000	995.000	27 860.000
					0.000	0.000
		<i>Total</i>	lei			27 860.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			334.320
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 194.320
		Total	lei			85 370.51
		TVA	20.00 %			17 074.10
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				102 444.61 6 459.77

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

APROBAT:

Investitor

SRL "Foremcons"

Primăria s. Coșcalia, r-ul Căușeni



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003875526

livrare

Coșcolio

Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Formular tipizat
Timpul de lucru
Republica Moldova
Nr. 118 din 28 august 2017 r

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки 02.12.2020 / 02.12.2020

8. Foaie de parcurs
Путевой лист

seria:
серия

număr:
номер

data:
дата

1. Furnizor:
Поставщик

S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML0000000000225124978, BC
MOLDINCONBANK SA, MOLDMD2X349

c.f./ nr.TVA 1005600001878 /
ф.к./ код НДС 0304951

2. Cumpărător/beneficiar:
Покупатель/получатель

PRIMARIA SATULUI COSCALIA, S.COSCALIA Poleanickin nr.89

c.f./ nr.TVA 1005600001878 /
ф.к./ код НДС 0304951

3. Delegație
Доверенность

seria
серия

număr
номер

data
дата

delegatul
делегированный

c.f./ nr.TVA 1007601005202 /
ф.к./ код НДС

5. Punct încărcare
Пункт погрузки

or. Chișinău

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces verbal de recepție a lucrărilor executate nr.7,
nr.8, nr.9, nr.10, nr.11 pe luna decembrie 2020

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

s. Coșcalia, r-nul Căușeni

7. Redirijări
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива

10.2 Unitate de măsură
Единица измерения

10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor
Количество товаров/активов, объем услуг

10.4 Preț unitar fără TVA, lei
Цена единицы без НДС, лев

10.5 Valoarea totală fără TVA, lei
Общая сумма без НДС, лев

10.6 Cota TVA, %
Ставка НДС, %

10.7 Suma totală a TVA, lei
Общая сумма НДС, лев

10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei
Стоимость товаров/активов, услуг, лев

10.9 Ală informație
Другая информация

10.10 Tip ambalaj
Тип упаковки

10.11 Număr locuri
Количество мест

10.12 Masa brută, tone
Масса брутто, тонн

1. Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal
in s. Coșcalia, r-nul Căușeni

un

1

398535,60

398535,60

20

79707,12

478242,72

79707,12

478242,72

X

X

X

X

0,00

11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

12. Permis eliberarea:
разрешил:

director Dumitru Axentii

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)

director Dumitru Axentii

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.

M.П.

4. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

5. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarului:
Принят товары/активы (услуги)
покупателя/получателя

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя



17. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					18. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
19 Forma de plată Вид оплаты					
20. Mențiuni Отметки					
21. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					

Antreprenor SRL "Foremcons"
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia si Modernizarea
 Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
 Causeni N03/2020-CO, BP1**

Valoarea lucrarilor executate **153 079.44 lei**

Proces - verbal Nr. 11

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020

Retele electrice ВЛ-0,23 кВ линия 1 от ТП-464

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 10 kV	buc	23.000	336.726	7 744.706
		<i>Total</i>	lei			7 744.706
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			241.696
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			130.000
		<i>Total</i>	100.00 +			8 116.402
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			1 176.878
		<i>Total</i>	100.00 +			9 293.280
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			557.597
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 850.877 1 074.206
		2. Lucrari de montare				
2	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП4 2*25	1000 m	2.360	5 093.157	12 019.850

1	2	3	4	5	6	7
3	Pretul firmei	Cablu CIII4 2*25	m	2 501.000	13.800	34 513.800
4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate:AVVG-1 3x4 mm2	100 m	0.560	1 046.739	586.174
5	136	Banda F2007	m	150.000	8.000	1 200.000
6	137	Screpa A200	buc	150.000	2.000	300.000
7	163	Consola CA 2000	buc	50.000	32.500	1 625.000
8	1681	Clema ES 1500	buc	50.000	120.250	6 012.500
9	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	75.000	38.718	2 903.880
10	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	37.000	26.750	989.750
11	162	Curau CSB180	buc	187.000	1.850	345.950
12	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	75.000	22.500	1 687.500
13	1628	Clema FIDOS15-10	buc	111.000	14.600	1 620.600
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,BZUM-TF-01-09	buc	1.000	213.114	213.114
15	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	2.000	261.901	523.801
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1.000	24.904	24.904
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B16A	buc	2.000	155.204	310.409
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	1.000	155.205	155.205
19	08-01-081-1	Taimer T3-15	buc	1.000	89.556	89.556
20	08-01-015-10	Descarcator, 220V,OIIC1-B 1P	set	1.000	2 479.741	2 479.741
21	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC	buc	37.000	352.492	13 042.212
22	08-02-148-	Cablu pina la 35 kV in	100 m	0.080	1 086.987	86.959

1	2	3	4	5	6	7
	1	tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
23	Pretul firmei	Cablu ABBГ-2x35 mm2	m	8.000	20.400	163.200
24	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0.080	5 462.750	437.020
25	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0.075	16 725.933	1 254.445
26	08-03-529-1	Contactator КМИ-11810	buc	1.000	380.036	380.036
27	08-01-087-3	Sveler 5П	t	0.010	18 779.500	187.795
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP65	buc	1.000	732.184	732.184
		Total	lei			83 885.585
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			4 505.074
		Cheltuieli de transport	10.00 %			5 670.844
		Total	100.00 +			94 061.503
		Cheltuieli de regie	76.00 %			15 217.139
		Total	100.00 +			109 278.642
		Beneficiu de deviz	6.00 %			6 556.719
		Total capitol: Inclusiv salariu				115 835.361 20 022.551
		3. Utilaj				
29	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1.000	795.850	795.850
30	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	1.000	375.000	375.000
31	Pretul firmei	Separator de sarcini BH32-1P-32A	buc	2.000	30.350	60.700
32	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	2.000	15.500	31.000
33	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1.000	17.500	17.500
34	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-B-1P	buc	1.000	83.350	83.350
35	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	1.000	224.250	224.250
36	Pretul	Contactator КМИ-11810	buc	1.000	270.000	270.000

1	2	3	4	5	6	7
	firmei					
		Total	lei			1 857.650
		Cheltuieli de depozitare	1.20 %			22.292
		Total capital: Inclusiv salariu				1 879.942

		Total	lei			127 566.20
		TVA	20.00 %			25 513.24
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				153 079.44

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Foremcons"

(denumirea)



APROBAT:

Investitor

Primăria s. Coșcalia, r-ul Căușeni

(denumirea)



Antreprenor SRL "Foremcons"
(denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
(denumirea)

Obiect Reconstructia si Modernizarea
Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
Causeni N03/2020-CO, BP1

Valoarea lucrarilor executate **73 613.86 lei**

Proces - verbal Nr. 7

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020

Retele electrice ВЛ-0,23 кВ (линия 1от ТП-472)

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 10 kV	buc	13.000	335.205 46.705	4 357.660 607.160
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 50 W	buc	21.000	169.723 132.041	3 564.189 2 772.869
		<i>Total</i>	lei			7 921.849
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			760.507
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			73.982
		<i>Total</i>	100.00 +			8 756.338
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			1 269.669
		<i>Total</i>	100.00 +			10 026.007
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			601.560
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 627.567 3 380.029
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate:AVVG-1 3x4 mm2	100 m	0.320	1 046.228 388.666	334.793 124.373
4	08-03-573-	Dulap (pupitru) de	buc	1.000	216.664	216.664

1	2	3	4	5	6	7
	4	comanda suspendat, inaltime,BZUM-TF-01-09			136.654	136.654
5	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	2.000	262.550 162.024	525.101 324.049
6	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1.000	24.904 19.604	24.904 19.604
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B16A	buc	1.000	155.855 89.950	155.855 89.950
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	1.000	155.855 89.950	155.855 89.950
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1.000	155.855 89.950	155.855 89.950
10	08-01-081-1	Taimer TƏ-15	buc	1.000	89.556 65.156	89.556 65.156
11	08-01-015-10	Descarcator, 220V,OIIC1- B 1P	set	1.000	2 493.441 813.006	2 493.441 813.006
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC	buc	64.000	352.549 196.621	22 563.136 12 583.718
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0.080	1 086.987 714.987	86.959 57.199
14	Pretul firmei	Cablu ABBГ-2x35 mm2	m	8.000	20.400 0.000	163.200 0.000
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0.080	5 552.250 2 000.800	444.180 160.064
16	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0.075	16 758.000 5 321.640	1 256.850 399.123
17	08-03-529-1	Contacto KMI-11810	buc	1.000	381.736 197.197	381.736 197.197
18	08-01-087-3	Sveler 5II	t	0.010	18 855.000 3 586.500	188.550 35.865

1	2	3	4	5	6	7
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP65	buc	1.000	735.734 136.654	735.734 136.654
		<i>Total</i>	lei			29 967.951
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			3 447.565
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			1 009.290
		<i>Total</i>	100.00 +			34 424.806
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			11 645.109
		<i>Total</i>	100.00 +			46 069.915
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			2 764.195
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 834.110 15 322.512
		3. Utilaj				
20	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1.000	795.850 0.000	795.850 0.000
21	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	1.000	375.000 0.000	375.000 0.000
22	Pretul firmei	Separator de sarcini BH32-1P-32A	buc	2.000	30.350 0.000	60.700 0.000
23	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1.000	15.500 0.000	15.500 0.000
24	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1.000	17.500 0.000	17.500 0.000
25	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1.000	18.750 0.000	18.750 0.000
26	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-B-1P	buc	1.000	83.350 0.000	83.350 0.000
27	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	1.000	224.250 0.000	224.250 0.000
28	Pretul firmei	Contactator КМИ-11810	buc	1.000	270.000 0.000	270.000 0.000
		<i>Total</i>	lei			1 860.900
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			22.331
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 883.231

		Total	lei	61 344.88
		TVA	20.00 %	12 268.98

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal:				73 613.86
		Inclusiv salariu				18 702.54

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

[Signature]

SRL "Foremcons"

[Signature]
(denumirea)



APROBAT:

Investitor

Primăria s. Coșcalia, r-ul Căușeni

[Signature]
(denumirea)



Antreprenor SRL "Foremcons"
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
 (denumirea)

Obiect Reconstructia si Modernizarea
Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
Causeni N03/2020-CO, BP1

Valoarea lucrarilor executate **40 468.86 lei**

Proces - verbal Nr. 8

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020

Retele electrice ВЛ-0,23 кВ линия 1 от ТП-467

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 10 kV	buc	18.000	337.149	6 068.683
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 50 W	buc	30.000	170.028	5 100.842
		<i>Total</i>	lei			11 169.525
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 080.433
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			106.960
		<i>Total</i>	100.00 +			12 356.918
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			1 791.753
		<i>Total</i>	100.00 +			14 148.671
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			848.920
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 997.591 4 801.925
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate:AVVG-1 3x4 mm2	100 m	0.450	1 046.953	471.129
4	08-03-526-	Automat mono-, bi-,	buc	1.000	173.955	173.955

1	2	3	4	5	6	7
	1	tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B32A				
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC	buc	30.000	352.571	10 577.118
		<i>Total</i>	lei			11 222.202
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 386.776
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			373.272
		<i>Total</i>	100.00 +			12 982.250
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			4 684.223
		<i>Total</i>	100.00 +			17 666.473
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			1 059.988
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 726.461 6 163.451

	Total	lei	33 724.05
	TVA	20.00 %	6 744.81
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		40 468.86

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Foremcons"

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Primăria s. Coșcalia, r-ul Căușeni

(denumirea)



Antreprenor SRL "Foremcons"
(denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
(denumirea)

Obiect **Reconstructia si Modernizarea
Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
Causeni N03/2020-CO, BP1**

Valoarea lucrarilor executate **37 337.78 lei**

Proces - verbal Nr. 9

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020

Retele electrice ВЛ-0,23 кВ линия 1 от ТП-468

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 10 kV	buc	16.000	335.205	5 363.274
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 50 W	buc	28.000	170.104	4 762.919
		<i>Total</i>	lei			10 126.193
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			999.997
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			92.376
		<i>Total</i>	100.00 +			11 218.566
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			1 626.692
		<i>Total</i>	100.00 +			12 845.258
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			770.715
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 615.973 4 444.433
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate:AVVG-1 3x4 mm2	100 m	0.420	1 046.395	439.486
4	08-03-526-	Automat mono-, bi-,	buc	1.000	172.705	172.705

1	2	3	4	5	6	7
	1	tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A				
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC	buc	28.000	352.674	9 874.877
		<i>Total</i>	lei			10 487.068
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 295.676
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			349.071
		<i>Total</i>	100.00 +			12 131.815
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			4 376.507
		<i>Total</i>	100.00 +			16 508.322
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			990.499
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 498.821 5 758.562

		Total	lei			31 114.82
		TVA	20.00 %			6 222.96
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				37 337.78

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Foremcons"

(denumirea)



APROBAT:

Investitor

Primăria s. Coșcalia, r-ul Căușeni



Antreprenor SRL "Foremcons"
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia si Modernizarea
 Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
 Causeni N03/2020-CO, BP1**

Valoarea lucrarilor executate **173 742.78 lei**

Proces - verbal nr. 10

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020

Retele electrice ВЛ-0,23 кВ линия 1 от ТП-462

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 10 kV	buc	27.000	336.501	9 085.524
		<i>Total</i>	lei			9 085.524
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			283.730
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			152.000
		<i>Total</i>	100.00 +			9 521.254
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			1 380.582
		<i>Total</i>	100.00 +			10 901.836
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			654.110
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 555.946 1 261.024
		2. Lucrari de montare				
2	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului. СИП4 2*25	1000 m	2.732	5 093.158	13 914.508

1	2	3	4	5	6	7
3	Pretul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	2 895.000	13.800	39 951.000
4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate:AVVG-1 3x4 mm2	100 m	0.430	1 047.479	450.416
5	136	Banda F2007	m	160.000	8.000	1 280.000
6	137	Screpa A200	buc	160.000	2.000	320.000
7	163	Consola CA 2000	buc	70.000	32.500	2 275.000
8	1681	Clema ES 1500	buc	50.000	120.250	6 012.500
9	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	85.000	38.718	3 291.064
10	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	43.000	26.750	1 150.250
11	162	Curau CSB180	buc	128.000	1.850	236.800
12	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	85.000	22.500	1 912.500
13	1628	Clema FIDOS15-10	buc	129.000	14.600	1 883.400
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,BZUM-TF-01-09	buc	1.000	213.114	213.114
15	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	2.000	261.901	523.801
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1.000	24.904	24.904
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B16A	buc	2.000	155.204	310.409
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	1.000	155.205	155.205
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1.000	155.205	155.205
20	08-01-081-1	Taimer TЭ-15	buc	1.000	89.556	89.556
21	08-01-015-10	Descarcator, 220V,ОПС1-B 1P	set	1.000	2 479.741	2 479.741
22	08-02-363-	Console metalice, speciale,	buc	43.000	352.638	15 163.436

1	2	3	4	5	6	7
	1	sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC				
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0.080	1 086.987	86.959
24	Pretul firmei	Cablu ABBF-2x35 mm2	m	8.000	20.400	163.200
25	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0.080	5 462.750	437.020
26	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0.075	16 725.933	1 254.445
27	08-03-529-1	Contactor КМИ-11810	buc	1.000	380.036	380.036
28	08-01-087-3	Sveler 5Π	t	0.010	18 779.500	187.795
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP65	buc	1.000	732.184	732.184
		Total	lei			95 034.448
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			5 125.389
		Cheltuieli de transport	10.00 %			6 424.700
		Total	100.00 +			106 584.537
		Cheltuieli de regie	76.00 %			17 312.425
		Total	100.00 +			123 896.962
		Beneficiu de deviz	6.00 %			7 433.818
		Total capitol: Inclusiv salariu				131 330.780 22 779.507
		3. Utilaj				
30	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1.000	795.850	795.850
31	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	1.000	375.000	375.000
32	Pretul firmei	Separator de sarcini BH32-1P-32A	buc	2.000	30.350	60.700
33	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	2.000	15.500	31.000
34	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1.000	17.500	17.500

1	2	3	4	5	6	7
35	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1.000	18.750	18.750
36	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1Р	buc	1.000	83.350	83.350
37	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	1.000	224.250	224.250
38	Pretul firmei	Contactator КМИ-11810	buc	1.000	270.000	270.000
		<i>Total</i>	lei			1 876.400
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			22.517
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 898.917

		Total	lei	144 785.65
		TVA	20.00 %	28 957.13
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu	173 742.78	

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Foremcons"

(denumirea)



APROBAT:

Investitor

Primăria s. Coșcalia, r-ul Căușeni

(denumirea)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EAA004050567



Formularul este aprobat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Товарная накладная
Унифицированная форма № 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 22.12.2020 / 22.12.2020 Дата выписки / дата поставки		8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
1. Furnizor: S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML00000000225124978, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X		9. Transportator S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Перевозчик	
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA SATULUI COSCALIA, S.COSCALIA Poleaniciin nr.89 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Proces verbal de recepție a lucrărilor executate nr.5, Прилагаемые документы noiembrie - decembrie 2020	
5. Punct încărcare or. Chișinău Пункт погрузки		6. Punct descărcare s. Coșcalia, r-ul Căușeni Пункт разгрузки	
7. Redirișări Переадресовки			

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr loturi Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal in s. Coșcalia, r-ul Căușeni	un	1	191343,95	191343,95	20	38268,79	229612,74				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			191343,95	X		38268,79	229612,74	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director Dumitru Axentii
Отпуск разрешил:

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Dumitru Axentii
Сдан товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului/
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись



18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					



Antreprenor SRL "Foremcons"
(denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
(denumirea)

Obiect Reconstructia si Modernizarea
Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
Causeni N03/2020-CO, BP1

Valoarea lucrarilor executate **51 958.10 lei**

Proces - verbal nr. 5

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020

Retele electrice BJI-0,23 kV TII-462

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pretul firmei	Corpuri de iluminat c лампой LED 50W	buc	43.000	995.000 0.000	42 785.000 0.000
		<i>Total</i>	lei			42 785.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			513.420
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 298.420
		Total	lei			43 298.42
		TVA	20.00 %			8 659.68
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				51 958.10

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Foremcons"

(denumirea)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primăria s. Coșcalia, r-ul Căușeni



Antreprenor SRL "Foremcons"
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
 (denumirea)

Obiect Reconstructia si Modernizarea
Illuminatului stradal in s.Coșcalia r-ul
Causeni N03/2020-CO, BP1

Valoarea lucrarilor executate **44 708.14 lei**

Proces - verbal nr. 6

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020

Retele electrice БЛ-0,23 кВ ТП-464

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pretul firmei	Corpuri de iluminat c лампой LED 50W	buc	37.000	995.000 0.000	36 815.000 0.000
		<i>Total</i>	lei			36 815.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			441.780
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 256.780
		Total	lei			37 256.78
		TVA	20.00 %			7 451.36
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				44 708.14

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)



SRL "Foremcons"
 (denumirea)

L.S.

APROBAT:

Investitor

Primăria s. Coșcalia, r-ul Căușeni



(denumirea)

Antreprenor SRL "Foremcons"
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
 (denumirea)

Obiect Reconstructia si Modernizarea
Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
Causeni N03/2020-CO, BP1

Valoarea lucrarilor executate **51 766.80 lei**

Proces - verbal Nr. 12

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020

Retele electrice ВЛ-0,23 кВ (линия 1от ТП-472)

№ crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: c лампой LED 50 W	buc	43.000	169.723 132.041	7 313.340 5 677.780
		<i>Total</i>	lei			7 313.340
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 277.501
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			6.606
		<i>Total</i>	100.00 +			8 597.447
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			1 246.630
		<i>Total</i>	100.00 +			9 844.077
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			590.645
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 434.722 5 677.780
		2. Lucrari de montare				
2	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП4 2*25	1000 m	0.849	5 093.188 3 761.738	4 324.070 3 193.730
3	Pretul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	850.000	13.800 0.000	11 730.000 0.000
4	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate:AVVG-1 3x4	100 m	0.319	1 046.228 388.666	333.721 123.969

1	2	3	4	5	6	7
		mm2				
5	136	Banda F2007	m	61.000	8.000	488.000
					0.000	0.000
6	137	Screpa A200	buc	61.000	2.000	122.000
					0.000	0.000
7	163	Consola CA 2000	buc	30.000	32.500	975.000
					0.000	0.000
8	1681	Clema ES 1500	buc	26.000	120.250	3 126.500
					0.000	0.000
9	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	40.000	38.718	1 548.736
					13.838	553.536
10	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	22.000	26.750	588.500
					0.000	0.000
11	162	Curau CSB180	buc	63.000	1.850	116.550
					0.000	0.000
12	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	38.000	22.500	855.000
					0.000	0.000
13	1628	Clema FIDOS15-10	buc	59.000	14.600	861.400
					0.000	0.000
		<i>Total</i>	lei			25 069.477
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			871.028
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			1 970.352
		<i>Total</i>	100.00 +			27 910.857
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			2 942.139
		<i>Total</i>	100.00 +			30 852.996
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			1 851.180
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32 704.278 3 871.235

		Total	lei	43 139.00
		TVA	20.00 %	8 627.80
				51 766.80
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		9 549.02

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Foremcons"

(denumirea)

L.Ş.

APROBAT:

Investitor

Primăria s. Coscalia, r-ul Căuşeni

(denumirea)

L.Ş.

Antreprenor SRL "Foremcons"
(denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
(denumirea)

Obiect Reconstructia si Modernizarea
Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
Causeni N03/2020-CO, BP1

Valoarea lucrarilor executate **12 521.67 lei**

Proces - verbal nr. 14

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020

Retele electrice БЛ-0,23 кВ ТП-462

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 50 W	buc	43.000	170.078 132.041	7 313.340 5 677.780
		<i>Total</i>	lei			7 313.340
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 277.501
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			6.606
		<i>Total</i>	100.00 +			8 597.447
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			1 246.630
		<i>Total</i>	100.00 +			9 844.077
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			590.645
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 434.722 5 677.780

		Total	lei	10 434.72
		TVA	20.00 %	2 086.95
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		12 521.67 5 677.78

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Foremcons"
(denumirea)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
(denumirea)

L.Ș.

Antreprenor SRL "Foremcons"
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia si Modernizarea
 Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
 Causeni N03/2020-CO, BP1**

Valoarea lucrarilor executate **57 898.48 lei**

Proces - verbal nr. 13
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020
Retele electrice БЛ-0,23 кВ ТП-463

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 10 kV	buc	32.000	336.298 46.705	10 761.547 1 494.547
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 50 W	buc	40.000	169.723 132.041	6 790.456 5 281.656
		<i>Total</i>	lei			17 552.003
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 524.646
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			184.380
		<i>Total</i>	100.00 +			19 261.029
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			2 792.849
		<i>Total</i>	100.00 +			22 053.878
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			1 323.233
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 377.111 6 776.203
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate:AVVG-1 3x4 mm2	100 m	0.600	1 046.228 388.666	628.164 233.177
4	08-03-526-	Automat mono-, bi-,	buc	1.000	172.705	172.705

1	2	3	4	5	6	7
	1	tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B25A			89.950	89.950
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC	buc	40.000	352.571 196.621	14 102.824 7 864.824
		<i>Total</i>	lei			14 903.693
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 842.289
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			494.962
		<i>Total</i>	100.00 +			17 240.944
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			6 222.843
		<i>Total</i>	100.00 +			23 463.787
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			1 407.827
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 871.614 8 187.951

		Total	lei	48 248.74
		TVA	20.00 %	9 649.74
		57 898.48		
		TOTAL proces-verbal:		
		Inclusiv salariu		
		14 964.16		

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor SRL "Foremcons"
(denumirea)

Investitor Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
(denumirea)

Obiect **Reconstructia si Modernizarea
Iluminatului stradal in s.Coscalia r-ul
Causeni N03/2020-CO, BP1**

Valoarea lucrarilor executate **10 759.55 lei**

Proces - verbal nr. 15

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020

Retele electrice BJI-0,23 кВ ТП-464

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 50 W	buc	37.000	169.826 132.041	6 283.572 4 885.532
		Total	lei			6 283.572
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			1 099.245
		Cheltuieli de transport	10.00 %			4.754
		Total	100.00 +			7 387.571
		Cheltuieli de regie	14.50 %			1 071.198
		Total	100.00 +			8 458.769
		Beneficiu de deviz	6.00 %			507.526
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 966.295 4 885.532

	Total	lei	8 966.29
	TVA	20.00 %	1 793.26
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 759.55 4 885.53

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Foremcons"
(denumirea)

L.Ş.

APROBAT:

Investitor

Primaria s. Coșcalia, r-ul Căușeni
(denumirea)

L.Ş.

DECLARAȚIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea antreprenorului	Pretul contractului/ Valoarea lucrărilor executate, lei	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor	Numarul si data contractului
1	Lucrări de renovare a pereților de suport si a trotuarelor tehnice, bd. Dacia (tronson str. H. Botev - bd. Traian)	Pretura sectorului Botanica	Contractant unic	6 629 963,54/ 5 030 551,64	7 luni	In derulare	Nr. 10 – 13/66 din 27.04.2023
2	Amenajarea cu utilaje a terenurilor de joacă pentru copii la IP Grădinița "Sălcioara", com. Stăuceni	Primăria comunei Stăuceni	Contractant unic	4 124 979,50/ 3 723 455,58	5 luni	Nr. 1 din 20.12. 2023	Nr. 98 din 20.06.2023
3	Construcția unui scuar public cu teren de joacă pentu copii din str. Unirii 20 com. Stăuceni, mun. Chișinău	Primăria comunei Stăuceni	Contractant unic	2 578 074,92/ 2 528 402,34	4 luni	Nr. 1 din 12.12. 2023	Nr. 113 din 14.07.2023
4	Constructia rețelei de aductiune, statie de pompare, rezervoarelor de apa, in s.Ghidighici (Etapa I) (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primaria s.Ghidighici	Contractant unic	14 556 843,27/ 14 646 752,75	12 luni	Nr. ____ din 19.04.2024	Nr.40 din 15.06.2021 Nr.51 din 14.04.2023
5	Lucrările de extindere a rețelilor de apeduct și renovare a sondelor arteziene existente cu nr.castral 8519316.066 și nr.cadastral 8519316.067 (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primaria satului Ermoclia	Contractant unic	5 155 765,15/ 5 155 765,15	12 luni	Nr. 1 din 15.12.2023	Nr. 1 din 05.01.2023

6	Construcția sondei arteziene și a rețelelor de alimentare cu apă din s.Lopățica, r-l Cahul (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primăria s. Lopățica	Contractant unic	8 292 094,76/ 8 292 094,76	10 luni	Nr.1 din 13.12.2023	Nr. 22/22 din 07.12.22
7	Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Egorovca, inclusiv forarea sondei arteziene la obiectul achizitiei "Alimentarea cu apă a s. Egorovca, com.Egorovca, r-nul Fălesti" (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primăria comunei Egorovca	Contractant unic	10 213 159,19/ 10 213 159,19	6 luni	Nr.1 din 08.12.2023	Nr. 33 din 23.11.2022
8	Construcția stației de epurare în comuna Chircăieștii Noi, raionul Căușeni (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primăria comunei Chircăieștii Noi	Contractant unic	8 037 438,07/ 8 037 438,07	12 luni	Nr. 1 din 29.11.2023	Nr. 36 din 22.11.2022
9	Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă în com.Vădeni, r-nul Soroca. Etapa 2, obiectul nr.13/20, localizat în s.Dumbrăveni, com.Vădeni, r-nul Soroca (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primăria comunei Vădeni, r-nul Soroca	Contractant unic	3 022 507,98/ 2 950 279,07	9 luni	Nr. 2 din 23.11.2023	Nr. 36 din 25.10.2022
10	Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s. Prajila, r-l Florești (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primăria s. Prajila, r-l Florești	Contractant unic	12 779 542,00/ 12 710 078,02	15 luni	Nr.____ din 22.09.2023	Nr. 39 din 26.07.2021
11	Construcția rețelei de apeduct din s.Miciurin (inclusiv sat.Birarovca) r-l Drochia (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primaria sat.Miciurin r-l Drochia	Contractant unic	11 004 952,23/ 11 004 952,23	11 luni	Nr.____ din 20.09.2023	Nr. 26 din 21.09.22

12	Lucrările de construcție a serviciilor de alimentare cu apă în s. Dămășcani, r-nul Rîșcani (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primaria or. Costesti	Contractant unic	7 886 890,52/ 7 886 890,52	7 luni	Nr. _ din 19.09.2023	Nr. 110 din 07.11.2022
13	Sistemul de aprovizionare cu apă a sectorului de apă de lângă moară în s. Hîjdieni, raionul Glodeni (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primăria Hîjdieni, raionul Glodeni	Contractant unic	8 117 859,08/ 8 117 859,08	5 luni	Nr. ____ din 15.09.2023	Nr. ocds- b3wdpl+MD- 1660919527080 din 14.09.22
14	Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor satului Șeptelici raionul Soroca (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primaria s.Șeptelici, r. Soroca	Contractant unic	10 975 557,67/ 10 975 557,67	6 luni	Nr. _ din 14.09.2023	Nr. 21 din 02.11.2022
15	Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Sudarca, r-nul Dondușeni, Suplimentar - bransarea consumatorilor (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primaria com. Sudarca, r-nul Donduseni	Contractant unic	3 137 573,47/ 3 137 573,47	12 luni	Nr. ____ din 23.08.2023	Nr. 8 din 02.02.2023
16	Forare a fîntînei arteziene și construcție a rețelei de apeduct în s. ȘESTACI (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primăria s. Șestaci	Contractant unic	8 243 312,37/ 8 250 508,18	10 luni	Finalizat	Nr. 24/22 din 18.10.22
17	Extinderea rețelelor de canalizare din orasul Telenesti si satul Mihalașa (Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)	Primăria or. Telenești	Contractant unic	9 853 671,64/ 9 853 671,64	9 luni	Finalizat	Nr. 68 din 22.09.2022

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Excavator CAT 428 A.2022, FOR 004	buc	1	
2.	Excavator CAT 428 A.2022, FOR 003	buc	1	
3.	Excavator Komatsu WB 97 A.2007, TAE687	buc	1	
4.	Excavator Komatsu WB 93 A.2007, TBI991	buc	1	
5.	Excavator pe șenile Komatsu PC88, A.2007, TAP856	buc	1	
6.	Excavator pe șenile Komatsu PC88, A.2007, TAT016	buc	1	
7.	Excavator Komatsu WB 97 R A. 2003, TAO814	buc	1	
8.	Excavator Komatsu WB 93 R A. 2002, echipare malaxor, TAT023	buc	1	
9.	Excavator Hidromek HMK102B, A.2023, FOR 002	buc	1	
10.	Excavator Caterpillar, A 2022, FOR 001	buc	1	
11.	Incarcator Bobcat S 205- TAX 039	buc	1	
12.	Autocamion Mercedes 814D – FRG 908	buc	1	
13.	Basculanta Kamaz 5511-TAE 642	buc	1	
14.	Basculanta ZIL MMZ 554 – AGZ481	buc	1	
15.	Mercedes Sprinter	buc	7	
16.	Mercedes Sprinter A-2005, basculant	buc	1	
17.	Ford Transit, 2009	buc	1	
18.	Ford Transit, 2013, basculant	buc	1	
19.	Ford Transit, 2014	buc	1	
20.	Volkswagen Caddy A-2014	buc	2	
21.	Volkswagen Caddy A-2012	buc	1	
22.	Volkswagen A-2009	buc	1	
23.	Dacia Logan A-2020 1,5d	buc	1	

24.	Dacia Logan A-2009. 1,4b	buc	1	
25.	Skoda Fabia A-2008, 1,4 d	buc	1	
26.	Skoda Fabia A-2012, 1,4	buc	1	
27.	Skoda Fabia A-2016 1,4d	buc	1	
28.	Skoda Fabia A-2018 1,4d	buc	1	
29.	Aparat sudura cap-cap George Fisher 250Eco Butt Welding Machine	buc	1	
30.	Aparat de sudura electrofuziune cu inregistrator Georg Fischer MSA 125 230V Scanner	buc	2	
31.	Aparat de sudare invertor Paton ВДН-200Е	buc	1	
32.	Aparat sudura electrofuziune FitingFox	buc	2	
33.	Roata compactoare SVR40, Dimen.1200mm x 1000mm x 550mm	buc	1	
34.	Compactor Bomag BT65	buc	1	
35.	Compactor pe benzina Tolsen	buc	1	
36.	Compactor Waker Neuson	buc	1	
37.	Compactor Mikasa MTX-60	buc	1	
38.	Compactor TSS RM75L	buc	1	
39.	Compacor Total	buc	1	
40.	Generator Hitachi E62SC 5,5 kw cu starter electric	buc	4	
41.	Generator Honda HK7500 cu starter electric puterea max 7.5Kva (6.5kW),	buc	1	
42.	Generator Fubag 7kWt/230V/445cm3/AVR.Fubag BS7500AES	buc	1	
43.	Generator electric pe benzina Tolsen 8000W	buc	5	
44.	Generator pe benzina 8kW Konner Sohnen	buc	1	
45.	Generator electric pe benzina WOKIN 8000W	buc	1	
46.	Masina sub presiune inalta (Karcher)+furtun	buc	1	
47.	Masina de taiat asphalt Belle DSXA01 (motor Honda GX390)	buc	1	
48.	Masina de taiat asphalt Bisonte MTA500S motor schimbat nou	buc	1	
49.	Masina de taiat asphalt Tolsen + motor Honda GX390	buc	1	
50.	Betoniera 0.33m3	buc	1	
51.	Betoniera 185-195 L	buc	3	
52.	Betoniera MPN 160l	buc	1	
53.	Betoniera Tolsen 850W 200L Industrial	buc	1	
54.	Motopompa Senci SCWT-80 60mc/h	buc	3	
55.	Motopompa pe benzina Fubag 4T	buc	1	

56.	Motopompa Rural 4T	buc	1	
57.	Pompa submersibila pentru apa murdara SomaFix 750 W, 32m	buc	1	
58.	Pompa Gnom 40-25 5.5kW 380V Q-40m3/h H-25m	buc	2	
59.	Pompa submersibila Днестр MPN pu ape uzate, cu tocatator 1500W	buc	2	
60.	Pompa submersibila Graphite 900W pentru ape reziduale + furtun de incendiu	buc	1	
61.	Pompa submersibila Nero QCD 3.5", 750W, 61m, 40l/min	buc	1	
62.	Pompa de drenaj PDP 850m APC	buc	1	
63.	Pompa de testare Eryl 60 atm	buc	1	
64.	Pompa de fecale Maxima WQD 1.5, fonta cu picioare	buc	1	
65.	Compresor de aer Remeza CB4/C-100 LB 30A	buc	1	
66.	Compresor 10 bar	buc	1	
67.	Compresor Fubag 2.2kW/100l/P=400rpm	buc	1	
68.	Aparat de sudura semiautomat MIG-200G 230 V	buc	1	
69.	Nivela optica + stativ + mira Bosch GOL32G	buc	1	
70.	Polizor unghiular diam.230 Bosch GWS26-230JH	buc	1	
71.	Polizor unghiular Hikoki 125mm/1700W/11000rpm	buc	1	
72.	Polizor unghiular 125mm cu acumulator Hikoki G18DBBVL	buc	2	
73.	Polizor unghiular 125 cu acumulator Tolsen MP20V	buc	2	
74.	Polizor unghiular 125mm Hikoki G13SWA 1100W	buc	2	
75.	Polizor unghiular 230mm Hikoki G23W2 2200W	buc	2	
76.	Polizor unghiular Hikoki G23SC4UDZ	buc	1	
77.	Polizor unghiular 230mm Hikoki G23ST 230mm G23STNSZ	buc	1	
78.	Polizor unghiular d230 Hikoki	buc	3	
79.	Vibrator Beton	buc	1	
80.	Ciocan rotopercutor Hikoki DH24PH2 SDS+ 730W	buc	2	
81.	Ciocan rotopercutor Hikoki SDS-Max 1100W DH40MCW	buc	1	
82.	Ciocan rotopercutor Hikoki DH28PCW SDS+ 800W	buc	2	
83.	Ciocan rotopercutor SDS-Max Hikoki SDS-MaxII/1500/15.5J/2950rpm	buc	1	
84.	Ciocan rotopercutor Hikoki SDS-MaxII/1100W/10.5J/2800rpm	buc	1	
85.	Mixer electric mortare Total 1400W M14	buc	1	

86.	Ciocan demolator Hikoki HEX30/1340W/45J1400rpm	buc	1	
87.	Placa vibratoare 520*445 6.5HP	buc	1	
88.	Masina de insurubat cu acumulator Hikoki DS18DD 18Vx5Ah	buc	1	
89.	Masina de insurubat + 2 acumulatoare 5A Hikoki WH18DB 18V 5Ah	buc	1	
90.	Masina de insurubat Hikoki Li-ion/18V/2x3Ah/1700rpm/55Nm	buc	2	
91.	Masina de insurubat Hikoki Li-Tion/18V/53Nm/2*2.5Ah/1250rpm	buc	1	
92.	Motocoasa set cu cutit GSB 230-2 si cap de cosit AutoCut 26-2 Styhl FS-250	buc	1	
93.	Ferestrau electric Einhell TE-AP 1050W 230V	buc	1	
94.	Ferestrau sabie cu acumulator Hikoki CR14DSL4 14V	buc	1	
95.	Motoferestrau Tolsen Industrial 52cc 50cm 2200W 2.9CP	buc	1	
96.	Karcher Aparat cu cusiune inalta Karcher K5	buc	1	
97.	Roata masurare Total	buc	2	
98.	Roata de masurare Bosch GWM32	buc	1	
99.	Pistol pulverizare Total 450W rezervor plastic	buc	1	
100.	Masina de gaurit Hikoki	buc	2	
101.	Arzător cu flacăra Makita HR2470	buc	2	
102.	Suflanta frunze pe benzina Tolsen 63,3CC 2700W Industrial	buc	1	
103.	Prelungitor electric (20 m.) Interelectrocomplect	buc	3	
104.	Prelungitor electric (100 m.) Interelectrocomplect	buc	1	
105.	Prelungitor electric (70 m.) Interelectrocomplect	buc	2	
106.	Prelungitor electric (50 m.) Interelectrocomplect	buc	3	
107.	Strung pentru tăiat teracotă Super Pro 450	buc	1	
108.	Roabe Manual	buc	6	
109.	Popi plastic	buc	4	
110.	Scară podeț	Buc	2	
111.	Scară verticală, 5 m.	Buc	2	
112.	Scară, 10 m	buc	1	
113.	Scara cu balamele Profi 4*4 trepte (5m)	buc	1	

114	Scara multifunctionala din aluminiu cu 3 sectiuni 3/14 Alumet	buc	1	
115	Coş pentru beton Incomaş	buc	2	
116	Butoi plastic	buc	3	
117	Balon gaz (propan)Lukoil	buc	3	
118	Balon gaz (O2)	buc	2	
119	Furtun pentru apă	buc	3	
120	Ciocan metal	Buc	5	
121	Ciocan cauciuc	buc	2	
122	Macara de fereastră	buc	2	
123	Schele (tip Italia)	M2	600	
124	Sisteme metalice sprijiniri maluri de pina la 5m adincime	m.l.	22	
125	MASINA DE CAROTAT DD200 G02 BS 230V, Stativ BT 160	buc	1	

Cu stimă,

Semnat:_____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	<u>Diriginti de șantier:</u> 1. <u>Smetanca Radu</u>	1. Superioare	1. 7 <u>ani</u>	1. a) Reabilitarea zonei pietonale și iluminarea nocturna a edificiilor din perimetrul strazilor Alexei Sciusev-Maria Cibotari- Mihail Kogilniceanu Sfatul Tari b) Reconstructia acoperis in cladirea administrativa IP Edinet c) Amenajarea teritoriului adiacent bd. Dacia (trotuar public) pe terenurile cu nr. cad. 0100103009, 01001030407, 01001030410 (tronson str. M. Milo - bd. Traian) d) Lucrari de constructie a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta din s.Stoicani, r-nul Soroca e) Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare) f) Amenajarea teritoriului partea pară a bd. Dacia (trotuar pietonal, parcare publică) pe terenurile cu nr. cadastrale 01001100578, 01001030434, 01001120246, 0100112023, 0100112024, 01001110305, 01001120247 (tronson bd. Traian - bd. Cuza Vodă)	1. <u>Nr. 1526 din 10.12.2021</u>

2	1. <u>Tirbu Vladislav</u>	3. Superioare	3. 6 ani	a) Constructia retelei de alimentare cu apa a s.Climautii de Jos, r-nul Soldanesti (Lucrări de electricitate) b) Constructia retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s.Prajila, r-nul Floresti (Lucrări de electricitate) c) Retele de alimentare cu apa din s.Horodiste, r-nul Donduseni (Lucrări de electricitate) d) Lucrari de constructie a retelelor de alimentare cu apa si canalizare s.Zabriceni, r-nul Edinet (Lucrări de electricitate) e) Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s.Sudarca r-nul Donduseni (Lucrări de electricitate) f) Retele de alimentare cu apa din s.Donduseni (Lucrări de electricitate) g) Reparatie capitala a sistemului de energie electrica a gradinitei de copii din s.Besghioz, mun.Ceadir-Lunga,UTA Gagauzia h) Lucrari de schimbare a cablajului electric la SM al MAI i) Construcția unui scuar public cu teren de joacă pentu copii din str. Unirii 20 com. Stăuceni, mun. Chișinău (Lucrări de electricitate)	2. Nr. 0557 din 24.11.2021
	Maiștri: 1. Voicu Igor 2. Negura Veaceslav 3. Oprea Ion	Superioare	5-25 ani		

Specialiști: Instalator apă Izolator hidrofug Montator conducte Sudor- polietilena/otel Excavatorist Electrician Betonist Tencuitor Zidar Fierar Zugrav Tâmplar Lăcătuș Dulgher Faianțar Parchetar Tinichigiu Finisor	Medii de specialitate	3-33 ani		
--	--------------------------	----------	--	--

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea întreprinderii: SRL „Foremcons”

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

NU ESTE CAZUL

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI
NU ESTE CAZUL**

.....
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

NU ESTE CAZUL

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

NU ESTE CAZUL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării

Cu stimă,

Semnat: _____

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”
