

Antreprenor SRL „Certicus,,
(denumirea)

Investitor Gimnaziul s. Trifesti, rnul Rezina
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie interioare si
exterioare - Gimnaziul s. Trifesti,
rnul Rezina** *școale primare-
grădinițe Trifesti.*

ef. 11.12.2021

Valoarea lucrarilor executate

239 339,72 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 12 an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia interioara				
		1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	108,800	565,03 208,12	61 474,87 22 643,45
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	16,320	94,60	1 543,87
	74220100601 00	Timplar	h-om	223,040	94,60	21 099,58
	28741363133 00	Diblu din metal	buc	435,200	1,00	435,20
	27321036461 51	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	114,240	335,93	38 376,64
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,632	12,00	19,58
2	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, LED 600*600 4000K /Armstrong/	buc	9,000	427,06 21,76	3 843,52 195,82
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	2,070	94,60	195,82
	28752744005 01	Corp de iluminat LED 600*600 4000K	buc	9,450	386,00	3 647,70
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				65 318,39 22 839,27
		1.2. Timplarie PVC				
3	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	13,830	2 354,45 104,07	32 562,01 1 439,24

2	3	4	5	6	7
71292000112 00	Finisor MP	h-om	14,522	94,60	1 373,78
93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,692	94,60	65,46
20301129511 50	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	13,830	2 213,13	30 607,59
28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	41,490	0,35	14,52
24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	2,904	105,00	304,92
24302261016 00	Chit siliconic	kg	1,010	133,00	134,33
26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,915	6,00	41,49
40111062027 41	Energie electrica	kw	5,532	3,00	16,60
29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,277	12,00	3,32
	Total capitul:				
	Total Incluziv salariu				32 562,01 1 439,24
	1.3. Pardoseli				
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,300	44,69 43,52 1 845,54 1 797,22
	71320400127 00	Parchetar	h-om	9,499	94,60 898,61
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	9,499	94,60 898,61
	23201662007 29	Parchetin	l	1,239	17,00 21,06
	41001262028 18	Apa	m3	1,239	10,00 12,39
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	1,239	12,00 14,87
5	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi OSB	m2	10,000	22,39 20,81 223,92 208,12
	71320400127 00	Parchetar	h-om	1,100	94,60 104,06
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	94,60 104,06
	23201662007 29	Parchetin	l	0,400	17,00 6,80
	41001262028 18	Apa	m3	0,300	10,00 3,00
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,500	12,00 6,00
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,000	21,47 20,81 214,72 208,12
	71320400127 00	Parchetar	h-om	1,100	94,60 104,06
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	94,60 104,06
	41001262028 18	Apa	m3	0,300	10,00 3,00
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,300	12,00 3,60
7	RpCK02A1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente,	m2	10,000	302,53 136,22 3 025,34 1 362,24


2	3	4	5	6	7
	80x200x1000mm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	3,000	94,60	283,80
71290200128 00	Pavator	h-om	4,500	94,60	425,70
26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,500	2,75	70,12
14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,075	335,00	25,12
26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x1000 B 2	m	25,125	86,00	2 160,75
41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,075	10,00	0,75
	Total capitul:				
	Total				21 549,57
	Incluziv salariu				5 419,07

	Total proces-verbal:		144 278,13
	Cheltuieli directe	lei	9 659,24
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	10 394,65
	Transportarea materialelor	10,00 %	164 332,02
	Cheltuieli directe	100,00 +	23 828,14
	Cheltuieli de regie	14,50 %	188 160,16
	Total	100,00 +	11 289,61
	Beneficiu	6,00 %	199 449,77
	Total	100,00 +	39 889,95
	TVA	20,00 %	239 339,72
	TOTAL:		40 246,82

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)
L.S.

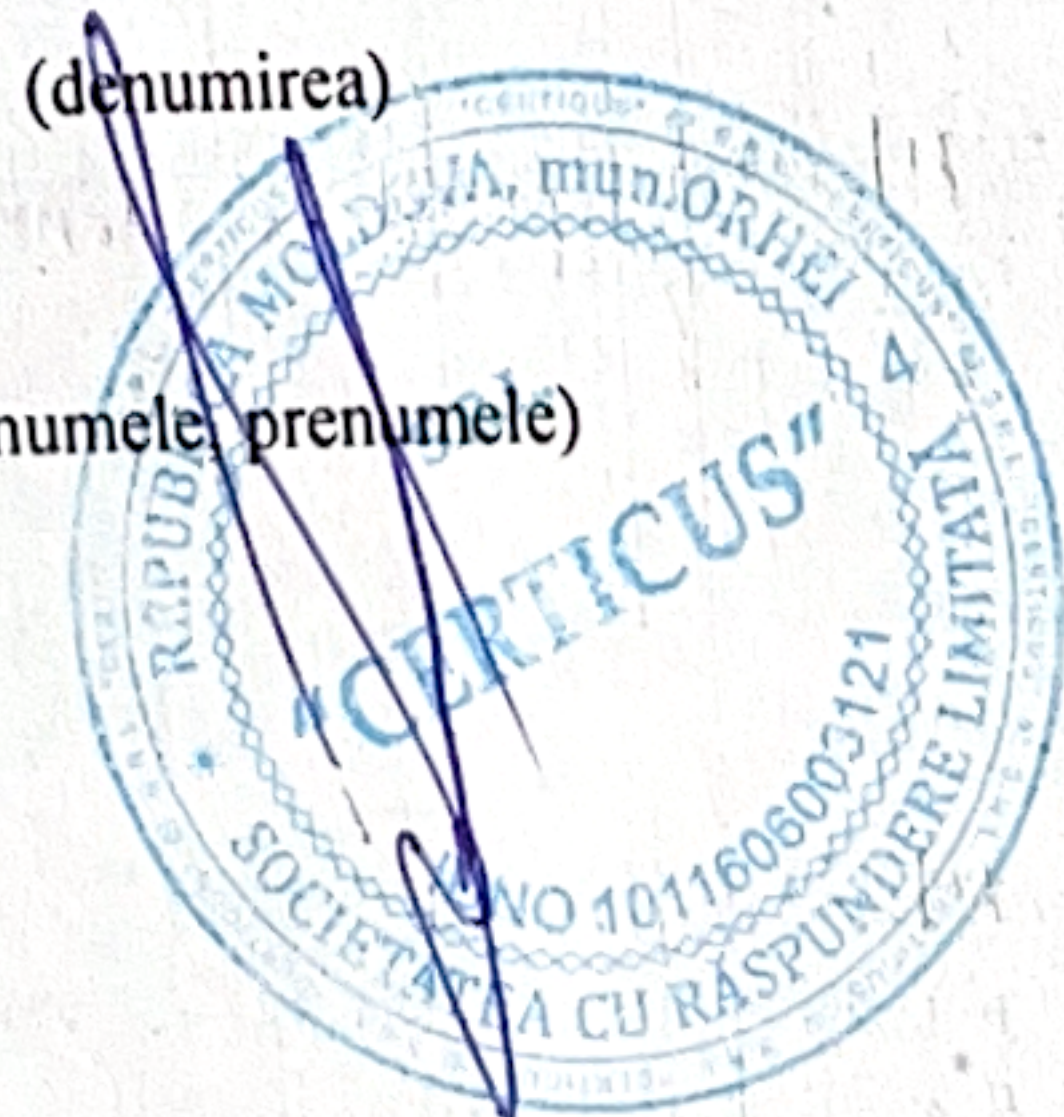

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)
L.S.

