

**Constructia centralei termice pe
gaze naturale a Scolii
Profesionale nr.1 din municipiul
Cahul.**
Lucrari generale de constructie.
(denumirea obiectivului)

Valoarea lucrarilor executate
391 686, 859 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2008

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,230	788,413 0,000	181,335 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	1,680	108,301 108,301	181,945 181,945
3	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,084	317,619 0,000	26,680 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ	100 m3	0,084	723,560 463,738	60,779 38,954

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			338,559	271,524
121	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металоконструкции опоры для дымовой трубы)	kg	1 028,300	27,955 11,040	28 745,892 11 352,124
122	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,028	847,686 338,534	871,421 348,013
		Total Дымовая труба				47 336,579
		Inclisiv salariu				15 977,548
		Total Дымовая труба				59 671,889
		Inclisiv salariu				18 948,752

	Прямые затраты	lei	273 625,811
	CASM	27,50 %	24 151,042
	Cheltuieli de achizitionare depozitare	1,00 %	1 747,597
	Transportarea materialelor	3,00 %	5 242,792
	Cheltuieli de regie	5,00 %	15 238,363
	Beneficiul	2,00 %	6 400,112
	TVA	20,00 %	65 281,142
	Total deviz:		391 686,859
	Inclisiv salariu		87 821,971

Beneficiar: Școala Profesională nr.1 din mun.Cahul

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Antreprenor: SRL "Tehnogazmontaj"

Responsabil tehnic



**Constructia centralei termice pe
gaze naturale a Scolii
Profesionale nr.1 din mun.Cahul
Rețele termice exterioare**

(denumirea obiectivului)

Valoarea lucrarilor executate
63 706,34 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2008

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Capitolul I. Lucrări de construcție Capitolul 1.1 Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,07	671,43 0,00	47,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,25	109,36 109,36	27,34 27,34

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare (Защита термоизоляции трубопроводов и аппаратов листами черной стали или оцинкованными, толщиной 0,3 мм, на самонарезающихся винтах с шлицеванной полукруглой головкой, имеющая окружность сверху термоизоляции до 0,35 м, монтаж)				
		Total Capitolul 1.4. Conducte Inklusiv salariu				22 751,06
		5. Capitolul 2. Utilaj				6 245,84
31		Robinet D125 Pn25, 065N0745	buc	2,00	4 133,33 0,00	8 266,66 0,00
		Total Capitolul 2. Utilaj Inklusiv salariu				8 266,66

	Прямые затраты	lei	45 914,91
	Соц. и мед. страхование	27,50 %	2 180,53
	Транспорт	3,00 %	1 105,31
	Итого	100,00 +	49 200,75
	Заготовительно-складские расходы	1,00 %	368,44
	Итого	100,00 +	49 569,19
	Накладные расходы	5,00 %	2 478,47
	Итого	100,00 +	52 047,66
	Сметная прибыль	2,00 %	1 040,96
	Итого	100,00 +	53 088,62
	НДС	20,00 %	10 617,72
	Total deviz:		63 706,34
	Inklusiv salariu		7 929,19

Beneficiar: Școala Profesională nr. 1 din mun. Cahul

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Antreprenor: SRL "Tehnogazmontaj"

Responsabil tehnic

**Constructia centralei termice pe
gaze naturale a scolii
Profesionale nr.1 din municipiul
Cahul**

**Узел учета расхода газа.
Echipament de tehnologie (marca
TH)**

(denumirea obiectivului)

Valoarea lucrarilor executate
74 926,94 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2008

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducte si materiale				
1	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	3,00	659,59 31,54	1 978,76 94,63
2	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm	buc	2,00	727,91 31,54	1 455,82 63,08
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de D15 mm 3cai sub manometru	buc	1,00	98,54 7,89	98,54 7,89
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de D15 mm ventil (Вентиль запорный проходной	buc	2,00	97,81 7,88	195,63 15,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				32 765,94 8 316,06
		2. Lucrari de montare				
39	IA23A	Filtru de combustibil lichid D50	buc	1,00	481,16 162,97	481,16 162,97
40	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 50 mm	buc	1,00	329,63 273,36	329,63 273,36
		<i>Прямые затраты</i>	lei			810,79
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	27,50 %			119,99
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,00 %			3,74
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			11,23
		<i>Total</i>	100,00 +			945,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			218,16
		<i>Total</i>	100,00 +			1 163,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			23,27
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 187,18 436,33
		3. Utilaj				
41		Filtru D50 FS-50	buc	1,00	957,50 0,00	957,50 0,00
42		Contor de gaze D50 G65, RABO (RVG) (panee DKZ)	buc	1,00	27 528,50 0,00	27 528,50 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				28 486,00

		<i>Прямые затраты</i>	lei	62 439,12
		TVA	20,00 %	12 487,82
				74 926,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 752,39

Beneficiar: Școala Profesională nr. 1 din mun.Cahul

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Antreprenor: SRL "Tehnogazmontaj"

Responsabil tehnic _____

R

**Constructia centralei termice pe
gaze naturale a scolii
Profesionale nr.1 din municipiul
Cahul**

WinCmeta

**Alimentari cu gaze. Conducte
exterioare. Presiune medie (marca
AGE)**

(denumirea obiectivului)

Valoarea lucrarilor executate
108 065,18 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,21	2 847,62 0,00	598,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,65	108,37 108,37	70,44 70,44
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,14	216,93 0,00	30,37 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,14	1 406,36 461,86	196,89 64,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Прямые затраты</i>	lei			975,21
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	27,50 %			236,08
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,00 %			1,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			3,47
		<i>Total</i>	100,00 +			1 215,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			429,24
		<i>Total</i>	100,00 +			1 645,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			32,89
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 678,05 858,47
		3. Utilaj				
98		SRP punct de control gazului: regulator de presiune RDNK-50	buc	2,00	22 166,67 0,00	44 333,34 0,00
99		Manometru 0.15P=0-2500 mm.v.s.	buc	1,00	80,30 0,00	80,30 0,00
100		Manometru 0.15P=0-0,3MPa	buc	1,00	80,30 0,00	80,30 0,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			44 493,94
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			533,93
		Total Utilaj Inclusiv salariu				45 027,87

		Прямые затраты	lei	90 054,32
		TVA	20,00 %	18 010,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		108 065,18 12 316,12

Beneficiar: Școala Profesională nr.1 din mun.Cahul

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Antreprenor: SRL "Tehnogazmontaj"

Responsabil tehnic

**Construcția centralei termice pe
gaze naturale a școlii
Profesionale nr.1 din municipiul
Cahul
Nod de evidență. Automatizare
(marca ATH)**

(denumirea obiectivului)

Valoarea lucrărilor executate
70 902,02 lei

Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate
pe noiembrie an 2008

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Dispozitive și mijloace automatizare				
1	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe îmbinări de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (manometru)	buc	2,00	54,15 54,15	108,29 108,29
2	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 12 (Corector microELCOR-2)	buc	1,00	132,21 118,28	132,21 118,28
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe îmbinări de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (convertizori)	buc	2,00	54,15 54,15	108,29 108,29
4	10-06-068-16	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (PIO)	buc	1,00	1 051,40 1 051,40	1 051,40 1 051,40
5	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe construcții metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina	buc	1,00	27,34 27,34	27,34 27,34

1	2	3	4	5	6	7
36		Розетка с заземляющим контактом, 220В, 10А.	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
		Total Echipament automatizare Inclusiv salariu				816,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				54 151,50


		Прямые затраты	lei	59 085,02
		TVA	20,00 %	11 817,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		70 902,02 2 520,73

Beneficiar: Școala Profesională nr. 1 din mun. Cahul

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Antreprenor: SRL "Tehnogazmontaj"

Responsabil tehnic

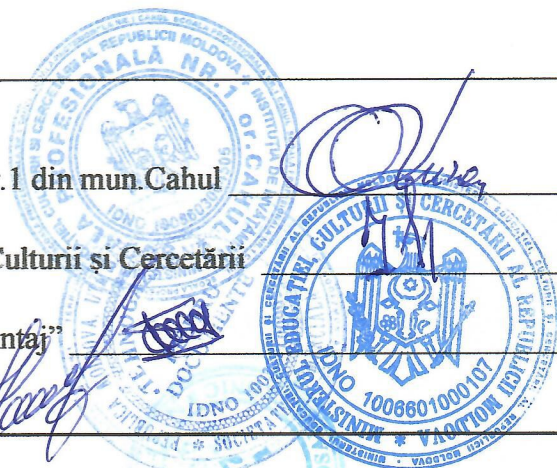

**Constructia centralei termice pe
gaze naturale a Scolii
Profesionale nr.1 din mun.Cahul
Rețele termice. Lucrari generale de
constructie**

(denumirea obiectivului)

Valoarea lucrarilor executate
27 041,11 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2008

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,32	518,81 0,00	166,02 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,80	108,42 108,42	86,74 86,74
3	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat	100 m3	0,19	241,05	45,80

1	2	3	4	5	6	7
		кольцевого алмазного сверла: 20 мм)				
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	63,83	25,86 11,04	1 650,67 704,44
20		Гайка M12	buc	16,00	12,00 0,00	192,00 0,00
21	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	2,20	199,82 120,91	439,60 266,01
		Total Capitolul 4. Перемышка Т-1				2 717,07
		Inclisiv salariu				1 263,80

	Прямые затраты	lei	18 890,72
	Соц. и мед.страхование	27,50 %	1 684,65
	Транспорт	3,00 %	337,38
	Заготовительно-складские расходы	1,00 %	127,65
	Итого	100,00 +	21 040,40
	Накладные расходы	5,00 %	1 052,02
	Итого	100,00 +	22 092,42
	Сметная прибыль	2,00 %	441,84
	Итого	100,00 +	22 534,26
	НДС	20,00 %	4 506,85
	Total deviz:		27 041,11
	Inclisiv salariu		6 126,01

Beneficiar: Școala Profesională nr.1 din mun.Cahul

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Antreprenor: SRL "Tehnogazmontaj"

Responsabil tehnic



[Handwritten signature]

**Construcția centralei termice pe
gaze naturale a școlii
Profesionale nr.1 din municipiul
Cahul**

**Automatizarea instalațiilor
termomecanice. Alimentarea cu gaze.
Instalații interioare (marca
AIT/AAGI.SU)**
(denumirea obiectivului)

Valoarea lucrarilor executate
73 629,31 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe 22.11 an 2008

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
		1.1. Приборы и средства автоматизации				
1	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (регулятор программируемый ECL Comfort 310 с ключом A375,3a)	шт.	1,00	27,34 27,34	27,34 27,34
2	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (датчик температуры ESMT)	шт.	1,00	84,94 82,01	84,94 82,01
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (погружной датчик температуры ESMU)	шт.	2,00	57,08 54,15	114,16 108,29
4	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (погружной датчик температуры ESMU)	шт.	1,00	57,08 54,15	57,08 54,15
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (термометр A4602)	шт.	7,00	57,19 54,15	400,30 379,03

1	2	3	4	5	6	7
54		Погружной датчик температуры ESMU l=250mm	шт.	1,00	1 234,17 0,00	1 234,17 0,00
55		Термометр A4602	шт.	7,00	140,83 0,00	985,81 0,00
56		Датчик реле температуры ДР-ТП-90	шт.	4,00	560,30 0,00	2 241,20 0,00
57		Манометр диапазон измерения 0...0.25 МПа МП4-У	шт.	4,00	80,83 0,00	323,32 0,00
58		Манометр диапазон измерения 0,,,0,4МПа МП4-У	шт.	12,00	80,83 0,00	969,96 0,00
59		Манометр диапазон измерения 0,,,0,6МПа МП4-У	шт.	6,00	80,83 0,00	484,98 0,00
60		Манометр сигнализирующий предел измерения 0,4МПа ДМ2010Сг	шт.	3,00	466,66 0,00	1 399,98 0,00
61		Напоромер мембранный показывающий, верхний предел измерения 4,0кПа НМП-100	шт.	2,00	750,00 0,00	1 500,00 0,00
62		Датчик-реле напора ДЕ-57-6	шт.	2,00	447,91 0,00	895,82 0,00
63		Сейсмический сенсор SEISMIC M16	шт.	1,00	4 796,70 0,00	4 796,70 0,00
		Прямые затраты	lei			26 820,28
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			321,84
		Total Utilaj Inclusiv salariu				27 142,12

		Прямые затраты	lei	61 357,76
		TVA	20,00 %	12 271,55
		Total deviz: Inclisiv salariu		73 629,31
				10 566,06

Beneficiar: Școala Profesională nr.1 din mun.Cahul

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Antreprenor: SRL "Tehnogazmontaj"

Responsabil tehnic

[Signature]



**Constructia centralei termice pe
gaze naturale a scolii
Profesionale nr.1 din municipiul
Cahul
Echipament electric de forta.
Iluminatul electric interior (marca
EEF/IEI.SU)**

(denumirea obiectivului)

Valoarea lucrarilor executate
56 324,27 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 22.11. an 2008

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale 1.1. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	5,50	69,87 69,87	384,29 384,29
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,50	16,34 16,34	89,89 89,89
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	5,50	39,38 39,38	216,59 216,59

1	2	3	4	5	6	7
57		Источник бесперебойного питания ИМП-1025AP-1025BA/615Вт	buc	1,00	1 034,20 0,00	1 034,20 0,00
58		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc	1,00	503,33 0,00	503,33 0,00
		Прямые затраты	lei			1 537,53
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			18,45
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 555,98

		Прямые затраты	lei	46 936,89
		TVA	20,00 %	9 387,38
				56 324,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		13 376,95

Beneficiar: Școala Profesională nr.1 din mun.Cahul

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Antreprenor: SRL "Tehnogazmontaj"

Responsabil tehnic

[Signature]

**Construcția centralei termice pe
gaze naturale a scolii
Profesionale nr.1 din municipiul
Cahul
Semnalizarea de incendiu (marca
SI.SU)**

(denumirea obiectivului)

Valoarea lucrarilor executate
23 830,18 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 22.11. an 2008

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Bapra-1/2GSM)	buc	1,00	844,72 841,12	844,72 841,12
2	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (ИПК-9)	buc	3,00	108,89 105,14	326,67 315,42
3	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(ИПР-1)	buc	1,00	108,29 105,14	108,29 105,14
4	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (RM-1)	buc	1,00	105,14 105,14	105,14 105,14
5	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "PIC" pentru: 4 raze (DSC PC 585H серия "Classic")	buc	1,00	583,52 578,27	583,52 578,27
6	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de	buc	1,00	115,38	115,38

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			65,16
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 495,24

		Прямые затраты	lei			19 858,48
		TVA	20,00 %			3 971,70
		Total deviz: Inclusiv salariu				23 830,18
						6 838,30

Beneficiar: Școala Profesională nr.1 din mun.Cahul

Investitor: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Antreprenor: SRL "Tehnogazmontaj"

Responsabil tehnic



[Handwritten signature]
