

Antreprenor SRL Bioenerg Construct
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Cirnatenii Noi r. Causeni
 (denumirea)

Obiect **Termoizolarea fatadelor
 Gradinitei de copii Viorica si
 reparatia capitala cu
 replanificare a blocului B din s,
 Cirnatenii Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate 1 008 571,13 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Lucrari de demolare					
1	RpCI19A	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm. Demontarea si montarea dupa executia lucrarilor de constructie.	m	7,0000	76,12 38,50	532,81 269,50	
		<i>Total</i>	lei			532,81	
		Total capitol: Inclusiv salariu				532,81 269,50	
		1.2. Finisarea interioara					
		1.2.1. Pereti					
		1.2.1.1. PE-1 placare cu ceramica pina la tavan					
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	119,0500	8,95 1,95	1 065,50 232,15	
		<i>Total</i>	lei			1 065,50	
		Total capitol:				1 065,50	

1	2	3	4	5	6	7
		25 mmp				
		<i>Total</i>	lei			133 687,98
		<i>Total VR</i>				133 687,98
		<i>Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			8 698,12
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 5 %</i>	5 %			3 056,08
		<i>Cheltuieli de regie (VR) * 56 %</i>	56 %			20 295,62
		<i>Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i>	4 %			6 629,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				172 367,30 36 242,18

		Total	lei	840 475,94
		TVA (VR) * 20 %	20 %	168 095,19
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 008 571,13 257 052,63

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Bioenerg Construct

Investitor
Primaria s. Cirtatenii Noi r. Causeni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar S. Bragan - A. Bragan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL Bioenerg Construct
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Cirnatenii Noi r.
 Causeni
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a gradinitei
 de copii Viorica din s. Cirnatenii
 Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **618 997,67 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		2. Inchideri si compartimentari				
1	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (pl 9)	m2	7,7000	812,06 188,37	6 252,90 1 450,45
		<i>Total</i>	lei			6 252,90
		<i>Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			348,11
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 5 %</i>	5 %			237,68
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 8 %</i>	8 %			547,09
		<i>Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i>	4 %			295,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 681,21 1 450,45
		3. Finisarea interioara				
		3.1. Pereti				
		3.1.1. PE-1 placare cu ceramica pina la tavan				

Antreprenor SRL Bioenerg Construct
(denumirea)

Investitor Primaria s. Cîrnatenei Noi r. Causeni
(denumirea)

Obiect **Termoizolarea fatadelor
Grădinitei de copii Viorica și
reparația capitală cu
replanificare a blocului B din s,
Cîrnatenei Noi r. Causeni**

Valoarea lucrărilor executate **725 611,04 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de recepție a lucrărilor executate
pe 14.06 an 20 24

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisarea interioara				
		1.1. Pereti				
		1.1.1. PE-3				
1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	696,380	41,68 34,25	29 028,10 23 851,02
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	696,380	21,48 7,80	14 958,28 5 431,79
3	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 7012	m2	181,090	171,57 79,30	31 070,35 14 360,45
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 9001	m2	515,290	171,57 79,30	88 410,39 40 862,51

1	2	3	4	5	6	7

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Bioenerg Construct


Investitor
Primaria s. Cirnatenii Noi r. Causeni

(denumirea)

(denumirea)

SRL Bioenerg Construct
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primaria s. Cirnatenii Noi r. Causeni
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "Bioenerg Construct" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Cirnateni
 (denumirea)

Obiect **Termoizolarea fatadelor
 Gradinitei de copii Viorica si
 reparatia capitala cu
 replanificare a blocului B din s,
 Cirnatenii Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **360 179,88 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Finisari interioare					
1	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:dimensiunile si culoarea de coordonat cu Beneficiarul	m2	98,2800	358,09 <hr/> 82,50	35 192,66 <hr/> 8 108,10	
		<i>Total</i>	lei			35 192,66	
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 192,66 8 108,10	
		2. Tavane					
		2.1. Tip T1					
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	299,3800	359,13 <hr/> 140,75	107 514,85 <hr/> 42 137,74	
		<i>Total</i>	lei			107 514,85	
		Total capitol: Inclusiv salariu				107 514,85 42 137,74	

1	2	3	4	5	6	7	
		protectia michiilor			0,00	0,00	
		<i>Total</i>	lei				101 893,42
		Total capitol: Inclusiv salariu					101 893,42 4 535,70

		Total	lei	244 600,93
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	13 147,57
		Cheltuieli de transport (VR) * 5 %	5 %	9 478,97
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 8 %	8 %	21 378,20
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4 %	11 544,23
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu +Benefi) * 20 %	20 %	60 029,98
				360 179,88
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		54 781,54

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Bioenerg Construct" SRL
(denumirea)

Investitor
Primaria Cirnateni
(denumirea)

Administrator Foal C
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Abraș
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Antreprenor SRL Bioenerg Construct
 (denumirea)

Investitor Primaria s, Cîrnatenui Noi r.
 Causeni
 (denumirea)

Obiect **Termoizolarea fatadelor
 Gradinitei de copii Viorica si
 reparatia capitala cu
 replanificare a blocului B din s,
 Cîrnatenui Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **94 208,96 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850- PD1	buc	1,000	433,71 150,80	433,71 150,80
2	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc	27,000	75,20 72,80	2 030,40 1 965,60
3	08-03-575-1	Dispozitiv: bare de conexiune	buc	4,000	75,20 72,80	300,80 291,20
4	PRET FURNIZOR R	Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
5	pret furnizor	Bara de legare a firului de N pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
6	08-03-572-	Bloc de comanda de	buc	1,000	433,71	433,71

1	2	3	4	5	6	7	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					9 421,24

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Bioenerg Construct

Investitor
Primaria s, Cirsatenii Noi r. Causeni

(denumirea)

(denumirea)

SRL Bioenerg Construct
(funcția, numele, prenumele, semnătura)


Primaria s, Cirsatenii Noi r. Causeni
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Administ. Traian Poale

Abrașan

L.Ș.

L.Ș.



F. Beldan

Antreprenor "Bioenerg Construct" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Cirnateni
 (denumirea)

Obiect **Termoizolarea fatadelor
 Gradinitei de copii Viorica si
 reparatia capitala cu
 replanificare a blocului B din s,
 Cirnatenii Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **183 180,42 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 20 24

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Inchideri si complementari					
1	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	6,4000	2 094,22 55,08	13 403,04 352,54	
		<i>Total</i>	lei			13 403,04	
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 403,04 352,54	
		2. Finisari exterioare					
2	CE19A	Lacrimar pentru protectia vatei minerale.	m	250,0000	166,82 53,00	41 704,45 13 250,00	
		<i>Total</i>	lei			41 704,45	
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 704,45 13 250,00	
		3. Ingradirea si finisarea rampelor de acces					
3	CH06A	Balustrada din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 102 cm inaltime, asezati la distante de 1,0 m prevazuti	m	3,2500	1 569,83 58,50	5 101,96 190,12	

1	2	3	4	5	6	7
11	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	3,2500	1 569,83 58,50	5 101,96 190,12
		<i>Total</i>				67 679,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 679,55. 23 156,89

	Total	lei	122 787,04
	Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	8 822,26
	Cheltuieli de transport (VR) * 5 %	5 %	4 297,36
	Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 8 %	8 %	10 872,53
	Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4 %	5 871,16
	TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu +Benefi) * 20 %	20 %	30 530,07
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		183 180,42 36 759,43

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Bioenerg Construct" SRL

Investitor
Primaria Cirnateni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Jan
Racay



Antreprenor SRL Bioenerg Construct
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Cirnatenii Noi r.
 Causeni
 (denumirea)

Obiect **Объект** Reparatia capitala a
 gradinitei de copii Viorica din s.
 Cirnatenii Noi r. Causeni

Valoarea lucrarilor executate **206 203,70 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2004

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-3 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Demontari si reparatii 1.1.1.1. Apeduct apa rece B1				
1	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	64,000	12,65 <hr/> 12,65	809,60 <hr/> 809,60
2	SA15B	Teava din polipropilena PN10 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul 20*2.8 mm. Consum fittinguri: Cot PP-R d20 - 5 buc; Teu PP-R d20 - 1 buc; Racord drept M x Fe 20x1/2" - 10 buc; Cot PP-R x Fe 20x1/2" - 3 buc	m	120,000	83,35 <hr/> 34,65	10 001,88 <hr/> 4 158,00
3	RpSD26A	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru	buc	1,000	165,10 <hr/> 12,10	165,10 <hr/> 12,10

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Canalizare K1				
74	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	3 773,70 101,75	3 773,70 101,75
		<i>Total</i>	lei			3 773,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 773,70 101,75
		<i>Total</i>	lei			3 773,70
		<i>Asigurari sociale (PI3) * 24 %</i>	24 %			24,42
		<i>Transport materiale (PI3+Asigur) * 5 %</i>	5 %			183,60
		<i>Total PI3+HP+PIH+HPIII+PIPIII +Asigur+Transp</i>				3 981,72
		<i>Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Transp) * 56 %</i>	56 %			56,98
		<i>Total PI3+HP+PIH+HPIII+PIPIII +Asigur+Transp+Cheltu</i>				4 038,70
		<i>Beneficiu de de viz (PI3+Asigur+Transp+Cheltu) * 4 %</i>	4 %			161,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 200,25 101,75
		<i>Total</i>	lei			171 836,42
		Total capitol: Inclusiv salariu				171 836,42 29 884,16

		<i>Total</i>	lei			171 836,42
		TVA (PI3) * 20 %	20 %			34 367,28
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				206 203,70
						29 884,16

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Bioenerg Construct

(denumirea)

SRL Bioenerg Construct

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor

Primaria s. Cîrnateni Noi r. Causeni

(denumirea)

Primaria s. Cîrnateni Noi r. Causeni

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

2-4

Antreprenor "Bioenerg Construct" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Cirnateni
 (denumirea)

Obiect **Termoizolarea Fatadelor
 Gradinitei de copii Viorica si
 reparatia capitala cu
 replanificare bloc B din s.
 Cirnatenii Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **158 919,40 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 20 24

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incalzire				
1	ID04B	Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	1,0000	95,50 12,50	95,50 12,50
2	ID13C	Supapa de sens cu arc, cu mufe, montata pe conducte de distributie cu apa calda (rece), avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	1,0000	297,00 14,00	297,00 14,00
3	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	120,0000	60,00 10,00	7 200,00 1 200,00
4	ID06A	Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4" (dop lateral cu robinet de aerisire)	buc	21,0000	98,00 5,00	2 058,00 105,00
5	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru	buc	18,0000	128,00 5,00	2 304,00 90,00

2	3	4	5	6	7
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					9 611,93

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Bioenerg Construct" SRL

Investitor
Primaria Cîrnateni

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Facla C

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



Antreprenor SRL Bioenerg Construct
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Cirnatenii Noi r.
 Causeni
 (denumirea)

Obiect **Termoizolarea fatadelor
 Gradinitei de copii Viorica si
 reparatia capitala cu
 replanificare a blocului B din s,
 Cirnatenii Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **45 593,83 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *noiembrie* an 20 *24*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze - Panou de incendiu	buc	1,000	2 545,15 2 535,00	2 545,15 2 535,00	
2	10-01-039-06	Piese diverse: Placa de comunicare SmartLan/RS485, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	130,00 130,00	130,00 130,00	
3	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control	buc	1,000	330,66 325,00	330,66 325,00	
4	08-03-575-1 adoptata	Montarea in dulap a acumulatorului	buc	2,000	75,16 72,80	150,32 145,60	
5	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: intrerupatoare automate	buc	1,000	75,16 72,80	75,16 72,80	
6	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)	buc	1,000	330,32 325,00	330,32 325,00	

1	2	3	4	5	6	7
		operar -5°C +40°C				
25		Buton manual de semnalizare incendiu conventional sensibilitate configurabila la: 0.10dB/m, 50mA, tensiunea de operare 10-30 Vcc, temperatura de operare -5°C +40°C, grad protectie IP67	buc	1,000	320,00 0,00	320,00 0,00
26	pret furnizor	Sirena LD-95, 12V, 150mA	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 592,00
		<i>Manipulare Depozitare (II3) * 1,2 %</i>	1,2 %			151,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 743,10

		Total	lei	37 994,86
		TVA (II3) * 20 %	20 %	7 598,97
				45 593,83
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 075,07

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Bioenerg Construct
(denumirea)

Investitor
Primaria s. Cirnatonii Noi r. Causeni
(denumirea)

SRL Bioenerg Construct
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primaria s. Cirnatonii Noi r. Causeni
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



2-7

Antreprenor SRL Bioenerg Construct
(denumirea)

Investitor Primaria s. Cirnatenui Noi r. Causeni
(denumirea)

Obiect **Termoizolarea fatadelor
Gradinitei de copii Viorica si
reparatia capitala cu
replanificare a blocului B din s,
Cirnatenui Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **80 937,65 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe *noiembrie* an 20 *14*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1864)	buc	1,000	2 351,33 2 340,00	2 351,33 2 340,00	
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	227,17 142,20	227,17 142,20	
3	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA	buc	1,000	307,93 300,00	307,93 300,00	
4	08-01-121-1	Acumulator montat in panou, tip: 7A*h, 12V	buc	2,000	182,10 123,60	364,20 247,20	
5	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: intrerupatoare automate	buc	1,000	69,40 67,20	69,40 67,20	
6	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100)	buc	1,000	307,79 300,00	307,79 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA (PI3) * 20 %	20 %			13 489,61	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					80 937,65
							17 139,24

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Bioenerg Construct
(denumirea)

Investitor
Primaria s. Cirnatenii Noi r. Causeni
(denumirea)

SRL Bioenerg Construct
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primaria s. Cirnatenii Noi r. Causeni
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

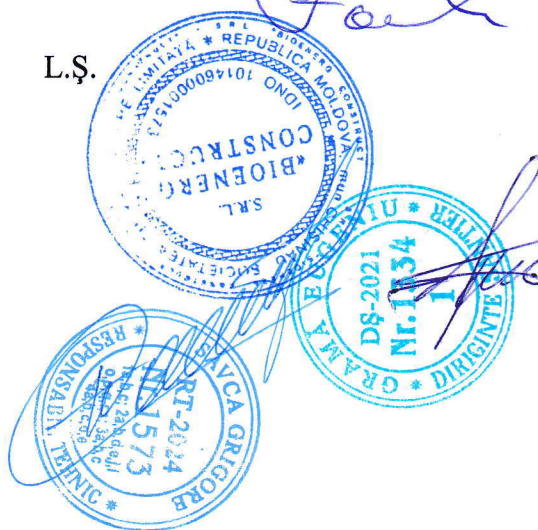

L.Ș.



Antreprenor SRL Bioenerg Construct
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Cirnatenii Noi r. Causeni
 (denumirea)

Obiect **Termoizolarea fatadelor
 Gradinitei de copii Viorica si
 reparatia capitala cu
 replanificare a blocului B din s,
 Cirnatenii Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **33 263,81 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *noiembrie* an 20 *24*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
1	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 (dulap 19" 18U)	buc	1,000	400,84 325,00	400,84 325,00	
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (rafturi, SWITCH 24 port, patch panel 24 port, cable managment, UPS, PDU)	buc	2,000	75,00 72,80	150,00 145,60	
3	10-02-051-04	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu. Patch cord	100 buc	0,200	201,50 201,50	40,30 40,30	
4	pret furnizor	Patch cord cat.6e L=0.5 m	buc	10,000	15,00 0,00	150,00 0,00	
5	pret furnizor	Patch cord cat.6e L=2.0 m	buc	10,000	65,00 0,00	650,00 0,00	
6	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe	100 m	1,200	2 831,52	3 397,82	

1	2	3	4	5	6	7
		ventilare cu termostat in set				
14	pret furnizor	Polita pentru dulap RACK 19"	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
15	pret furnizor	Ethernet switch: standart industrial 19", 1U, 2xAC220V; Ports: 24 RJ-45 ports, 2 combo ports, 10/100/1000 Mbps, 19", 1U	buc	2,000	4 000,00 0,00	8 000,00 0,00
16	pret furnizor	19" Patch panel modular 24xRJ45, 1U, cat. 6A SFTP, with Jack RJ45 fully shielded	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
17	pret furnizor	Organizator cablu 1U	buc	3,000	125,00 0,00	375,00 0,00
18	pret furnizor	Bloc de alimentare UPS, 1550VA/1100W, 200-240V, 50/60 Hz	buc	1,000	6 200,00 0,00	6 200,00 0,00
19	pret furnizor	PDU 12 x C13, I=16-20A, U=200-240V, 50/60Hz pentru montare in dulap	buc	1,000	800,00 0,00	800,00 0,00
20	pret furnizor	Cablu de alimentare pentru PDU compatibil cu UPS de tip CEE 7/4	buc	1,000	325,00 0,00	325,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 500,00
		<i>Depozitare (II3) * 1,2 %</i>	1,2 %			222,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 722,00

	Total	lei	27 719,84
	TVA (II3) * 20 %	20 %	5 543,97
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		33 263,81
			3 312,79

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL Bioenerg Construct

(denumirea)

SRL Bioenerg Construct

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor

Primaria s. Cirnateni Noi r. Causeni

(denumirea)

Primaria s. Cirnateni Noi r. Causeni

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor SRL BioenergConstruct
(denumirea)

Investitor Primaria Cirnateni
(denumirea)

Obiect **Termoizolarea fatadelor
Gradinitei de copii Viorica si
reparatia capitala cu
replanificare a blocului B din s,
Cirnatenii Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **416 566,62 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Deviz 2-1					
		1.1. Lucrari de demolare					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. Desfacerewa stresinei	m2	80,0000	42,90 41,40	3 432,00 3 312,00	
2	RpCI19A	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm. Demontarea si montarea dupa executia lucrarilor de constructie.	m	122,0000	76,11 38,50	9 285,96 4 697,00	
3	RpCI21A	Reparatii la burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, rotunde, cu diam. de 10,2 cm, 12,3 cm si 15,4 cm. Demontarea si montarea ulterioara dupa executia lucrarilor de reparatie.	m	19,7228	71,62 32,30	1 412,48 637,05	
		<i>Total</i>	lei			14 130,44	

1	2	3	4	5	6	7	
		Inclusiv salariu				41 177,00	
		1.4.2. Executarea acceselor in cladire					
29	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) . Rampa	m3	9,9000	1 746,69 369,80	17 292,24 3 661,02	
30	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	100,0000	359,08 147,00	35 907,50 14 700,00	
		<i>Total</i>	lei			53 199,74	
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 199,74 18 361,02	
		<i>Total</i>	lei			134 356,40	
		Total capitol: Inclusiv salariu				134 356,40 59 538,02	
		<i>Total</i>	lei			269 761,58	
		Total capitol: Inclusiv salariu				269 761,58 107 428,60	

		<i>Total</i>	lei		269 761,58
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %		25 782,86
		Cheltuieli de transport (VR) * 5 %	5 %		7 686,57
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 8 %	8 %		24 258,49
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %		19 649,36
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu +Benefi) * 20 %	20 %		69 427,77
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			416 566,62 107 428,60

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL BioenergConstruct

(denumirea)

Administratoarea
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
Primaria Cirnateni Noi

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor "Bioenerg Construct" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Cirnateni
 (denumirea)

Obiect **Termoizolarea fatadelor
 Gradinitei de copii Viorica si
 reparatia capitala cu
 replanificare a blocului B din s,
 Cirnatenii Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **65 208,23 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850- PD1	buc	2,0000	433,71 150,80	867,42 301,60
2	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc	26,0000	75,20 72,80	1 955,20 1 892,80
3	08-03-594-1	Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED	100 buc	0,1100	10 426,36 5 720,00	1 146,90 629,20
4	pret furnizor	Corp de iluminat LED incorporat in tavan, 596x596 mm, 48W, IP20, 6000Lm, 4000K, 230V, 50Hz	buc	11,0000	500,00 0,00	5 500,00 0,00
5	08-03-593-2	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat	100 buc	0,0500	9 714,80 4 069,00	485,74 203,45

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	nisa IIIPB-123-1 36 YXJ3 IP31			0,00	0,00
17	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=25A	buc	4,0000	150,00 0,00	600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 350,00
		<i>Cheltuieli de depozit (VR) * 1,2 %</i>	1,2 %			244,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 594,20

		Total	lei	54 340,19
		TVA (VR) * 20 %	20 %	10 868,04
				65 208,23
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		4 366,40

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Bioenerg Construct" SRL
(denumirea)

Administrator Feol C
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria Cirnateni
(denumirea)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "CBioenerg Construct" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Cirnateni
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a gradinitei
 de copii Viorica din s. Cirnatenii
 Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **12 826,52 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apeduct apa rece B1				
1	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	63,08 26,40	504,63 211,20
2	SA08G	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm	m	48,0000	167,08 57,75	8 020,08 2 772,00
		<i>Total</i>	lei			8 524,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 524,71 2 983,20
		<i>Total</i>	lei			8 524,71
		<i>Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			715,97
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 5 %</i>	5 %			275,67
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 8 %</i>	8 %			761,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			411,11

1	2	3	4	5	6	7
		(VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %				
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 688,77 2 983,20
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Canalizare K1				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		<i>Total</i>	lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00

		Total	lei	10 688,77
		TVA (VR) * 20 %	20 %	2 137,75
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		12 826,52
				2 983,20

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Bioenerg Construct" SRL
(denumirea)


Administrator Focul C
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria Cirnateni Noi
(denumirea)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "Bioenerg Construct" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Cîrnateni
 (denumirea)

Obiect **Termoizolarea Fatadelor
 Gradinitei de copii Viorica si
 reparatia capitala cu
 replanificare bloc B din s.
 Cîrnateni Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate 110 244,88 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
1	ID04B	Robinet sfera, cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	1,0000	95,50 12,50	95,50 12,50	
2	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	45,0000	145,00 145,00	6 525,00 6 525,00	
3	RCsU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	15,0000	85,80 85,80	1 287,00 1 287,00	
4	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 150 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2	24,0000	395,12 83,95	9 482,87 2 014,80	
5	ID02A	Cap termostatic, cu reglaj de tip RA 2991 sau similar	buc	11,0000	295,20 9,00	3 247,20 99,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 5 %	5 %			3 402,60
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 5 %	5 %			3 572,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 027,28 14 395,30
		2. Utilaj				
19	pret furnizor	Ventilator axial Tip VF 315 -VP 900 cu greutate 3,6-9,2 kg cu motor de 0,25-0,55 kW + Anemostat A 125 VRF ABC + Atenuator de zgomot	buc	4,0000	5 600,00 0,00	22 400,00 0,00
20	pret furnizor	Ventilator axial in constructie antieploziva de joasa presiune ambele antrenate cu cuplaj avind debitul de 2000-10000 m c /h cu motor electric de 0,37-1,1 kW + Anemostat A 125 VRF ABC + Atenuator de zgomot	buc	2,0000	6 200,00 0,00	12 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 800,00
		Cheltuieli de depozit (VR) * 1,2 %	1,2 %			417,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 217,60

		Total	lei			110 244,88
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				110 244,88 14 395,30

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Bioenerg Construct" SRL
(denumirea)

Administrator
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria Cirnateni Noi
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "Bioenerg Construct" SRL
 (denumirea)

Investitor PRimaria Cirnateni
 (denumirea)

Obiect **Termoizolarea fatadelor
 Gradinitei de copii Viorica si
 reparatia capitala cu
 replanificare a blocului B din s,
 Cirnatenii Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **8 466,17 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare					
1	08-03-575-1 adoptata	Montarea in dulap a acumulatorului	buc	1,0000	75,16 72,80	75,16 72,80	
2	10-08-002-02	Avertizoare "SI" automate: de fum cu baza in executare normala	buc	10,0000	135,94 130,00	1 359,37 1 300,00	
		<i>Total</i>	lei			1 434,53	
		<i>Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %</i>	24 %			329,47	
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 5 %</i>	5 %			1,02	
		<i>Cheltuieli de regie (VR) * 56 %</i>	56 %			768,77	
		<i>Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 4 %</i>	4 %			101,35	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 635,14 1 372,80	
		2. Utilaj, inventar, mobilier					
3	pret furnizor	Acumulator 12V, 7A/h	buc	1,0000	320,00 0,00	320,00 0,00	
4		Detector optic de fum conventional, sensibilitate configurabila la: 0.09dB/m, 40mA,	buc	10,0000	250,00 0,00	2 500,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		tensiunea de operare 10-30 Vcc, Temperatura de operar -5°C +40°C				
5		Buton manual de semnalizare incendiu conventional sensibilitate configurabila la: 0.10dB/m, 50mA, tensiunea de operare 10-30 Vcc, temperatura de operar -5°C +40°C, grad protectie IP67	buc	5,0000	320,00 0,00	1 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 420,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 420,00


		Total	lei	7 055,14
		TVA (VR) * 20 %	20 %	1 411,03
				8 466,17
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 372,80

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Bioenerg Construct" SRL
(denumirea)

Administrator Paul C
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Investitor
PRimaria Cirnateni Noi
(denumirea)

APROBAT:

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor "Bioenerg Construct" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Cirnateni
(denumirea)

Obiect **Termoizolarea fatadelor
Gradinitei de copii Viorica si
reparatia capitala cu
replanificare a blocului B din s,
Cirnatenii Noi r. Causeni**

Valoarea lucrarilor executate **2 780,98 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Utilaj, inventar, mobilier					
1	pret furnizor	Senzor combinat: infrarosu+deteriorare LC 102 PI	buc	2,0000	230,00 0,00	460,00 0,00	
2	pret furnizor	Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313	buc	4,0000	320,00 0,00	1 280,00 0,00	
3	pret furnizor	Sirena LD-95, 12V, 150mA	buc	1,0000	550,00 0,00	550,00 0,00	
		<i>Total</i>	lei			2 290,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 290,00	

	Total	lei	2 290,00
	Cheltuieli de depozit (VR) * 1,2 %	1,2 %	27,48
	TVA (VR+Cheltu) * 20 %	20 %	463,50
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 780,98

INTOCMIT
Antreprenor general (subantreprenor)
"Bioenerg Construct" SRL
(denumirea)

APROBAT:
Investitor
Primaria Cirnateni
(denumirea)

