



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»**

(Лицензия № 023955, серия АММШ от 02.03.2007г.)




**ПРОЕКТ**

**Объект:** «Аmenajarea teritoriului reparație capital a încăperilor existente în blocul A, A5 și A6 (blocurile sanitare etajul - 2), termoizolarea peretilor exsteriori a LT «G.Coșbuc» pe bd. Larisa, №3 în mun. Bălți».

**Объект № 22 - 12 - OLC**

**Рабочие чертежи**

мун. Бэлць 2022 год

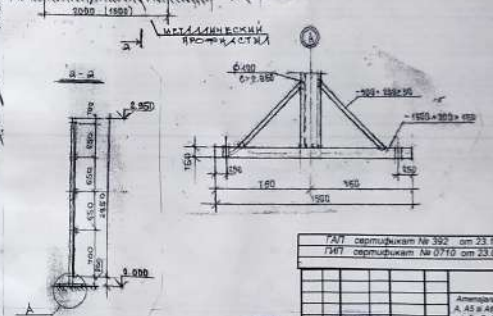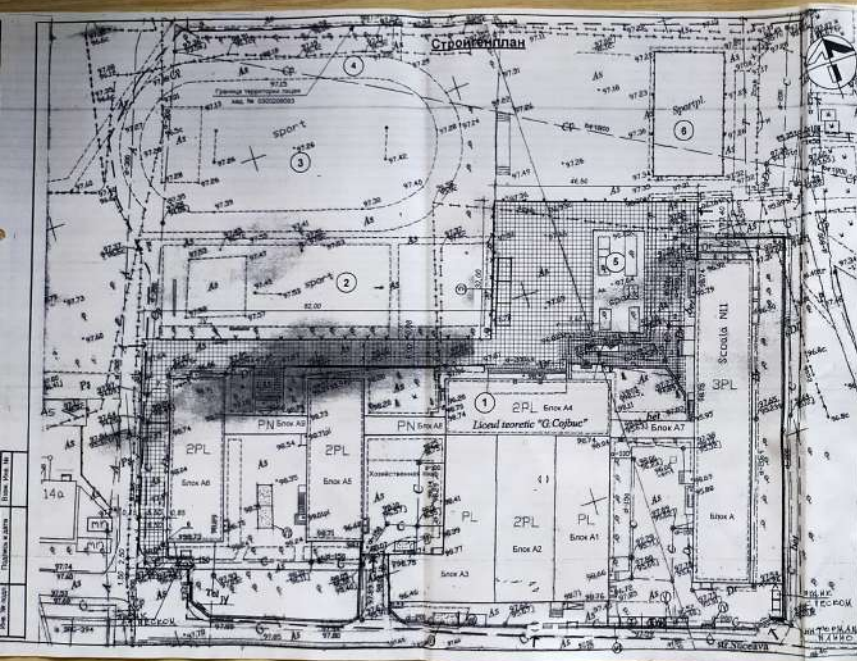

**Экспликация зданий и сооружений**

Порядковый номер	Наименование	Площадь, кв. м	Примечания
1	Здание лицей "G. Сегвич" на 1568 учащихся	4172,4	Существ. объект
2	Спортивная площадка для баскетбола и занятий ОБП	1615,0	Существ.
3	Футбольное поле	1600,0	Существ.
4	Беговая легкоатлетическая дорожка	1000,0	Существ.
5	Площадка для школьных младших классов	276,0	Существ.
6	Универсальная спортивная площадка для баскетбола, волейбола и мини-футбола	600,0	Существ.

ГАП сертификат № 392 от 23.10.19 г.		Лицензия № 023955 серия АММ/И	
ГубИП сертификат № 0710 от 23.02.21 г.		От 02.03.07 г.	
<b>22-12 - OLC</b>			
Альтернативная технология: проектирование и строительство в блоках А, А5 и А6 (корпуса здания, этаж-2), возмозможна реконструкция существующих в г. Т. Г. Сегвич" от Латвия, 3 м. Илго			
Исполнитель	Составитель	Дата	Фазы
А.С.Р. Уильямс	Уильямс	08.22	PE 1
С.Д. Фролов	Фролов	08.22	
Коллеги	Уильямс	08.22	
Организация строительства		Фазы	Планов
Строительный		PE	1
		Ин-центр Амбасад и Специализирован. Ин-т МП АП Виего и Боня	



ВЕДОМОСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ ПОЯСН. ЛАНЧ	НАИМЕНОВАНИЙ	КОЛ. ЕД.	ПРИМЕЧАНИЯ
I	КОНТОРА	1	ВАГОНЧИК 2,5x3,5
II	ГАРДЕРОБНАЯ	1	"
III	УМЫВАЛЬНАЯ	1	"
IV	ПОЖАРНЫЙ ЩИТ	3	СК. ЧЕРТЕЖИ
V	ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОБОГРЕВА И СУШКИ	1	ВАГОНЧИК 2,5x3,5
VI	ТУАЛЕТ	1	МОБИЛЬНЫЙ БЮК ГАДЕ
VII	ПЛОЩАДКА СКЛАДОВОЙ	7	СК. ЧЕРТЕЖИ
VIII	МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД	1	ВАГОНЧИК 2,5x3,5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ВРЕМЕННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СЕКЦИОННОЕ.
- ОГРАЖДЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

- Перед началом строительных работ, участок оградить, согласно плана и условным обозначениям. На участке лица установлен стационарный забор из сетчатых панелей на бетонном ленточном фундаменте. (существующее ограждение показано на плане).
- Для ведения строительных работ также устанавливается временное ограждение (металлические секции из профнастила). Панели длиной 2,0 м и 1,5 м. и высотой 2,95 м. После окончания строительных работ временное ограждение убирается.
- На ограждение вывесить информационное панно. (см. чертеж).
- Строительные работы необходимо разделить и выполнять поэтапно, при условии не мешать и не прекращать учебный процесс лиц.
- Оборудовать строительную площадку средствами пожаротушения согласно НСМ Е, 03, 02 - 2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СНиП III- 4-80 «Техника безопасности в строительстве» и системой пожаротушения.
- На стройплощадке имеется электроэнергия (освещение стройплощадки, подключение малой механизации). Подключения выполнить от электрощита лица.
- Вода для строительных, технических и бытовых нужд, подключить от водопроводного колодца лица.
- Въезд и выезд на стройплощадку устраивается со стороны ул. Сучава (смотри чертеж), через существующие ворота.
- Для подъем стройматериалов, на строительные леса, установить подъемник.
- Все лица, находящиеся на стройплощадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТу 12.4.087-84. При работе на высоте, рабочие должны иметь страховочные приспособления.
- Руководитель объекта, на стройплощадки обязан обеспечить рабочие места всеми необходимыми инструментами для соблюдения всех требований, правил и инструкций по охране труда. На стройплощадке установить строительный вагончик ( контора, раздевалка, душевая ), а также биотуалет. Также для обеспечения пожаробезопасности установить ящики с песком и определить место для размещения средств пожаротушения.
- Продолжительность ведения строительно - монтажных работ - 12 месяцев.



22-12-OLC						
Amenajarea teritoriului, reparație capitală a încăperilor existente în blocul A, A5 și A6 (blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea pereților exteriori a L.T. „G. Coșbuc” bd. Lariș, 3 m. Bălți						
Director	Companie	05.22	Организация строительства	Faza	Planșa	
A.Ș.P.	Vesellovscala	05.22		PE	2	
I.Ș.P.	FOKA	05.22		ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.	IM «Biroul Arhitectură și Sistemizare» mun. Bălți	
Elaborat.	Vesellovscala	05.22			МП АП Бюро м.Бэлць	
