

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie. Lucrari de constructie

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-09

Valoarea lucrarilor executate 342 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor.	m3	34,9400	77,71	2 715,34
					77,71	2 715,34
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	5,8200	688,09	4 004,71
					68,69	399,80
3	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15	m3	38,8000	1 635,11	63 442,24
					395,51	15 345,79
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	116,4000	228,06	26 546,09
					117,96	13 730,45
5	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	146,0000	19,97	2 915,46
					4,09	597,71
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stilpi din teava profilata 40x40x2-200m)	kg	462,0000	35,04	16 189,97
					14,57	6 732,00
7	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Teava profilata 15x15x1,5mm-1056kg; Otel lat 20x4mm-776kg)	kg	1 832,0000	53,90	98 739,45
					31,22	57 203,25
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.	m2	10,0000	2 648,81	26 488,10
					118,65	1 186,53

Total manopera (ore)	1 411,0686
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		241 041,35
Asigurari sociale	24,0000%	23 498,61
Total		264 539,95
Cheltuieli de transport	3,0000%	4 099,88
Total		268 639,83
Cheltuieli de regie	3,0000%	8 059,20
Total		276 699,03
Beneficiu de deviz	3,0000%	8 300,97

Total General fara TVA	285 000,00
TVA (20%)	57 000,00
TOTAL GENERAL	342 000,00
Inclusiv salariul	97 910,86

Antreprenor:


(functia, semnatura, numele, prenumele)

Popov Valeriu



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

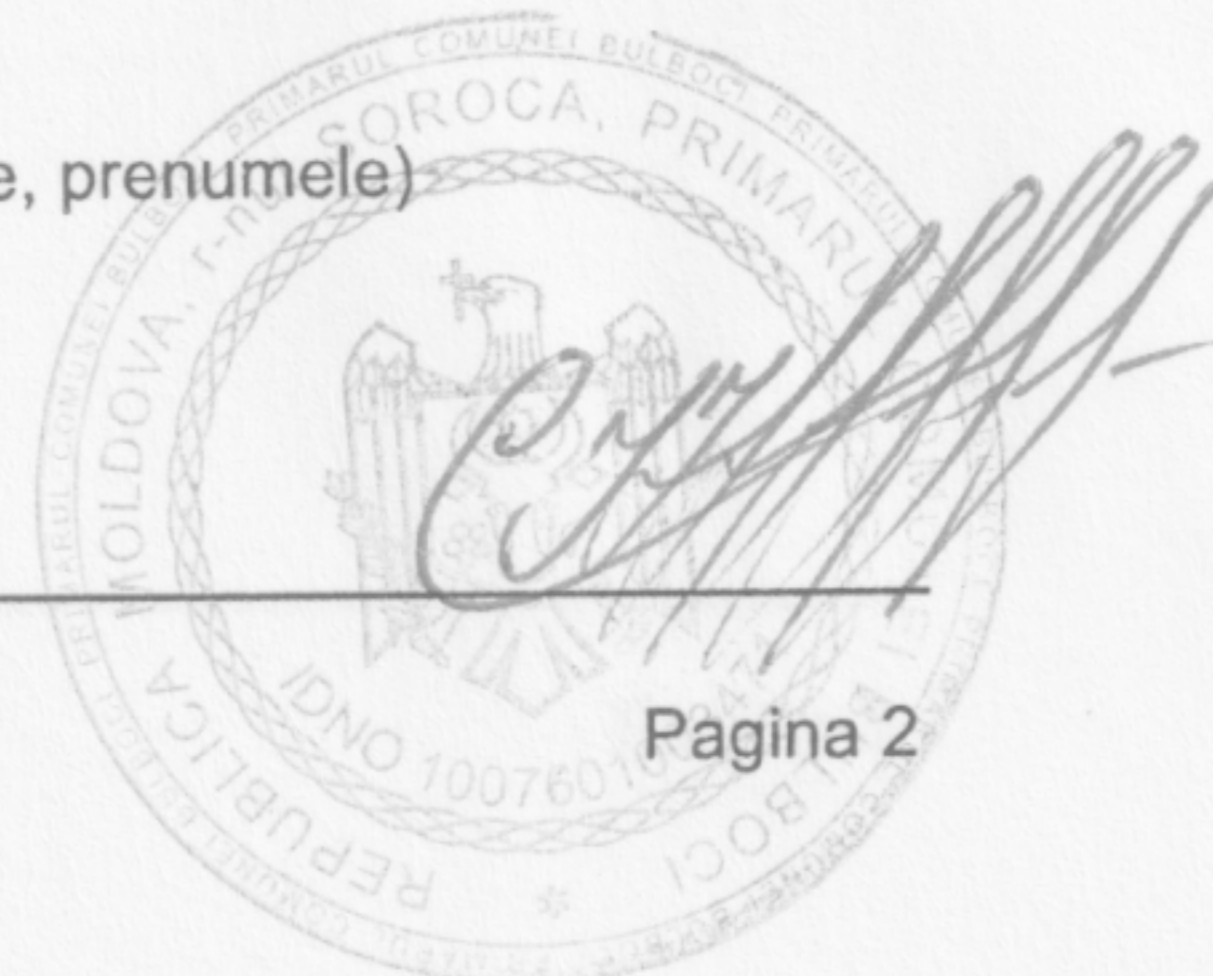

ANTREPRENOR:

EURO VL CONSTRUCT SRL

Director

Popov Vladislav Popov Vladislav



Diriginte de șantier

Mocanu Dumitru

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: ÎI NASTAS SERGHEI

Director

Nastas Serghei Nastas Serghei

Responsabil tehnic

Nastas Serghei Nastas Serghei



BENEFICIAR:

Primăria comunei Bulboci

Primar

Cojocar Iurie Cojocar Iurie



Faint grid table with columns and rows, likely a ledger or schedule, containing numerical data.

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie. Lucrari de constructii

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-08


Valoarea lucrarilor executate 361 771,80 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Pereti						
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	78,0000	294,16	22 944,43
					139,35	10 869,22
2	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton	m2	78,0000	100,09	7 807,01
					83,53	6 515,61
3	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	78,0000	27,05	2 109,93
					15,19	1 184,66
4	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,0000	30,20	2 355,74
					22,78	1 776,98
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic	m2	78,0000	7,15	557,95
					2,28	177,70
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,0000	60,03	4 682,08
					41,77	3 257,80
TOTAL Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Pereti						40 457,15
Inclusiv salariul						23 781,97
Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Glafuri la ferestre si usa						
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	7,2800	572,40	4 167,04
					286,09	2 082,77
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	18,2000	30,36	552,54
					19,74	359,35
9	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	7,2800	27,05	196,93
					15,19	110,57
10	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton	m2	7,2800	100,09	728,65
					83,53	608,12
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri	m2	7,2800	7,15	52,08
					2,28	16,59
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor glafuri	m2	7,2800	50,04	364,33
					41,77	304,06
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri	m2	7,2800	7,15	52,08
					2,28	16,59
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2	7,2800	60,03	436,99
					41,77	304,06
TOTAL Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Glafuri la ferestre si usa						6 550,63
Inclusiv salariul						3 802,10
Capitolul 1.1.3. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Tavan						
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	61,0000	294,58	17 969,29
					145,04	8 847,71

Președinte: Bogdan Victor, viceprimarul or.Telenesti

Membrii Comisiei:

- Mîrzenco Gheorghe -arhitect primăria or.Telenesti
- Roșca Tudor- specialist primăria or.Telenesti
- Zară Mihail – specialist primăria or.Telenesti
- Lazări Diana – director instituția de educație timpurie ”Andries” din or. Telenesti
- Mereuță Alexei-Responsabil tehnic

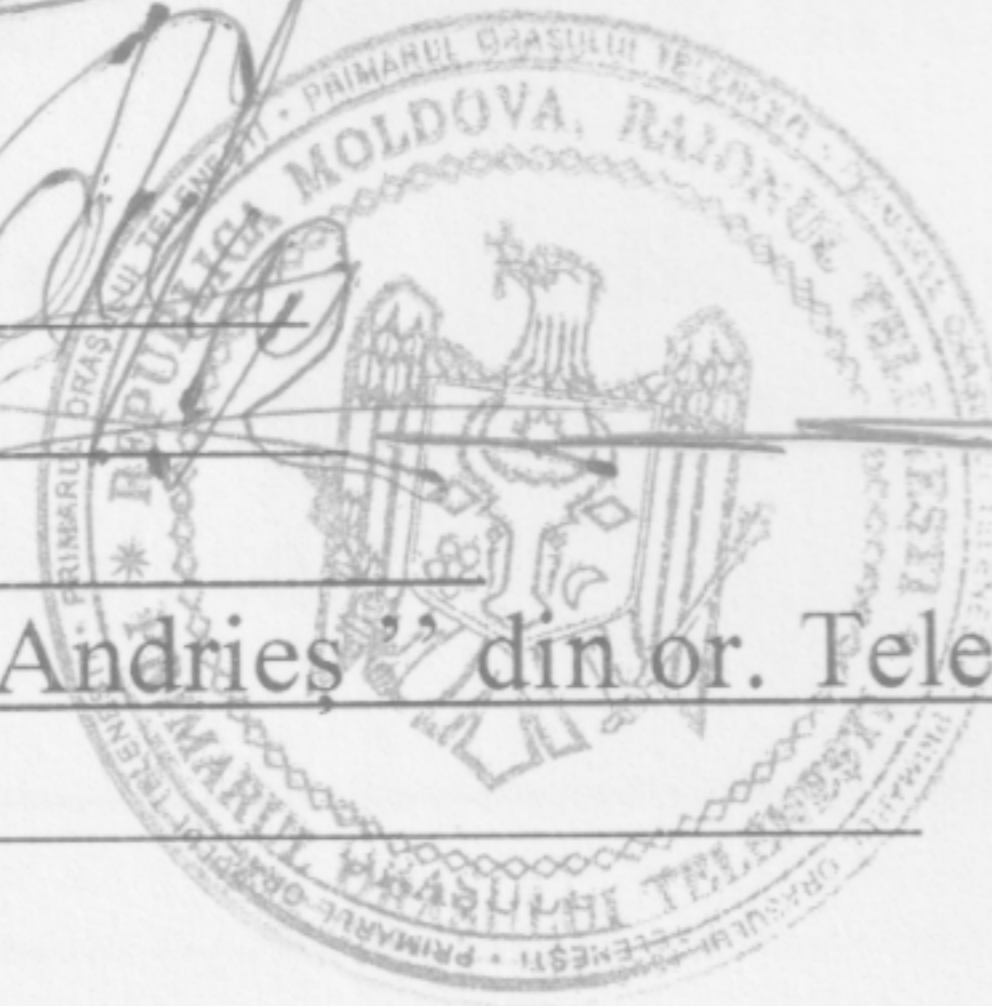

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: EuroVL Construct SRL

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primaria or.Telenesti

« 29 » noiembrie 2023

« 29 » noiembrie 2023

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAK000893277



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării / data livrării 27.11.2023 / 27.11.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: EURO VL CONSTRUCT S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.39 Cont MD33VI022241400000578MDL, Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI TELENESTI, OR.TELENESTI 31 August nr.8 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1022600000768 / ф.к./ код НДС 0612800							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare OR.TELENESTI Пункт погрузки		6. Punct descărcare OR.TELENESTI Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație capitale.Extinderea grupelor de creșă publice la instituția de educație timpurie "Andrieș" din or. Telenești	serv	1	360000.00	360000,00	20	72000,00	432000,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				360000,00	X	72000,00	432000,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil VLADISLAV POPOV
Отпуск разрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.11.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VLADISLAV POPOV
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.11.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului\ Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de renovare. Lucrari de constructii

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-08

Valoarea lucrarilor executate 356 400,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.1.1. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Tavan						
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	15,8800	302,55	4 804,44
					132,16	2 098,74
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,8800	5,98	94,90
					2,08	32,96
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,8800	46,34	735,81
					38,06	604,35
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	15,8800	56,32	894,32
					38,06	604,35
TOTAL Capitolul 1.1.1. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Tavan						6 529,47
Inclusiv salariul						3 340,41
Capitolul 1.1.2. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Pereti						
5	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	2,6800	453,77	1 216,10
					449,77	1 205,38
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastră,usa)	m2	21,8000	111,16	2 423,33
					110,71	2 413,52
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	21,6800	20,18	437,56
					18,68	405,04
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,5000	110,57	5 141,70
					83,03	3 861,09
9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	21,7000	404,22	8 771,53
					169,53	3 678,76
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,8000	5,98	148,20
					2,08	51,48
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Orizont/	m2	24,8000	108,37	2 687,51
					84,42	2 093,57
12	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,8000	25,70	637,40
					13,84	343,21
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,8000	46,34	1 149,12
					38,06	943,82
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,8000	56,32	1 396,67
					38,06	943,82
15	RCsO16A	Pereti dispartitori din placi PVC	m2	9,4000	2 083,39	19 583,89
					265,02	2 491,16

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 1
privind valoarea
lucrărilor executate pe
luna noiembrie a.2023

Antreprenor	SC EURO VL CONSTRUCT SRL	IDNO	1022600000768
Beneficiar	PRIMĂRIA SATULUI IGNAȚEI	IDNO	1007601005453
Contractul de antrepriză	nr.39 din 21.09.2023	Suma contractului:	356400 (lei)
Acorduri adiționale la contract	nr. ___ din _____	Perioada de executare prevăzută de contract	4 (luni)
		Durata contractului (valabilitatea)	31.12.2023
Denumirea obiectului executat și adresa	Lucrări de renovare a blocurilor sanitare si a salilor de distribuie a bucatelor finisate la grădinița in s Ignăței r Rezina Pe adresa: s Ignăței, raionul Rezina, clădirea grădiniței		

Se prezintă lunar de către antreprenor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei				
	De la începutul contractului, inclusiv luna raportată	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată		
			Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului	
1	2	3	4	5	
Nr.	Denumire a				
PV-1-	Lucrări de renovare a blocurilor sanitare si a salilor de distribuie a bucatelor finisate la grădinița in s Ignăței r Rezina	356400 lei	356400,00	356400 lei	
PV-2-					
Total		356400	356400	356400	
Inclusiv TVA 20%		59400	59400	59400	
Total general		356400,00	356400,00	356400,00	

CONTRACTOR SC EURO VL CONSTRUCT SRL, Vladislav Popov
/ANTREPRENOR/: _____ L.Ș.
(semnătura, numele, prenumele)

„Lucrarea este acceptată”


AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PRIMĂRIA SATULUI IGNAȚEI
/BENEFICIAR/: Vasile Turse
(semnătura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAK000642174

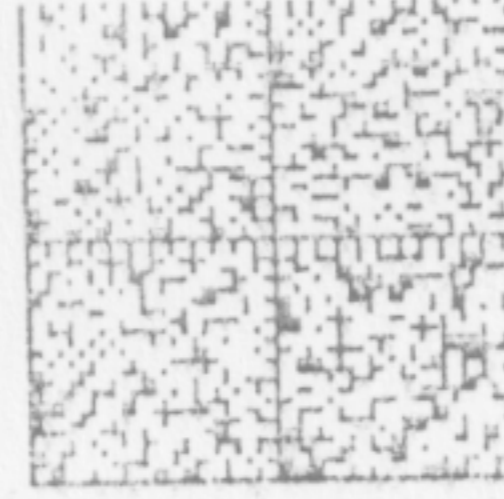

Formular 090/01
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipul facturii: factura simplă, factură dublă sau factură triplă
Nr. 1/19 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării / 14.11.2023 / 14.11.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
1. Furnizor: EURO VI. CONSTRUCT S.R.L., SEC. CIOCANĂ Mireea cel Batran bd. nr. 39 Cont MD33VI022241400000578MIDL., Поставщик В.С. VICTORIABANK S.A. fil. nr. 14 Chişinău, VICBMD2X446		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr. TVA ф.к. / код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA SATULUI IGNATEI, S.IGNATEI Покупатель/получатель		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./ nr. TVA 1022600000768 ф.к. / код НДС 0612800	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		6. Punct descărcare s. Ignatei Пункт разгрузки		7. Redirișări Передресовки	
5. Punct încărcare s. Ignatei Пункт погрузки		10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг
Lucrari de renovare a blocurilor sanitare si salilor de distribuire a bucatelor finite la gradinita de copii din s. Ignatei, r-nul Rezina		10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев
		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест
					10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		297000.00	297000.00	X	59400.00
				X	356400.00
				X	X
				X	X

13. Permis eliberarea: contabil VLADISLAV POPOV
Отпуск разрешил _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura, Denumirea, фамилия, имя, отчество

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 14.11.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VLADISLAV POPOV
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura, Держатель, фамилия, имя, отчество

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 14.11.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura, Должность, фамилия, имя, отчество

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura, Должность, фамилия, имя, отчество

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura, Должность, фамилия, имя, отчество

