

Antreprenor SRL " Visom Cons "
 (denumirea)

Investitor Prmaria com. Cirtatenii Noi
 (denumirea)

Obiect **Constructia stadionului de mini-
 fotbal din s. Cirtatenii Noi r-ul
 Causeni**

Valoarea lucrarilor executate

87940 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2023__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CO06B k=2	Imprejmuiri din Euro gard " pe stilpi din metal 40x40x4 mm gr. 5mm montati la 2.5m distanta nteax , cu naltmea la coama de 4.1m (Stilpi -42 buc. de 4.8m.l)	m	208,00	308,43 93,47	64 153,47 19 441,14
	71230300125	Montator P.B	h-om	191,36	84,97	16 259,86
	9310060019	Muncitor deservire CM	h-om	37,44	84,97	3 181,28
	27107037003 40	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	102,84	23,20	2 385,89
	14111222017 51	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	15,00	350,00	5 250,00
	28111063020	Stilp din beton armat prefabricat	buc	42,00	785,00	32 970,00
	24105200067	Automacara	h-ut	10,40	395,00	4 106,44

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	64 153
	Asigurarea sociala	24,00 %	4 666
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 624
	Total	100,00 +	70 443
	Cheltuieli de regie	3,00 %	2 114
	Beneficiu	1,00 %	726
	Total	100,00 +	73 283
	TVA	20,00 %	14 657
			87 940
	TOTAL:		19 441

1	2	3	4	5	6	7
						87 94
						19 441
		TOTAL:				

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
(SRL "Visom Cons")
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.

(denumirea)

(Prmaria com. Cîrnatenui Noi)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.



Antreprenor SRL " Visom Cons "
 (denumirea)

Investitor Prmăria com. Cîrnatenui Noi
 (denumirea)

Obiect **Constructia stadionulu de mini-
 fotbal din s. Cîrnatenui Noi ,
 r-ul Causeni**

Valoarea lucrărilor executate

140 101 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrărilor executate
 pe **octombrie** an **2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrării de trasament				
1	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodăririi apelor	100 m3	0,32	2 526,41 0,00	809,60 0,00
	29522600035 21	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,76	460,00	809,60
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,0	611,72 84,12	14 681,29 2 018,89
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	23,76	84,97	2 018,89
	14111222017 52	Piatra sparta	m3	27,60	350,00	9 660,00
	41001262028 18	Apa	m3	2,40	12,00	28,80
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,04	350,00	1 764,00
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,08	120,00	1 209,60
3	TsC54A	Strat de fundatie din meluza	m3	8,0	476,57 76,47	3 812,58 611,78
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	7,20	84,97	611,78
	14211022005 25	Meluza	m3	8,80	250,00	2 200,00
	41001262028 18	Apa	m3	0,80	12,00	9,60
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,68	350,00	588,00
	25922700040	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	3,36	120,00	403,20

1	2	3	4	5	6	7
	21	150 - 200 kg				
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,32	2 689.32 256.90	862,42 82,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97	84,97	82,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,20	650,00	780,00
		Total capitol:				
						20 165,89
						2 713,09
		2. Ingradirea terenului cu gard din rame cu plasa H=5m. (120 m.l.)				
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 25*25*2 mm) - 160 m.l.	kg	251,46	41,93 17,84	10 542,96 4 486,41
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	47,78	84,97	4 059,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,51	84,97	213,27
	7212030022700	Sudor	h-om	2,51	84,97	213,27
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,51	25,50	64,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	251,46	23,50	5 909,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,26	47,00	59,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,01	2,57	5,17
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,77	5,00	18,85
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 80*80*2mm 8 piloni h= 6m) (materialul beneficiar)	kg	340,8	18,43 17,84	6 280,73 6 081,31
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	64,75	84,97	5 501,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,41	84,97	289,75
	7212030022700	Sudor	h-om	3,41	84,97	289,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,41	25,50	86,95
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	340,80	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	1,70	47,00	79,90
	40111062027 41	Energie electrica	kw	2,73	2,57	7,02
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	5,11	5,00	25,55
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 40*25*2 mm) 36 m.l.	kg	68,76	41,93 17,84	2 882,96 1 226,97
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	13,06	84,97	1 109,71
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,69	84,97	58,63
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,69	84,97	58,63
	27341138032 07	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,69	25,50	17,59
	27752763098 86	Confectii metalice inglobate in beton	kg	68,76	23,50	1 615,86
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,34	47,00	15,98
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,55	2,57	1,41
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	1,03	5,00	5,15
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 80*40*4 mm) - 50.4 m.l.	kg	326,6	41,77 17,84	13 643,62 5 828,09
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	62,05	84,97	5 272,39
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,27	84,97	277,85
	72120300227 00	Sudor	h-om	3,27	84,97	277,85
	27341138032 07	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,27	25,50	83,39
	214578	Stilpi metalici 80*40*4	buc	6,00	953,00	5 718,00
	27752763098 86	Confectii metalice inglobate in beton	kg	81,12	23,50	1 906,32
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	1,63	47,00	76,61
	40111062027 41	Energie electrica	kw	2,61	2,57	6,71
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	4,90	5,00	24,50
9	CO06B k=2	Imprejmuiri din Euro gard " pe stilpi din metal 80x40x4 mm gr. 4mm montati la 2.5m distanta nteax , cu naltmea la coama de 5m (Stilpi -48 buc. de 6m.l)	m	104,0	423,42 0,00	44 035,62 0,00
	27321036462 5000	Plasa de sirma	m2	620,22	71,00	44 035,62
10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Stilpi	m2	49,37	116,95 93,47	5 773,52 4 614,72

1	2	3	4	5	6	7
		si chingi metalce)				
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	54,31	84,97	4 614,72
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	5,13	50,00	256,50
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,43	31,50	171,04
	24302261021 97	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,47	53,40	131,90
	24301161041 60	Email alchidic	kg	8,39	46,30	388,46
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,87	4,00	39,48
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	2,47	5,00	12,35
	23201662006 76	White spirit	kg	4,94	32,20	159,07
		Total capitol:				
						83 159,41
						22 237,50

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	103 327
		Asigurarea sociala	24,00 %	5 988
		Cheltuieli de transport	4,00 %	2 913
		Total	100,00 +	112 228
		Cheltuieli de regie	3,00 %	3 367
		Beneficiu	1,00 %	1 156
		Total	100,00 +	116 751
		TVA	20,00 %	23 350
				140 101
		TOTAL:		24 950

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
(SRL "Visom Cons")
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

(denumirea)
(Primaria com. Cirnatenei Noi)
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



**Constructia stadionului de mini-
fotbal din s. Cîrnateni Noi,
r-ul Causeni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Includere

Valoarea de deviz 140 101 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	54,31	84,97	4 614,72
2.	7212030022700	Sudor	h-om	9,88	84,97	839,50
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	187,64	84,97	15 943,78
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,93	84,97	2 713,09
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,88	84,97	839,50
		Total manopera				24 950

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,81	5,00	74,05
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	27,60	350,00	9 660,00
3.	1421102200525	Meluza	m3	8,80	250,00	2 200,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,47	5,00	12,35
5.	214578	Stilpi metalici 80*40*4	buc	6,00	953,00	5 718,00
6.	2320166200676	White spirit	kg	4,94	32,20	159,07
7.	2430116104160	Email alchidic	kg	8,39	46,30	388,46
8.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,13	50,00	256,50
9.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,47	53,40	131,90
10.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,43	31,50	171,04
11.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,87	4,00	39,48
12.	273210364625000	Plasa de sirma	m2	620,22	71,00	44 035,62
13.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,88	25,50	251,93
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	340,80	0,00	0,00
				401,34	23,50	9 431,49
15.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,93	47,00	231,71
16.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,90	2,57	20,31
17.	4100126202818	Apa	m3	3,20	12,00	38,40
		Total materiale de construcții				72 822

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,44	120,00	1 612,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,72	350,00	2 352,00
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,20	650,00	780,00

4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc ³ buldoex	h-ut	1,76	460,00	809,60
Total utilaje de construcții						5 555

Total:

Cheltuieli directe	lei	103 327
Asigurarea sociala	24,00 %	5 988
Cheltuieli de transport	4,00 %	2 913
Total	100,00 +	112 228
Cheltuieli de regie	3,00 %	3 367
Beneficiu	1,00 %	1 156
Total	100,00 +	116 751
TVA	20,00 %	23 350

Total deviz:

140 101

Intocmit

(SRL " Visom Cons ")

Verificat

(Primaria com. Cîrnătenii Noi)



Construcția stadionului de mini-fotbal din s. Cîrnatenei Noi r-ul Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Includere

Valoarea de deviz 140 101 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de trasament				
1	TsC02D11	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m ³	0,32	2 526,41 0,00	809,60 0,00
2	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m ³	24,0	611,72 84,12	14 681,29 2 018,89
3	TsC54A	Strat de fundație din meluza	m ³	8,0	476,57 76,47	3 812,58 611,78
4	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv	100 m ³	0,32	2 689,32 256,90	862,42 82,42
Total Lucrări de trasament						20 165,89
Incluziv salariu						2 713,09
		2. Ingradirea terenului cu gard din rame cu plasa H=3.m. (104.8 m.l.)				
5	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Teava profilată 25*25*2 mm) - 160 m.l.	kg	251,46	41,93 17,84	10 542,96 4 486,41

1	2	3	4	5	6	7
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 80*80*2mm 8 piloni h= 6m)	kg	340,8	18,43 17,84	6 280,73 6 081,31
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 40*25*2 mm) 36 m.l.	kg	68,76	41,93 17,84	2 882,96 1 226,97
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 80*40*4 mm) - 50.4 m.l.	kg	326,6	41,77 17,84	13 643,62 5 828,09
9	CO06B k=2	Imprejmuiri din Euro gard 45*45*2,4 " pe stilpi din metal 80x40x4 mm gr. 4mm montati la 2.5m distanta nteax , cu naltmea la coama de 5m (Stilpi -48 buc. de 5m.l)	m	104,0	423,42 0,00	44 035,62 0,00
10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Stilpi si chingi metalce)	m2	49,37	116,95 93,47	5 773,52 4 614,72

**Total Ingradirea
terenului cu gard din
rame cu plasa H=5.m. (120 m.l.)
Incluziv salariu**

83 159,41

22 237,50

Cheltuieli directe	lei	103 327
Asigurarea sociala	24,00 %	5 988
Cheltuieli de transport	4,00 %	2 913
Total	100,00 +	112 228
Cheltuieli de regie	3,00 %	3 367
Beneficiu	1,00 %	1 156
Total	100,00 +	116 751
TVA	20,00 %	23 350

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**140 101
24 950**

Intocmit

(SRL " Visom Cons ")

Verificat

Primaria com. Cirlatenii Noi)



Investitor
ObiectPrmăria com. Cîrnatenei Noi
Construcția stadionului de mini- fotbal din s. Cîrnatenei Noi r-ul
Causeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Includere
(formular desfășurat)

Intocmit în prețuri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de trasament				
1	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			2 530,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	460,00	2 530,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			611,72 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
3	TsC54A	Strat de fundatie din meluza	m3			476,57 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Meluza	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			2 695,06 257,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	257,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	650,00	2 437,50
		2. Ingradirea terenului cu gard din rame cu plasa H=5.m. (120 m.l.)				
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 25*25*2 mm) - 160 m.l.	kg			41,93 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	Kg	0,0100	25,50	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	Kg	1,0000	23,50	23,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	Kg	0,0050	47,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	Kw	0,0080	2,57	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	Kg	0,0150	5,00	0,07
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 80*80*2mm 8 piloni h= 6m)	kg			18,43 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	Kg	0,0100	25,50	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	Kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	Kg	0,0050	47,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	Kw	0,0080	2,57	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	Kg	0,0150	5,00	0,07
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 40*25*2 mm) 36 m.l.	kg			41,93 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	Kg	0,0100	25,50	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	Kg	1,0000	23,50	23,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	Kg	0,0050	47,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	Kw	0,0080	2,57	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	Kg	0,0150	5,00	0,07
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 80*40*4 mm) - 50.4 m.l.	kg			41,77 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	Kg	0,0100	25,50	0,26
	214578	Stilpi metalici 80*40*4	Buc		953,00	17,51
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	Kg		23,50	5,84
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	Kg	0,0050	47,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	Kw	0,0080	2,57	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	Kg	0,0150	5,00	0,08
9	CO06B k=2	Imprejmuiri din Euro gard " pe stilpi din metal 80x40x4 mm gr. 4mm montati la 2.5m distanta nteax , cu naltmea la coama de 5m (Stilpi -48 buc. de 6 m.l)	M			423,42 0,00
	273210364625000	Plasa de sirma	m2	5,7900	71,00	423,42
10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Stilpi si chingi metalce)	m2			116,94 93,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2430226100700	Grund alchidic	Kg	0,1040	50,00	5,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	Kg	0,1100	31,50	3,46
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	Kg	0,0500	53,40	2,67
	2430116104160	Email alchidic	Kg	0,1700	46,30	7,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	Buc	0,2000	4,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	Kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	Kg	0,1000	32,20	3,22

INTOCMIT

Antreprenor
SRL " Visom Cons "

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor
Prmria com. Cîrnăteanu Noi

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL " Visom Cons "
(denumirea)

Investitor Prmaria com. Cîrnatenui Noi
(denumirea)

Obiect **Constructia stadionulu de mini-
fotbal din s. Cîrnatenui Noi ,
r-ul Causeni**

Valoarea lucrurilor executate

173 178 lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrurilor executate
pe octombrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de trasament				
1	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,28	2 526,41 0,00	3 233,80 0,00
	29522600035 21	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,03	460,00	3 233,80
2	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,28	2 689,32 256,90	3 442,33 328,83
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	3,87	84,97	328,83
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,79	650,00	3 113,50
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	9,50	65,47 65,47	621,98 621,98

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	7,32	84,97	621,98
4	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pîna la 3 km	t	166,40	34,21 0,00	5 692,50 0,00
	34105400000 06	Autobasculanta	h-ut	12,65	450,00	5 692,50
		Total capitul:				
						12 990,61 950,81
		2. Ingradirea terenului cu gard din rame cu plasa H=3.m. (104.8 m.l.)				
5	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200	m3	4,00	2 018,24 701,05	8 072,30 2 804,01
	71230100102 00	Betonist	h-om	31,40	84,97	2 668,06
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,60	84,97	135,95
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 163,52	2,43	2 827,35
	14211022005 25	Meluza	m3	3,09	250,00	772,50
	14211022002 90	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,85	420,00	1 197,00
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,17	12,00	14,04
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	2,40	26,00	62,40
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,00	395,00	395,00
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 25*25*2 mm) -208 m.l.	kg	229,00	41,93 17,84	9 602,05 4 086,20
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	43,51	84,97	3 697,04
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,29	84,97	194,58
	72120300227 00	Sudor	h-om	2,29	84,97	194,58
	27341138032 07	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,29	25,50	58,40
	27752763098 86	Confectii metalice inglobate in beton	kg	229,00	23,50	5 381,50
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	1,15	47,00	54,05
	40111062027 41	Energie electrica	kw	1,83	2,57	4,70
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	3,44	5,00	17,20
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 40*25*2 mm) -104 m.l.	kg	198,00	41,93 17,84	8 301,98 3 533,05

1	2	3	4	5	6	7
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	37,62	84,97	3 196,57
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,98	84,97	168,24
	72120300227 00	Sudor	h-om	1,98	84,97	168,24
	27341138032 07	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,98	25,50	50,49
	27752763098 86	Confectii metalice inglobate in beton	kg	198,00	23,50	4 653,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,99	47,00	46,53
	40111062027 41	Energie electrica	kw	1,58	2,57	4,06
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	2,97	5,00	14,85
8	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Stilpi si chingi metalce)	m2	98,80	116,95 93,47	11 554,46 9 234,54
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	108,68	84,97	9 234,54
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	10,28	50,00	514,00
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,87	31,50	342,40
	24302261021 97	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,94	53,40	263,80
	24301161041 60	Email alchidic	kg	16,80	46,30	777,84
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,76	4,00	79,04
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	4,94	5,00	24,70
	23201662006 76	White spirit	kg	9,88	32,20	318,14
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Carcasa la portite de intrare -2*2.2-1buc. 1*2- 1 buc.)	kg	56,00	41,93 17,84	2 348,04 999,24
	72142400218 10	Lacatus CM	h-om	10,64	84,97	904,08
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,56	84,97	47,58
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,56	84,97	47,58
	27341138032 07	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,56	25,50	14,28
	27752763098 86	Confectii metalice inglobate in beton	kg	56,00	23,50	1 316,00
	28731559012 00	Electrozi pentru sudura	kg	0,28	47,00	13,16
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,45	2,57	1,16
	10101262003 41	Carbuni de forja (huila)	kg	0,84	5,00	4,20
10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Stilpi si chingi metalce)	m2	1,70	117,29 93,46	199,40 158,89
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,87	84,97	158,89
	24302261007 00	Grund alchidic	kg	0,18	50,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	24302261094 44	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,19	31,50	5,99
	24302261021 97	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,09	53,40	4,81
	24301161041 60	Email alchidic	kg	0,29	46,30	13,43
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,34	4,00	1,36
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,09	5,00	0,45
	23201662006 76	White spirit	kg	0,17	32,20	5,47
		Total capitul:				
						40 078,23
						20 815,93
		3. Teren artficial S=640m2				
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fracta 20-40	m3	62,00	629,22 84,12	39 011,66 5 215,46
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	61,38	84,97	5 215,46
	235421475	Pietris fracta 20-40	m3	62,00	420,00	26 040,00
	41001262028 18	Apa	m3	6,20	12,00	74,40
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,02	350,00	4 557,00
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,04	120,00	3 124,80
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractia 5-20	m3	31,00	692,22 84,12	21 458,83 2 607,73
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	30,69	84,97	2 607,73
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat fractia 5-20	m3	35,65	420,00	14 973,00
	41001262028 18	Apa	m3	3,10	12,00	37,20
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,51	350,00	2 278,50
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,02	120,00	1 562,40
13	TsC54A	Strat de fundatie din meluza	m3	31,00	476,57 76,47	14 773,76 2 370,66
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	27,90	84,97	2 370,66
	14211022005 25	Meluza	m3	34,10	250,00	8 525,00
	41001262028 18	Apa	m3	3,10	12,00	37,20
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,51	350,00	2 278,50
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,02	120,00	1 562,40
		Total capitul:				
						75 244,25
						10 193,85

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	128 314
	Asigurarea sociala	24,00 %	7 671
	Cheltuieli de transport	4,00 %	2 740

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			138 725
		Cheltuieli de regie	3,00 %			4 161
		Beneficiu	1,00 %			1 429
		Total	100,00 +			144 315
		TVA	20,00 %			28 863
						173 178
		TOTAL:				31 961

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(SRL " Visom Cons ")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primar Andrei Brage

(denumirea)


(Primaria com. Cernatenii Noi)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:



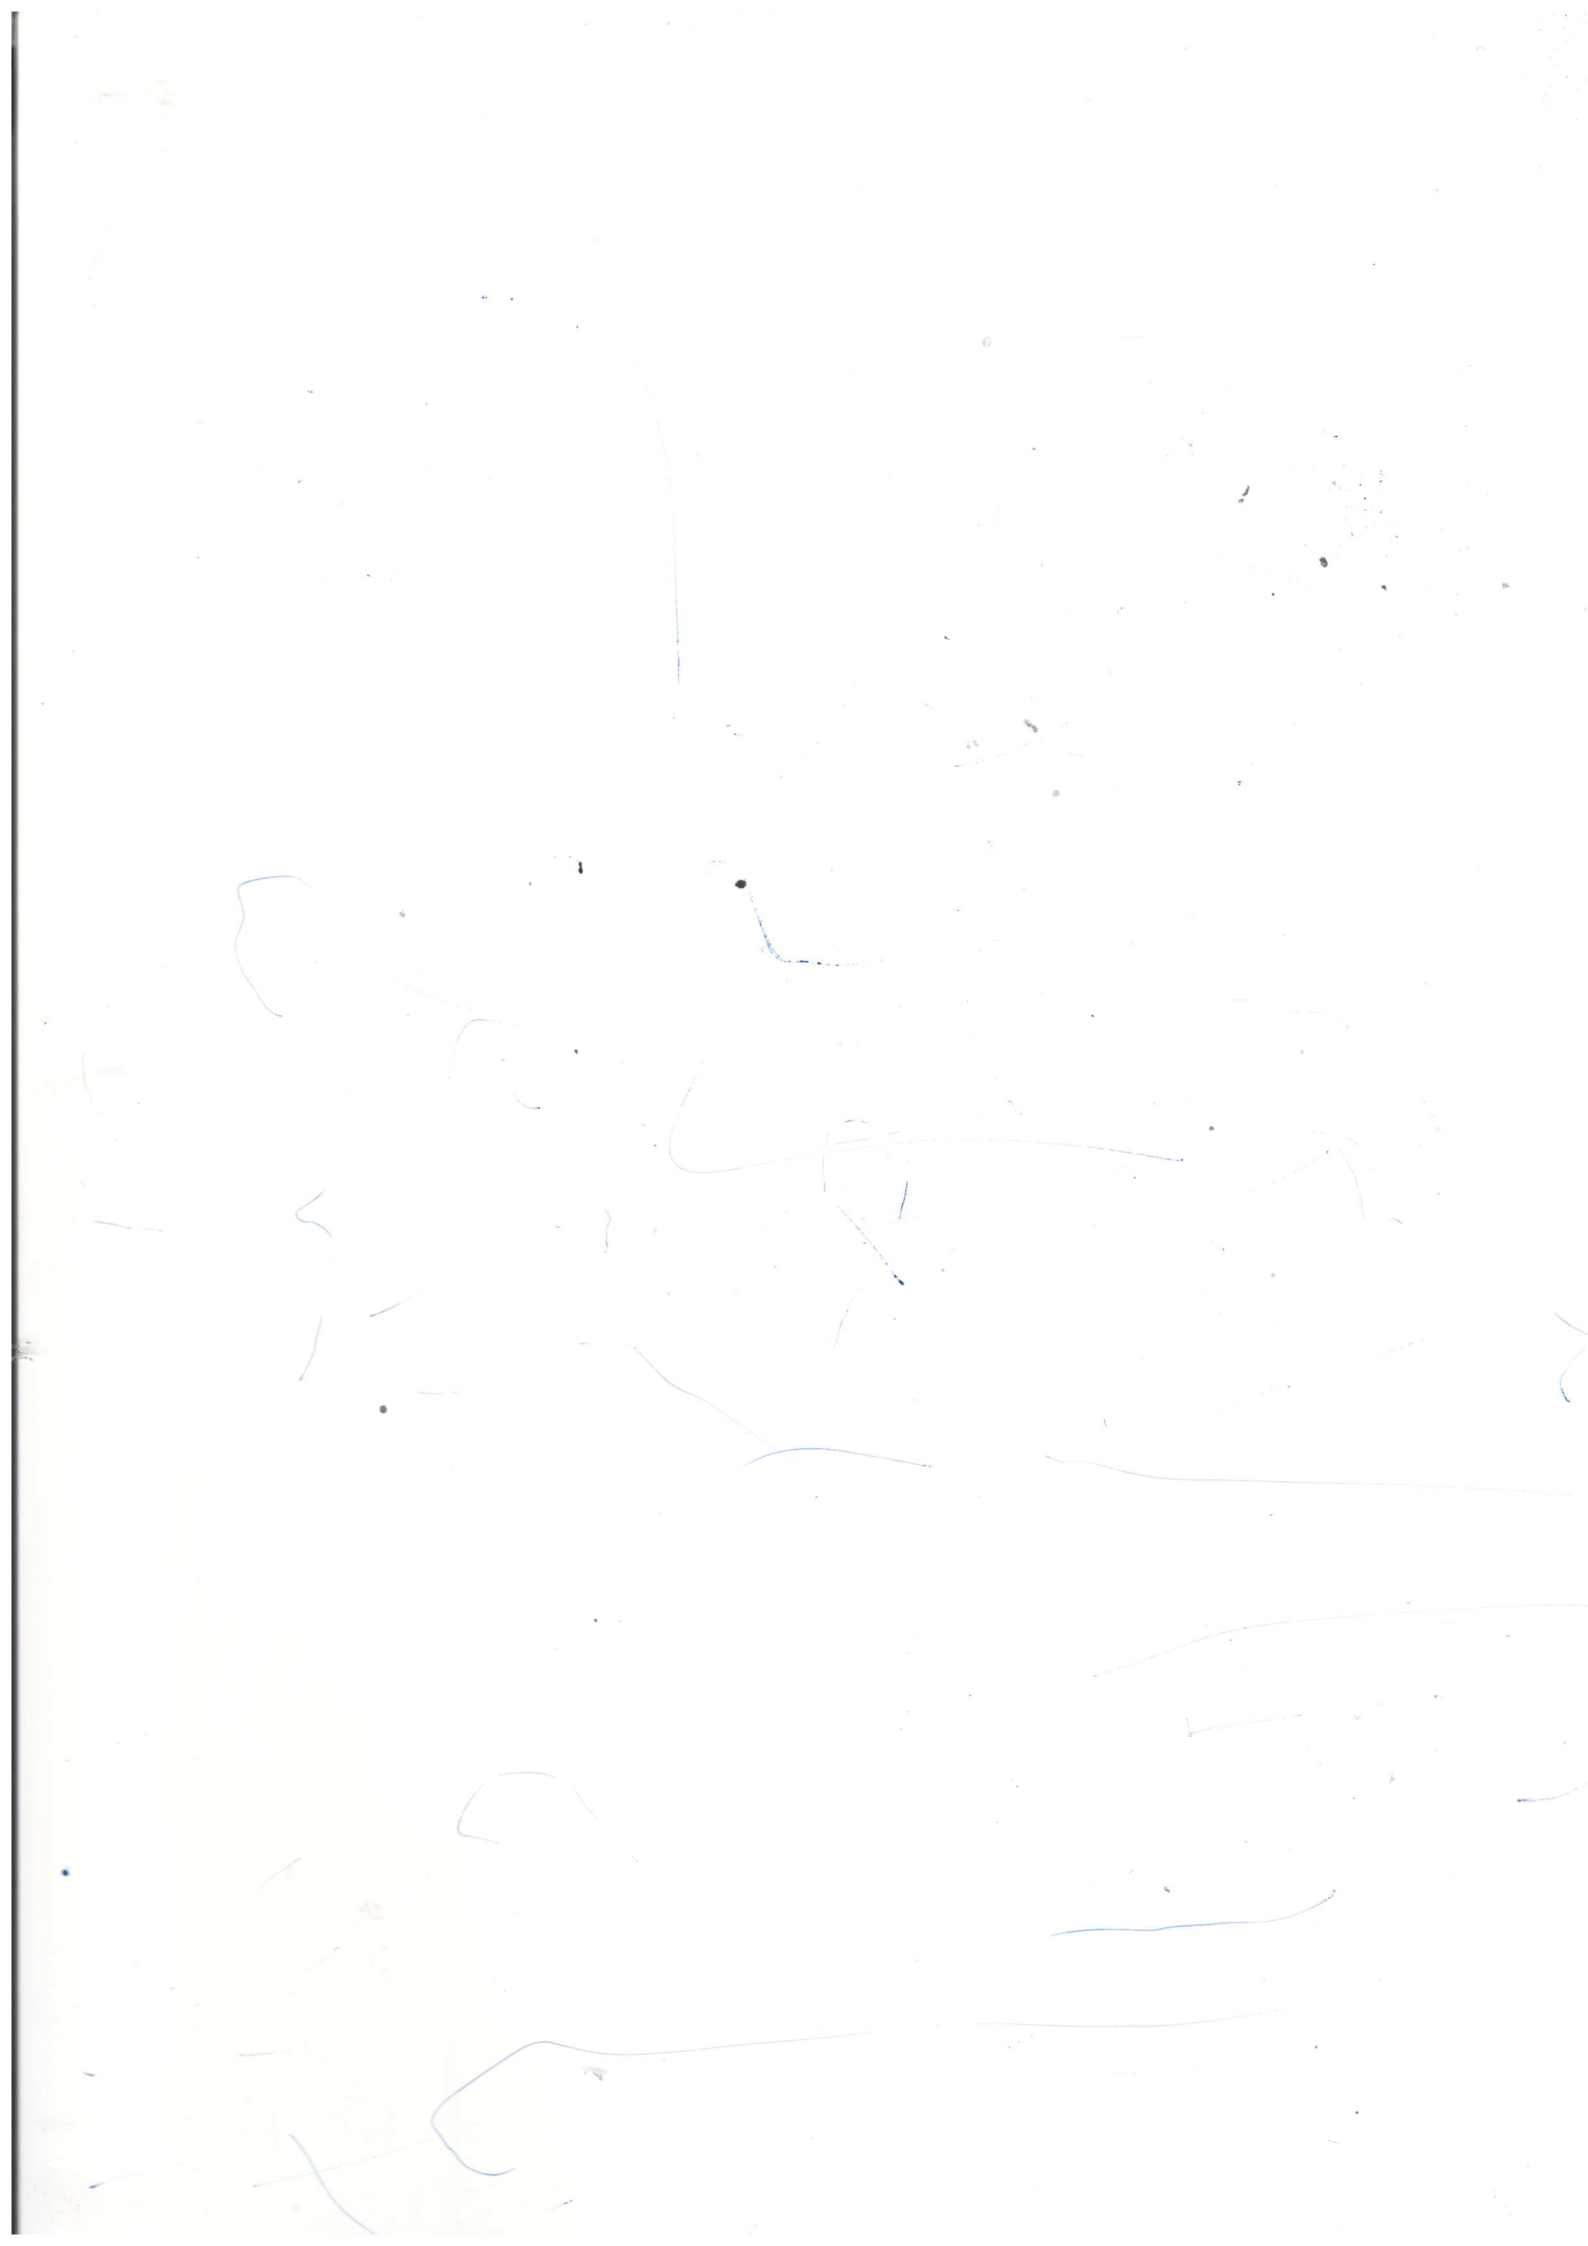

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32

Privind achiziția lucrări/servicii de valoare mică

Achiziționarea Construcția stadionului de mini-fotbal din s. Cîrnăteni Noi, raionul Căușeni

23 august 2023

s. Cîrnăteni Noi

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocde-b3wdp1-MD-1692166652163

, din data de 16.08.2023

între **Primăria com. Cîrnăteni Noi,**

(denumirea autorității contractante)

s. Cîrnăteni Noi, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 98, telefon: 024364236,

(localitatea)

IDNO 1007601006221 **reprezentat de Primar Braga Andrei,**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **„VISOM CONS” SRL,**

(denumirea operatorului economic)

Mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bic str. Grădinarilor 131 A, telefon: 060-10-12-12,068-11-04-06

(localitatea)

IDNO 1020600017616, autorizat pentru activitatea în construcții: 2825/231 din 26.07.2023. Aviz din 26.07.2023, eliberată de ***Agenția pentru Supraveghere Tehnică de pe lângă Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova***, pe un termen de 3 ani (trei ani), pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, Instalații și rețele tehnico-edilitare, restructurii reprezentat de **Administrator Mosneaga Olesia**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Achiziționarea Construcția stadionului de mini-fotbal din s. Cîrnăteni Noi, raionul Căușeni**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 zile calendaristice** de la primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților, or executarea lor în asemenea condiții se va răsfrânge asupra calității lucrărilor);
- c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finisarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție a lucrărilor. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor **constituie 5 ani din momentul recepționării lucrărilor.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **378180.00 lei (Trei sute șaptezeci opt mii una suta optzeci lei, 00 bani)lei MD, inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de până la 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturilor finale se va face în termen de 15 zile de la prezentarea lor la Beneficiar.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până la prezentarea la Beneficiar a procesului-verbal de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta pentru consultare la necesitate de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin din cauza lipsei acestor documente.

4.7. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.8. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.9. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4.10. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.11. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.12. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.14. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.15. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afară cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.17. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.18. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

4.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.22. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.23. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. FORȚA DE MUNCĂ

6.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

6.2. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

7.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

7.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

7.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

7.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

7.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

7.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

7.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.

7.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

7.9. Antreprenorul începe lucrările după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

8. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

8.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci) ani**.

8.2. Perioada de garanție începe de la data recepției finisării lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

8.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

9. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

9.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

9.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

9.3. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

9.4. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

9.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

9.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

9.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

9.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

11. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

11.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute din cauza unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

11.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Antreprenorul notifică Beneficiarul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

11.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 11.1 și 11.2 din prezentul contract.

11.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

11.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează a fi plătite în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

11.6. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

Anexa nr. 1 la contractul nr. 32 din 23 august 2023:

a) Propunerea tehnică;

Anexa nr. 2 la contractul nr. 32 din 23 august 2023:

b) Propunerea financiară

12.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

12.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților.

12.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la 23.08.2023, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Digitally signed by Gavrilan Silvia
Date: 2023.08.24 16:15:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ANTREPRENORUL	BENEFICIARUL
Denumirea: SRL „VISOM CONS“	Denumirea: Primaria com. Cîrnateni Noi
Adresa poștală: <u>ID-2081 Mun. Chișinău com. Bubuieci s. Bic str. Grădinarilor 131 A</u>	Adresa poștală: MD-7717, s. Cîrnateni Noi, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 98
Telefon: 060101212, 068110406	Telefon: 024364236, 068435753, contabilitatea – 067174243
IBAN: MD88VI022241100000849MDL	IBAN: M77TRPDAF319220D11068AE
Cod fiscal: 1020600017616	Cod fiscal: 1007601006221
Banca: BC „VICTORIABANK” SA, fil 11 Chișinău, VICBMD2X883 Cod TVA: 0611593	Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, TREZMD2X
Adresa poștală a băncii: Or. Chișinău	Adresa poștală a băncii: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
ANTREPRENOR Digitally signed by Mosneaga Olesia Date: 2023.08.23 15:52:39 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova Administrator SRL „Visom Cons“	BENEFICIAR Primar Primarii com. Cîrnateni Noi
Mosneaga Olesia	Digitally signed by Braga Andrei Date: 2023.08.23 15:29:40 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova Braga Andrei

