



Nr.1480/19
din 11 septembrie 2019

Primăria mun.Bălți

Vă prezentăm Raportul de Verificare nr.1480/19 la proiectul de execuție, la obiectul nr. 19-54 – AE, D

„Reparația capitală a rețelei de alimentare cu apă din str.Soroca (de la blocul locativ nr.11 pînă la blocul locativ nr.59), mun.Bălți”.

Anexă: Raportul de verificare – 2 file.

Administrator



EVTODIEVA Irina

Raport de verificare nr.1480/19

la proiectul de execuție

„Reparația capitală a rețelei de alimentare cu apă din str.Soroca (de la blocul locativ nr.11 pînă la blocul locativ nr.59), mun.Bălți”.**1. Beneficiar:** Primăria mun.Bălți.**2. Proiectant:** BAS ÎM mun.Bălți (licența s.AMMII nr.023955 din 02.03.07);**Autori:** IȘP, sp.pr.AE – lu.Galușco (cert.nr.1223),

Devizier – E.Rusnac.

3. Baza de proiectare:

- tema de proiectare;
- certificat de urbanism pentru proiectare nr.381 din 30.07.2019, eliberat de Primăria mun.Bălți;
- aviz de racordare;
- Lista volumelor de lucrări necesare spre executare confirmate de către BAS ÎM mun.Bălți.

4. Date privind verificarea documentației de proiect.

Verificarea documentației de proiect s-a efectuat de verificatori atestați în următoarea componență:

L.Niculița (cert.nr.171) – Rețele de apeduct;

V.Evtodiev (cert.nr.146) – Devize.

5. Date generale.**5.1. Condiții de amplasament.**

Amplasamentul proiectat este situat în intravilanul mun.Bălți, str.Soroca.

Seismicitatea de calcul a amplasamentului – 7 grade.

5.2. Rețele de apeduct.

Alimentarea cu apă se prevede din apeductului existent Ø100 mm din str.Soroca. racordarea se efectueaza în căminele existente. Rețelele proiectate se execută din țevi de polietilenă SDR17 PN10 Ø110 mm pozate în țevile existente de oțel Ø300 mm.

Stingerea incendiului exterior se prevede din hidranții existenți, consumul de calcul – 10l/sec.

Căminele de vane sunt prevăzute conform proiectului-tip 901-09.11.84 din elemente prefabricate de beton armat.

5.3. Devize.

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CPL.01-01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **549,95 mii lei**.

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază: hidranți antiincendiu 4,0 buc, conducte din polietilenă 832,0 m, îmbinări cu flanșe 84,0 buc, spălarea țevilor 832,0 m, proba de presiune 832,0 m, racordarea la conducta existentă 81,0 buc, etc.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului III, 2019 (prețuri de piață), normelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

6. Date privind rezultatele verificării documentației de proiect.

În urma verificării documentației de proiect obiecțiile și propunerile făcute de verificatori au fost transmise proiectantului, care a operat în proiect modificările necesare.

La faza finală documentația de proiect s-a ștampilat de verificatori atestați în ordinea stabilită.

7. Concluzii.


Ca urmare, proiectul de execuție „**Reparația capitală a rețelei de alimentare cu apă din str.Soroca (de la blocul locativ nr.11 pînă la blocul locativ nr.59), mun.Bălți**” (soluții de apeduct și devize) se recomandă pentru aprobare cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA20% în sumă de **549,95 mii lei**, inclusiv **512,09 mii lei** – lucrări construcții-montaj.

Verificator



Liudmila Niculița

Verificator

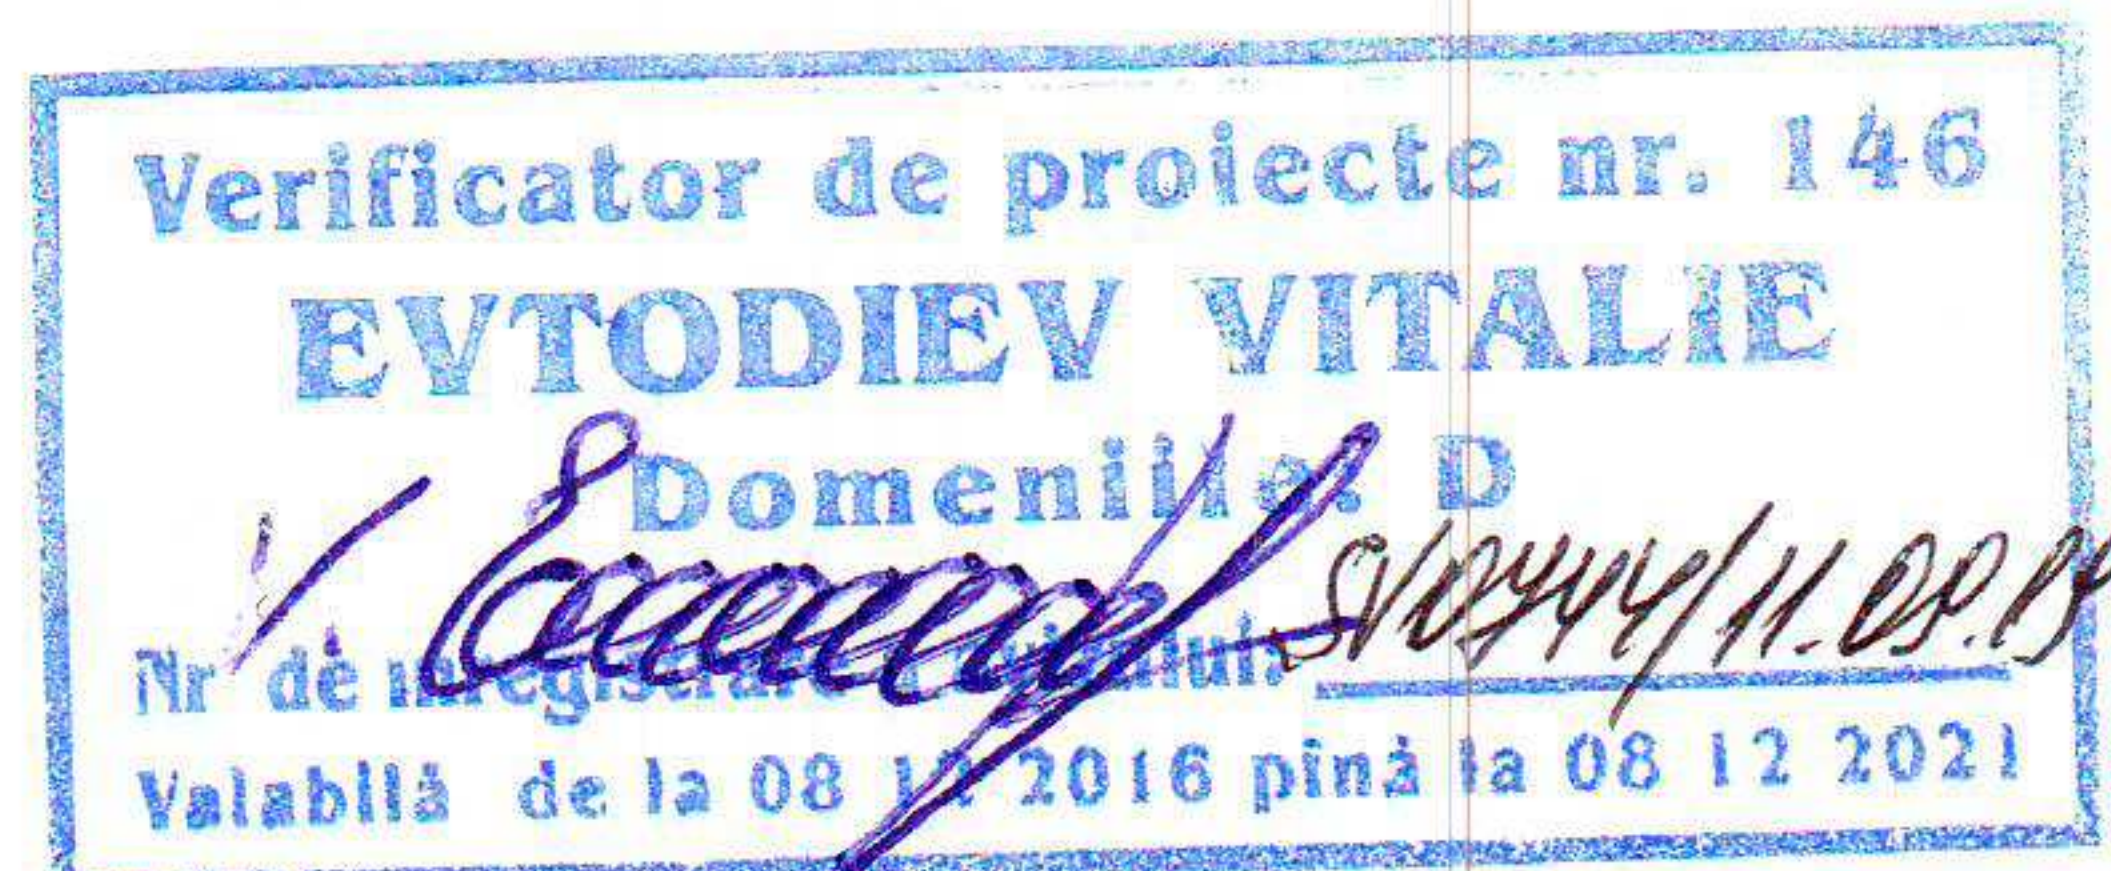

Vitalie Evtodiev
