

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
în luna octombrie 2023

Beneficiar: Consiliul raional Nisporeni

Cod fiscal 1007601004788

Antreprenor: SRL "Trans Invest Group"

Cod fiscal 1017600052299

Contract Nr. 37 din 17 iulie 2023

Denumirea obiectivului executat și adresa:

„Servicii de întreținere de rutină a drumurilor publice
locale din raionul Nisporeni”

Denumirea obiectelor categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv: lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	608 654,00	165 642,75	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	121 730,80	33 128,55	
TOTAL general	730 384,80	198 771,30	

Antreprenor:


SRL "Trans Invest Group"

Administrator Ion Popa

Beneficiar:

Consiliul raional Călărași

Președinte Vasile Mărcuță

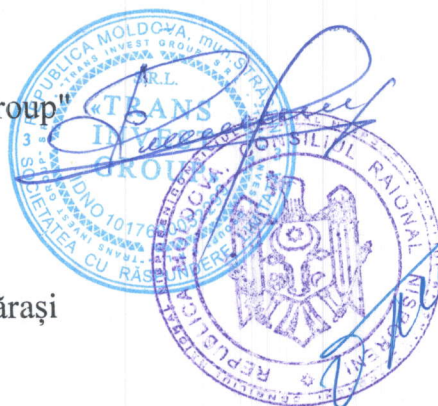

Antreprenor SRL „Trans Invest Group”
 (denumirea)

Investitor Consiliul Raional Nisporeni
 (denumirea)

Obiect Servicii de intretinere de rutina a drumurilor
 publice locale din raionul Nisporeni

Valoarea lucrarilor executate **198 771,30 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe luna octombrie 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Intretinerea imbracamintei						
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	159,87	276,90 34,98	44 267,40 5 592,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 267,40 5 592,25
2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris						
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	10,00	605,00 0,00	6 050,00 0,00
3	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	16,00	1 949,76 334,80	31 196,16 5 356,80
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	8,00	3 982,41 334,80	31 859,28 2 678,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				69 105,44 8 035,20
3. Intretinerea platformei drumului						
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	40,00	319,00 0,00	12 760,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 760,00

1	2	3	4	5	6	7	
		4. Asigurarea esteticii rutiere					
6	RpDB39 A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	10,00	315,00 75,00	3 150,00 750,00	
7	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,00	735,40 65,40	4 412,40 392,40	
8	DF53A	Vopsirea stlpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatonale	buc	6,00	29,51 16,80	177,08 100,80	
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	8,00	1 036,00 26,40	8 288,00 211,20	
10	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	40,00	42,35 0,00	1 694,00 0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 721,48 1 454,40	

	Total	lei	143 854,32
	Asigurari sociale	24 %	3 619,64
	Total		147 473,96
	Cheltuieli de regie	8 %	11 797,92
	Total		159 271,88
	Beneficiu de deviz	4 %	6 370,87
	Total		165 642,75
	TVA	20 %	33 128,55
			198 771,30
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		15 081,85

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL „Trans Invest Group”
(denumirea)

Adminstrator Ion Popa
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diriginte de șantier

A. Lîsenco

APROBAT:

Investitor
Consiliul Raional Nisporeni
(denumirea)

Președinte Vasile Mărcuță
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

**Obiect Servicii de intretinere de rutina a
drumurilor publice locale din raionul Nisporeni**
Investitor Consiliul Raional Nisporeni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea imbracamintei				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			276,90
						34,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	60,00	34,98
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	25,20	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 835,00	211,02
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 000,00	7,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	300,00	18,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	20,00	1,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	20,00	0,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	210,00	1,68
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	300,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 267,39
		2. Intretinerea imbracamintei rutiere din pietris				
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km			605,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	550,00	605,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 050,00
3	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2			1 949,76
						334,80
	7129020012800	Pavator	h-om	5,580	60,00	334,80
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,150	360,00	414,00
	1212121212121	apa	m3	2,500	25,20	63,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,140	350,00	749,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	150,00	123,30
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,350	300,00	105,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	210,00	14,91
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,265	550,00	145,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 196,16
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 982,41
						334,80
	7129020012800	Pavator	h-om	5,580	60,00	334,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,150	360,00	414,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,500	360,00	1 980,00
	1212121212121	apa	m3	2,500	25,20	63,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,300	300,00	90,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	210,00	14,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,140	350,00	749,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	150,00	123,30
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,388	550,00	213,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 859,28
		3. Intretinerea platformei drumului				

1	2	3	4	5	6	7
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			319,00
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	550,00	319,00
		Cheltuieli directe	lei			12 760,00
		4. Asigurarea esteticii rutiere				
6	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora			315,00
						75,00
	7124030010900	Drumar	h-om	1,250	60,00	75,00
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,200	200,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			3 150,00
7	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			735,40
						65,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330	60,00	19,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760	60,00	45,60
	2663102100000	Beton	m3	0,100	1 200,00	120,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,000	550,00	550,00
		Cheltuieli directe	lei			4 412,40
8	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatonale	buc			29,51
						16,80
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,280	60,00	16,80
	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,0294	62,50	1,84
	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,132	62,50	8,25
	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,042	62,50	2,62
		Cheltuieli directe	lei			177,08
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			1 036,00
						26,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	60,00	13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	60,00	13,20
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	60,00	1,20
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	60,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			8 288,00
10	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			42,35
						0,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,077	550,00	42,35
		Cheltuieli directe	lei			1 694,00

APROBAT:

Intocmit
SRL „Trans Invest Group”

Investitor
Consiliul rational Nisporeni

Administrator

Ion Popa

Preşedinte

Vasile Mărcuţa

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)



Servicii de intretinere de rutina a drumurilor publice locale din raionul Nisporeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 198 771,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,98	60,00	118,800
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,76	60,00	105,600
3.	7124030010900	Drumar	h-om	12,50	60,00	750,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	133,92	60,00	8 035,200
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	93,204	60,00	5 592,253
6.	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,68	60,00	100,800
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,32	60,00	379,200
Total manopera						15 081,85

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	60,00	25,20	1 512,00
2.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,40	360,00	6 624,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	44,00	360,00	15 840,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,20	360,00	3 312,00
5.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	18,385	1 835,00	33 736,58
6.	23203226001101	Bitum	t	0,096	12 000,00	1 151,06
7.	24301161032182	Vopsea de ulei	kg	0,252	62,50	15,75
8.	24301161032201	Vopsea neagra	kg	0,176	62,50	11,03
9.	24301261032201	Vopsea alba	kg	0,792	62,50	49,50
10.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	8,00	1 000,00	8 000,00
11.	2663102100000	Beton	m3	0,60	1 200,00	720,00
12.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	6,00	550,00	3 300,00
13.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,00	0,50	8,00
14.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,00	0,50	16,00
15.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,00	0,50	8,00
16.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,32	60,00	19,20
17.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,16	60,00	9,60
18.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,00	0,50	16,00
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,959	25,20	24,17
Total materiale de constructii						74 372,89

Utilaje de constructii:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	7,994	20,00	159,87
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	9,592	300,00	2 877,66
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	30,544	550,00	16 799,20
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,08	550,00	7 744,00
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	19,728	150,00	2 959,20
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	51,36	350,00	17 976,00
7.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	9,592	20,00	191,84
8.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,279	20,00	25,58
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,704	210,00	357,84
10.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,279	210,00	268,58
11.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	12,00	200,00	2 400,00
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,799	300,00	239,81
13.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	8,00	300,00	2 400,00
Total utilaje de constructii						54 399,58

Total	lei	143 854,32
Asigurari sociale	24 %	3 619,64
Total		147 473,96
Cheltuieli de regie	8 %	11 797,92
Total		159 271,88
Beneficiu de deviz	4 %	6 370,87
Total		165 642,75
TVA	20 %	33 128,55

Total deviz:**198 771,30**

Intocmit

Verificat



Director Popo Ion Traian
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
