



KRAFT

Formular tipizat
Anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor
al Republicii Moldova nr.118 din 28.08.2017

Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов
Республики Молдова № 118 от 28.08.2017 г.

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

AAM 3663758



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		10.12.2021 / 10.12.2021		8. Foala de parcurs Путевой лист		seria серия		număr: номер		data дата													
1. Furnizor: Поставщик		Kraft Constructions SRL, adr. mun.Chisinau, str.Albisoara 84/6, IBAN MD22EN00002224110980895, B.C.'ENERGBANK'S.A. fil. 'Centru' Chisinau, BIC ENEGMD22895		9. Transportator Перевозчик		Kraft Constructions SRL, mun.Chisinau, str.Albisoara 84/6		c.f. / nr. TVA ф.к. / код НДС		1020600027411 / 0611157													
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		Edilitate SA, adr. Chisinau, str.Vadul lui Voda 5, IBAN MD32ML00000002251834188, BC'Moldindconbank'S.A., BIC MOLDM2X						c.f. / nr. TVA ф.к. / код НДС		1003600045544 / 0200122													
3. Delegație Доверенность		data дата		delegatul делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces-Verbal 12.2021													
5. Punct încărcare Пункт погрузки		Chisinau		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		Chisinau		7. Redirijări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de măsură Единица изме- рения		10.3 Cantitatea mărfurilor/active- lor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
1. Lucrari de reparatie curenta in curtile blocurilor de locuit din ctorul Ciocana, mun.Chisinau str.Ginta Latina 21,21/1, 21/2. ntract nr.64 din 11.10.2021		serv		1,00		1 726 885,44		1 726 885,44		20%		345 377,09		2 072 262,53									
11. TOTAL (pe pagină) /		Всего (по странице)				1 726 885,44		x		345 377,09		2 072 262,53		x		x		x					
12. TOTAL (pe factura fiscală) /		Всего (по налоговой накладной)				1 726 885,44		x		345 377,09		2 072 262,53		x		x		x					
13. Permis eliberarea Отпуск/разрешил		Contabil-sef, Alupi I.		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись																			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile) Сдал товары/активы (услуги)		Contabil-sef, Alupi I.		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись																			
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посреднику (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись																			
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдал товары/активы посреднику (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись																			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись																L.Ș M.П.			





Subantreprenor **"Kraft Construcțiuni" S.R.L.**

(denumirea)

Antreprenor
 general

Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.

(denumirea)

Obiect

**Lucrări de reparație curentă în curțile blocurilor de locuit din
 sectorul Ciocana, mun. Chișinău (str.Ginta Latina, nr. 21; 21/1; 21/2)**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **decembrie** an **2021**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. str. G. Latina, 21, 21/1, 21/2					
1	DI18G	Buldoexcavator	h-ut	220,000	358,33 0,00	78 832,60 0,00	
2	DI18G	Freza W-350 (3674m2)	h-ut	123,188	334,92 0,00	41 258,12 0,00	
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	543,400	64,00 64,00	34 777,60 34 777,60	
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	543,400	19,76 0,00	10 737,58 0,00	
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	992,000	173,62 39,21	172 231,04 38 896,32	
m	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	380,000	107,36 17,30	40 796,80 6 574,00	
6	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1 247,156	39,78 39,78	49 611,87 49 611,87	

1	2	3	4	5	6	7
7	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	1,440	441,09 <hr/> 243,32	635,17 <hr/> 350,38
8	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc	62,000	259,56 <hr/> 72,65	16 092,72 <hr/> 4 504,30
10	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,800	1 109,69 <hr/> 259,47	5 326,51 <hr/> 1 245,46
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	428,020	327,25 <hr/> 80,72	140 069,54 <hr/> 34 549,77
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,376	7 490,15 <hr/> 0,00	25 286,75 <hr/> 0,00
13	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	114,000	1 200,00 <hr/> 32,64	136 800,00 <hr/> 3 720,96
14	RpDB22F	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic (3 675m2)	t	428,875	1 254,87 <hr/> 46,70	538 182,37 <hr/> 20 028,46
15	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	773,179	140,32 <hr/> 8,65	108 492,48 <hr/> 6 688,00

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (tr.)				
16	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (parcare)	m2	181,000	140,32 8,65	25 397,92 1 565,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 424 529,07 202 521,77

	Total	lei	1 424 529,07
	Fondul social si asigurarea medicala	24 %	48 605,22
	Cheltuieli de transport	7 %	72 107,93
	Cheltuieli directe		1 545 242,22
	Cheltuieli de regie	8,5 %	131 345,59
	Total		1 676 587,81
	Beneficiu de deviz	3 %	50 297,63
	Total		1 726 885,44
	TVA	20 %	345 377,09
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 072 262,53 202 521,77

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor

Antreprenor general

"Kraft Constructions" S.R.L.

Firma de constructie a drumurilor "Edilitate" S.A.

(denumirea)

(denumirea)

Administrator

Sergiu Marcu

Diriginte de santier

Igor Bulbaş


(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.



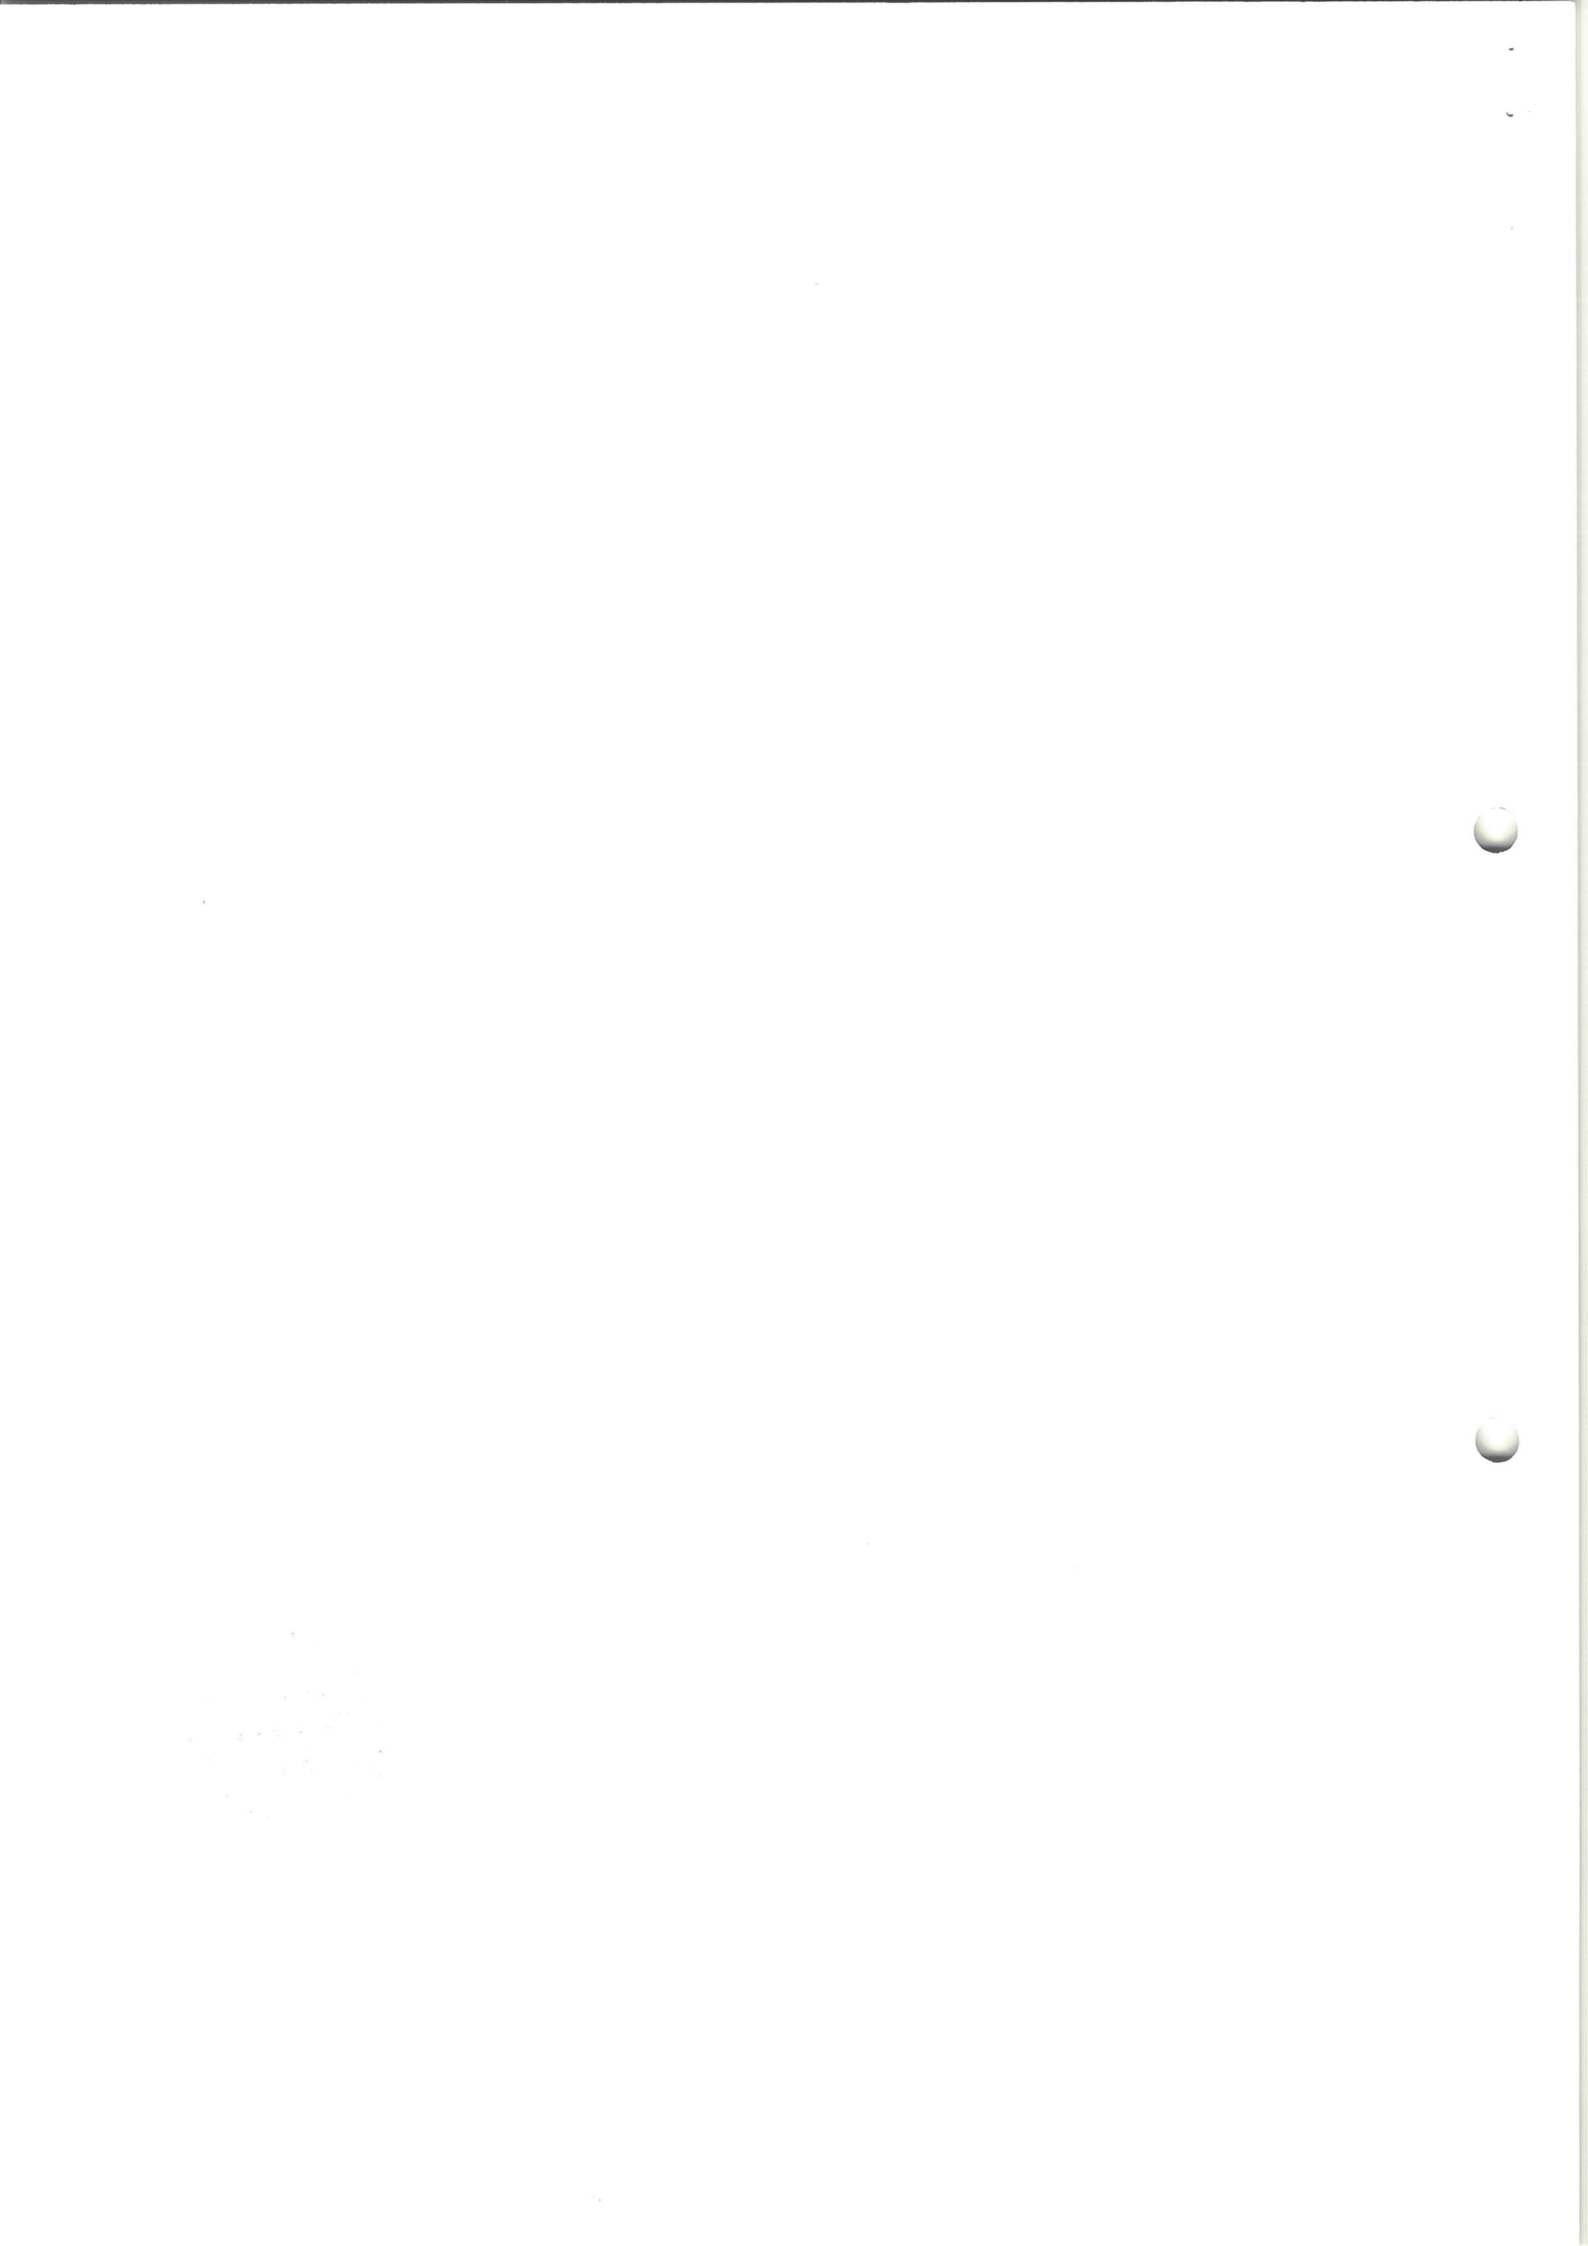

**Obiect Lucrări de reparație curentă în curțile
blocurilor de locuit din sectorul Ciocana,
mun. Chișinău**

**Antreprenor general Firma de construcție a
drumurilor "Edilitate" S.A.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. G. Latina, 21, 21/1, 21/2				
1	DI18G	Buldoexcavator	h-ut			358,33
	29522200035461	Buldoexcavator	h-ut	1,0000	358,33	358,33
2	DI18G	Freza W-350 (3674m2)	h-ut			334,92
	2952220003546	Freza W-350	h-ut	1,0000	334,92	334,92
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			19,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	260,01	19,76
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			173,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	829,48	43,96
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	1,0050	90,00	90,45
m	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			107,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	829,48	39,82
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	50,00	50,25
6	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			39,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,66	39,78
7	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			441,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	57,66	243,32
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	220,71	176,57
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	26,50	21,20
8	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea	buc			259,56

1	2	3	4	5	6	7
		medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa				72,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6600	57,66	38,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2640112300739	Caramizi	buc	49,142857	3,25	159,71
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,034285	793,05	27,19
10	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 109,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	829,48	850,22
11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			327,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (agregat grosier 32/63 mm)	m3	1,2700	169,33	215,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,70	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	171,78	29,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	189,73	0,95
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 490,15
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 241,41	7 458,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	105,00	31,50
13	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 200,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	57,66	32,64
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	1 099,75	1 110,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	171,78	13,90
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	321,18	42,72
14	RpDB22F	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic (3 675m2)	t			1 254,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6200	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	1,0030	1 099,75	1 114,08
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,000529	7 241,41	3,87
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,1400	542,16	75,90
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,08278	171,78	14,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0007	105,00	0,07
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	20,00	0,02
15	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (tr.)	m2			140,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 099,75	129,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	171,78	2,45
16	DB16D k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (parcare)	m2			140,32
						8,65

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 099,75	129,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	171,78	2,45

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


L.S.



**Investitor
I. Orlovscaia**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S. S.A.

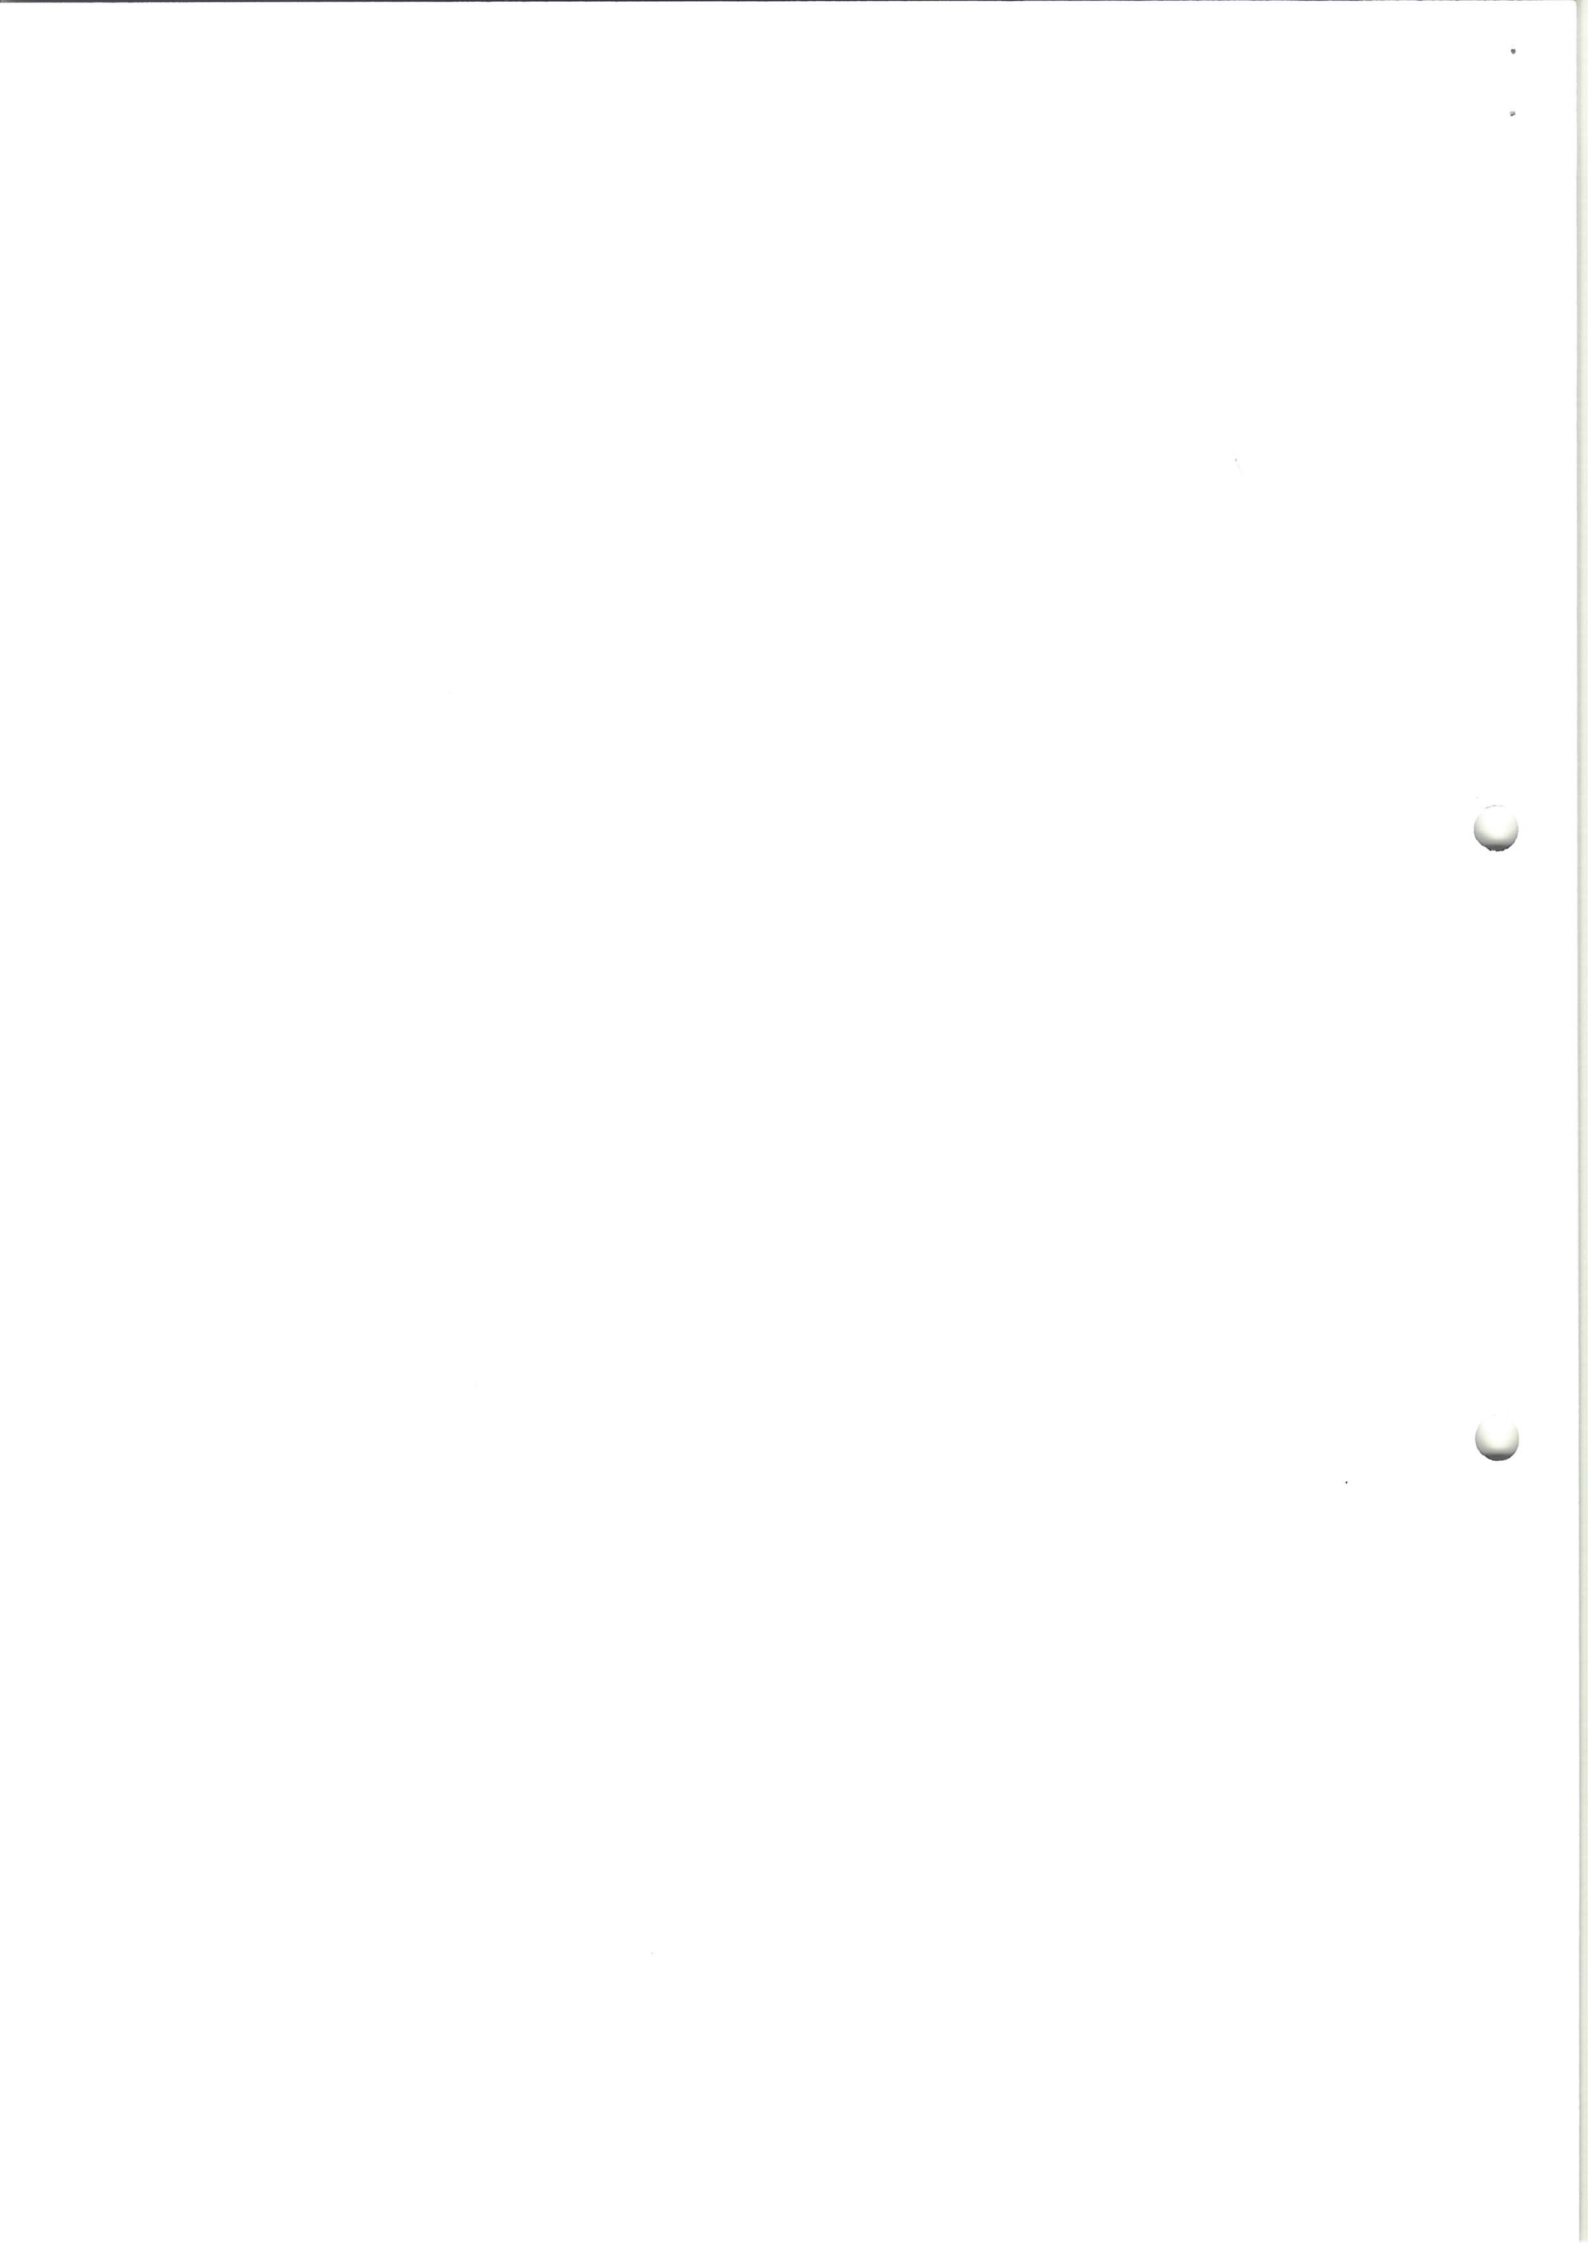

**Lucrări de reparație curentă în curțile blocurilor de locuit
din sectorul Ciocana, mun. Chișinău**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 2 072 262,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	40,9284	57,66	2 359,93
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,6800	57,66	1 134,75
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 173,5480	57,66	67 666,78
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	446,2293	57,66	25 729,58
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	823,4908	57,66	47 482,48
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	943,9438	57,66	54 427,80
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	64,5240	57,66	3 720,45
Total manopera						202 521,77

Materiale:

1.	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	434,4632	1 099,75	477 800,90
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	115,1400	1 099,75	126 625,22
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	112,1160	1 099,75	123 299,57
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm (agregat grosier 32/63 mm)	m3	543,5854	169,33	92 045,32
5.	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,2291	7 241,41	1 659,01
6.	23203226000401	Bitum	t	3,4773	7 241,41	25 180,55
7.	2640112300739	Caramizi	buc	3 046,8571	3,25	9 902,29
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	75,7360	829,48	62 821,50
9.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	2,1257	793,05	1 685,79
10.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	996,9600	90,00	89 726,40
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	381,9000	50,00	19 095,00
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	21,4010	12,70	271,79
Total materiale de construcții						1 030 113,34

Utilaje de construcții:


1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,1520	220,71	254,26
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,3130	105,00	137,86
3.	2952220003546	Freza W-350	h-ut	123,1880	334,92	41 258,12
4.	29522200035461	Buldoexcavator	h-ut	220,0000	358,33	78 832,60
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	63,4854	171,78	10 905,53

6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15,1620	321,18	4 869,73
7.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	60,0425	171,78	10 314,10
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,2226	171,78	1 584,26
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	60,0425	542,16	32 552,64
10.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,5146	20,00	10,29
11.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,1520	26,50	30,53
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	41,2984	260,01	10 738,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1401	189,73	406,04
Total utilaje de construcții						191 893,96

Total	lei	1 424 529,07
Fondul social si asigurarea medicala	24 %	48 605,22
Cheltuieli de transport	7 %	72 107,93
Cheltuieli directe		1 545 242,22
Cheltuieli de regie	8,5 %	131 345,59
Total		1 676 587,81
Beneficiu de deviz	3 %	50 297,63
Total		1 726 885,44
TVA	20 %	345 377,09

Total deviz:

2 072 262,53



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I. Orlovscia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
