

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

IV4456063



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		26.03.2019 / 26.03.2019		8. Foaia de parcurs seria: număr: Путевой лист серия номер		data: дата						
1. Furnizor: FCP SOLDI S.R.L.; m.Chisinau BD.Decebal 80 ap.14 MD-2038; MD-2023; VICBMD2X500 Поставщик В.С. 'VICTORIABANK' S.A. fil. N30 Chisinau, MD44VI000000222483019MDL MDL		9. Transportator Перевозчик		FCP SOLDI S.R.L.		c.f./ nr.TVA 1002600027435 / ф.к./код НДС 0300375						
2. Cumpărător: Primaria Cojusna raionul Straseni; 023742406; MD70TRPDAU319230H10718AC, MDL, TREZMD2X, Покупатель Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat						c.f./ nr.TVA 1010601000025 / ф.к./код НДС						
3. Delegație Доверенность		data дата		delegatul елегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы						
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun. Chisinau zRETELE (constructia apeduct)		6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки					
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului		10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor	10.4 Preț unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA, %	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea mărfurilor/ activelor, serviciilor, lei	10.9 Altă informație	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr r locuri	10.12 Masa brută, tone
Lucrari de constr. la Complexul instal. de debitare a apei p/u aproviz.s. Cojusna, r-ul Straseni					957 301,00	20	191 460,00	1 148 761,00				
Lucrari de constr. la Complexul instal. de debitare a apei p/u aproviz.s. Cojusna, r-ul Straseni					32 760,00	20	6 552,00	39 312,00				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)					990 061,00	x	198 012,00	1 188 073,00	x	x	x	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					990 061,00	x	198 012,00	1 188 073,00	x	x	x	
13. Permis eliberarea:		Director firma, Lisii Alexandru		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat mărfurile/activele (serviciile):		Director firma, Lisii Alexandru		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись										
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись										
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/ beneficiarul:		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись										

L.Ș.
M.П.

Antreprenor FCP "Soldi" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Cojusna, r. Straseni
 (denumirea)

Obiect **Complexul instalatiilor de
 debitare a apei pentru
 aprovizionarea cu apa a s.
 Cojusna r-nul Straseni**

Valoarea lucrarilor executate **39 312 lei**

Proces - verbal

Deviz local de resurse № 1
 Pichetarea axelor retelei de apa

de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 2019


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	0001	Pichetarea axelor retelei de apa (L= 9100m.l)	set	1,00	32 760,00	32 760,00
					0,00	0,00
		Total	lei			32 760 <i>u</i>
		TVA	20,00 %			6 552 <i>u</i>
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				39 312 <i>w</i>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
 FCP "Soldi" SRL

(denumirea)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)

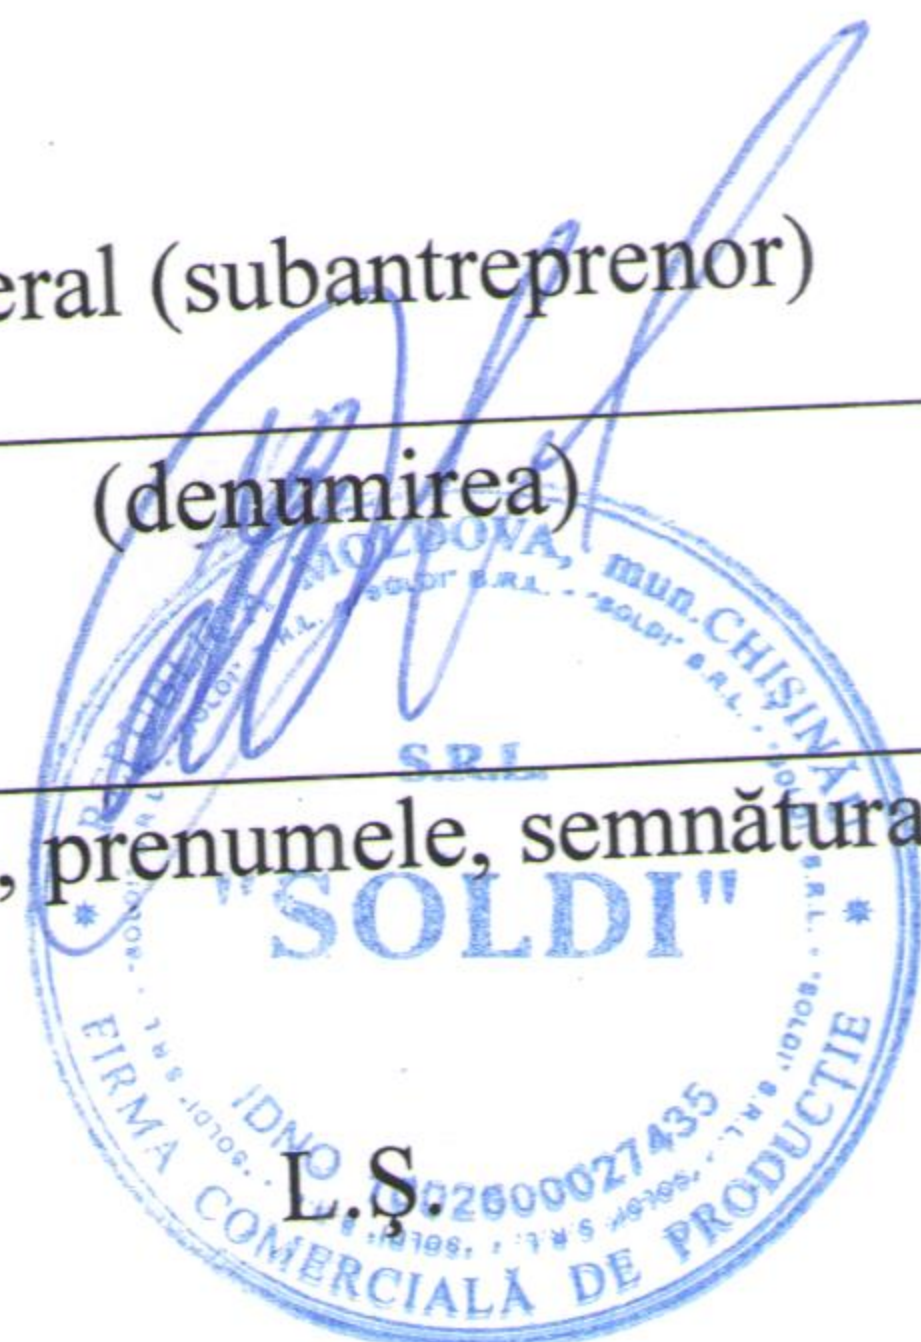

Investitor
 Primaria Cojusna, r. Straseni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

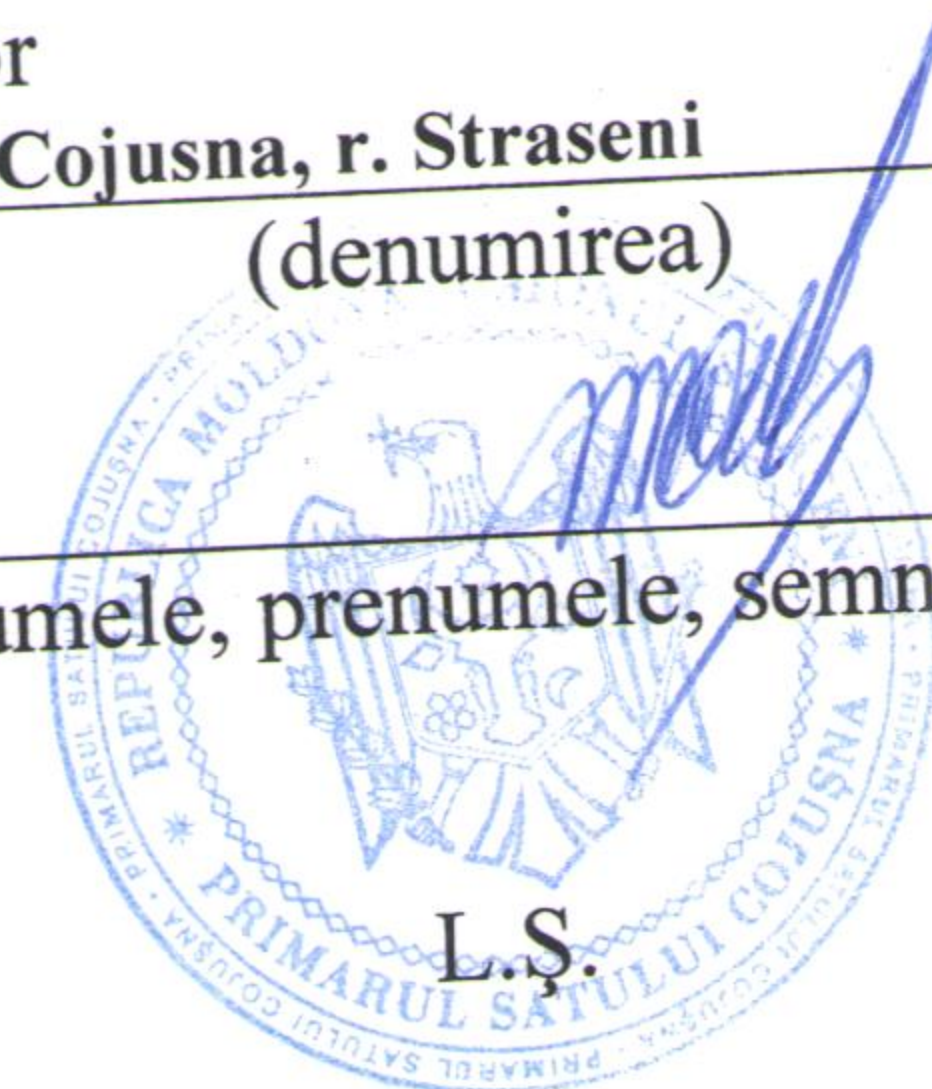

2	3	4	5	6	7
	patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I				
	Total capitol: Inclusiv salariu				792 344,42 31 086,03
	<i>Total</i>	lei			826 973,08
	<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,00 %			12 142,15
	<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			29 498,40
	<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			868 613,63
	<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			60 802,95
	<i>Total</i>	100,00 +			929 416,58
	<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			27 882,50
	Total capitol: Inclusiv salariu				957 299,08 44 970,93


	Total	lei	957 301
	TVA	20,00 %	191 460
			1 148 761
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		44 972

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
FCP "Soldi" SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

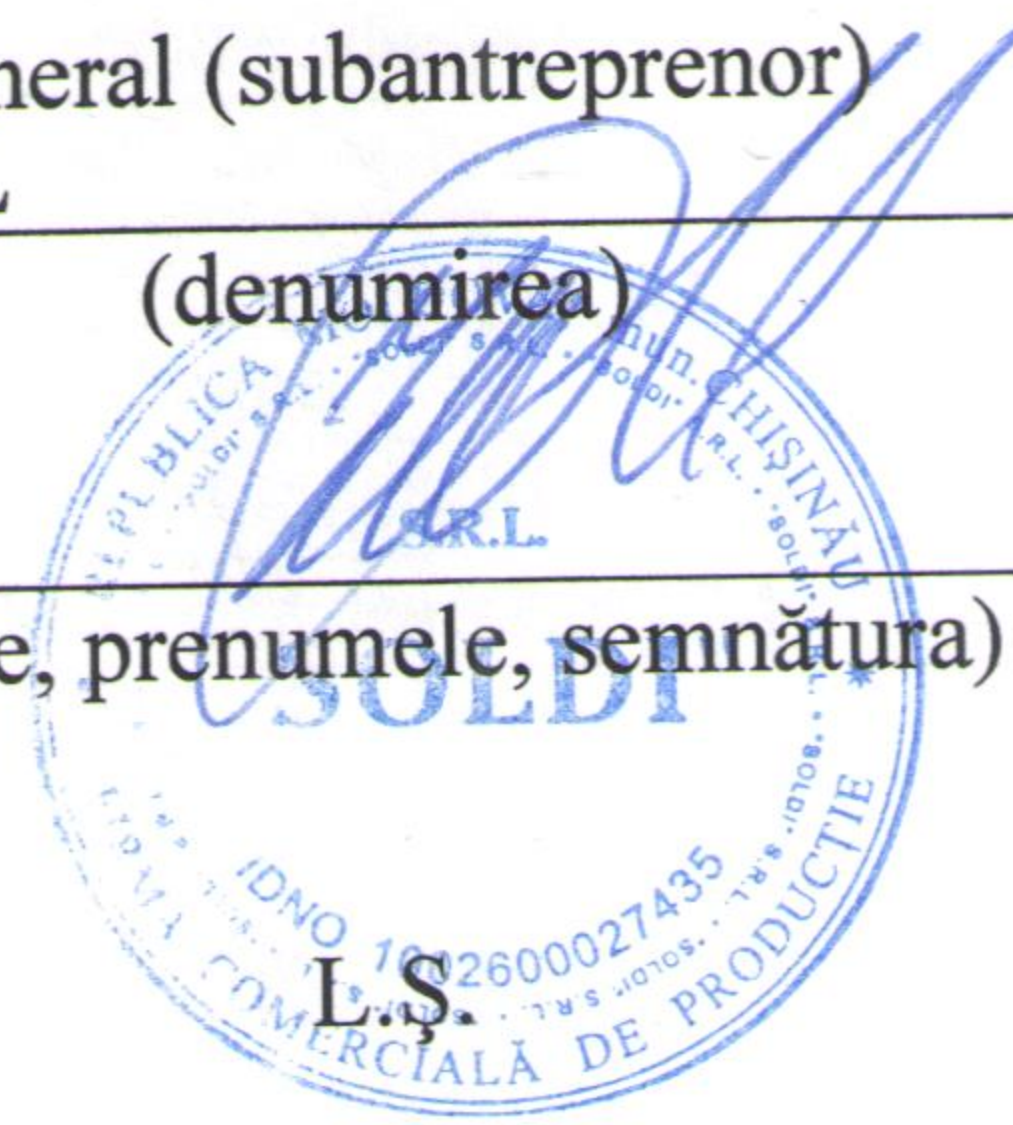


APROBAT:

Investitor
Primaria Cojusna, r. Straseni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

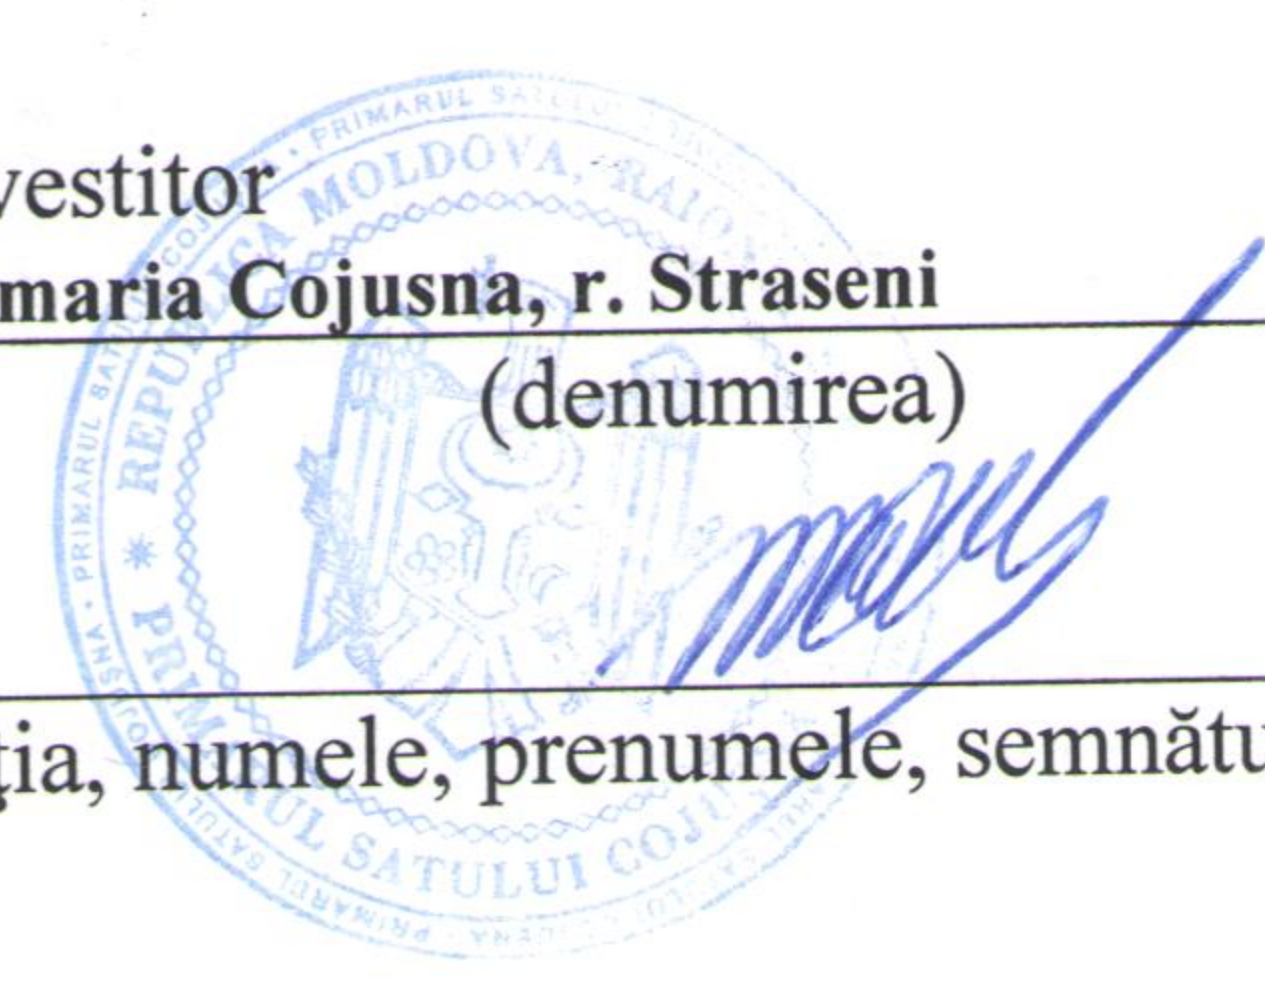

L.Ș.



		20-39 kva				
17.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	20,49	98,00	2 008,02
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,49	98,00	440,02
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	26,51	158,00	4 188,58
		Total utilaje de construcții				44 541

Total	lei	957 301
TVA	20,00 %	191 460

Total deviz:

1 148 761


Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

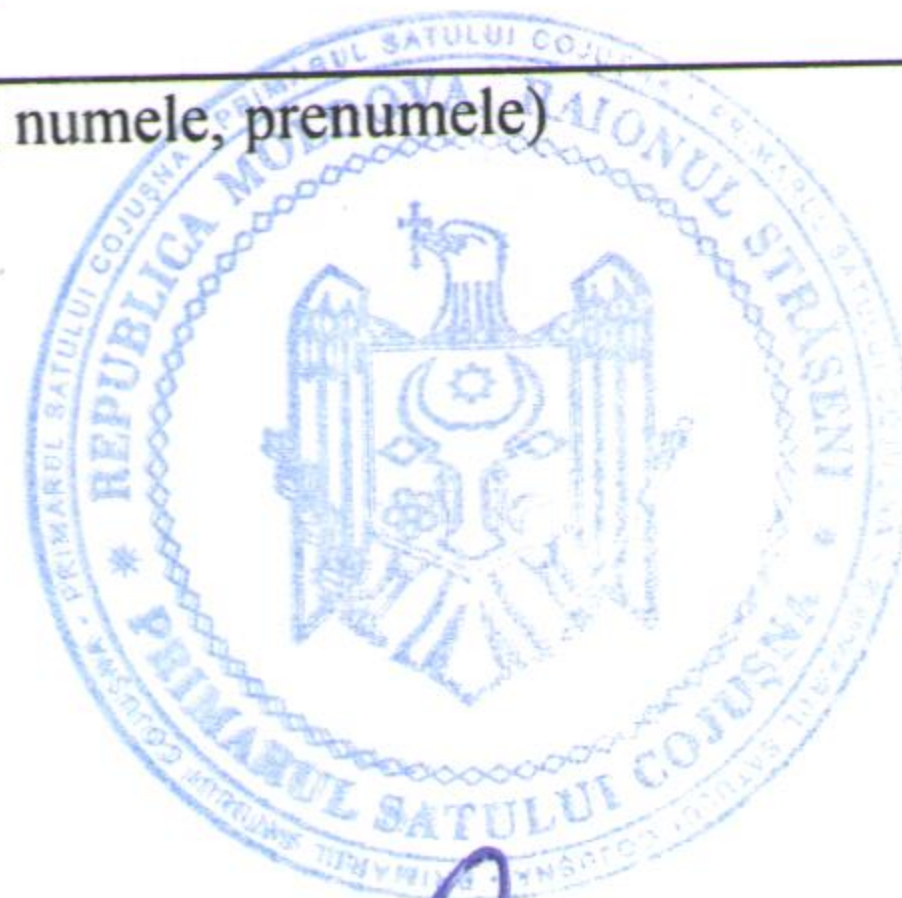

Antreprenor FCP "Soldi" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Cojusna, r. Straseni
 (denumirea)

Obiect **Complexul instalatiilor de
 debitare a apei pentru
 aprovizionarea cu apa a s.
 Cojusna raionul Straseni**

Valoarea lucrarilor executate **1 148 761 lei**

Proces - verbal

Deviz local de resurse № 7 Retele exterioare de distributie a apei

de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsA02E	3 Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu- in transee	m3	30,00	48,11 48,11	1 443,42 1 443,42
2	TsA02E	5 Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m	m3	12,66	48,11 48,11	609,08 609,08

2	3	4	5	6	7	
	teren mijlociu- larjirea transeei pentru camine sol uscat					
3	TsE01B	9 Nivelarea manuala a terenurilor in transee, in teren mijlociu	100m2	12,54	305,46 305,46	3 830,53 3 830,53
4	TsD02A1	14 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратн. засыпка траншеи землёй)	100 m3	23,23	246,33 0,00	5 722,32 0,00
5	TsD05B	16 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	24,89	925,00 321,49	23 023,31 8 001,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 628,66 13 884,90
		1.2. Conducte, armaturi				
6	AcB01C	27 Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 250 mm- Vana d=200mm Pn=20	buc	2,00	5 509,98 36,45	11 019,97 72,90
7	AcB01A	28 Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm/ Vana d=80mm PN20	buc	1,00	1 649,85 20,05	1 649,85 20,05
8	AcA26A	36 Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm /	buc	2,00	1 195,59 32,44	2 391,18 64,88

	2	3	4	5	6	7
		Racord cu flansa din fonta d=80mm, l=0.5m				
9	AcA26B	42 Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm / Racord cu flanse din PE- otel cu d=200x200mm, Pn=20	buc	6,00	3 971,58 67,43	23 829,49 404,59
10	AcA26A	43 Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Racord cu flanse din PE- otel cu d=80x90, Pn=20	buc	2,00	500,10 32,44	1 000,20 64,88
11	AcA26B	44 Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm / Bransament cu flanse din fonta cu d=200mm, 90	buc	1,00	2 390,58 67,43	2 390,58 67,43
12	GD54G	48 Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm/ Bransament PE 15* d=200mm Pn=10	buc	4,00	1 023,97 58,32	4 095,88 233,28
13	GD54G	49 Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm/ Bransament PE 90* d=200mm Pn=10	buc	2,00	1 158,11 58,32	2 316,22 116,64
14	GD54G	52 Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm/ Bransament PE 30* d=200mm Pn=20	buc	3,00	1 158,88 58,32	3 476,63 174,96

	2	3	4	5	6	7
	GD54G	53 Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm/ Bransament PE 60* d=200mm Pn=20	buc	2,00	$\frac{1\ 209,35}{58,32}$	$\frac{2\ 418,69}{116,64}$
16	GD54G	54 Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm/ Bransament PE 90* d=200mm Pn=20	buc	1,00	$\frac{1\ 158,11}{58,32}$	$\frac{1\ 158,11}{58,32}$
17	SA37I	55 Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel montată prin încadrare în sprigin de beton	buc	20,00	$\frac{43,66}{18,95}$	$\frac{873,17}{379,08}$
18	AcA51A	60 Montarea prin introducerea în teville de protecție existente din oțel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, avind diam. 160-315 mm / d=200mm, PE100, SDR11, Pn=20	m	120,50	$\frac{555,95}{41,63}$	$\frac{66\ 991,49}{5\ 015,89}$
19	AcA10B	62 Montarea în pământ a tevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm/ teava d=200mm PE100, SDR17, Pn=10	m	616,94	$\frac{261,51}{6,05}$	$\frac{161\ 338,12}{3\ 732,84}$
20	AcA10B	63 Montarea în pământ a tevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform	m	255,00	$\frac{377,73}{6,05}$	$\frac{96\ 320,30}{1\ 542,93}$

2	3	4	5	6	7
	normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm/ teava d=200mm PE100, SDR11, Pn=16				
21	AcA10B 64 Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm/ teava d=200mm PE100, SDR11, Pn=20	m	724,00	445,75 6,05	322 721,54 4 380,56
22	CB01A 80 Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,00	133,91 61,97	2 678,10 1 239,30
23	AcD22A 81 Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (бетонные упоры)	m3	8,00	1 296,32 310,92	10 370,56 2 487,35
24	AcE11B 83 Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	5,90	2 262,90 501,96	13 351,12 2 961,57
25	AcE11A1 84 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa	buc	2,00	4 439,00 0,00	8 878,00 0,00
26	AcE10B 86 Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	6,49	2 425,67 552,20	15 742,59 3 583,77

2	3	4	5	6	7	
	AE10B1	88 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	3,00	2 927,33 0,00	8 781,99 0,00
28	VC34A	91 Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (elemente MC)	kg	56,10	32,38 10,93	1 816,34 613,45
29	SA34I	92 Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"	buc	12,00	487,92 23,69	5 854,98 284,31
30	RpAcH19A	93 Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc	12,00	71,18 60,14	854,21 721,71
31	RpCE32A	94 Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit	m	42,80	105,14 23,69	4 499,87 1 014,04
32	IzF05C1K=2	95 Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatiche, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi	m2	101,54	71,68 13,85	7 278,77 1 406,61
33	AcE08A	96 Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau	buc	5,00	1 649,29 65,61	8 246,47 328,05

**Complexul instalatiilor de
debitare a apei pentru
aprovizionarea cu apa a s.
Cojusna raionul Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7
Rețele exterioare de distributie a apei**

Valoarea de deviz 1 148 761 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,40	36,45	415,53
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,40	36,45	780,03
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	29,00	36,45	1 057,05
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	77,24	36,45	2 815,40
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	38,59	36,45	1 406,61
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,20	36,45	663,39
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	497,13	36,45	18 120,39
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,83	36,45	613,45
9.	7212030022700	Sudor	h-om	50,13	36,45	1 827,24
10.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	19,20	36,45	699,84
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	380,93	36,45	13 884,90
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,42	36,45	416,26
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,30	36,45	2 270,84
Total manopera						44 972

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	396,20	13,75	5 447,75
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,38	162,00	61,56
3.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,20	162,00	32,40
4.	1714227322926	Fringhie cinipa gudronata	kg	81,63	52,00	4 244,76
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04	2 500,00	100,00
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	5,83	2 500,00	14 575,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,40	2 650,00	1 060,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	2 650,00	106,00
9.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,05	2 650,00	132,50
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,51	72,00	108,72

11.	2010237318750	Distantieri	buc	39,77	1,25	49,71
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	223,39	0,60	134,03
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,10	600,00	60,00
14.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,12	12,00	1,44
15.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,49	14,50	65,11
16.	2320156200901	Motorina	kg	36,07	14,50	523,02
17.	2320187315789	Decofrol	kg	2,40	12,00	28,80
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	584,31	8,50	4 966,64
19.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	324,93	8,50	2 761,91
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,54	10,50	26,67
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,12	29,00	32,48
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,89	10,80	31,21
23.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,48	22,00	10,56
24.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	31,46	18,00	566,28
25.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	4,49	18,00	80,82
26.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	11,11	15,00	166,65
27.	25212167010012	Teava din polietilena d200mm PE100, SDR17, Pn=10	m	635,59	237,20	150 761,95
28.	25212167010013	Teava din polietilena d200mm PE100, SDR11, Pn=16	m	262,71	350,00	91 948,50
29.	25212167010014	Teava din polietilena d200mm PE100, SDR11, Pn=20	m	745,88	416,00	310 286,08
30.	25212167010033	Teava din polietilena diam. 200 mm, PE100, SDR11, Pn=20	m	122,31	416,00	50 880,96
31.	25221033048401	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 6"	m	4,80	1 150,79	5 523,79
32.	25231567138114	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)/ Bransament PE 15* d=200mm, Pn=10	buc	4,04	665,00	2 686,60
33.	25231567138115	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)/ Bransament PE 90* d=200mm, Pn=10	buc	2,02	797,81	1 611,58
34.	25231567138118	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)/ Bransament PE 30* d=200mm, Pn=20	buc	3,03	798,57	2 419,67
35.	25231567138119	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)/ Bransament PE 60* d=200mm, Pn=20	buc	2,02	848,54	1 714,05
36.	25231567138120	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)/ Bransament PE 90* d=200mm, Pn=20	buc	1,01	797,81	805,79
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	21,35	1,45	30,96
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	84,15	1,45	122,02
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	11,34	1,45	16,44
40.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	1 380,00	0,00
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	64,99	0,50	32,49
42.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	5,15	222,00	1 143,30
43.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9a (0,23 m3)	buc	3,00	400,00	1 200,00
44.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	5,00	125,00	625,00
45.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	5,00	115,00	575,00
46.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQD-10 (0,18 m3)	buc	3,00	333,33	999,99
47.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,00	400,00	1 200,00
48.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-1(0,10 m3)	buc	3,00	264,00	792,00
49.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIQD-15 (0,38 m3)	buc	2,00	825,00	1 650,00
50.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,00	642,00	1 284,00
51.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9a (0,31 m3)	buc	2,00	642,00	1 284,00
52.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-15-1(0,27 m3)	buc	2,00	800,00	1 600,00

53.	2663102100000	Beton	m3	8,32	920,00	7 654,40
54.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	2,97	850,00	2 524,50
55.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	2,25	890,00	2 002,50
56.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,11	850,00	93,50
57.	2664102101126	Var	kg	1,38	4,80	6,63
58.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,13	750,00	97,50
59.	2682132601626	Carton bitumat	m2	233,54	12,00	2 802,48
60.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	58,46	11,00	643,06
61.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,00	18,00	54,00
62.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,23	18,00	22,14
63.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,00	16,00	0,00
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00	18,00	90,00
65.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	79,00	12,00	948,00
66.	28741173000007	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica/ Vana d=200mm Pn=20	buc	2,06	5 251,22	10 817,51
67.	28741173000008	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica/ Vana d=80mm Pn=20	buc	1,04	1 567,12	1 629,80
68.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,00	18,00	18,00
69.	28752741101001 2	Piese de legatura/ Racord cu flanse din PE- otel d=200x200mm, Pn=20	buc	6,00	3 781,00	22 686,00
70.	28752741101001 3	Piese de legatura/ Racord cu flanse din PE- otel d=80x90mm, Pn=20	buc	2,00	404,51	809,02
71.	28752741101001 4	Piese de legatura/ Bransament cu flanse din fonta cu d=200mm, 90	buc	1,00	2 200,00	2 200,00
72.	28752741101006	Piese de legatura/ Racord cu flansa din fonta d=80mm, l=0.5m	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
73.	2875274200000	Capac cu rama	buc	5,10	1 290,00	6 579,00
74.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	5,00	1 290,00	6 450,00
75.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	20,00	24,00	480,00
76.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	2,41	14,50	34,95
77.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,98	1,58	28,41
78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,94	21,00	19,74
79.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03	21,00	0,63
		Total materiale de constructii				737 462

Utilaje de constructii:

1.	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	20,49	256,00	5 245,44
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	4,28	245,00	1 048,60
3.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	6,03	275,00	1 658,25
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,84	15,00	27,60
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	19,95	98,00	1 955,10
6.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	20,49	98,00	2 008,02
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	18,00	98,00	1 764,00
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	25,32	226,00	5 722,32
9.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	2,60	25,00	65,00
10.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	4,80	16,00	76,80
11.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,36	25,00	9,00
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	234,71	64,00	15 021,44
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,25	25,00	81,25
14.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	2,11	25,00	52,75
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	56,24	25,00	1 406,00
16.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de	h-ut	18,00	98,00	1 764,00
