



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind valoarea lucrărilor executate
decembrie 2023

<u>DÎTS a Primăriei mun.Bălți</u> Beneficiar:	1015601000259 Cod fiscal
<u>SRL „Vladmih Company”</u> Antreprenor:	1014602000950 Cod fiscal
Contract nr. 175 din 03 august 2023	
Înregistrat cu nr. 2023-00000001337 din 15 august 2023	
Amenajarea teritoriului, reparație capitală a încăperilor existente în blocul A, A5 și A6 (blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea peretilor exteriori a L.T. "G.Cosbuc" bd.Larisa, 3 m.Balti.	

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări, cheltuielilor	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	Total	Perioada precedentă	Perioada curentă
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	3 943 739,68	2 435 194,61	1 508 545,07
Total:	3 943 739,68	2 435 194,61	1 508 545,07
TVA 20%	788 747,94	487 038,93	301 709,01
Total spre plată	4 732 487,62	2 922 233,54	1 810 254,08



Investitor (Beneficiar) Seful, _____
DÎTS a Primăriei mun.Bălți

[Signature]
funcția, numele, semnatura

[Signature]

L. Ș.

ÎN DCC CU

Director, Larisa Bragari

[Signature]
funcția, numele, semnatura



Antreprenor

Director, Marian Negru

[Signature]
funcția, numele, semnatura

Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: DITS al primăriei mun. Balti
 (denumirea)

Obiect: Amenajarea teritoriului, reparație
 capitală a încăperilor existente în blocul
 A, A5 și A6 (blocurile sanitare, etajul-2),
 termoizolarea peretilor exteriori a
 L.T. "G. Cosbuc" bd. Larisa, 3 m. Balti
 (ob.22-12-PG Amenajarea teritoriului)

Valoarea lucrărilor executate
14 043,58 lei

Proces - verbal №6
 de recepție a lucrărilor executate
 pe decembrie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de amenajare a teritoriului				
		1.3. Invelis tip 1				
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscă de ciment și nisip, în proportie 1:6, rostuit cu amestec uscă de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	40,00	237,66 42,91	9 506,33 1 716,48
Total			lei			9 506,33
Total Invelis tip 1						9 506,33
Inclusiv salariu						1 716,48
Total			lei			9 506,33
Asigurarea socială			24 %			411,96
Transportarea materialelor			4 %			311,59
Total						10 229,88
Cheltuieli de regie			10 %			1 022,98
Total						11 252,86
Beneficiu de deviz			4 %			450,11
Total						11 702,98
TVA			20 %			2 340,60
Total Lucrări de amenajare a teritoriului						14 043,58
Inclusiv salariu						1 716,48
Total			lei			14 043,58

1	2	3	4	5	6	7
						14 043,58
Total proces-verbal:						1 716,48
Inclusiv salariu						

Intocmit:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Vladmih Company"

(denumirea)

Director,
Negru Marian

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier,
Chibzii Ivan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Aprobat:

Investitor

DÎTS a Primăriei m. Bălți

(denumirea)

Șef al DÎTS,

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Director ÎM DCC CU,
Bragari Larisa

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil tehnic,
Barîșpoli Marina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Marina

L.Ș.



Director L.T."G.Cosbuc" m.Balti,
Bujor V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: DÎTS al Primăriei mun. Balti
 (denumirea)

Obiect: Amenajarea teritoriului, reparație capitală a încăperilor existente în blocul A, A5 și A6 (blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea peretilor exteriori a L.T. "G. Cosbuc" bd. Larisa, 3 m. Balti (ob. 22-12-IV) Incalzire și ventilare. (marca IV)

Valoarea lucrărilor executate
4 699,81 lei

P r o c e s - v e r b a l №10 de recepție a lucrărilor executate pe decembrie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Отопление				
1	IB01A	Radiatoare din fontă cu coloane libere și secțiune circulară sau coloane unite și secțiune eliptică (Чугунные секционные радиаторы "М-140 -АО , 58секций)	m2	17,34	41,16 28,82	713,68 499,68
12	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. pînă la 1"	m	60,00	12,92 7,92	775,20 475,20
13	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele avînd diametrul de pînă la 1", inclusiv	m	60,00	10,48 6,48	628,80 388,80
15	AcE51A	Racordarea la conductă existentă din tevi de oțel (cu stut) avînd diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб , диам. 15 мм)	piesa	4,00	202,43 161,28	809,72 645,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Отопление				2 927,40
		Inclusiv salariu				2 008,80
		Total Lucrari de constructie				3 916,51
		Inclusiv salariu				2 008,80
	Total		Lei			3 916,51
	TVA		20 %			783,30
		Total proces-verbal:				4 699,81
		Inclusiv salariu				2 008,80

Intocmit:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Vladmih Company"

(denumirea)

**Director,
Negru Marian**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Diriginte de șantier,
Chibzii Ivan**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Aprobat:

Investitor


DÎTS a Primăriei m. Bălți

(denumirea)

Șef al DÎTS,

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

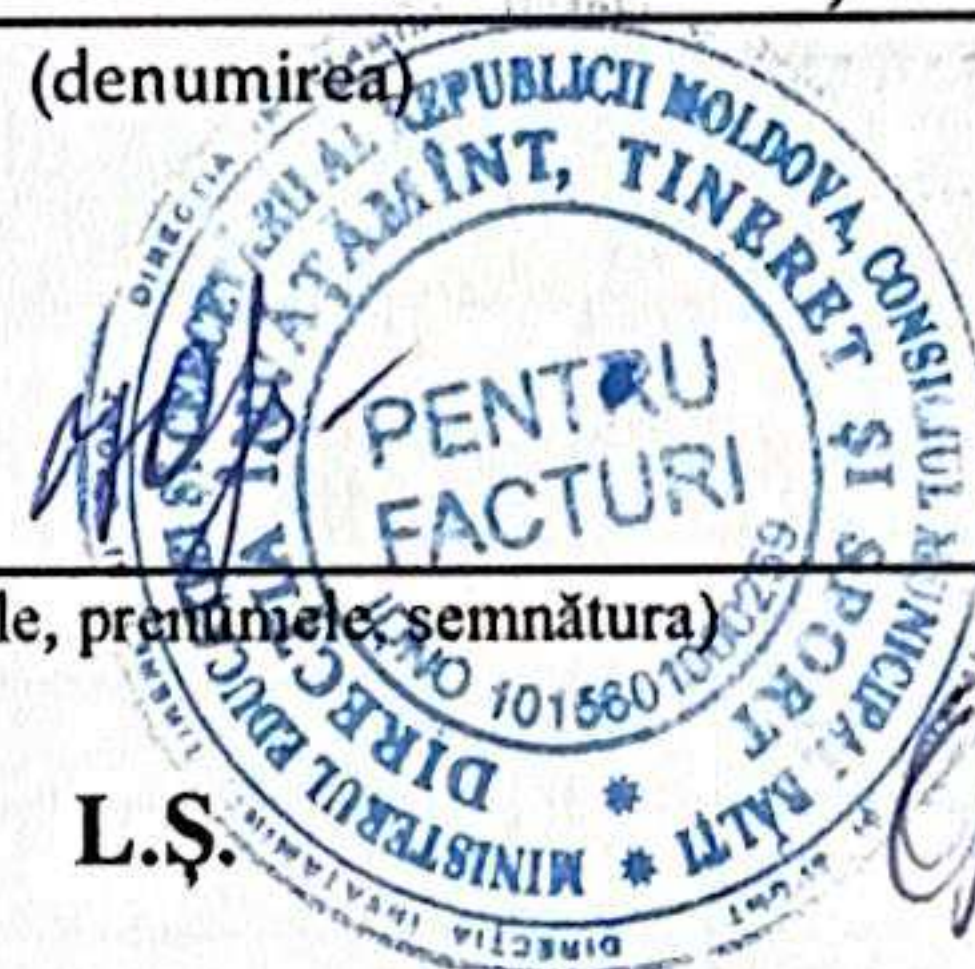

**Director ÎM DCC CU,
Bragari Larisa**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



**Responsabil tehnic,
Barîșpoli Marina**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



**Director L.T."G.Cosbuc" m.Balti,
Bujor V.**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor: SRL Vladmih Company
 (denumirea)

Investitor: DITS al Primariei mun. Balti
 (denumirea)

Obiect: Amenajarea teritoriului, reparatie
 capitala a incaperilor existente in blocul
 A, A5 si A6 (blocurile sanitare, etajul-2),
 termoizolarea peretilor exteriori a
 L.T."G.Cosbuc" bd.Larisa, 3 m. Balti
 (ob.22-12-PG) Amenajarea teritoriului.
 Se adauga.

Valoarea lucrarilor executate
39 767,16 lei

Proces - verbal №7
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare a teritoriului				
		1.1. Invelis tip 1				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton cl. B 15, BP100.30.15	m	15,80	269,46 48,24	4 257,45 762,19
Total				lei		4 257,45
Total Invelis tip 1						4 257,45
Inclusiv salariu						762,19
		1.2. Invelis tip 2				
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, cl. B 15, BP100.20.8	m	112,75	123,74 21,60	13 952,04 2 435,38
3		Beton C12/15 XF2 (portiunea	m3	5,10		

1	2	3	4	5	6	7
		intre pavajul montat si suprafata existenta)			1 283,33	6 550,12
					0,00	0,00
Total			lei			20 502,16
Total Invelis tip 2						20 502,16
Inclusiv salariu						2 435,38
		1.3. Ridicarea sau coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare (PG - 3)				
4	RpAcF34 A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor (Demontarea capacului de canalizare)	buc	7,00	91,90 86,40	643,30 604,80
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea pereului in jurul caminelor)	m3	2,18	276,99 246,24	603,84 536,80
6	RpAcF38 A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	0,12	1 259,58 1 249,17	151,15 149,90
7	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capac de la demontare)	buc	7,00	108,16 59,04	757,14 413,28
Total			lei			2 155,43
Total Ridicarea sau coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de canalizare (PG -3)						2 155,43
Inclusiv salariu						1 704,78
Total			lei			26 915,04
Asigurarea sociala			24 %			1 176,56
Transportarea materialelor			4 %			876,32
Total						28 967,92
Cheltuieli de regie			10 %			2 896,79
Total						31 864,71
Beneficiu de deviz			4 %			1 274,59
Total						33 139,30
TVA			20 %			6 627,86

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de amenajare a teritoriului						39 767,16
Inclusiv salariu						4 902,35
Total	lei					39 767,16
Total proces-verbal:						39 767,16
Inclusiv salariu						4 902,35

Intocmit:

Aprobat:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Vladmih Company"

(denumirea)

Director,
Negru Marian

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de șantier,
Chibzii Ivan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



DÎTS a Primăriei m. Bălți

(denumirea)

Șef al DÎTS,

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Director ÎM DCC CU,
Bragari Larisa


(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil tehnic,
Barișpoli Marina


(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

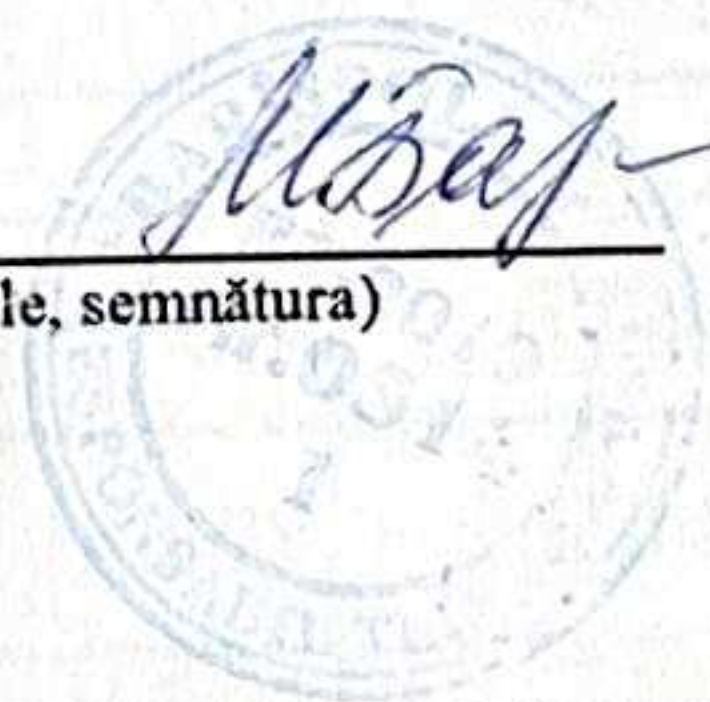

Director L.T."G.Cosbuc" m.Balti,
Bujor V.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

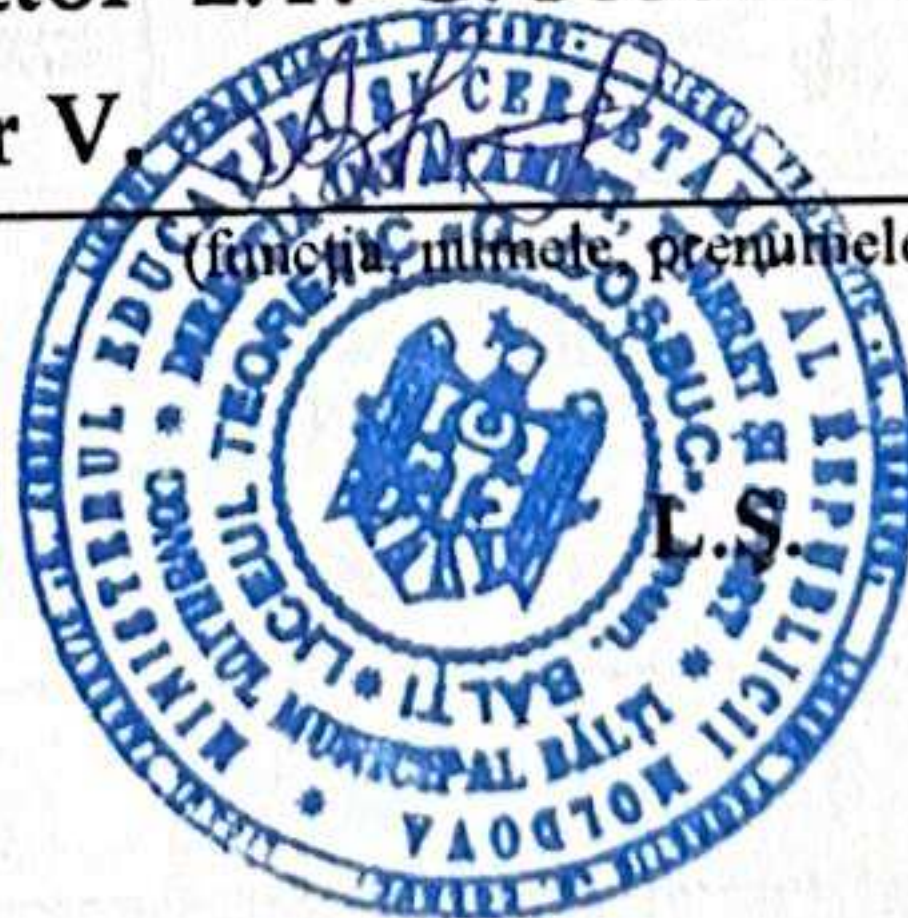

Antreprenor: SRL "Vladmih Company"
 (denumirea)

Investitor: DÎTS al Primăriei mun. Bălți
 (denumirea)

Obiect: Amenajarea teritoriului, reparație
 capitală a încăperilor existente în blocul
 A, A5 și A6 (blocurile sanitare, etajul-2),
 termoizolarea peretilor exteriori a
 L.T. "G. Cosbuc" bd. Larisa, 3 m. Balti
 (ob.22-12-RAC) Retele interioare de
 alimentare cu apă și canalizarea.

Valoarea lucrărilor executate
167 626,69 lei

Proces - verbal №8
 de recepție a lucrărilor executate
 pe decembrie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări tehnice sanitare 1.1. Фрагмент 1 Блок А 1.1.1. Водопровод В1				
1	SD07B	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descarcare , pentru teava din oțel, având diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20mm)	buc	1,00	175,38 17,28	175,38 17,28
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descarcare , pentru teava din oțel, având diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm)	buc	8,00	89,46 12,96	715,68 103,68
3	Pretul firmei	Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм	m	5,00	15,00 0,00	75,00 0,00
4	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, îmbinată prin lipire în conduite de legătură în obiecte sanitare, la clădiri de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20	m	2,00	146,64 118,80	293,29 237,60

1	2	3	4	5	6	7
		мм PN10)				
5	SA09A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10)	m	10,40	<div>116,48</div> <div>97,20</div>	<div>1 211,37</div> <div>1 010,88</div>
6	SA09A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10 в штробе пола)	m	1,60	<div>116,47</div> <div>97,20</div>	<div>186,36</div> <div>155,52</div>
7	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,40	<div>7,20</div> <div>7,20</div>	<div>10,08</div> <div>10,08</div>
8	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	14,00	<div>3,60</div> <div>3,60</div>	<div>50,40</div> <div>50,40</div>
9	Pretul firmei	Крестовина PPRC 25x20	buc	1,00	<div>6,50</div> <div>0,00</div>	<div>6,50</div> <div>0,00</div>
10	Pretul firmei	Тройник PPRC 20x15	buc	1,00	<div>3,50</div> <div>0,00</div>	<div>3,50</div> <div>0,00</div>
11	Pretul firmei	Тройник PPRC 15x15	buc	8,00	<div>5,00</div> <div>0,00</div>	<div>40,00</div> <div>0,00</div>
12	Pretul firmei	Переход PPRC 20x15	buc	1,00	<div>3,00</div> <div>0,00</div>	<div>3,00</div> <div>0,00</div>
13	Pretul firmei	Уголок PPRC 90гр. d=15mm	buc	8,00	<div>2,50</div> <div>0,00</div>	<div>20,00</div> <div>0,00</div>
14	SD03A	Robinet pentru lavoar sau	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм)			777,09 75,60	1 554,18 151,20
15	SD18A прим	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/ 2" - 1"(Кран поливочный Ду=15мм)	buc	1,00	352,68 266,40	352,68 266,40
16	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Крепления трубопрвода d20mm)	buc	3,00	43,11 23,76	129,34 71,28
17	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Крепления трубопрвода d15mm)	buc	4,00	37,23 20,88	148,93 83,52
18	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	1,00	28,80 28,80	28,80 28,80
19	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений)	buc	1,00	32,37 30,96	32,37 30,96
					5 036,86	
Total Водопровод B1					2 217,60	
Inclusiv salariu						
1.1.2. Канализация K1						
20	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(Умывальник керамический с сифоном)	buc	2,00	1 077,79 147,60	2 155,58 295,20
21	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком)	buc	4,00	2 851,14 302,40	11 404,54 1 209,60
22	SC07A1	Vas pentru closet, complet	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком)			2 539,05 302,40	2 539,05 302,40
23	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный d=50 мм)	buc	1,00	193,36 59,76	193,36 59,76
24	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,00	66,43 41,76	465,01 292,32
25	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava de canalizare din polipropilena d=100mm)	m	12,00	115,89 51,84	1 390,64 622,08
26	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,90	5,76 5,76	10,94 10,94
27	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Крестовина 45° 100x100x100 мм)	buc	1,00	76,50 39,60	76,50 39,60
28	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Тройник 100x100 мм)	buc	6,00	66,08 39,60	396,45 237,60
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110	buc	2,00	68,30 39,60	136,60 79,20

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Тройник 100x50 мм)				
30	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Отвод d= 50 мм)	buc	2,00	41,80 28,80	83,60 57,60
31	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Отвод d=100 мм)	buc	4,00	62,46 39,60	249,83 158,40
32	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Переход d=100x50 мм)	buc	1,00	65,23 39,60	65,23 39,60
33	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Тройник 45° 100x100 мм)	buc	1,00	67,28 39,60	67,28 39,60
34	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Тройник 45° 100x50 мм)	buc	1,00	78,55 39,60	78,55 39,60
35	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Прочистка d=100 мм)	buc	1,00	70,35 39,60	70,35 39,60
36	SB27A прим	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный клапан HL 900N Ду 100)	buc	1,00	115,32 40,32	115,32 40,32
37	SB27A прим	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50)	buc	1,00	85,32 40,32	85,32 40,32
38	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la	buc	4,00	28,80	115,20

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime			28,80	115,20
39	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	32,37 30,96	129,48 123,84
Total Канализация K1						19 828,83
Inclusiv salariu						3 842,78
Total Фрагмент 1 Блок А						24 865,69
Inclusiv salariu						6 060,38
		1.2. Фрагмент 2 Блок А				
		1.2.1. Водопровод В1				
40	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=25mm)	buc	1,00	240,18 20,88	240,18 20,88
41	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20mm)	buc	1,00	175,38 17,28	175,38 17,28
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm)	buc	11,00	89,46 12,96	984,06 142,56
43	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм)	buc	2,00	777,09 75,60	1 554,18 151,20
44	Pretul firmei	Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм	m	5,00	15,00 0,00	75,00 0,00
45	SA09C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 25 мм PN10)	m	3,30	184,31 144,00	608,22 475,20
46	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in	m	1,50	146,65	219,97

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10)			118,80	178,20
47	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10 в штробе пола)	m	1,50	146,65 118,80	219,97 178,20
48	SA09A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10)	m	12,00	116,48 97,20	1 397,74 1 166,40
49	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,83	7,20 7,20	13,18 13,18
50	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	18,30	3,60 3,60	65,88 65,88
51	Pretul firmei	Тройник PPRC 25x15	buc	1,00	3,80 0,00	3,80 0,00
52	Pretul firmei	Тройник PPRC 25x20	buc	1,00	4,50 0,00	4,50 0,00
53	Pretul firmei	Переход PPRC 20x15	buc	1,00	3,00 0,00	3,00 0,00
54	Pretul firmei	Тройник PPRC 15x15	buc	6,00	5,00 0,00	30,00 0,00
55	Pretul	Уголок PPRC 90гр. d=20mm	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				3,30	3,30
					0,00	0,00
56	Pretul firmei	Уголок PPRC 90гр. d=15mm	buc	8,00	2,50	20,00
					0,00	0,00
57	SD18A прим	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/ 2" - 1"(Кран поливочный Ду=15мм)	buc	1,00	352,68	352,68
					266,40	266,40
58	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Крепления трубопровода d25mm)	buc	2,00	46,11	92,22
					23,76	47,52
59	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Крепления трубопровода d20mm)	buc	3,00	43,11	129,34
					23,76	71,28
60	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Крепления трубопровода d15mm)	buc	12,00	37,23	446,78
					20,88	250,56
61	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	3,00	28,80	86,40
					28,80	86,40
62	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений)	buc	3,00	32,37	97,11
					30,96	92,88
Total Водопровод B1						6 822,89
Inclusiv salariu						3 224,02
		1.2.2. Канализация K1				
63	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(Умывальник керамический с сифоном)	buc	1,00	1 077,79	1 077,79
					147,60	147,60

1	2	3	4	5	6	7
64	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком)	buc	3,00	<div>2 851,14</div> <div>302,40</div>	<div>8 553,41</div> <div>907,20</div>
65	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком)	buc	1,00	<div>2 539,05</div> <div>302,40</div>	<div>2 539,05</div> <div>302,40</div>
66	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар керамический с сифоном)	buc	3,00	<div>1 205,08</div> <div>162,00</div>	<div>3 615,23</div> <div>486,00</div>
67	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный d=50 мм)	buc	1,00	<div>193,36</div> <div>59,76</div>	<div>193,36</div> <div>59,76</div>
68	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	11,00	<div>66,43</div> <div>41,76</div>	<div>730,73</div> <div>459,36</div>
69	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava de canalizare din polipropilena d=100mm)	m	4,00	<div>115,89</div> <div>51,84</div>	<div>463,55</div> <div>207,36</div>
70	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,50	<div>5,76</div> <div>5,76</div>	<div>8,64</div> <div>8,64</div>
71	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava	buc	1,00	<div>76,50</div>	<div>76,50</div>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Фрагмент 2 Блок А						25 065,84
Inclusiv salariu						6 520,90
		1.3. Фрагмент 3 Блок А6				
		1.3.1. Водопровод В1				
80	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=25mm)	buc	1,00	240,18 20,88	240,18 20,88
81	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20mm)	buc	2,00	175,38 17,28	350,76 34,56
82	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm)	buc	12,00	89,46 12,96	1 073,52 155,52
83	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Водоразборный кран для умывальника Ду 15мм)	buc	2,00	777,09 75,60	1 554,18 151,20
84	Pretul firmei	Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм	m	5,00	15,00 0,00	75,00 0,00
85	SA09C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 25 мм PN10)	m	3,30	184,31 144,00	608,22 475,20
86	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10)	m	3,00	146,65 118,80	439,94 356,40
87	SA09A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si	m	13,50	116,48 97,20	1 572,45 1 312,20

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10)				
88	SA09A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 15 мм PN10 в штробе пола)	m	1,50	116,48 97,20	174,72 145,80
89	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,13	7,20 7,20	15,34 15,34
90	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	21,30	3,60 3,60	76,68 76,68
91	SD18A прим	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/2" - 1" (Кран поливочный Ду=15мм)	buc	1,00	352,68 266,40	352,68 266,40
92	Pretul firmei	Тройник PPRC 25x20	buc	1,00	4,50 0,00	4,50 0,00
93	Pretul firmei	Переход PPRC 20x15	buc	2,00	3,00 0,00	6,00 0,00
94	Pretul firmei	Тройник PPRC 15x15	buc	8,00	5,00 0,00	40,00 0,00
95	Pretul firmei	Уголок PPRC 90гр. d=20mm	buc	2,00	3,30 0,00	6,60 0,00
96	Pretul firmei	Уголок PPRC 90гр. d=15mm	buc	3,00	2,50 0,00	7,50 0,00
97	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Крепления трубопровода d25mm)			46,11 23,76	92,22 47,52
98	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Крепления трубопровода d20mm)	buc	3,00	43,11 23,76	129,34 71,28
99	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Крепления трубопровода d15mm)	buc	10,00	37,23 20,88	372,32 208,80
100	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	3,00	28,80 28,80	86,40 86,40
101	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах известково-цементным раствором, после установок или укреплений)	buc	3,00	32,45 30,96	97,34 92,88
Total Водопровод В1						7 375,89
Inclusiv salariu						3 517,06
		1.3.2. Канализация К1				
102	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(Умывальник керамический с сифоном)	buc	2,00	1 077,79 147,60	2 155,58 295,20
103	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический с косым выпуском и смывным бачком)	buc	4,00	2 851,14 302,40	11 404,54 1 209,60
104	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime,	buc	2,00	2 539,04 302,40	5 078,09 604,80

1	2	3	4	5	6	7
		avind sifonul interior tip S (Унитаз керамический детский с косым выпуском и смывным бачком)				
105	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный d=50 мм)	buc	2,00	193,36 59,76	386,73 119,52
106	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,00	66,43 41,76	465,01 292,32
107	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava de canalizare din polipropilena d=100mm)	m	12,00	115,89 51,84	1 390,64 622,08
108	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,90	5,76 5,76	10,94 10,94
109	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Крестовина 45° 100x100x100 мм)	buc	1,00	76,50 39,60	76,50 39,60
110	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Тройник 100x100 мм)	buc	6,00	66,08 39,60	396,45 237,60
111	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Тройник 100x50 мм)	buc	2,00	68,30 39,60	136,60 79,20
112	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin	buc	2,00	41,80 28,80	83,60 57,60

1	2	3	4	5	6	7
		lipire, avind diametrul de 50 mm (Отвод d= 50 мм)				
113	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Отвод d=100 мм)	buc	4,00	62,46 39,60	249,83 158,40
114	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Переход d=100x50 мм)	buc	1,00	65,23 39,60	65,23 39,60
115	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Тройник 45° 100x100 мм)	buc	1,00	67,28 39,60	67,28 39,60
116	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Тройник 45° 100x50 мм)	buc	1,00	78,55 39,60	78,55 39,60
117	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Прочистка d=100 мм)	buc	1,00	70,35 39,60	70,35 39,60
118	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curature, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Прочистка d= 50 мм)	buc	1,00	49,60 28,80	49,60 28,80
119	SB27A прим	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm (Вентиляционный клапан HL 900N Ду 50)	buc	1,00	85,32 40,32	85,32 40,32
120	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	4,00	28,80 28,80	115,20 115,20
121	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	32,37	129,48

1	2	3	4	5	6	7
					30,96	123,84
Total Canalizarea K1						22 495,52
Inclusiv salariu						4 193,42
Total Фрагмент 3 Блок А6						29 871,41
Inclusiv salariu						7 710,48
		1.4. Фрагмент 4 Блок А5				
		1.4.1. Водопровод В1				
122	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=25mm)	buc	1,00	240,18 20,88	240,18 20,88
123	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=20mm)	buc	2,00	175,38 17,28	350,76 34,56
124	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый бронзовый d=15mm)	buc	12,00	89,46 12,96	1 073,52 155,52
125	Pretul firmei	Шланг полиэтиленовый для пол.крана Ду=15мм	m	5,00	15,00 0,00	75,00 0,00
126	SA09C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 25 мм PN10)	m	3,30	184,31 144,00	608,22 475,20
127	SA09B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (Труба полипропиленовая PPRC d 20 мм PN10)	m	3,00	146,65 118,80	439,94 356,40
128	SA09A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm (Труба	m	13,50	116,48 97,20	1 572,45 1 312,20
