



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAD000334701



Data eliberării /data livrării 12.10.2022 / 12.10.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата								
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС										
1. Furnizor: Поставщик PULTUSK INVEST S.R.L., SEC.CENTRU Veronica Mide nr.1 bl.1 of.2 Cont MD31VI000002224607389M DL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.7 Orhei, VICBMD2X836		c.f./ nr.TVA 1014606001999 / ф.к./ код НДС 7401063										
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель PRIMARIA ORASULUI CRICOVA, OR.CRICOVA Chisinaului nr.90		c.f./ nr.TVA 1007601010183 / ф.к./ код НДС										
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковок	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
reparatie a strazii Minerilor din or. Cricova, mun.Chisinau		serv	1	4057309.08	4057309,08	20	811461,82	4868770,90				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					4057309,08	X	811461,82	4868770,90	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director FIODOR NEPOTU
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 12.10.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director FIODOR NEPOTU
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена
электронная подпись Поставщика 12.10.2022

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul
(transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель
director VALENTIN GUTAN
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена
электронная подпись Покупателя 12.10.2022

ANTREPRENOR
PULTUSK INVEST S.R.L.
BENEFICIAR
PRIMARIA OR. CRICOVA

Fiodor NEPOTU
Valentin GUTAN

NOTA INFORMATIVĂ
 privind valoarea lucrărilor executate
 pe luna octombrie an. 2022

Investitor (Beneficiar)	Cod fiscal
Primăria or. Cricova	
Antreprenor general	1007601010183
"PULTUSK INVEST" SRL	
Subantreprenor	1014606001999
Contract: Nr. 92 din _____ 2022	
Denumirea obiectului de executat și adresa :	Lucrari de reparatie a strazii Minerilor din or. Cricova, mun. Chisinau

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	4.248.135,65	4.057.309,08	<i>w</i>
Taxa pe valoarea adăugată 20%	849.627,13	811.461,82	
Total general	5.097.762,78	4.868.770,90	<i>w</i>

ANTREPRENOR
"PULTUSK INVEST" SRL



Administrator

[Signature]

Fiodor NEPOTU

Funcția, numele, semnătura

BENEFICIAR
 Primăria or. Cricova



Primar

[Signature]

Valentin GUȚAN



Antreprenor "PULTUSK-INVEST" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Cricova
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie a strazii Minerilor din
 or. Cricova, mun. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate **4 868 770,90 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **octombrie** an **2022**

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
		1.1. Ajuatarea fintinilor - 48buc				
1	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	48,000 ✓	536,14 97,50 ✓	25 734,56 4 680,00
		<i>Total</i>	Lei			25 734,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 734,56 4 680,00
		<i>Total</i>	Lei			25 734,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 734,56 4 680,00
		2. Trotuar - 1060m2				
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - formarea cavatei sub bordure	100 m3	0,900 ✓	1 526,40 0,00 ✓	1 373,76 0,00
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	15,000 ✓	209,95 209,95 ✓	3 149,25 3 149,25

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - adaugarea piatra sparta LA30 fr. 16-32mm sub bordure mari si mici Hmed-5cm	m3	50,000	490,65 64,35	24 532,50 3 217,50
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15XF2)	m	1 508,000	248,99 44,20	375 476,92 66 653,60
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15XF2)	m	816,000	128,21 19,50	104 620,18 15 912,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - sub platfprma trotuarului, inclusiv dupa bordure mici	m3	140,000	20,15 20,15	2 821,00 2 821,00
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din piatra sparta, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	10,600	1 021,95 586,95	10 832,67 6 221,67
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 060,000	74,89 16,64	79 388,70 17 638,40
10	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=2,000	m2	- 1 060,000	5,17 1,75	-5 485,50 -1 860,30
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsie bituminoasa Tip C60B2 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,35 l/m2	t	0,371	11 623,58 0,00	4 312,35 0,00
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic BA 8 bitum 50/70 cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 060,000	180,99 7,80	191 849,40 8 268,00
		<i>Total</i>	Lei			792 871,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				792 871,23 122 021,12
		3. Supralargirea drumului pentru parcari auto - 656m2				

1	2	3	4	5	6	7	
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - formarea cavatei sub bordure	100 m3	1,368	1 526,32 0,00	2 088,00 0,00	
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	239,400	19,00 0,00	4 548,50 0,00	
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,368	192,41 23,38	263,22 31,98	
16	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm	m3	45,600	452,17 74,75	20 619,17 3 408,60	
17	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta fr.4-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20m)	m3	91,200	612,30 107,25	55 841,80 9 781,20	
		<i>Total</i>	Lei			83 360,69	
		Total capitol: Inclusiv salariu				83 360,69 13 221,78	
		4. Refacerea transeelor dupa realizarea retelelor de canalizare - 1083.6m2					
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - decaparea stratului de acoperire h=10cm	100 m3	3,100	1 526,40 0,00	4 731,84 0,00	
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	542,790	19,00 0,00	10 313,00 0,00	
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,100	192,56 23,40	596,94 72,54	
21	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm	m3	93,360	452,17 74,75	42 214,51 6 978,66	
22	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu	m3	183,220	612,30 107,25	112 185,74 19 650,34	

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innoroire (piatra sparta fr.4-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20m)				
		<i>Total</i>	Lei			170 042,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				170 042,03 26 701,54
		5. Aplicarea straturilor bituminoase - 6985 m2				
23	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri (selectiv)	m3	8,000 ✓	208,00 208,00	1 664,00 1 664,00
24	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	11,200 ✓	72,15 72,15	808,08 808,08
25	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	11,200 ✓	19,00 0,00	212,75 0,00
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor cu beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	2 150,000 ✓	297,82 37,90	640 323,75 81 474,25
27	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	6 985,000 ✓	0,15 0,00	1 068,52 0,00
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsie bituminoasa Tip C60B2 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,35 l/m2	t	2,450 ✓	11 630,27 0,00	28 494,15 0,00
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmd-2.0cm	t	298,000 ✓	1 816,88 13,65	541 430,35 4 067,70
30	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.0974 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus K=1,250	m2	6 985,000 ✓	221,31 4,06	1 545 825,13 28 376,53
		<i>Total</i>	Lei			2 759 826,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				2 759 826,73
		Inclusiv salariu				116 390,56
		Total	Lei			3 831 835,24
		Asigurari sociale	24 %			67 923,60
		Total				3 899 758,84
		Cheltuieli de regie	2 %			77 995,18
		Total				3 977 754,02
		Beneficiu de deviz	2 %			79 555,06
		Total				4 057 309,08
		TVA	20 %			811 461,82
						4 868 770,90
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				283 015,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

"PULTUSK-INVEST" SRL

Primaria or. Cricova

(denumirea)

(denumirea)

Director


F. NEPOTU

Primar

V. GUȚAN

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





Diriginte de șantier

Ghenadie Bolboceanu

Responsabil tehnic

Petru Morari



**Lucrari de reparatie a strazii
Minerilor din or. Cricova, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse № 2-1-6

Valoarea de deviz 4 868 770,90 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-6:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	36,000	65,00	2 340,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 528,557	65,00	99 356,20
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 853,212	65,00	120 458,78
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	605,388	65,00	39 350,22
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,600	65,00	1 664,00
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	305,320	65,00	19 845,80
Total manopera						283 015,00

Materiale:

1.	11110001000131 1	Beton asfatic rul BA16 rul, bitum 50/70	t	1 398,654	1 700,00	2 377 711,8 0
2.	11110001000131 2	Beton asfatic rul BA 8 bitum 50/70	t	99,640	1 800,00	179 352,00
3.	1212121212121	Apa	m3	20,955	15,00	314,32
4.	1411122201646	Piatra sparta 16-32 mm	m3	55,708	300,00	16 712,40
5.	14111222016601	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	m3	172,356	300,00	51 706,80
6.	1411122201672	Piatra sparta 32-63 mm	m3	334,518	300,00	100 355,40
7.	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	m3	57,517	300,00	17 255,10
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,528	240,00	4 206,72
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	182,177	240,00	43 722,48
10.	23203226000401	Emulsie bituminoasa Tip C60B2	t	2,906	11 100,00	32 256,60
11.	23203226001101	Emulsie bituminoasa Tip C60B2	t	1,290	11 100,00	14 319,00
12.	2640112300739	Caramizi	buc	2 154,240	4,50	9 694,08
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 110,320	2,30	14 053,74
14.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine - inele de aducere la cota 10-15 cm	buc	48,960	195,00	9 547,20
15.	2663102100015	Beton clasa C12/15	m3	97,060	1 200,00	116 472,00
16.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	1,469	1 120,00	1 645,28
17.	2666122800284	Bordura beton BR100.30.15	m	1 515,540	130,00	197 020,20
18.	2666122800325	Bordura beton BR100.20.8	m	820,080	80,00	65 606,40
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	118,102	15,00	1 771,54
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,496	15,00	172,44
21.	4100126202818	Apa	m3	5,000	15,00	75,00
Total materiale de construcții						3 253 970,5 0

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,000	190,00	3 990,00
2.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	2,095	110,00	230,45
3.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	107,500	35,00	3 762,50
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	129,000	650,00	83 850,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,846	650,00	549,90
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	46,276	350,00	16 196,60
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	12,720	350,00	4 452,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	136,426	350,00	47 749,10
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	39,634	350,00	13 871,90
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	27,366	300,00	8 209,80
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	129,000	210,00	27 090,00
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	55,991	850,00	47 592,35
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	25,605	320,00	8 193,60
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,787	420,00	750,54
15.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	17,200	65,00	1 118,00
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,800	35,00	168,00
17.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	17,200	320,00	5 504,00
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	60,297	250,00	15 074,25
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,987	250,00	6 496,75
Total utilaje de construcții						294 849,74

Total	Lei	3 831 835,24
Asigurari sociale	24 %	67 923,60
Total		3 899 758,84
Cheltuieli de regie	2 %	77 995,18
Total		3 977 754,02
Beneficiu de deviz	2 %	79 555,06
Total		4 057 309,08
TVA	20 %	811 461,82
Total deviz:		4 868 770,90


Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

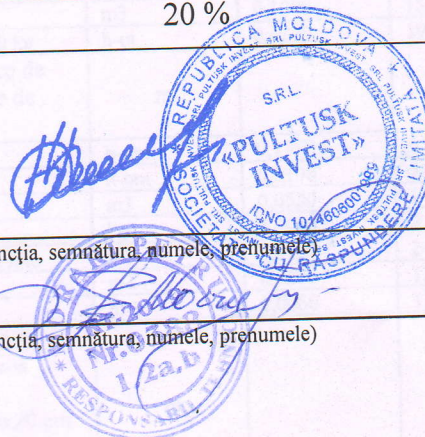

Obiect Lucrari de reparatie a strazii Minerilor
din or. Cricova, mun. Chisinau

Investitor Primaria or. Cricova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
		1.1. Ajuatarea fintinilor - 48buc				
1	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			536,14 97,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	65,00	48,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	4,50	201,96
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 120,00	34,28
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine - inele de aducere la cota 10-15 cm	buc	1,0000	195,00	198,90
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	35,00	3,50
		2. Trotuar - 1060m2				
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - formarea cavatei sub bordure	100 m3			1 526,40 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	320,00	1 526,40
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			209,95 209,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	65,00	209,95
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - adaugarea piatra sparta LA30 fr. 16-32mm sub bordure mari si mici Hmed-5cm	m3			490,65 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	190,00	79,80
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15XF2)	m			248,99 44,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	65,00	11,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	65,00	33,15
	2663102100015	Beton clasa C12/15	m3	0,0530	1 200,00	63,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	240,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800284	Bordura beton BR100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15XF2)	m			128,21 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2663102100015	Beton clasa C12/15	m3	0,0210	1 200,00	25,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm				
	2666122800325	Bordura beton BR100.20.8	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m	0,0030	240,00	0,72
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - sub platforma trotuarului, inclusiv dupa bordure mici	m3	1,0050	80,00	80,40
				0,0030	15,00	0,04
			m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat				20,15
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din piatra sparta, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	h-om	0,3100	65,00	20,15
			100m2			1 021,95
	9310060019900	Muncitor necalificat				586,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	h-om	9,0300	65,00	586,95
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	m3	1,0000	15,00	15,00
9	D1111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	h-ut	1,2000	350,00	420,00
			m2			74,89
	9310060019930	Muncitor				16,64
	14111222016601	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	h-om	0,2560	65,00	16,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1740	300,00	52,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	m3	0,0200	15,00	0,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0146	300,00	4,38
10	D1112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111	h-ut	0,0055	250,00	1,38
			m2			5,17
	9310060019930	Muncitor				1,75
	14111222016601	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	h-om	0,0135	65,00	1,75
11	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsie bituminoasa Tip C60B2 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,35 l/m2	m3	0,0057	300,00	3,42
			t			11 623,58
	23203226000401	Emulsie bituminoasa Tip C60B2				0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	t	1,0300	11 100,00	11 429,11
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic BA 8 bitum 50/70 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	h-ut	0,3000	650,00	194,47
			m2			180,99
	7129040010110	Asfaltator				7,80
	111100010001312	Beton asfaltic rul BA 8 bitum 50/70	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	t	0,0940	1 800,00	169,20
			h-ut	0,0114	350,00	3,99
		3. Supralargirea drumului pentru parcare auto - 656m2				
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - formarea cavatei sub bordure	100 m3			1 526,32
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	320,00	0,00
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			1 526,32
			h-ut	0,0760	250,00	0,00
15	TsC51B	Autobasculanta-5t	100 m3			19,00
		Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	h-ut	0,0760	250,00	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat				192,41
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	h-om	0,3600	65,00	23,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	m3	0,0040	300,00	1,10
16	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm	h-ut	0,4000	420,00	167,94
			m3			452,17
	7129020012800	Pavator				74,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	h-om	1,1500	65,00	74,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,3110	240,00	314,64
			m3	0,2320	15,00	3,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	terasam. Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
17	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta fr.4-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20m)	m3			612,30 107,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	65,00	107,25
	1411122201646	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta 32-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,00	72,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		4. Refacerea transeelor dupa realizarea retelelor de canalizare - 1083.6m2				
18	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - decaparea stratului de acoperire h=10cm	100 m3			1 526,40 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	320,00	1 526,40
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			19,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			192,56 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	m3	0,0040	300,00	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	420,00	168,00
21	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm	m3			452,17 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	240,00	314,64
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
22	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta fr.4-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20m)	m3			612,30 107,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	65,00	107,25
	1411122201646	Piatra sparta 16-32 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	1411122201672	Piatra sparta 32-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	350,00	72,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		5. Aplicarea straturilor bituminoase - 6985 m2				
23	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri (selectiv)	m3			208,00 208,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000	65,00	208,00
24	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			72,15 72,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,00	72,15
25	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			19,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor cu beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			297,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	65,00	37,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	15,00	0,09
	111100010001311	Beton asfatic rul BA16 rul, bitum 50/70	t	0,1150	1 700,00	195,50
	23203226001101	Emulsie bituminoasa Tip C60B2	t	0,0006	11 100,00	6,66
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	320,00	2,56
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	210,00	12,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
27	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2			0,15
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	110,00	0,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	250,00	0,07
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza cu emulsie bituminoasa Tip C60B2 in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,35 l/m2	t			11 630,27
	23203226000401	Emulsie bituminoasa Tip C60B2	t	1,0300	11 100,00	11 435,27
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmd-2.0cm	t			1 816,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	65,00	13,65
	111100010001311	Beton asfatic rul BA16 rul, bitum 50/70	t	1,0100	1 700,00	1 717,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	850,00	27,71
30	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) - asternere totala (norma 0.0974 tn/m2) - nisip bitumat si otel patrat din norme de exclus K=1,250	m2			221,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	65,00	4,06
	111100010001311	Beton asfatic rul BA16 rul, bitum 50/70	t	0,0974	1 700,00	206,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	2,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	5,63

APROBAT:

Investitor

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

