

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

ЕАF000877823



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 07.03.2023 / 07.03.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML000000000225124978, BC'Moldindconbank'S.A. suc. 'Ciocana' Chisinau, MOLDDMD2X349		9. Transportator Перевозчик S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308		c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель PRIMARIA COMUNEI BACIOI, S.BACIOI Independentei nr.125				c.f./ nr.TVA 1005600001878 / ф.к./ код НДС 0304951	
3. Delegație Доверенность seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces - verbal de receptie a lucrarilor executate pe ianuarie - martie an.2023	
5. Punct încărcare or. Chișinău Пункт погрузки		6. Punct descărcare com. Bacioi, s.Bacioi, mun. Chișinau Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Bacioi	un	1	3523477,62	3523477,62	20
				704695,52	4228173,14
				704695,52	4228173,14
				X	0,00
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					

13. Permis eliberarea:
Отпуск director DUMITRU AXENTII
разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 07.03.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) director DUMITRU AXENTII

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 07.03.2023

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele Intermediarul (transportatorul):
М.П.

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul
(transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director ILIE LEAHU

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 07.03.2023

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport

Время простоя транспортного средства

Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя	
Încărcare Погрузка				
Descărcare Разгрузка				

19. Ruta și distanța de transport, km

Маршрут движения и расстояние перевозки, км

20. Forma de plată

Вид оплаты

21. Mențiuni

Отметки

22. Calculul prestațiilor de transport

Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

Antreprenor SC Foremcons SRL
(denumirea)

Investitor Primaria com. Bacioi
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructive a sistemului de
canalizare si reabilitare a drumului pe
unele strazi din comuna Bacioi**
Rețele exterioare de canalizare (SPAU-
5,6,10))

Valoarea lucrarilor executate **4 228 173,14 lei**

Proces - verbal Nr. 1

de receptie a lucrarilor executate
pe *ian - martie* an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	57,420	922,499 0,000	52 969,893 0,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	177,600	175,038 175,038	31 086,749 31 086,749
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m ,	m3	289,800	225,170 225,170	65 254,266 65 254,266

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	3 075,000	42,455 25,491	130 549,125 78 384,825
8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2	7 175,000	25,491 25,491	182 897,925 182 897,925
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	4,040	1 012,500 0,000	4 090,500 0,000
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	687,700	14,080 0,000	9 682,816 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,040	194,588 30,588	786,136 123,576
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 352,000	26,341 26,341	35 613,032 35 613,032
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de	m3	1 352,000	64,728	87 512,256

1	2	3	4	5	6	7
		mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			63,728	86 160,256
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	44,500	436,000 0,000	19 402,000 0,000
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	44,500	1 126,635 749,435	50 135,258 33 349,858
		Total capitol: Inclusiv salariu				669 979,956 512 870,487
		1.2. Conducte si armaturi				
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d200mm (C1)	m	2 043,000	496,468 33,138	1 014 284,124 67 700,934
19		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	2 043,000	4,880 0,000	9 969,840 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 024 253,964 67 700,934
		1.3. Camine				
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 195,12 m3)	m3	56,480	4 025,381 1 348,474	227 353,519 76 161,812
24		Placi prefabricate pt.	buc	80,000	848,000	67 840,000

1	2	3	4	5	6	7
		camine KII-10 (0,18 m3)			0,000	0,000
26		Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	123,000	<u>641,000</u> 0,000	<u>78 843,000</u> 0,000
27		Inel prefabricat pt. camine KII10-9 (0,24m3)	buc	34,000	<u>800,000</u> 0,000	<u>27 200,000</u> 0,000
30		Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1 (0,1m3)	buc	80,000	<u>848,000</u> 0,000	<u>67 840,000</u> 0,000
32		Inel de reazem KIIO-1 (0,02 m3)	buc	80,000	<u>236,000</u> 0,000	<u>18 880,000</u> 0,000
33		Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05m3)	buc	80,000	<u>357,000</u> 0,000	<u>28 560,000</u> 0,000
34		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	551,000	<u>165,000</u> 0,000	<u>90 915,000</u> 0,000
35		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	2 168,000	<u>20,000</u> 0,000	<u>43 360,000</u> 0,000
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,168	<u>1 045,631</u> 547,207	<u>2 266,928</u> 1 186,345
37		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	80,000	<u>1 981,860</u> 0,000	<u>158 548,800</u> 0,000
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIIO-1)	m3	3,900	<u>2 175,752</u> 382,365	<u>8 485,433</u> 1 491,224

1	2	3	4	5	6	7
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	1,000	717,652 97,715	717,652 97,715
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3	0,500	2 176,916 382,394	1 088,458 191,197
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	518,000	153,424 74,774	79 473,632 38 732,932
		Total capitol: Inclusiv salariu				901 372,422 117 861,225
		1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 056,000	33,266 24,641	35 128,896 26 020,896
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	73,890	182,397 135,952	13 477,314 10 045,493
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,580	1 057,500 0,000	2 728,350 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				51 334,560 36 066,389
		1.5. Demolarea si reconditionarea. Beton de ciment				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	100,000	33,266 24,641	3 326,600 2 464,100

1	2	3	4	5	6	7
51	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	12,600	352,797 290,597	4 445,242 3 661,522
52	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,200	1 057,362 0,000	211,472 0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 983,314 6 125,622
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 654 924,216 740 624,657

		Total	lei	2 654 924,21
		Asigurare sociala si medicala	24,00 %	177 749,88
		Cheltuieli de transport	4,00 %	70 413,67
		Total	100,00 +	2 903 087,76
		Cheltuieli de regie	14,50 %	420 947,73
		Total	100,00 +	3 324 035,49
		Beneficiul de deviz	6,00 %	199 442,13
		Total	100,00 +	3 523 477,62
		TVA	20,00 %	704 695,52
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		4 228 173,14 740 624,66

ANTREPRENOR: SC Foremcons SRL (entitatea)


Director




Axentii Dumitru

L.Ş.

Diriginte de şantier


(semnătura)


(numele, prenumele)

L.Ş.

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: SRL, FAVOR PROIECT (entitatea)

Responsabil tehnic


(semnătura)

Tocaru Andrei
(numele, prenumele)

L.Ş.

BENEFICIAR:


Primărie com. Băcioi (entitatea)

Primar


(semnătura)

Yeshu ilie
(numele, prenumele)

L.Ş.

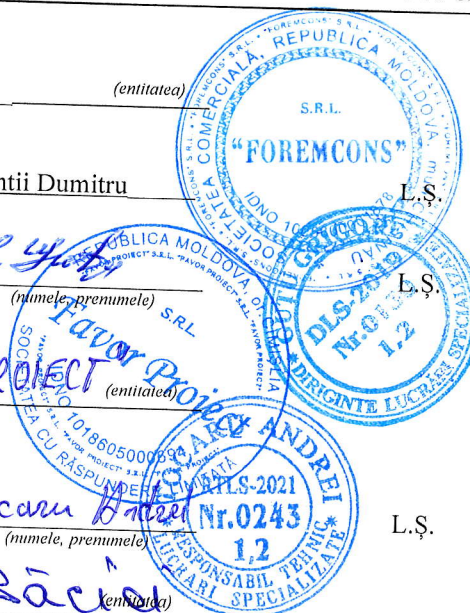

Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, **Investitor**
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)
№17/21-CE

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Retele exterioare de canalizare (SPA-5,6,10))

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,499 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,499
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038 175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,170 225,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	204,778
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	20,393
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2			42,455 25,491
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 900,00	15,931
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	55,00	1,032
8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2			25,491 25,491
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,080 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	14,080
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,588 30,588

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,588
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,000
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,728 63,728
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,728
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,000
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,000
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 126,635 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,200
		1.2. Conducte si armaturi				
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d200mm (C1)	m			496,468 33,138
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,138
	252121670050018	Teava PPHM SN8 d200mm	m	1,0450	441,00	463,149
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	90,00	0,180
19		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m			4,880 0,000
	2222219	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	1,0000	4,88	4,880
		1.3. Camine				
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 195,12 m3)	m3			4 025,381 1 348,474
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	84,97	944,017
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	84,97	404,458
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 600,00	1 105,496
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	500,00	65,457
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 200,00	87,004
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 600,00	201,388
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	30,00	302,100
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	30,00	217,512
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	30,00	54,378
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	2,12	44,832
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,611
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	300,00	588,001
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	120,00	9,119
24		Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc			848,000 0,000
	2222241	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	848,00	848,000
26		Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6 (0,16 m3)	buc			641,000 0,000
	2222261	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	641,00	641,000
27		Inel prefabricat pt. camine KLI10-9 (0,24m3)	buc			800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2222271	Inel prefabricat pt. camine KLI10-9 (0,24m3)	buc	1,0000	800,00	800,000
30		Placi prefabricate pt. camine KLI11-10-1 (0,1m3)	buc			848,000
						0,000
	2222301	Placi prefabricate pt. camine KLI11-10-1 (0,1m3)	buc	1,0000	848,00	848,000
32		Inel de reazem KLI0-1 (0,02 m3)	buc			236,000
						0,000
	2222321	Inel de reazem KLI0-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	236,00	236,000
33		Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05m3)	buc			357,000
						0,000
	2222331	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05m3)	buc	1,0000	357,00	357,000
34		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc			165,000
						0,000
	2222341	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	1,0000	165,00	165,000
35		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			20,000
						0,000
	2222351	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,000
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 045,631
						547,207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,207
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	272,994
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,00	144,297
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	50,00	27,491
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,755
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
37		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			1 981,860
						0,000
	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	1 943,00	1 981,860
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KLI0-1)	m3			2 175,752
						382,365
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	266310210000039	Beton B10	m3	1,0250	1 600,00	1 656,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			717,652
						97,715
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,715
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	443,33	581,206
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,660
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,760
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			2 176,916
						382,394
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000039	Beton B10	m3	1,0250	1 600,00	1 657,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,020
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000

1	2	3	4	5	6	7
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2			153,424
	9310060019920	Muncitor deservire CM				74,774
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	84,97	42,485
	24165373438290	Amestec "Penetron"	h-om	0,3800	84,97	32,289
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,8000	98,00	78,400
			m3	0,0250	10,00	0,250
		1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			33,266
	7123010010200	Betonist				24,641
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	h-om	0,2900	84,97	24,641
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	buc	0,0035	250,00	0,875
			m3	0,0400	10,00	0,400
44	DI109	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,350
		Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			182,397
	9310060019930	Muncitor				135,952
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,0191	200,00	3,819
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 057,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
		1.5. Demolarea si reconditionarea. Beton de ciment				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			33,266
	7123010010200	Betonist				24,641
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	h-om	0,2900	84,97	24,641
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	buc	0,0035	250,00	0,875
			m3	0,0400	10,00	0,400
51	RpCB18F	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,350
		Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			352,797
	7123010010200	Betonist				290,597
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000	84,97	178,437
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	h-om	1,3200	84,97	112,160
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	m3	0,0500	10,00	0,500
			h-ut	0,2900	150,00	43,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	55,00	15,950
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,250
52	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 057,362
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele exterioare de apeduct si
canalizare, inclusive statia de
epurare a comunei Bacioi (satele
Bacioi, Braila, Straisteni,
Frumusica) №17/21-CE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10))**

Valoarea de deviz 4 228 173,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	196,840	84,97	16 725,495
2.	7123010010200	Betonist	h-om	378,640	84,97	32 173,041
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	3 075,000	84,97	261 282,750
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	84,97	97,715
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 424,263	84,97	121 019,627
6.	7137010011500	Electrician	h-om	69,552	84,97	5 909,833
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,962	84,97	1 186,351
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 891,338	84,97	245 676,988
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	278,492	84,97	23 663,465
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	268,845	84,97	22 843,760
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	118,224	84,97	10 045,493
		Total manopera				740 624,66

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	1 194,383	2,12	2 532,092
2.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	443,33	581,206
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,114	5,00	10,570
4.	1714227322926	Fringhie de cinapa gudronata	kg	409,503	30,00	12 285,090
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	7,394	500,00	3 697,000
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	8,303	5 900,00	48 987,700
7.	2222219	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	2 043,000	4,88	9 969,840
8.	2222241	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	80,000	848,00	67 840,000
9.	2222261	Inel prefabricat pt. camine КЦД-10-6 (0,16 m3)	buc	123,000	641,00	78 843,000
10.	2222271	Inel prefabricat pt. camine КЦД10-9 (0,24m3)	buc	34,000	800,00	27 200,000
11.	2222301	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3)	buc	80,000	848,00	67 840,000
12.	2222321	Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	80,000	236,00	18 880,000

13.	2222331	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05m3)	buc	80,000	357,00	28 560,000
14.	2222341	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	551,000	165,00	90 915,000
15.	2222351	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	2 168,000	20,00	43 360,000
16.	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	81,600	1 943,00	158 548,800
17.	2320156200901	Motorina	kg	102,376	30,00	3 071,280
18.	2320166200676	White spirit	kg	4,228	25,00	105,700
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	568,754	30,00	17 062,620
20.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	414,400	98,00	40 611,200
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	16,910	35,00	591,850
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,455	37,00	312,835
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,192	50,00	59,600
24.	252121670050018	Teava PPHM SN8 d200mm	m	2 145,610	441,00	946 214,010
25.	26511221004022	Ciment M-400	kg	45,500	2,00	91,000
26.	266310210000039	Beton B10	m3	4,555	1 600,00	7 288,000
27.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	7,109	1 600,00	11 374,400
28.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	39,024	1 600,00	62 438,400
29.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	4,095	1 200,00	4 914,000
30.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,046	250,00	1 011,500
31.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	57,810	55,00	3 179,550
32.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	181,672	10,00	1 816,720
33.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	14,025	10,00	140,250
		Total materiale de construcții				1 760 333,22


Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,654	150,00	548,100
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,890	15,00	28,350
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,100	400,00	440,000
4.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,411	200,00	282,200
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	220,00	33,660
6.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	133,334	450,00	60 000,300
7.	2952260003553	Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP	h-ut	48,505	400,00	19 402,000
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,616	410,00	662,560
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,760	90,00	158,400
10.	2952270003306	Electropompă de apă 4-6 kw	h-ut	4,086	90,00	367,740
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	60,919	55,00	3 350,545
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	419,635	40,00	16 785,400
13.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	4,292	120,00	515,040
14.	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	339,864	25,00	8 496,600
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	110,701	300,00	33 210,300
16.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	44,013	220,00	9 682,860
17.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	120,00	2,760
		Total utilaje de construcții				153 966,82

Total	lei	2 654 924,55
Asigurare socială și medicală	24,00 %	177 749,88

Cheltuieli de transport	4,00 %	70 413,67
Total	100,00 +	2 903 087,76
Cheltuieli de regie	14,50 %	420 947,73
Total	100,00 +	3 324 035,49
Beneficiul de deviz	6,00 %	199 442,13
Total	100,00 +	3 523 477,62
TVA	20,00 %	704 695,52
		4 228 173,14

Total deviz:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

