

NOTĂ INFORMATIVĂ
 privind valoarea lucrărilor executate
 în luna septembrie 2022

Beneficiar: **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"** Cod fiscal 1003600023559

Antreprenor: **S. A. "Drumuri - Strășeni"** Cod fiscal 1003600111971

Contract Nr. 10/01-05/245 din 16 august 2022

Denumirea obiectivului executat și adresa:

**„Lucrări de întreținere periodică a sectorului de drum M5
 Fr. Cu Ucraina-Criva-Bălți-Chisinau-Tiraspol-fr. Cu
 Ucraina, km. 243+580 – 244+000, amplasat teritorial în
 raionul Strășeni (Sector experimental)”**

| Denumirea obiectelor categoriilor de lucrări | Valoarea lucrărilor executate (lei) | | |
|---|--|----------------------------|--|
| | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | din care pe luna raportată | |
| | | Total | inclusiv: lucrări de montare a utilajului |
| A | 1 | 2 | 3 |
| Valoarea lucrărilor de antrepriză | 1 175 061,00 | 1 175 061,00 | |
| Total | 1 175 061,00 | 1 175 061,00 | |
| Taxa pe valoarea adăugată 20% | 235 012,20 | 235 012,20 | |
| TOTAL general | 1 410 073,20 | 1 410 073,20 | |

Antreprenor:

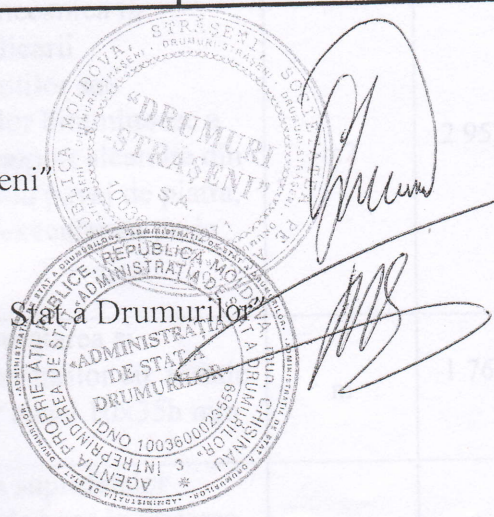
S. A. „Drumuri - Strășeni”

Director interimar Igor Gonța

Beneficiar:

Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef serviciu RLR Sergiu Manțuc



Antreprenor S. A. Drumuri - Straseni
 (denumirea)

Investitor I. S. Administratia de Stat a Drumurilor
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a sectorului
 de drum M2 Fr. cu Ucraina-Criva-Balti-
 Chisinau-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km.
 243+612-244+000 amplasat teritorial in r-l
 Straseni (Sector experimental)**

Valoarea lucrarilor executate **1 410 073,20 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe luna septembrie 2022

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--|------|-----------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 1 250,000 | 39,83 2,27 | 49 786,20 2 839,99 |
| 2 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 120,000 | 16,17 0,00 | 1 940,40 0,00 |
| 3 | RpDC06 B | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica | m2 | 2 953,000 | 0,59 0,00 | 1 740,55 0,00 |
| 4 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm | m | 1 760,000 | 44,87 7,16 | 78 973,51 12 603,36 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 3,540 | 16 127,69 0,00 | 57 092,01 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|---|----|-----------|----------------------|-------------------------------|
| 6 | RpDD18 A | Strat de geogril, de tip CG 50 L (tip ADFORS SAINT GOBAIN asezat cu suprapunerile nelipite (in interiorul normei geogrila se include in m2 cu norma de consum 1,1 m2) | m2 | 2 953,000 | 52,41 <hr/> 2,60 | 154 772,63 <hr/> 7 689,61 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 (cu utilizarea adaosuri de polimeri din material plastic reciclat MR 8), executat la cald in grosime de 5 cm. k=1,25 | m2 | 2 953,000 | 245,16 <hr/> 3,44 | 723 967,66 <hr/> 10 146,51 |

| | | | |
|--|--|------|-------------------------|
| | Total | lei | 1 068 272,96 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 7 987,07 |
| | Total | | 1 076 260,03 |
| | Cheltuieli de regie | 6 % | 64 575,60 |
| | Total | | 1 140 835,63 |
| | Beneficiu de deviz | 3 % | 34 225,07 |
| | Total | | 1 175 061,00 |
| | TVA | 20 % | 235 012,20 |
| | | | 1 410 073,20 |
| | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu | | 3327947 41266,54 |

INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
S. A. „Drumuri - Strasenî”

Investitor
I. S. Administratia de Stat a Drumurilor

(denumirea)

(denumirea)

Director-interimar  I. Gonța
(funcția, numele, prenumele, semnătura)


Șef serviciu RLR  Ș. Manțuc
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Diriginte de șantier

Responsabil tehnic

 Gh. Rusu

 A. Rogut

