

**FACTURĂ FISCALĂ**  
**НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ**



Seria, Nr.  
Серия, № **EAI000164560**



Data eliberării /data livrării  
Дата выписки /дата поставки **12.07.2023 / 12.07.2023**

număr:  
номер \_\_\_\_\_ data:  
дата \_\_\_\_\_

1. Furnizor:  
Поставщик **S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308 Cont MD61ML00000000225124978**

9. Transportator  
Перевозчик **S.C. FOREMCONS S.R.L., SEC.BOTANICA Padurii nr.8 of.308**

c.f./ nr.TVA 1005600001878 /  
ф.к./ код НДС 0304951

c.f./ nr.TVA 1005600001878 /  
ф.к./ код НДС 0304951

c.f./ nr.TVA 1007601010220 /  
ф.к./ код НДС

2. Cumpărător/beneficiar:  
Покупатель/получатель **PRIMARIA COMUNEI BACIOI, S.BACIOI Independentei nr.125**

4. Documente anexate  
Прилагаемые документы

Proces - verbal Nr.3 de receptie a lucrarilor executate  
pe mai- iunie an.2023

3. Delegație seria \_\_\_\_\_ număr \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ delegat  
Доверенность серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ делегированный \_\_\_\_\_

7. Redirijări  
Переадресовки

5. Punct încărcare or. Chișinău  
Пункт погрузки

6. Punct descărcare com. Bacioi, s.Bacioi, mun. Chisinau  
Пункт разгрузки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și curățare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi	un	1	3973811.69	3973811,69	20	794762,34	4768574,03				
				3973811,69	X	794762,34	4768574,03	X	X	X	0,00

12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor  
электронная подпись Поставщика 12.07.2023

13. Permis eliberarea:  
Отпуск \_\_\_\_\_  
разрешил: \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor  
электронная подпись Поставщика 12.07.2023

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărător/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_

director ILIE LEAHU

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător  
электронная подпись Покупателя 12.07.2023

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport  
Время простоя транспортного средства

Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя	
Încărcare Погрузка				
Descărcare Разгрузка				
20. Forma de plată Вид оплаты				

19. Ruta și distanța de transport, km  
Маршрут движения и расстояние перевозки, км

---

---

---

---

---

21. Mențiuni

Отметки

---

22. Calculul prestațiilor de transport  
Расчет транспортных услуг

---

---

4. Documente anexate  
Прилагаемые документы

---

---

Antreprenor SC Foremcons SRL  
 (denumirea )

Investitor Primaria com. Bacioi  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de constructive a sistemului de canalizare si reabilitare a drumului pe unele strazi din comuna Bacioi**  
 Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10))

Valoarea lucrarilor executate 4 768 574,03 lei

### Proces - verbal Nr. 3

de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari terasamente</b>				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	6,260	1 057,500 0,000	6 619,950 0,000
2	TsA20B k=1,2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,000	210,046 210,046	3 990,874 3 990,874
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-	h-ut	11,000	90,000 0,000	990,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		500 Mc/h				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	61,440	922,499 0,000	56 678,339 0,000
5	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	192,000	175,038 175,038	33 607,296 33 607,296
6	TsA16E1	Sapatura manuală de pământ, în spații limitate, în transe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m, adîncime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	321,000	225,170 225,170	72 279,570 72 279,570
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la sapaturi executate în spații limitate, avînd lățimea de pînă la 1,50 m între maluri adîncimea sapaturii de 0,00...2 m, între dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	3 406,000	42,455 25,491	144 601,730 86 822,346
8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la sapaturi executate în spații limitate, avînd lățimea de pînă la 1,50 m între maluri adîncimea sapaturii de 0,00...2 m, între dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2	7 948,000	25,491 25,491	202 602,468 202 602,468
9	AcF03C	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare	m3	37,000	553,828 99,415	20 491,636 3 678,355

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	4,500	1 012,500 0,000	4 556,250 0,000
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	761,000	14,080 0,000	10 714,880 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,500	194,588 30,588	875,646 137,646
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 498,000	26,341 26,341	39 458,818 39 458,818
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 498,000	64,728 63,727	96 962,544 95 463,046
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	49,420	436,000 0,000	21 547,120 0,000
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a	100 m3	49,420	1 126,635 749,435	55 678,302 37 037,078

1	2	3	4	5	6	7	
		umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv					
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>771 655,423 575 077,494</b>	
		<b>1.2. Conducte si armaturi</b>					
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d200mm (C1)	m	2 263,000	496,468 33,138	1 123 507,084 74 991,294	
19		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	2 263,000	4,880 0,000	11 043,440 0,000	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 134 550,524 74 991,294</b>	
		<b>1.3. Camine</b>					
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 195,12 m3)	m3	49,250	4 025,381 1 348,474	198 250,014 66 412,345	
23	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 17,06 m3)	m3	27,030	2 543,083 948,266	68 739,534 25 631,630	
24		Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	71,000	848,000 0,000	60 208,000 0,000	
25		Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	15,000	1 600,000 0,000	24 000,000 0,000	
26		Inel prefabricat pt. camine KИД-10-6 (0,16 m3)	buc	85,000	641,000 0,000	54 485,000 0,000	


1	2	3	4	5	6	7
27		Inel prefabricat pt. camine KIQ10-9 (0,24m3)	buc	45,000	800,000 0,000	36 000,000 0,000
28		Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-6 (0,265 m3)	buc	22,000	960,000 0,000	21 120,000 0,000
29		Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)	buc	26,000	1 333,000 0,000	34 658,000 0,000
30		Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-10-1 (0,1m3)	buc	71,000	848,000 0,000	60 208,000 0,000
31		Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-15-1 (0,27 m3)	buc	15,000	1 509,000 0,000	22 635,000 0,000
32		Inel de reazem KIQO-1 (0,02 m3)	buc	86,000	236,000 0,000	20 296,000 0,000
33		Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05m3)	buc	86,000	357,000 0,000	30 702,000 0,000
34		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	600,000	165,000 0,000	99 000,000 0,000
35		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	2 331,000	20,000 0,000	46 620,000 0,000
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,331	1 045,631 547,207	2 437,366 1 275,540
37		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	86,000	1 981,860 0,000	170 439,960 0,000
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu	m3	4,200	2 175,752 382,365	9 138,158 1 605,933

1	2	3	4	5	6	7	
		mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KLIQ-1)					
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	1,000	717,652 97,715	717,652 97,715	
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3	0,500	2 176,916 382,396	1 088,458 191,198	
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	580,000	153,424 74,774	88 985,920 43 368,920	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 049 729,062 138 583,281</b>	
		<b>1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt</b>					
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	480,000	33,266 24,641	15 967,680 11 827,680	
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	33,580	182,397 135,952	6 124,791 4 565,268	
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,100	1 057,500 0,000	1 163,250 0,000	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>23 255,721 16 392,948</b>	
		<b>1.5. Demolarea si reconditionarea. Beton de ciment</b>					
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a	m	226,000	33,266 24,641	7 518,116 5 568,866	

1	2	3	4	5	6	7
		rostrurilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri				
51	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	28,500	352,797 290,597	10 054,715 8 282,015
52	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,500	1 057,362 0,000	528,681 0,000
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>18 101,512 13 850,881</b>
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 997 292,242 818 895,898</b>


	Total	lei	2 997 292,24
	Asigurare sociala si medicala	24,00 %	196 535,28
	Cheltuieli de transport	4,00 %	80 302,57
	Total	100,00 +	3 274 130,09
	Cheltuieli de regie	14,50 %	474 748,86
	Total	100,00 +	3 748 878,95
	Beneficiul de deviz	6,00 %	224 932,74
	Total	100,00 +	3 973 811,69
	TVA	20,00 %	794 762,34
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>4 768 574,03 818 895,90</b>

Director



Axentii Dumitru

Diriginte de santier

  
(semnatura)

  
(numele, prenumele)

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ:

  
(entitatea)


Responsabil tehnic


  
(numele, prenumele)

BENEFICIAR:


  
(entitatea)


Primar

  
(semnatura)

  
(numele, prenumele)

L.S.



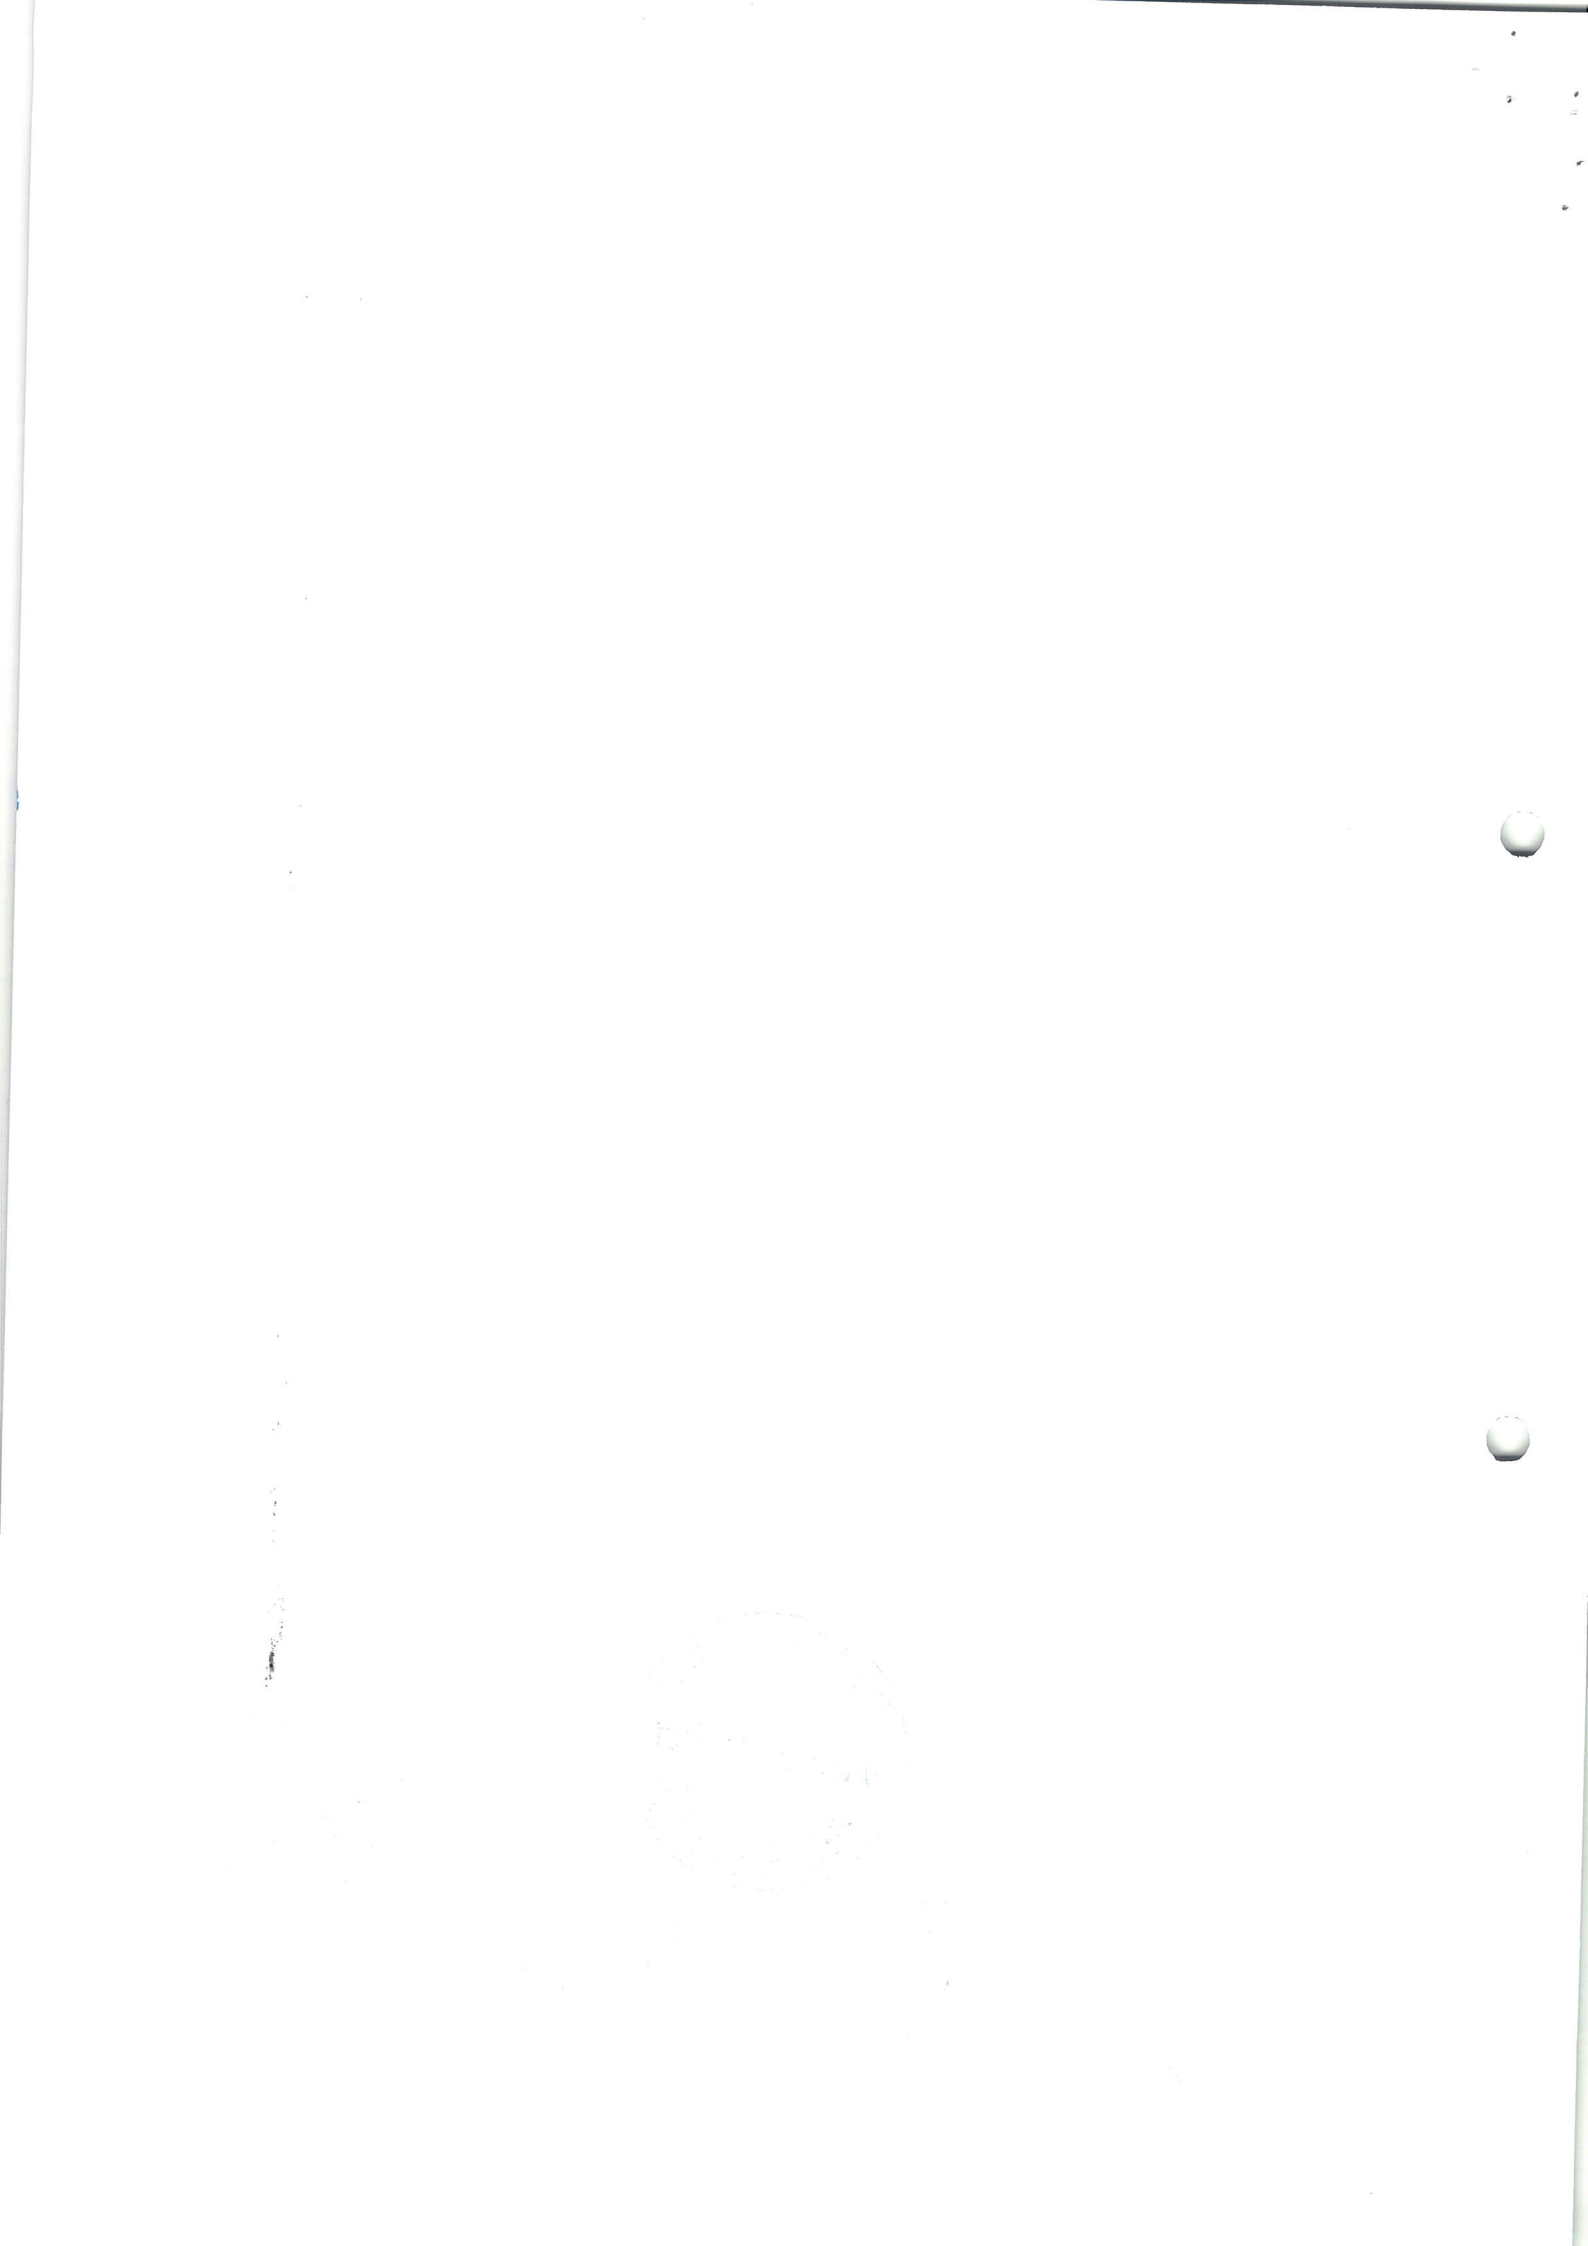

**Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor  
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi  
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)  
№17/21-CE**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari terasamente</b>				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 057,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
2	TsA20B k=1,2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			210,046 210,046
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	210,046
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			90,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	90,00	90,000
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,499 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,499
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038 175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,170 225,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	204,777
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	20,393
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2			42,455 25,491
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 900,00	15,930
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A I 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	55,00	1,034
8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total -	m2			25,491 25,491



**Obiect Retele exterioare de apeduct si canalizare, Investitor  
inclusive statia de epurare a comunei Bacioi  
(satele Bacioi, Braila, Straisteni, Frumusica)  
№17/21-CE**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Retele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari terasamente</b>				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 057,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
2	TsA20B k=1,2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			210,046
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	210,046
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			90,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	90,00	90,000
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,499
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,499
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			225,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	204,777
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	20,393
7	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2			42,455
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 900,00	15,930
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	55,00	1,034
8	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total -	m2			25,491
						25,491

1	2	3	4	5	6	7
		numai manopera)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,491
9	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			553,828 99,415
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,415
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	443,33	454,413
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			1 012,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,080 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	14,080
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			194,588 30,588
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,588
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	410,00	164,000
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
14	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,728 63,727
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,727
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,000
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,000
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 126,635 749,435
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,200
		<b>1.2. Conducte si armaturi</b>				
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 d200mm (C1)	m			496,468 33,138
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,138
	252121670050018	Teava PPHM SN8 d200mm	m	1,0450	441,00	463,149
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	90,00	0,180
19		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m			4,880 0,000
	2222219	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	1,0000	4,88	4,880
		<b>1.3. Camine</b>				
22	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 195,12 m3)	m3			4 025,381 1 348,474

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	84,97	944,018
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	84,97	404,457
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 600,00	1 105,446
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	500,00	65,452
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 200,00	87,009
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	1 600,00	201,389
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	30,00	302,100
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	30,00	217,512
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	30,00	54,378
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	2,12	44,832
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,00	1,611
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	300,00	588,000
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	120,00	9,120
23	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 17,06 m3)	m3			2 543,083 948,266
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	84,97	663,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	84,97	284,650
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 600,00	401,924
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	500,00	70,348
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 200,00	98,912
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 600,00	162,427
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	30,00	241,200
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	30,00	180,900
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	30,00	45,225
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	2,12	40,481
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,00	1,407
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	300,00	344,695
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	120,00	7,321
24		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			848,000 0,000
	2222241	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	848,00	848,000
25		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 600,000 0,000
	2222251	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
26		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc			641,000 0,000
	2222261	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	641,00	641,000
27		Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24m3)	buc			800,000 0,000
	2222271	Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24m3)	buc	1,0000	800,00	800,000
28		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc			960,000 0,000
	2222281	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	960,00	960,000
29		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 333,000 0,000
	2222291	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 333,00	1 333,000
30		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3)	buc			848,000 0,000
	2222301	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3)	buc	1,0000	848,00	848,000
31		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc			1 509,000 0,000
	2222311	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 509,00	1 509,000
32		Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc			236,000 0,000
	2222321	Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	236,00	236,000
33		Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05m3)	buc			357,000 0,000
	2222331	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05m3)	buc	1,0000	357,00	357,000
34		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc			165,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2222341	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	1,0000	165,00	165,000
35		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			20,000
	2222351	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,000
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 045,631
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,207
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,00	144,302
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	50,00	27,499
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,745
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,876
37		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			1 981,860
	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	1 943,00	1 981,860
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KLIQ-1)	m3			2 175,752
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000039	Beton B10	m3	1,0250	1 600,00	1 656,381
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,010
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			717,652
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,715
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	443,33	581,206
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,660
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,760
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			2 176,916
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,230
	266310210000039	Beton B10	m3	1,0250	1 600,00	1 657,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,020
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	90,00	36,000
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2			153,424
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,485
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	84,97	32,289
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	98,00	78,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,250
		<b>1.4. Demolarea si reconditionarea. Drumul din asfalt</b>				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			33,266

1	2	3	4	5	6	7
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	250,00	0,875
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,350
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			182,397
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,952
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,818
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	55,00	42,624
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în depozit teren catg. III	100 m3			1 057,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,500
		<b>1.5. Demolarea si reconditionarea. Beton de ciment</b>				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie în betonul de uzura la drumuri	m			33,266
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,641
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	250,00	0,875
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,350
51	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			352,797
						290,597
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	55,00	15,950
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,250
52	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în depozit teren catg. III	100 m3			1 057,362
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	450,00	1 057,362

APROBAT:

Intocmit

Investitor




(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

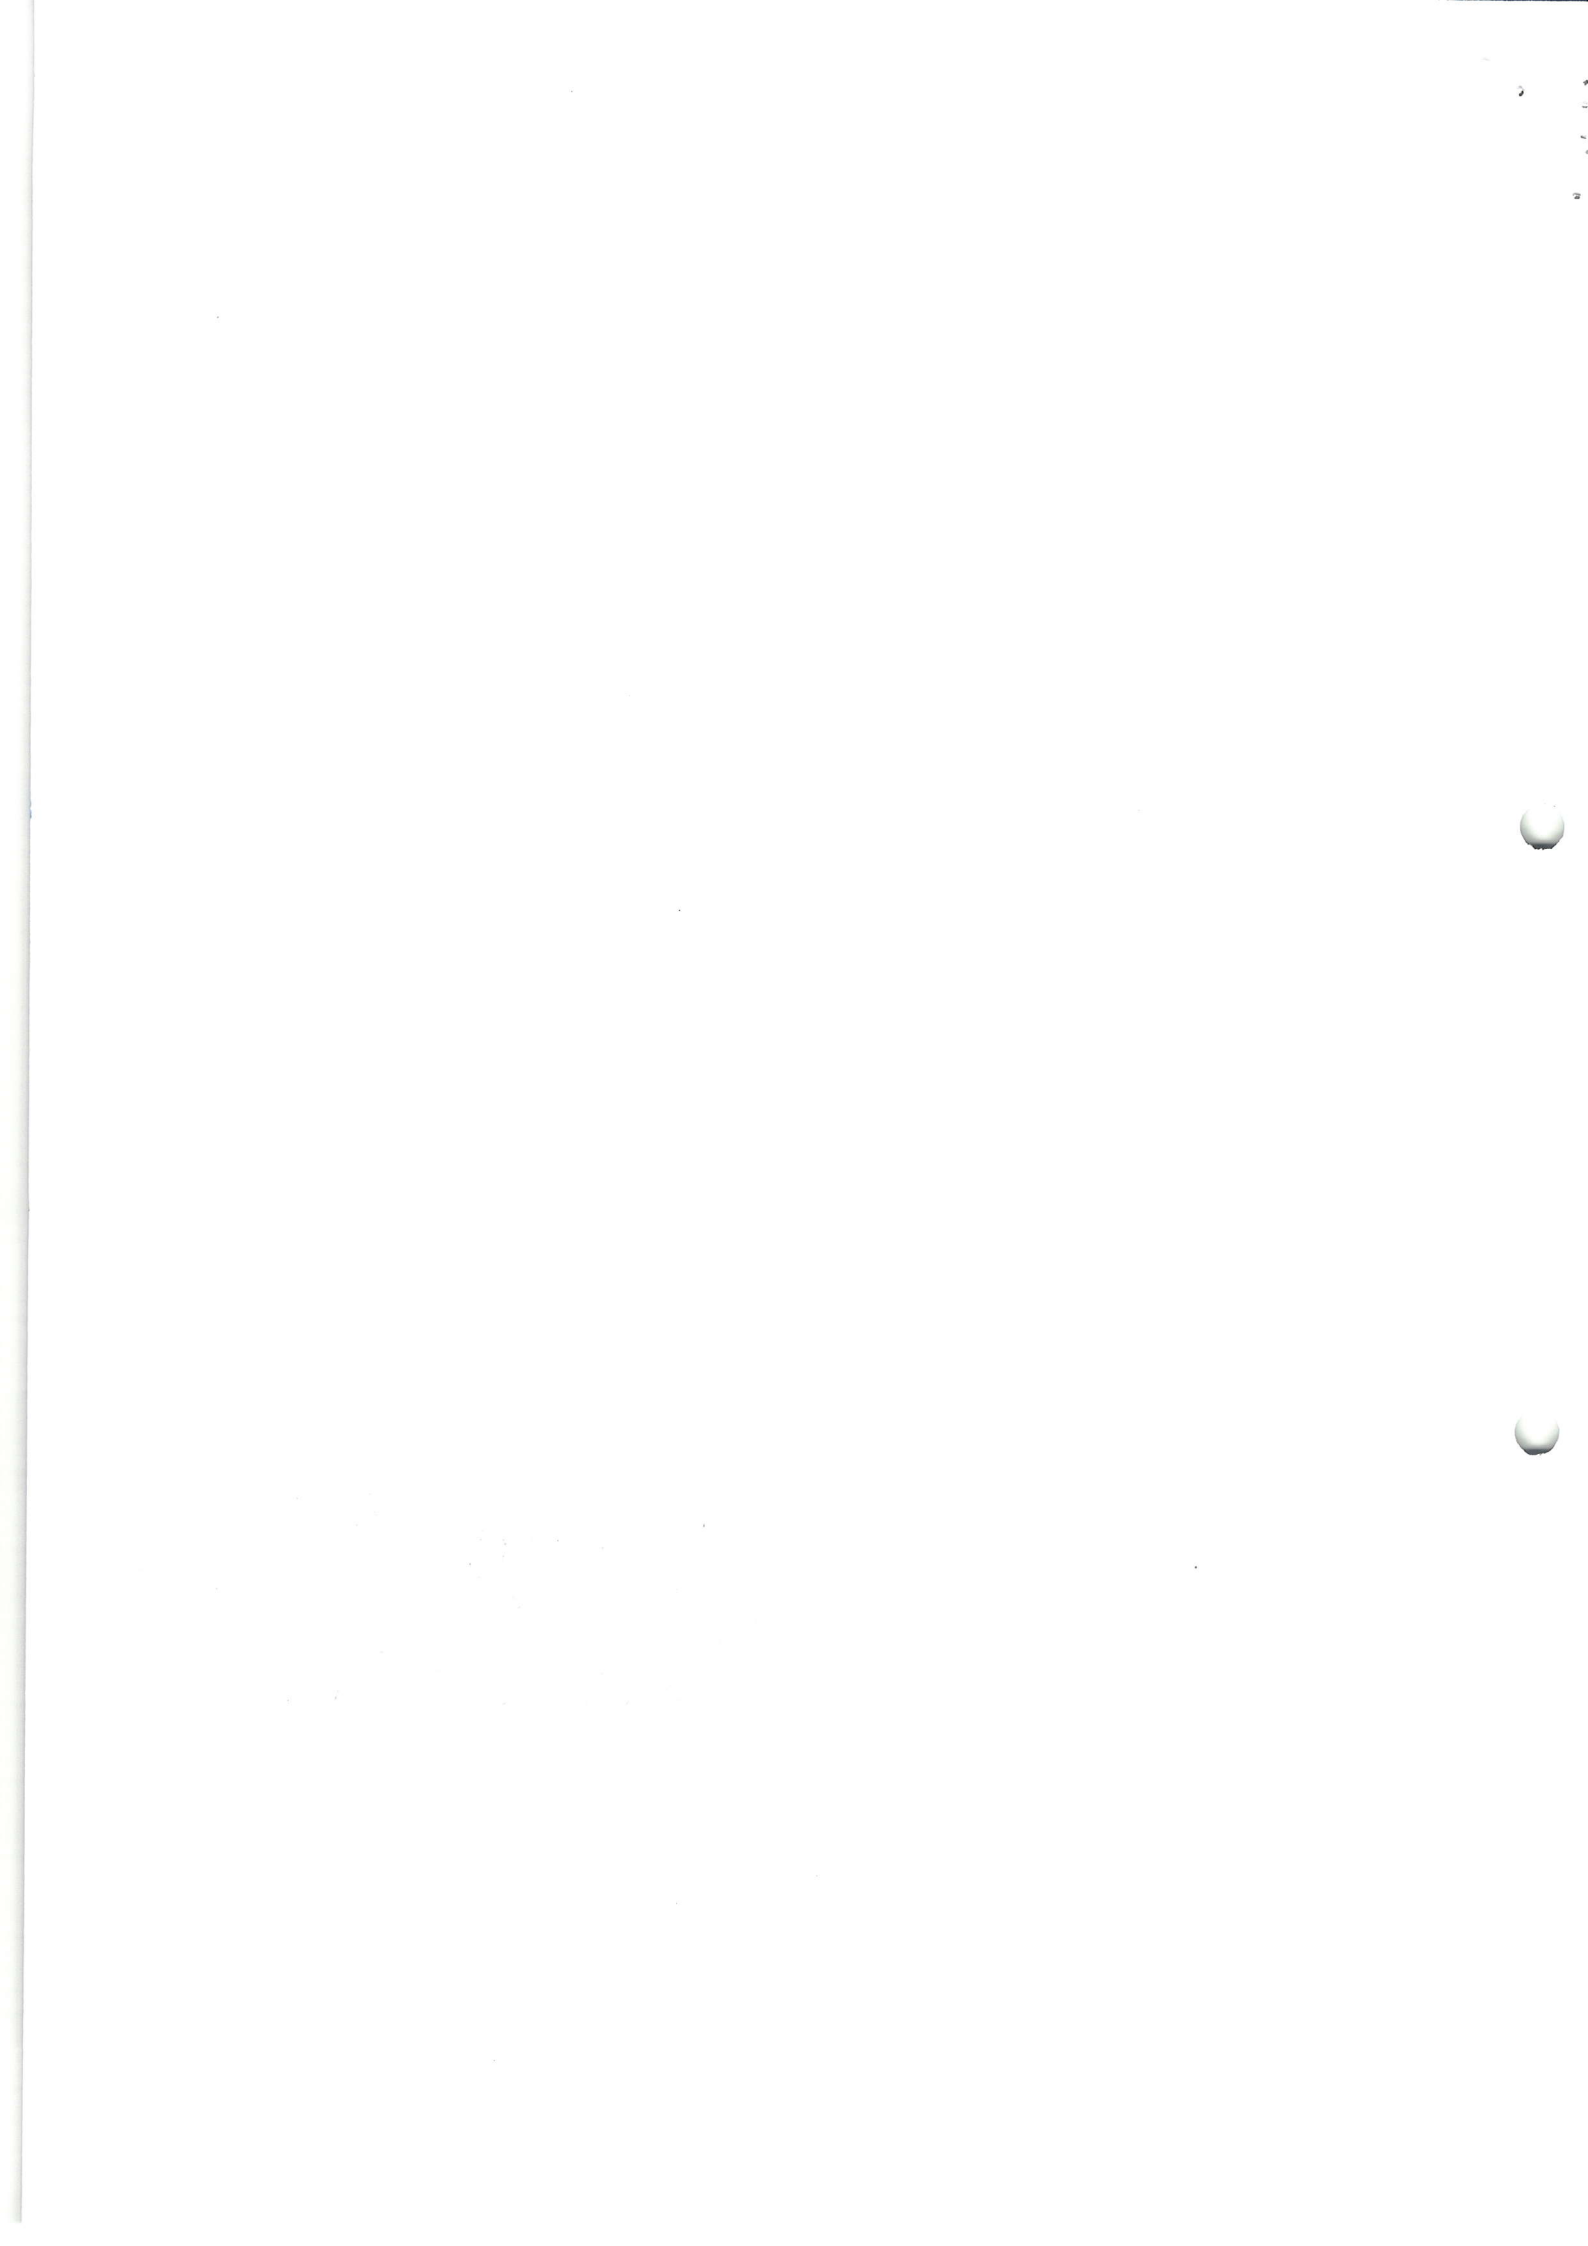

**Rețele exterioare de apeduct și  
canalizare, inclusive stația de  
epurare a comunei Bacioi (satele  
Bacioi, Braila, Straisteni,  
Frumusica) №17/21-CE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Rețele exterioare de canalizare (SPAU-5,6,10)**

Valoarea de deviz 4 768 574,03 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	220,400	84,97	18 727,388
2.	7123010010200	Betonist	h-om	282,685	84,97	24 019,744
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	3 406,200	84,97	289 424,814
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	84,97	97,715
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 640,842	84,97	139 422,345
6.	7137010011500	Electrician	h-om	77,040	84,97	6 546,089
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15,012	84,97	1 275,570
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 241,482	84,97	275 428,725
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	330,675	84,97	28 097,454
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	324,980	84,97	27 613,550
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	53,728	84,97	4 565,268
12.	9312040019600	Sapator	h-om	43,290	84,97	3 678,351
<b>Total manopera</b>						<b>818 895,90</b>

**Materiale:**

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	1 557,628	2,12	3 302,172
2.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	37,925	443,33	16 813,290
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	443,33	581,206
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,273	5,00	11,365
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	520,073	30,00	15 602,190
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	10,250	500,00	5 125,000
7.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	9,196	5 900,00	54 256,400
8.	2222219	Banda de semnalizare și avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	2 263,000	4,88	11 043,440
9.	2222241	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	71,000	848,00	60 208,000
10.	2222251	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	15,000	1 600,00	24 000,000
11.	2222261	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-6 (0,16 m3)	buc	85,000	641,00	54 485,000

12.	2222271	Inel prefabricat pt. camine KII10-9 (0,24m3)	buc	45,000	800,00	36 000,000
13.	2222281	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	22,000	960,00	21 120,000
14.	2222291	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	26,000	1 333,00	34 658,000
15.	2222301	Placi prefabricate pt. camine KII11-10-1 (0,1m3)	buc	71,000	848,00	60 208,000
16.	2222311	Placi prefabricate pt. camine KII11-15-1 (0,27 m3)	buc	15,000	1 509,00	22 635,000
17.	2222321	Inel de reazem KIIO-1 (0,02 m3)	buc	86,000	236,00	20 296,000
18.	2222331	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05m3)	buc	86,000	357,00	30 702,000
19.	2222341	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	600,000	165,00	99 000,000
20.	2222351	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	2 331,000	20,00	46 620,000
21.	2222371	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	87,720	1 943,00	170 439,960
22.	2320156200901	Motorina	kg	130,019	30,00	3 900,570
23.	2320166200676	White spirit	kg	4,545	25,00	113,625
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	713,268	30,00	21 398,040
25.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	464,000	98,00	45 472,000
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	18,182	35,00	636,370
27.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	9,091	37,00	336,30
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,282	50,00	64,100
29.	252121670050018	Teava PPHM SN8 d200mm	m	2 376,659	441,00	1 048 106,619
30.	26511221004022	Ciment M-400	kg	58,692	2,00	117,384
31.	266310210000039	Beton B10	m3	4,866	1 600,00	7 785,600
32.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	8,943	1 600,00	14 308,800
33.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	40,817	1 600,00	65 307,200
34.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	5,799	1 200,00	6 958,800
35.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,471	250,00	617,750
36.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	64,033	55,00	3 521,815
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	178,272	10,00	1 782,720
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,400	10,00	164,000
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>2 007 698,78</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,265	150,00	1 239,750
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,275	15,00	64,125
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,175	400,00	470,000
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,641	200,00	128,200
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	220,00	33,660
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	154,548	450,00	69 546,600
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	53,868	400,00	21 547,200
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,800	410,00	738,000
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,880	90,00	169,200
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	4,526	90,00	407,340
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	34,289	55,00	1 885,895
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	466,031	40,00	18 641,240
13.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	5,392	120,00	647,040
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	207,564	25,00	5 189,100

15.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	11,000	90,00	990,000
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	127,587	300,00	38 276,100
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	48,704	220,00	10 714,880
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	120,00	2,760
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>170 691,09</b>

Total	lei	2 997 292,24
Asigurare sociala si medicala	24,00 %	196 535,28
Cheltuieli de transport	4,00 %	80 302,57
Total	100,00 +	3 274 130,09
Cheltuieli de regie	14,50 %	474 748,86
Total	100,00 +	3 748 878,95
Beneficiul de deviz	6,00 %	224 932,74
Total	100,00 +	3 973 811,69
TVA	20,00 %	794 762,34

**Total deviz:**

**4 768 574,  
03**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primit

Edu Iliș



1

1917

1917

