

Antreprenor SA Pasc-con
 (denumirea)

Investitor Pretura sec.Botanica
 (denumirea)

Obiect **Renovarea trotuarului, pe o parte a
 str.Burebista pentru largirea trotuarului si
 organizarii a 65 locuri de parcare, pe
 sectorul de drum cuprins intre blocurile
 nr.30-93**

Valoarea lucrarilor executate 429 877 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 2. Suprafata pavata (alb)=2970,00 m2				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,000	873,870 520,670	4 369,349 2 603,349
2	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	700,000	62,500 14,761	43 750,217 10 332,672
3	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	700,000	8,814 3,114	6 169,548 2 179,548
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	920,000	218,619 34,365	201 129,121 31 616,131
		Total capitol: Inclusiv salariu				255 418,235 46 731,700
		2. Capitol 3. Suprafata pavata (negru)=413 m2				
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de	m2	50,000	218,619 34,365	10 930,930 1 718,268

1	2	3	4	5	6	7
		coordoneza suplimentar cu beneficiarul)				
6	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 405,514
						340,194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	980,00	980,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	980,00	82,320
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
7	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			2 587,432
						415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,554
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 134,00	2 134,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	980,00	35,280
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000

APROBAT:

*Pretura sect.
Botanica*


Intocmit
Director **Mihail Panaite**

Investitor
Secretarul **Ion Diacon**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Ion Diacon

Antreprenor SA Pasc-con
 (denumirea)

Investitor Pretura sec.Botanica
 (denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **359 259 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iude an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Capitol I Demolari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	658,000	49,203 ----- 16,721	32 375,837 ----- 11 002,681
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	463,200	39,785 ----- 39,785	18 428,597 ----- 18 428,597
3	DGD4A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	658,000	8,649 ----- 8,649	5 691,042 ----- 5 691,042
4	TsCO2DI	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,850	1 788,816 ----- 0,000	5 098,125 ----- 0,000
5	TsCO2DI	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,680	1 788,839 ----- 0,000	3 005,250 ----- 0,000
6	TsISIAIO	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	456,000	11,420 ----- 0,000	5 207,600 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		scade la norma D1111 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				3,114
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	3,114
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	250,00	5,701
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			218,619 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	154,17	156,483
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,91	3,056
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7,8700	1,91	15,032
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	185,00	0,925
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	185,00	7,919
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	42,00	0,840
		4. Capitol 5. Borduri				
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			386,695 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	95,00	19,951
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,161
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			211,172 38,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	980,00	44,100
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,91	6,055
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	185,00	1,665
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,600
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, alcilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			133,905 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	980,00	47,040
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,91	1,948
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	185,00	0,555
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	66,67	67,003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,060


APROBAT:

Intocmit
Director M. Panaite
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor I. Diacon
Secretar
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

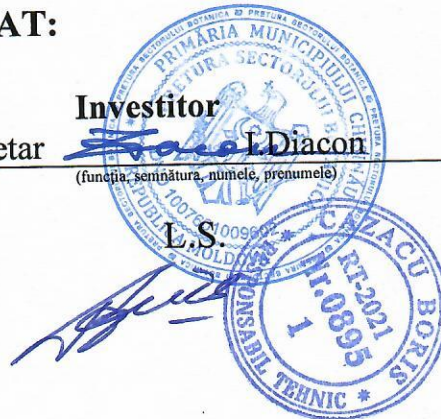

Antreprenor SA Pasc-con
(denumirea)

Investitor Pretura sec.Botanica
(denumirea)

Obiect **Renovarea trotuarului,pe o parte a str.Burebista
pentru largirea trotuarului si organizarii a 65
locuri de parcare,pe sectorul de drum cuprins
intre blocurile nr.30-93**

Valoarea lucrarilor executate **610 647 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Capitol I Demolari				
1	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	500,000	7,496 ----- 7,496	3 747,900 ----- 3 747,900
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	250,000	49,203 ----- 16,721	12 300,850 ----- 4 180,350
3	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	500,000	8,649 ----- 8,649	4 324,500 ----- 4 324,500
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,750	1 788,500 ----- 0,000	1 341,375 ----- 0,000
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,500	1 788,750 ----- 0,000	894,375 ----- 0,000
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	250,000	11,420 ----- 0,000	2 855,000 ----- 0,000
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,550	1 788,629 ----- 0,000	2 772,375 ----- 0,000
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	250,000	11,420 ----- 0,000	2 855,000 ----- 0,000
9	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,020	buc	2,000	609,420 ----- 88,220	1 218,840 ----- 176,440
10	AcF07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-	buc	2,000	950,657	1 901,313

	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	154,17	156,483
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,91	3,056
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7,8700	1,91	15,032
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	185,00	0,925
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	185,00	7,918
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	42,00	0,840
		4. Capitol 4. Suprafata asfaltata (parcari)=1100,00 m2				
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 099,533 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 700,00	10 023,333
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	254,00	76,200
20	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			140,954 6,919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,919
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 387,00	130,378
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	185,00	0,555
	2710603420375	Otel patrat lam. cald lt = 50 mm	kg	0,0110	18,00	0,198
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	257,00	2,904
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 099,533 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 700,00	10 023,333
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	254,00	76,200
22	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			140,980 6,919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,919
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,00	130,378
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	185,00	0,555
	2710603420379	Otel patrat lam. cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,198
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	257,00	2,930
		5. Capitol 5. Borduri				
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			386,691 57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	95,00	19,948
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	48,00	20,158
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			211,172 38,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	980,00	44,100
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,91	6,055
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	185,00	1,665
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,600
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			133,905 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	980,00	47,040
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,91	1,948
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	185,00	0,555
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	66,67	67,003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,060

APROBAT:

Investitor



Antreprenor SA Pasc-con
(denumirea)

Investitor Pretura sec.Botanica
(denumirea)

Obiect **Renovarea trotuarului,pe o parte a str.Burebista
pentru largirea trotuarului si organizarii a 65
locuri de parcare,pe sectorul de drum cuprins
intre blocurile nr.30-93**

Valoarea lucrarilor executate 613 482 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1 Demolari				
1	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	737,450	7,496 7,496	5 527,807 5 527,807
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	100,000	49,203 16,721	4 920,340 1 672,140
3	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	380,000	8,649 8,649	3 286,620 3 286,620
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	1 788,750 0,000	1 788,750 0,000
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,500	1 788,750 0,000	894,375 0,000
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	195,000	11,419 0,000	2 226,800 0,000
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	1 788,750 0,000	1 788,750 0,000
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	195,000	11,419 0,000	2 226,800 0,000
9	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	1,000	1 935,098 593,898	1 935,098 593,898
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 595,340 11 080,465
		2. Capitol 2.Suprafata pavata (alb)=2970.00 m2				

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,91	6,055
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	185,00	1,665
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,600
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			133,905
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,0480	980,00	47,040
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,91	1,948
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	185,00	0,555
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	66,67	67,003
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,060

APROBAT:


Intocmit
Director **Mihail Panaite**

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
Secretar **Ion Diacon**

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Antreprenor SA Pasc-con
 (denumirea)

Investitor Pretura sec.Botanica
 (denumirea)

Obiect **Renovarea trotuarului, pe o parte a str. Burebista
 pentru largirea trotuarului si organizarii a 65
 locuri de parcare, pe sectorul de drum cuprins
 intre blocurile nr.30-93**

Valoarea lucrarilor executate 678 086 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Capitol 1 Demolari				
1	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	1 222,00	7,50 7,50	9 159,87 9 159,87
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	300,00	49,20 16,72	14 761,02 5 016,42
3	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	417,00	8,65 8,65	3 606,63 3 606,63
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,00	1 788,75 0,00	1 788,75 0,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,92	1 788,75 0,00	1 645,65 0,00
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	350,00	11,42 0,00	3 997,00 0,00
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,00	1 788,75 0,00	3 577,50 0,00
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	350,00	11,42 0,00	3 997,00 0,00
9	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,02	buc	7,00	609,50 88,22	4 266,48 617,54
10	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de	buc	7,00	950,66	6 654,62

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02			47,28	330,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 454,53 18 731,43
		2. Capitol 2.Suprafata pavata (alb)=2970,00 m2				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	9,29	873,87 520,67	8 118,25 4 837,02
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	929,00	62,50 14,76	58 062,79 13 712,93
13	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	929,00	8,81 3,11	8 187,87 2 892,57
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	850,00	218,62 34,37	185 825,82 29 210,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				260 194,73 50 653,08
		3. Capitol 3.Suprafata pavata (negru)=413 m2				
15	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,00	873,87 520,67	873,87 520,67
16	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	100,00	62,50 14,76	6 250,03 1 476,10
17	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	100,00	8,81 3,11	881,36 311,36
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	50,00	218,62 34,37	10 930,93 1 718,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 936,20 4 026,40
		4. Capitol 4.Suprafata asfaltata(parcari)=1100,00 m2				
19	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	35,00	508,87 95,14	17 810,36 3 329,86
20	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	22,50	508,87 95,14	11 449,52 2 140,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 259,88 5 470,49
		5. Capitol 5. Borduri				
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,86	386,69	4 199,49
					57,08	619,93
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	299,00	211,17	63 140,40
					38,63	11 551,03
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, alcilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	299,00	133,90	40 037,46
					17,30	5 172,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				107 377,35 17 343,06

	Cheltuieli directe	lei	469 223
	Asigurari sociale si medicina	24,00 %	23 094
	Transport	6,00 %	20 406
	Cheltuieli de regie	7,00 %	35 891
	Beneficiu	3,00 %	16 458
	Tva	20,00 %	113 014
			678 086
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		96 224

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SA PASC-con

(denumirea)

Director

M. Panaite

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.

APROBAT:

Investitor

Pretura sec.Botanica

(denumirea)

Secretarul

I. Diacon

(functia, numele, prenumele, semnatura)



B. Cazacu
