

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EBD000046490

Formular tipizat
Anexa I la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение I к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 20.11.2025 / 22.10.2025 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: Поставщик "SMART BUILD" S.R.L., OR.SINGERA Unirii nr.56 Cont MD74ML022510000000001509, BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X		9. Transportator Перевозчик "SMART BUILD" S.R.L., OR.SINGERA Unirii nr.56		c.f./ nr.TVA 1024600010741 / ф.к./ код НДС 0310473							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель DIRECTIA EDUCATIE, TINERET SI SPORT SECTORUL CENTRU, SEC.CENTRU Bulgara nr.41				c.f./ nr.TVA 1007601009417 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație Доверенность seria _____ серия număr _____ номер data _____ дата delegatul _____ делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de amenajare a acelor la pavilioane în incinta Gradinitelor nr. 8, 78, 92, 174, instituții din subordinea D. sec.Centru	serv	1	212663.77	212663,77	20	42532,75	255196,52				
JTAL (pe factura fiscală) / Всесо (по налоговой накладной)				212663,77	X	42532,75	255196,52	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director NICOLETA FLOREA
Отпуск
разрешил: _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 20.11.2025

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director NICOLETA FLOREA
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 20.11.2025

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

contabil NATALIA BULARGA

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 20.11.2025

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobet prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor: SMART BUILD S.R.L.

Investitor: DETS sectorul Centru

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate

pentru luna octombrie

Valoarea lucrarilor executate 255 196,52 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Gradinita 8 Capitolul 1.1. Nivelarea maselor de pamint				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	7,980	85,06	678,78
					85,06	678,78
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	10,370	12,90	133,75
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1. Gradinita 8 Capitolul 1.1. Nivelarea maselor de pamint				812,53
		Inclusiv salariul				678,78
		Capitolul 1.2. Amenajarea accesului				
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=150 mm	m3	8,070	401,13	3 237,08
					109,35	882,46
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	55,000	94,23	5 182,58
					33,14	1 822,59
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (pavaje din beton h=60mm)	m2	53,780	289,24	15 555,18
					65,83	3 540,47
		TOTAL Capitolul 1.2. Amenajarea accesului				23 974,84
		Inclusiv salariul				6 245,52
		Capitolul 2. Gradinita nr.78 Capitolul 2.1. Nivelarea maselor de pamint				
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3	0,070	390,00	27,30
					0,00	0,00
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	7,000	218,34	1 528,36
					176,74	1 237,15
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km	t	12,000	12,90	154,80
					0,00	0,00
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3	0,070	104,71	7,33
					42,57	2,98
		TOTAL Capitolul 2. Gradinita nr.78 Capitolul 2.1. Nivelarea maselor de pamint				1 717,79
		Inclusiv salariul				1 240,13
		Capitolul 2.2. Amenajarea aceesului				
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=150mm	m3	16,500	401,11	6 618,36
					109,36	1 804,36
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	14,000	94,23	1 319,21
					33,14	463,93
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	140,000	289,23	40 492,74

		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (pavaje din beton h=60mm)			65,83	9 216,78
		TOTAL Capitolul 2.2. Amenajarea accesului				48 430,31
		Inclusiv salariul				11 485,07
		Capitolul 2.3. Scari				
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3	1,200	390,00	468,00
					0,00	0,00
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	48,000	237,75	11 411,76
					187,78	9 013,54
15	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	226,310	29,71	6 723,39
					11,60	2 624,86
16	CC02H	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	44,930	22,12	993,70
					3,09	138,96
17	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M250	m3	2,140	1 893,61	4 052,33
					508,12	1 087,37
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	228,480	41,49	9 480,25
					23,20	5 299,98
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	10,880	150,84	1 641,16
					121,51	1 321,99
20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	96,000	12,90	1 238,40
					0,00	0,00
21	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3	0,740	104,99	77,69
					41,95	31,04
		TOTAL Capitolul 2.3. Scari				36 086,68
		Inclusiv salariul				19 517,74
		Capitolul 3. Gradinita 92 Capitolul 3.1. Nivelarea maselor de pamint				
22	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	12,900	85,05	1 097,20
					85,05	1 097,20
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	16,770	12,90	216,35
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 3. Gradinita 92 Capitolul 3.1. Nivelarea maselor de pamint				1 313,55
		Inclusiv salariul				1 097,20
		Capitolul 3.2. Amenajarea accesului				
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=150 mm	m3	12,900	401,11	5 174,35
					109,36	1 410,68
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	86,000	94,23	8 103,67
					33,14	2 849,87
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2	84,000	289,23	24 295,65
					65,83	5 530,07
		TOTAL Capitolul 3.2. Amenajarea accesului				37 573,67
		Inclusiv salariul				9 790,62
		Capitolul 4. Gradinita 174 Capitolul 4.1. Nivelarea maselor de pamint				
27	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	9,300	85,05	791,00
					85,05	791,00
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	12,090	12,90	155,95
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 4. Gradinita 174 Capitolul 4.1. Nivelarea maselor de pamint				946,95
		Inclusiv salariul				791,00

		Capitolul 4.2. Amenajarea accesului				
TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=150mm	m3	9,300	401,11	3 730,35	
				109,36	1 017,01	
DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	62,000	94,23	5 842,17	
				33,14	2 054,55	
31 DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (pavaje din beton h=60mm)	m2	62,000	289,23	17 932,50	
				65,83	4 081,72	
					27 505,02	
					7 153,28	

Total manopera (ore)	525,071
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	178 361,34
Asigurari sociale	24,000% 13 919,84
Total	192 281,18
Cheltuieli de transport	5,000% 5 852,65
Total	198 133,83
Cheltuieli pentru depozitare	2,000% 2 341,06
Total	200 474,89
Cheltuieli de regie	4,000% 8 019,00
Total	208 493,89
Beneficiu de deviz	2,000% 4 169,88


Total General fara TVA	212 663,77
TVA (20%)	42 532,75
TOTAL GENERAL	255 196,52
Inclusiv salariul	57 999,34

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Antreprenor: SMART BUILD S.R.L.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: DETS sectorul Centru
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

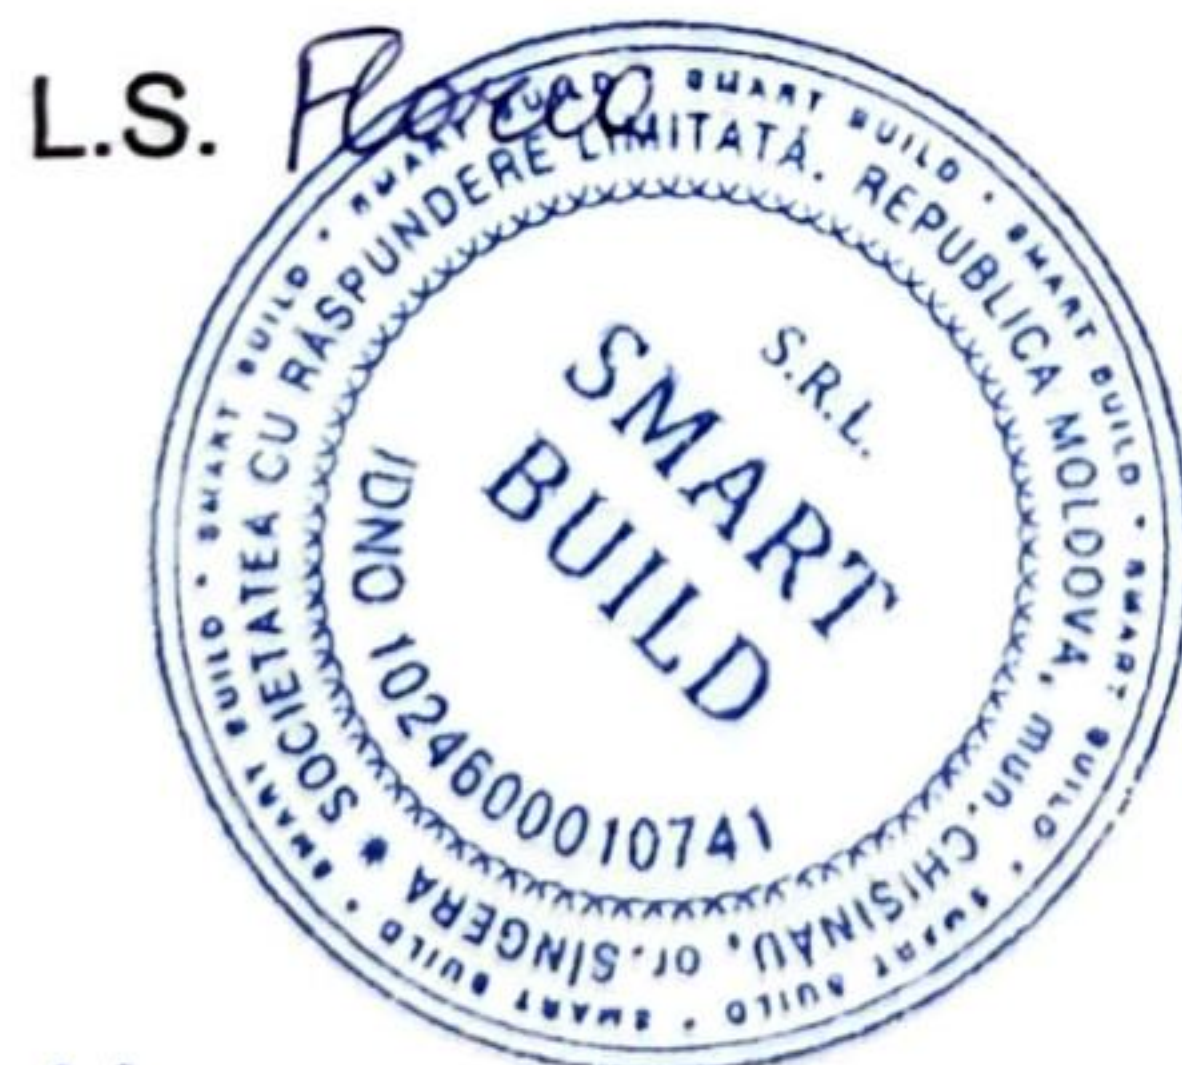

Gradinita nr. 8

Director D. Pavaleri

[Signature]

L.S.



Gradinita nr. 92

Director interimar

Nr. 92

Gradinita nr. 78



Gradinita nr. 174

Directorul nr. 174.



Nr. 174

Gradinitei de copii
Yarsetea L.

[Signature]

Devizul: Lucrari de amenajare a acceselor la pavilioane în incinta Gradinitelor nr. 8, 78, 92, 174, instituții din subordinea DETS sec.Centru.

Obiectul: Lucrari de amenajare a acceselor la pavilioane în incinta Gradinitelor nr. 8, 78, 92, 174

Scopul: Lista cu cantitățile de lucrări

Devizul local de resurse Nr. 2.1.1

aferezent situatiei de plata

Valoarea de deviz 255 196,52 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	8,453	110,46	933,72
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,342	110,46	2 688,82
3	7124010010700	Dulgher	h-om	69,600	110,46	7 688,02
4	7129020012800	Pavator	h-om	236,132	110,46	26 083,13
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,968	110,46	1 321,99
6	7212030022700	Sudor	h-om	2,285	110,46	252,40
7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	43,411	110,46	4 795,18
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,889	110,46	10 591,89
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,355	110,46	1 806,57
10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,436	110,46	600,47
11	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	110,46	1 237,15
Total manopera						57 999,34
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,544	5,62	3,06
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,570	3,71	16,95
3	1411122201752	Piatra sparta (h=150mm)	m3	53,786	241,80	13 005,46
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,455	168,70	245,46
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,651	281,17	183,04
6	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,626	281,17	457,18
7	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,699	281,17	477,70
8	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,611	281,17	4 108,18
9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,096	1 686,99	161,95
10	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,960	1 686,99	1 619,51
11	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,096	1 686,99	161,95
12	2010237318750	Distantieri	buc	67,893	0,56	38,02
13	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	29,04
14	2320166200676	White spirit	kg	1,088	62,98	68,52
15	2320187315789	Decofrol	kg	5,760	50,61	291,51
16	2430116104160	Email alchidic	kg	1,850	50,61	93,63
17	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,285	96,72	221,01
18	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,132	28,12	31,83
19	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,544	60,73	33,04
20	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,197	53,98	64,61
21	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	221,340	3,60	796,82
22	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	543,648	3,60	1 957,13
23	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	607,760	3,60	2 187,94
24	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,570	3,60	16,45
25	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 674,069	3,60	9 626,65
26	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaje din beton h=60mm)	m2	344,877	170,00	58 629,09
27	2663102100001	Beton clasa M250	m3	2,194	0,00	0,00
28	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,416	0,00	0,00
29	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare beton cu sectiunea de 100*20*8 cm	m	218,085	56,23	12 262,92

60014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,176	11,25	24,48
602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	46,053	18,56	854,74
10602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	231,968	17,43	4 043,20
734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,200	10,68	76,90
2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,263	7,65	17,31
2811236309800	Balustrada	kg	228,480	16,87	3 854,46
2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,000	7,20	86,40
2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,142	60,73	69,35
2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,796	163,08	1 108,28
4011106202741	Energie electrica	kw	1,828	1,12	2,05
4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,272	21,37	27,18
4100126202818	Apă	m3	4,677	21,37	99,95
Total materiale					117 052,95

Utilaje						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,430	25,00	135,63
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,640	15,00	294,65
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,820	25,00	245,57
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,540	25,00	13,38
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,130	150,00	19,95
6	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,300	150,00	495,30
7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,040	150,00	5,85
8	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,340	150,00	51,00
9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,860	15,00	12,84
10	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	5,430	25,00	135,63
11	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,120	0,00	0,00
12	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	37,990	50,00	1 899,25
						3 309,05

Total				178 361,34
Asigurari sociale				13 919,84
Total				192 281,18
Cheltuieli de transport				5 852,65
Total				198 133,83
Cheltuieli pentru depozitare				2 341,06
Total				200 474,89
Cheltuieli de regie				8 019,00
Total				208 493,89
Beneficiu de deviz				4 169,88
TOTAL Deviz fara TVA				212 663,77

Total				212 663,77
TVA				42 532,75
TOTAL Deviz				255 196,52

Intocmit:

Florea

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Grădinița 8

Pavel D. Imbica



Grădinița 174

Grădinița 92

Director interimar
Voricos

Grădinița 174

Directorul
nr. 174.
Yarztea L.

Anexa B
Formularul nr. 1RD

Activul: Lucrari de amenajare a acceselor la pavilioane în incinta Gradinitelor nr. 8, 78, 92, 174, instituții din subordinea DETS sec.Centru.
Obiectul: Lucrari de amenajare a acceselor la pavilioane în incinta Gradinitelor nr. 8, 78, 92, 174
Devizul: Lista cu cantitățile de lucrări

Deviz local Nr. 2.1.1
aferezent situatiei de plata

Valoarea de deviz 255 196,52 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Gradinita 8 Capitolul 1.1. Nivelarea maselor de pamint				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	7,980	85,06	678,78
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,145	110,46	678,78
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	10,370	12,90	133,75
2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,675	50,00	133,75
		TOTAL Capitolul 1. Gradinita 8 Capitolul 1.1. Nivelarea maselor de pamint				812,53
		Capitolul 1.2. Amenajarea accesului				
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=150 mm	m3	8,070	401,13	3 237,08
3.1	1411122201752	Piatra sparta (h=150mm)	m3	9,281	241,80	2 244,15
3.2	4100126202818	Apă	m3	0,807	21,37	17,25
3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,989	110,46	882,46
3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,695	25,00	42,38
3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,389	15,00	50,84
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	55,000	94,23	5 182,58
4.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,640	0,00	0,00
4.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	56,100	3,60	201,96
4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,165	281,17	46,39
4.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare beton cu sectiunea de 100*20*8 cm	m	55,275	56,23	3 108,11
4.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,165	21,37	3,53
4.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,600	110,46	729,04
4.7	7129020012800	Pavator	h-om	9,900	110,46	1 093,55
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (pavaje din beton h=60mm)	m2	53,780	289,24	15 555,18
5.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaje din beton h=60mm)	m2	54,587	170,00	9 279,79
5.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	86,048	3,60	309,77
5.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	423,249	3,60	1 523,70
5.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,269	281,17	75,63
5.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,313	281,17	650,35
5.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,076	163,08	175,47
5.7	7129020012800	Pavator	h-om	31,192	110,46	3 445,47
5.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,860	110,46	95,00
		TOTAL Capitolul 1.2. Amenajarea accesului				23 974,84
		Capitolul 2. Gradinita nr.78 Capitolul 2.1. Nivelarea maselor de pamint				
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3	0,070	390,00	27,30
6.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,182	150,00	27,30
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	7,000	218,34	1 528,36
7.1	9310060019930	Muncitor	h-om	11,200	110,46	1 237,15
7.2	2952220003546	Autogredor pina la 175 cp	h-ut	0,133	150,00	19,95
7.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,425	25,00	135,63

270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	5,425	25,00	135,63	
150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 15 km.	t	12,000	12,90	154,80	
310540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,096	50,00	154,80	
TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3	0,070	104,71	7,33	
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,027	110,46	2,98	
2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,029	150,00	4,35	
	TOTAL Capitolul 2. Gradinita nr.78 Capitolul 2.1. Nivelarea maselor de pamint				1 717,79	
	Capitolul 2.2. Amenajarea aceesului					
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=150mm	m3	16,500	401,11	6 618,36
10.1	1411122201752	Piatra sparta (h=150mm)	m3	18,975	241,80	4 588,16
10.2	4100126202818	Apă	m3	1,650	21,37	35,26
10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,335	110,46	1 804,36
10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere intema, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,465	25,00	86,63
10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,930	15,00	103,95
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	14,000	94,23	1 319,21
11.1	2663102100001	Beton clasa... (pt.Informatie)	m3	0,672	0,00	0,00
11.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14,280	3,60	51,41
11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	281,17	11,81
11.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare beton cu sectiunea de 100*20*8 cm	m	14,070	56,23	791,16
11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,042	21,37	0,90
11.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,680	110,46	185,57
11.7	7129020012800	Pavator	h-om	2,520	110,46	278,36
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (pavaje din beton h=60mm)	m2	140,000	289,23	40 492,74
12.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaje din beton h=60mm)	m2	142,100	170,00	24 157,00
12.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	224,000	3,60	806,40
12.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 101,800	3,60	3 966,48
12.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,700	281,17	196,82
12.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,020	281,17	1 692,64
12.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,800	163,08	456,62
12.7	7129020012800	Pavator	h-om	81,200	110,46	8 969,35
12.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,240	110,46	247,43
	TOTAL Capitolul 2.2. Amenajarea aceesului				48 430,31	
	Capitolul 2.3. Scari					
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3	1,200	390,00	468,00
13.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,120	150,00	468,00
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	48,000	237,75	11 411,76
14.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,200	10,68	76,90
14.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,000	7,20	86,40
14.3	2320187315789	Decofrol	kg	5,760	50,61	291,51
14.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,096	1 686,99	161,95
14.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,096	1 686,99	161,95
14.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,960	1 686,99	1 619,51
14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000	110,46	1 325,52
14.8	7124010010700	Dulgher	h-om	69,600	110,46	7 688,02
15	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	226,310	29,71	6 723,39
15.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	231,968	17,43	4 043,20
15.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,263	7,65	17,31
15.3	2010237318750	Distantieri	buc	67,893	0,56	38,02
15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,084	110,46	2 549,86
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,679	110,46	75,00
16	CC02H	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	44,930	22,12	993,70
16.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	46,053	18,56	854,74
16.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,258	110,46	138,96
17	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu	m3	2,140	1 893,61	4 052,33

		mijloace clasice beton clasa M250				
102100001	Beton clasa M250	m3	2,194	0,00	0,00	
1122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	607,760	3,60	2 187,94	
121102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,626	281,17	457,18	
121102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	1,455	168,70	245,46	
100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,621	21,37	13,27	
2222222222992	Material marunt (dulapi de rășinoase)	%	1,000	0,00	29,04	
7123010010200	Betonist	h-om	8,453	110,46	933,72	
9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,391	110,46	153,65	
2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,122	0,00	0,00	
2952260003540	Buldozer	h-ut	0,039	150,00	5,85	
2922140007000	Macara	h-ut	0,535	25,00	13,38	
2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,856	15,00	12,84	
18	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	228,480	41,49	9 480,25
18.1	2811236309800	Balustrada	kg	228,480	16,87	3 854,48
18.2	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	1,142	60,73	69,35
18.3	4011106202741	Energie electrică	kw	1,828	1,12	2,05
18.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,285	96,72	221,01
18.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,570	3,60	16,45
18.6	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	h-om	4,570	3,71	16,95
18.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	43,411	110,46	4 795,18
18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,285	110,46	252,40
18.9	7212030022700	Sudor	h-om	2,285	110,46	252,40
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul.	m2	10,880	150,84	1 641,16
19.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,132	28,12	31,83
19.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,197	53,98	64,61
19.3	2430226102197	Chit pe baza de rășini alchidice	kg	0,544	60,73	33,04
19.4	2430116104160	Email alchidic	kg	1,850	50,61	93,63
19.5	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	2,176	11,25	24,48
19.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,544	5,62	3,06
19.7	2320166200676	White spirit	kg	1,088	62,98	68,52
19.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,968	110,46	1 321,99
20	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 15 km.	t	96,000	12,90	1 238,40
20.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	24,768	50,00	1 238,40
21	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III.	100 m3	0,740	104,99	77,69
21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,281	110,46	31,04
21.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,311	150,00	46,65
		TOTAL Capitolul 2.3. Scări				36 086,68
		Capitolul 3. Grădina 92 Capitolul 3.1. Nivelarea maselor de pământ				
22	TsA01B1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	12,900	85,05	1 097,20
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,933	110,46	1 097,20
23	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 15 km.	t	16,770	12,90	216,35
23.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	4,327	50,00	216,35
		TOTAL Capitolul 3. Grădina 92 Capitolul 3.1. Nivelarea maselor de pământ				1 313,55
		Capitolul 3.2. Amenajarea accesului				
24	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă h=150 mm	m3	12,900	401,11	5 174,35
24.1	1411122201752	Piatră spartă (h=150mm)	m3	14,835	241,80	3 587,10
24.2	4100126202818	Apă	m3	1,290	21,37	27,57
24.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,771	110,46	1 410,68
24.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,709	25,00	67,73
24.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,418	15,00	81,27
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100*20*8 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	86,000	94,23	8 103,67
25.1	2663102100001	Beton clasa. .(pt.informatie)	m3	4,128	0,00	0,00
25.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	87,720	3,60	315,79
25.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,258	281,17	72,54
25.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare beton cu secțiunea de 100*20*8 cm	m	86,430	56,23	4 859,96
25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,258	21,37	5,51
25.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,320	110,46	1 139,95
25.7	7129020012800	Pavator	h-om	15,480	110,46	1 709,92
26	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip,	m2	84,000	289,23	24 295,65

		grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)				
	112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaje din beton h=60mm)	m2	85,260	170,00	14 494,20
	1122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	134,400	3,60	483,84
	1122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	661,080	3,60	2 379,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,420	281,17	118,09
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,612	281,17	1 015,59
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,680	163,08	273,97
	7129020012800	Pavator	h-om	48,720	110,46	5 381,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,344	110,46	148,46
		TOTAL Capitolul 3.2. Amenajarea accesului				37 573,67
		Capitolul 4. Gradinita 174 Capitolul 4.1. Nivelarea maselor de pamint				
27	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	9,300	85,05	791,00
27.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,161	110,46	791,00
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	12,090	12,90	155,95
28.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,119	50,00	155,95
		TOTAL Capitolul 4. Gradinita 174 Capitolul 4.1. Nivelarea maselor de pamint				946,95
		Capitolul 4.2. Amenajarea accesului				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=150mm	m3	9,300	401,11	3 730,35
29.1	1411122201752	Piatra sparta (h=150mm)	m3	10,695	241,80	2 586,05
29.2	4100126202818	Apă	m3	0,930	21,37	19,87
29.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,207	110,46	1 017,01
29.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,953	25,00	48,83
29.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,906	15,00	58,59
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	62,000	94,23	5 842,17
30.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,976	0,00	0,00
30.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	63,240	3,60	227,66
30.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,186	281,17	52,30
30.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare beton cu sectiunea de 100*20*8 cm	m	62,310	56,23	3 503,69
30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,186	21,37	3,97
30.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,440	110,46	821,82
30.7	7129020012800	Pavator	h-om	11,160	110,46	1 232,73
31	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (pavaje din beton h=60mm)	m2	62,000	289,23	17 932,50
31.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaje din beton h=60mm)	m2	62,930	170,00	10 698,10
31.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	99,200	3,60	357,12
31.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	487,940	3,60	1 756,58
31.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,310	281,17	87,16
31.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,666	281,17	749,60
31.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,240	163,08	202,22
31.7	7129020012800	Pavator	h-om	35,960	110,46	3 972,14
31.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,992	110,46	109,58
		TOTAL Capitolul 4.2. Amenajarea accesului				27 505,02

Total manopera (ore)	525,071
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	178 361,34
Asigurari sociale	24,000%
Total	192 281,18
Cheltuieli de transport	5,000%
Total	198 133,83
Cheltuieli pentru depozitare	2,000%
Total	200 474,89
Cheltuieli de regie	4,000%
Total	208 493,89
Beneficiu de deviz	2,000%
	4 169,88

Total General fara TVA	212 663,77
TVA (20%)	42 532,75
TOTAL GENERAL	255 196,52

referință: 0 Lei, din data de 00.00.00

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Gradinita nr. 8

Director D. Pavaloi

Gradinita nr. 92

Director interimar
Storicos

Gradinita nr. 78

Gradinita nr. 174

Directorul U.C. nr. 174.
Măgariștea L.

N. Streu
