

Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		22.05.2019 / 22.05.2019		8. Foaia de parcurs seria: număr Путевой лист серия номер		data: дата						
1. Furnizor: FCP SOLDI S.R.L.; m.Chisinau BD.Decebal 80 ap.14 MD-2038; VICBMD2X500 B.C.'VICTORIABANK'S.A. Поставщик fil. N30 Chisinau, MD44VI000000222483019MDL MDL				9. Transportator Перевозчик		FCP SOLDI S.R.L. c.f./ nr.TVA 1002600027435 / ф.к./код НДС 0300375						
2. Cumpărător: Primaria Cojusna raionul Strasenii; 023742406; MD70TRPDAU319230H10718AC, MDL, TREZMD2X, Покупатель Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat						c.f./ nr.TVA 1010601000025 / ф.к./код НДС						
3. Delegație Доверенность		data дата		delegatul елегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы						
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
mun. Chisinau CONSTRUCTIE (lucrari de const)				Punkt разгрузки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului		10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor	10.4 Preț unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA, %	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea mărfurilor/ activelor, serviciilor, lei	10.9 Altă informație	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr locuri	10.12 Masa brută, tone
Lucrari de constr. la Complexul instal. de debitare a apei p/u aproviz.s. Cojusna, r-ul Strasenii					134 194,17	20	26 838,83	161 033,00				
Lucrari de constr. la Complexul instal. de debitare a apei p/u aproviz.s. Cojusna, r-ul Strasenii					133 288,33	20	26 657,67	159 946,00				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)					267482,50	x	53496,50	320979,00	x	x	x	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					267 482,50	x	53 496,50	320 979,00	x	x	x	
13. Permis eliberarea:				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
14. Predat mărfurile/activele (serviciile):				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/ beneficiarul:				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись								



1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm / Racord cu flanse din PE-otel cu d=200x200mm, Pn=20				
4	GD54G	51 Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 200 mm/ Bransament PE 60* d=200mm Pn=16	buc	2,00	1 209,35 58,32	2 418,69 116,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 224,72 422,83
		1.2. Trecere apeductului de apa sub calea ferata si drumuri				
5	TsC03B1	67 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,55	525,96 0,00	289,28 0,00
6	TsA01B1	68 Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,25	27,99 27,99	34,99 34,99
7	TsC03B2	69 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,55	656,29 0,00	360,96 0,00
8	TsA01B2	70 Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3	1,25	42,28 42,28	52,85 52,85

1	2	3	4	5	6	7
		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
9	TsD05B	71 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,05	922,40 320,80	46,12 16,04
10	GA08E	72 Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 5 mm	m	16,00	1 573,04 134,14	25 168,60 2 146,18
11	GA09D	73 Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 426 mm - sub drum si calea ferata	m	14,00	2 122,42 173,14	29 713,92 2 423,93
12	CA03A	74 Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - заделка концов футляра бетоном	m3	1,00	782,53 143,98	782,53 143,98
13	AcA53C	75 Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. - suport PE pentru manta de protectie	buc	6,00	270,06 43,74	1 620,39 262,44
14	TsC03B1	76 Sapatura mecanica cu	100 m3	1,11	525,84	583,68

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (обратная засыпка траншеи землёй)			0,00	0,00
15	TsD01B	77 Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,50	11,37 11,37	28,43 28,43
16	TsA24C	78 Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	0,56	190,00 0,00	106,40 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 788,15 5 108,84
		1.3. Camine				
17	TsC53B	79 Compactarea pamintului cu piatra sparta (в колодцах)	100m2	0,39	1 645,72 248,62	641,83 96,96
18	CB01A	80 Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	15,00	133,91 61,97	2 008,58 929,48
19	AcD22A	81 Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (бетонные упоры)	m3	5,00	1 296,31 310,92	6 481,55 1 554,59
20	AcE11A	82 Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa	m3	2,00	911,18 351,38	1 822,37 702,75

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				
21	AcE11A1	84 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa	buc	1,00	4 439,00 0,00	4 439,00 0,00
22	AcE10A	85 Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,74	911,13 386,49	1 585,37 672,50
23	AcE10A1	87 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	4 271,33 0,00	4 271,33 0,00
24	CA03D2 (AcD52C1)	90 Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, drepunghiulare cu diametrul 2,0 m -1set,) Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - Placi de fundatie monolit 2.8x2.8x0.2- (1.58m3*2=3.16m3) (AcD52C1 anulat)	m3	3,16	967,20 207,74	3 056,36 656,47
25	AcE08A	96 Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si	buc	2,00	1 649,07 65,61	3 298,14 131,22

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, necarosabil tip I				
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 604,53 4 743,97
		<i>Total</i>	lei			114 617,40
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,00 %			2 774,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			3 552,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			120 943,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			8 466,07
		<i>Total</i>	100,00 +			129 409,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			3 882,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				133 292,25 10 275,64

		Total	lei	133 288
		TVA	20,00 %	26 658
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		159 946
				10 274

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
FCP "Soldi" SRL


Investitor
Primaria Cojusna, r. Straseni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

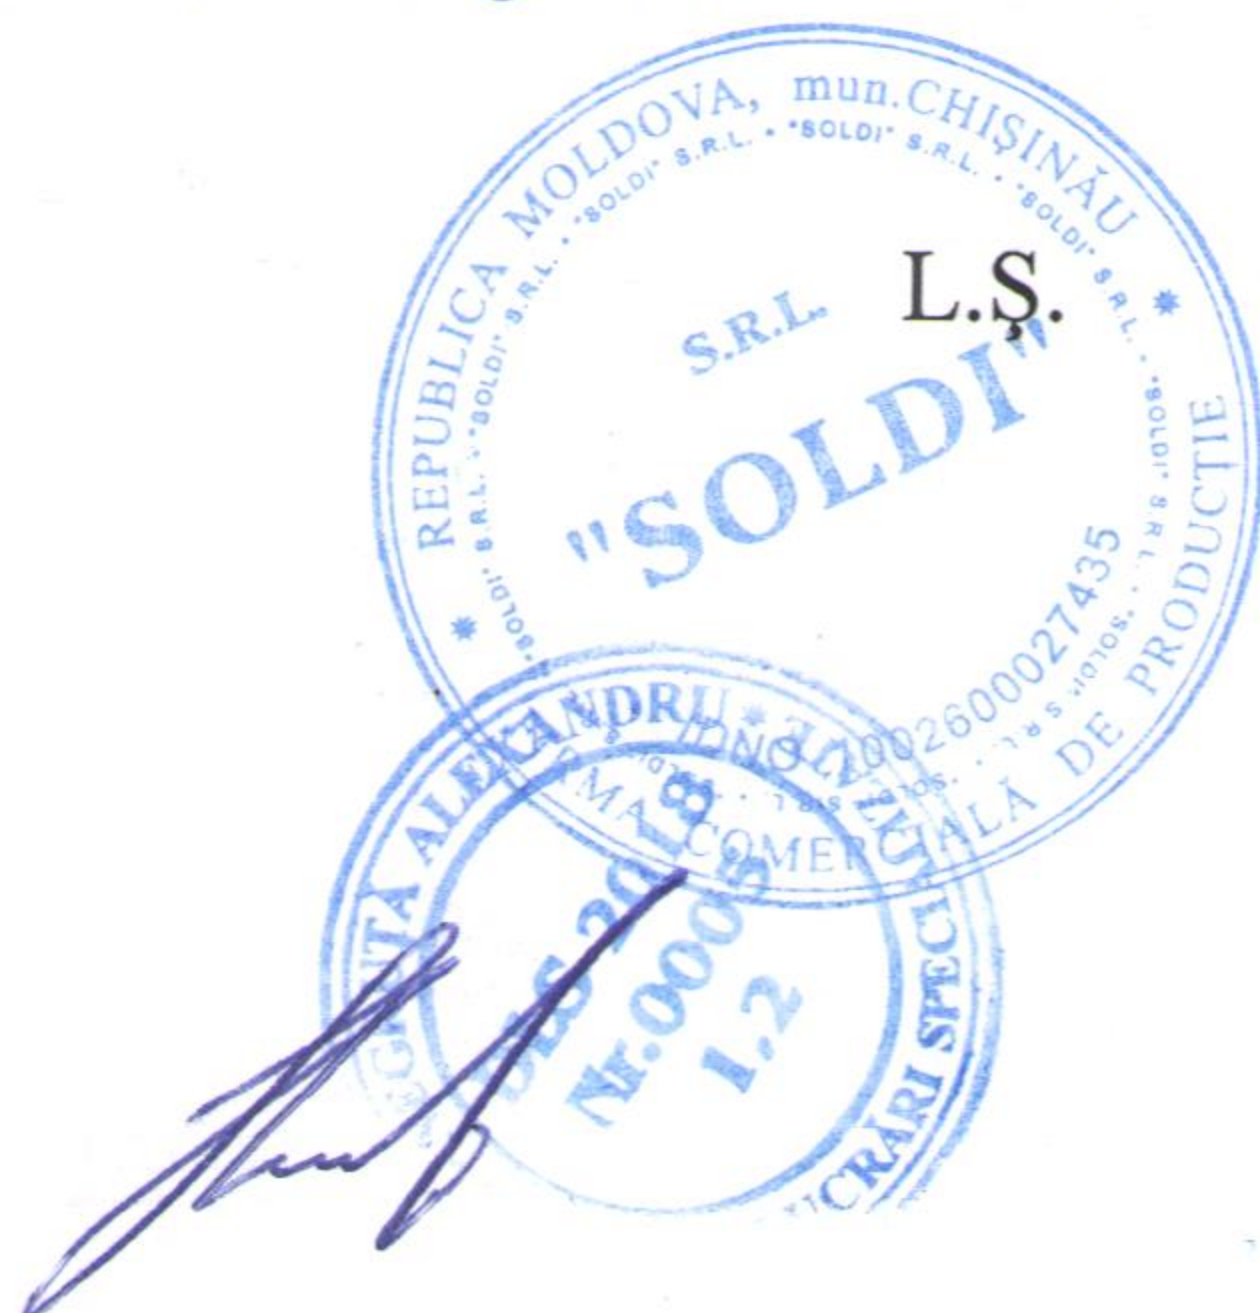

**Complexul instalatiilor de
debitare a apei pentru
aprovizionarea cu apa a s.
Cojusna raionul Strasenii**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7
Rețele exterioare de distributie a apei**

Valoarea de deviz 159 946 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,30	36,45	739,94
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	21,75	36,45	792,79
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	46,25	36,45	1 685,81
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	34,43	36,45	1 254,98
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	115,46	36,45	4 208,52
6.	7212030022700	Sudor	h-om	17,12	36,45	624,03
7.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,20	36,45	116,64
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,29	36,45	229,27
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,41	36,45	197,20
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,70	36,45	426,46
Total manopera						10 274

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,93	245,00	717,85
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,92	245,00	715,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,30	162,00	534,60
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,00	12,50	112,50
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03	2 500,00	75,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,30	2 650,00	795,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	2 650,00	79,50
8.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,02	2 650,00	53,00
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,45	72,00	32,40
10.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,06	2 650,00	159,00
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	6,00	14,50	87,00
12.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	56,20	14,50	814,90
13.	2320187315789	Decofrol	kg	1,80	12,00	21,60
14.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	312,06	8,50	2 652,51
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,84	10,50	29,82
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,84	10,80	30,67
17.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	6,88	24,00	165,12

18.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	24,00	4,80	115,20
19.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,04	15,00	60,60
20.	25212167010000 1	Teava din otel d426x5mm	m	14,28	1 150,79	16 433,28
21.	25212167010001	Teava din otel 426x5mm (Tub de protectie)	m	16,32	1 150,79	18 780,89
22.	25231567138110 1	Fiting polietilena - suport PE pentru manta de protectie	buc	6,06	14,50	87,87
23.	25231567138117	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)/ Bransament PE 60* d=200mm, Pn=16	buc	2,02	848,54	1 714,05
24.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	186,85	1,45	270,93
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,66	1,45	48,81
26.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	880,88	1,45	1 277,28
27.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	2,06	222,00	457,32
28.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,00	400,00	400,00
29.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	2,00	125,00	250,00
30.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,00	115,00	230,00
31.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИ-10 (0,18 m3)	buc	1,00	333,33	333,33
32.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	400,00	400,00
33.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	264,00	264,00
34.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИ-15 (0,38 m3)	buc	1,00	825,00	825,00
35.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	642,00	642,00
36.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00	642,00	642,00
37.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	800,00	800,00
38.	2663102100000	Beton	m3	5,20	920,00	4 784,00
39.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,63	850,00	535,50
40.	2664102101126	Var	kg	0,41	4,80	1,97
41.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,04	750,00	30,00
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,25	18,00	40,50
43.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	84,00	16,00	1 344,00
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,75	18,00	67,50
45.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,58	30,00	257,40
46.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	36,00	12,00	432,00
47.	28741173000005	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica/ Vana d=250mm Pn=16	buc	1,03	9 532,49	9 818,46
48.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,30	18,00	5,40
49.	28752741101001 0	Piese de legatura/ Racord cu flanse din PE- otel d=200x200mm, Pn=16	buc	2,00	3 781,00	7 562,00
50.	28752741101001 2	Piese de legatura/ Racord cu flanse din PE- otel d=200x200mm, Pn=20	buc	2,00	3 781,00	7 562,00
51.	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,04	1 290,00	2 631,60
52.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,00	1 290,00	2 580,00
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,74	21,00	36,54
54.	4100126202818	Apa	m3	0,20	21,00	4,20
		Total materiale de constructii				88 800

Utilaje de constructii:

1.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	30,20	185,00	5 587,00
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	9,48	98,00	929,04
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,82	256,00	1 233,92
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	226,00	4,52
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,50	16,00	40,00

6.	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	22,12	185,00	4 092,20
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,06	25,00	1,50
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,03	25,00	25,75
9.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,62	25,00	40,50
10.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	3,00	16,00	48,00
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,30	64,00	83,20
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,40	25,00	60,00
13.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	0,56	64,00	35,84
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,05	25,00	51,25
15.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,00	98,00	294,00
16.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	9,54	98,00	934,92
17.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	6,48	98,00	635,04
18.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,56	126,00	70,56
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,65	158,00	1 208,70
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,04	158,00	164,32
		Total utilaje de constructii				15 540

Total	lei	133 288
TVA	20,00 %	26 658

Total deviz:

159 946

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor FCP "Soldi" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Cojusna, r. Straseni
 (denumirea)

Obiect **Complexul instalatiilor de
 debitare a apei pentru
 aprovizionarea cu apa a s.
 Cojusna raionul Straseni**

Valoarea lucrarilor executate **159 946 lei**

Proces - verbal
Deviz local de resurse № 7
Retele exterioare de distributie a apei

de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte, armaturi				
1	AcB01C	25 Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 250 mm- Vana d=250mm Pn=16	buc	1,00	9 919,69 36,45	9 919,69 36,45
2	AcA26B	40 Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm / Racord cu flanse din PE-otel cu d=200x200mm, Pn=16	buc	2,00	3 971,59 67,44	7 943,17 134,87
3	AcA26B	42 Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a	buc	2,00	3 971,59 67,44	7 943,17 134,87

Antreprenor FCP "Soldi" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Cojusna, r. Straseni
 (denumirea)

Obiect **Complexul instalatiilor de
 debitare a apei pentru
 aprovizionarea cu apa a s.
 Cojusna raionul Straseni**

Valoarea lucrarilor executate **161 033 lei**

Proces - verbal

Deviz local de resurse № 7 Variatii Retele exterioare de distributie a apei

de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Se Include				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Conducte, armaturi				
1	AcA10B	117 Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm/ teava d=200mm PE100, SDR11, Pn=20	m	243,00	445,75 6,05	108 317,00 1 470,39
		Total capitol: Inclusiv salariu				108 317,00 1 470,39
		1.1.2. Trecere apeductului de apa sub drumuri				
2	GA09D	119 73 Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de	m	4,00	2 123,36 173,14	8 493,43 692,55

1	2	3	4	5	6	7
		protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 426 mm - sub drum si calea ferata				
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 493,43 692,55
		<i>Total</i>	lei			116 810,43
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			486,66
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			4 465,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			121 762,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			8 523,35
		<i>Total</i>	100,00 +			130 285,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			3 908,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				134 194,05 2 162,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				134 194,05 2 162,94

		Total	lei	134 194
		TVA	20,00 %	26 839
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		161 033 2 163

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
FCP "Soldi" SRL



Investitor
Primaria Cojusna, r. Straseni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

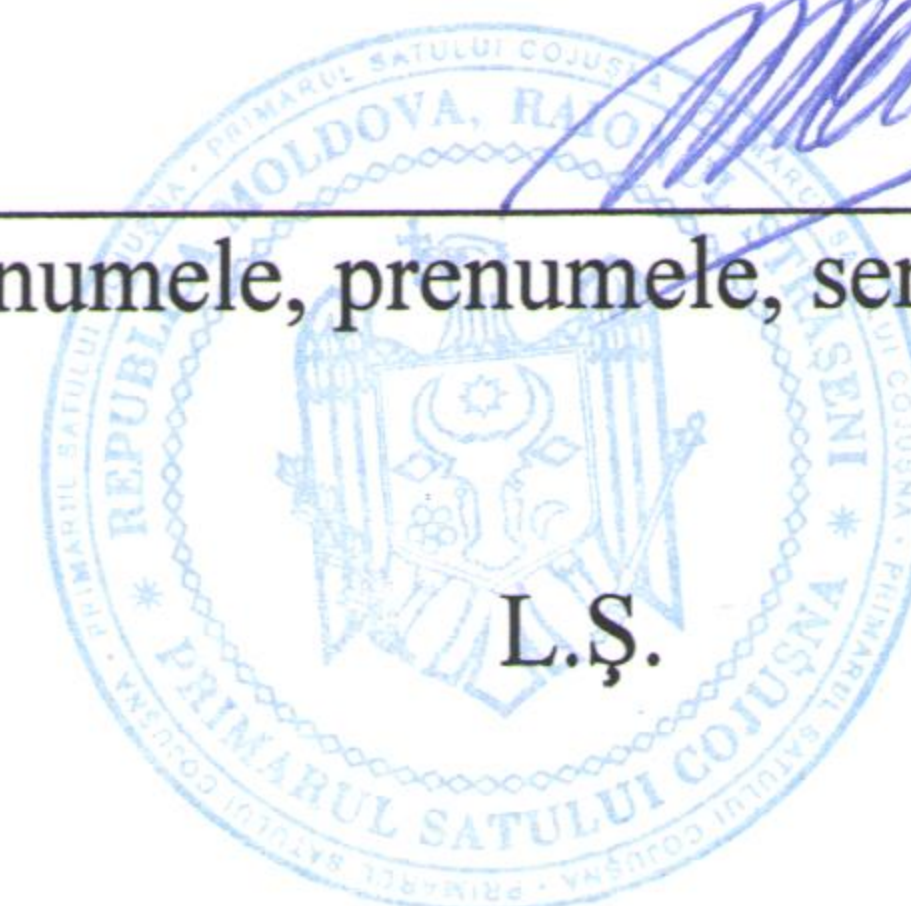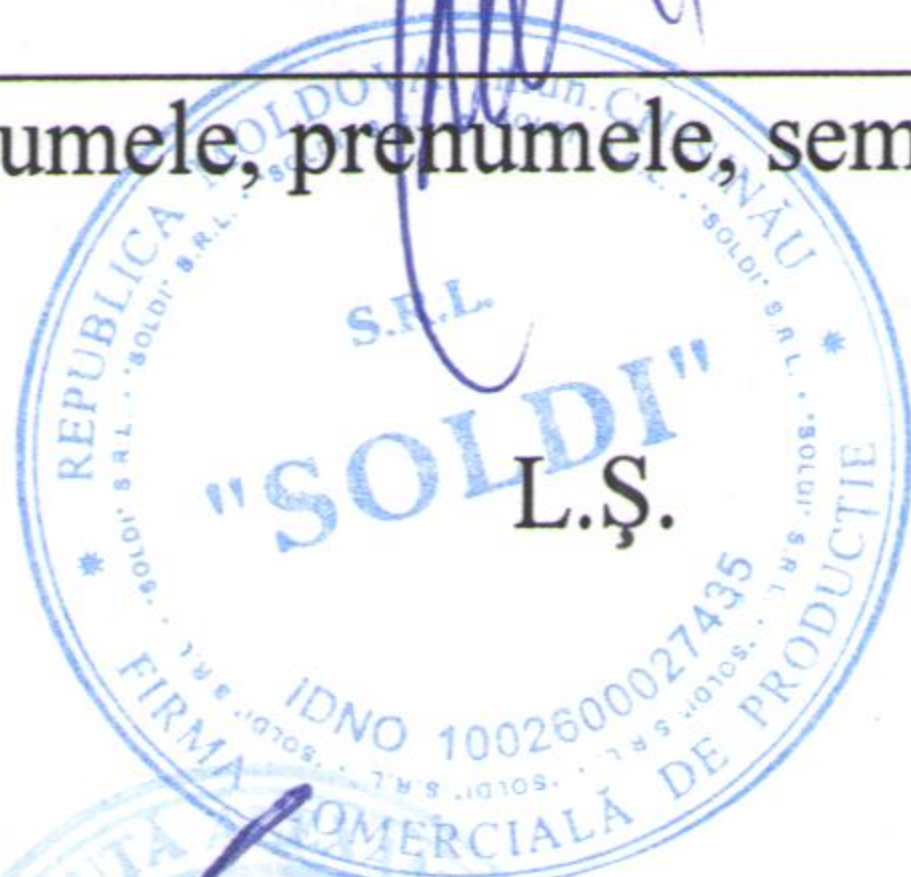

**Complexul instalatiilor de
debitare a apei pentru
aprovizionarea cu apa a s.
Cojusna raionul Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7 Variatii
Retele exterioare de distributie a apei

Valoarea de deviz 161 033 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7 Variatii:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	40,34	36,45	1 470,39
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	18,36	36,45	669,22
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,64	36,45	23,33
		Total manopera				2 163

Materiale:

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,20	12,50	15,00
2.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,89	2 500,00	2 225,00
3.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,01	2 650,00	26,50
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,80	14,50	11,60
5.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,80	14,50	40,60
6.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	47,56	8,50	404,26
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,40	10,50	4,20
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	10,80	4,32
9.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,96	24,00	23,04
10.	25212167010000 1	Teava din otel d426x5mm	m	4,08	1 150,79	4 695,22
11.	25212167010014	Teava din polietilena d200mm PE100, SDR11, Pn=20	m	250,34	416,00	104 141,44
12.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,17	30,00	35,10
		Total materiale de construcții				111 626

Utilaje de construcții:

1.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	6,80	185,00	1 258,00
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,04	98,00	297,92
3.	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	6,32	185,00	1 169,20

4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,32	25,00	8,00
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,29	25,00	182,25
6.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,08	98,00	105,84
Total utilaje de construcții						3 021

Total	lei	134 194
TVA	20,00 %	26 839

Total deviz:

161 033

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

