GRAFIC SĂPTĂMÂNAL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR – 90 ZILE CALENDARISTICE

Obiectiv: Reparația străzilor din satul Șerpeni, raionul Anenii Noi

Perioada planificată| Grafic întocmit pe 13 săptămâni.

Nr.	Sector / stradă	Denumirea lucrării	Cant./U.M.	Durata
M1	General	Mobilizarea utilajelor, personalului și organizarea șantierului		5
M2	General	Semnalizarea temporară și organizarea circulației		90
M3	General	Trasări topografice și pregătirea fronturilor de lucru		4
M4	General	Aprovizionarea etapizată cu materiale		63
1	str. Eugen Doga	Săpătură mecanică cu autogreder	3.1 100 m³	5
2	str. Eugen Doga	Reprofilarea părții carosabile	3 100 m²	4
3	str. Eugen Doga	Compactarea pământului cu cilindru compactor	3.1 100 m³	3
4	str. Eugen Doga	Fundație din piatră spartă, H = 15 cm	24 100 m²	9
5	str. Eugen Doga	Amorsarea stratului de bază	1.56 t	1
6	str. Eugen Doga	Strat de bază din beton asfaltic, H = 6 cm	2 400 m²	5
7	str. Eugen Doga	Amorsarea înaintea stratului de uzură	0.72 t	1
8	str. Eugen Doga	Strat de uzură din beton asfaltic, H = 4 cm	2 400 m²	5
9	str. Eugen Doga	Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă, H = 10 cm	600 m²	5
10	str. Tricolor și str. Tineretului	Scarificarea și reprofilarea împietruirii	1 600 m²	5
11	str. Tricolor și str. Tineretului	Fundație din piatră spartă, H = 15 cm	16 100 m²	7
12	str. Tricolor și str. Tineretului	Amorsarea stratului de bază	1.04 t	1
13	str. Tricolor și str. Tineretului	Strat de bază din beton asfaltic, H = 6 cm	1 600 m²	4
14	str. Tricolor și str. Tineretului	Amorsarea înaintea stratului de uzură	0.48 t	1
15	str. Tricolor și str. Tineretului	Strat de uzură din beton asfaltic, H = 4 cm	1 600 m²	4
16	str. Tricolor și str. Tineretului	Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă, H = 10 cm	220 m²	4
17	str. Constituției	Săpătură mecanică cu autogreder	3.3 100 m³	6
18	str. Constituției	Reprofilarea părții carosabile	3 300 m²	5
19	str. Constituției	Compactarea pământului cu cilindru compactor	3.3 100 m³	4
20	str. Constituției	Fundație din piatră spartă, H = 15 cm	27 100 m²	11
21	str. Constituției	Amorsarea stratului de bază	1.76 t	1
22	str. Constituției	Strat de bază din beton asfaltic, H = 6 cm	2 700 m²	6
23	str. Constituției	Amorsarea înaintea stratului de uzură	0.81 t	1
24	str. Constituției	Strat de uzură din beton asfaltic, H = 4 cm	2 700 m²	6
25	str. Constituției	Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă, H = 10 cm	600 m²	6
C1	Control și finalizare	Control de laborator și recepția fazelor determinante		52
C2	Control și finalizare	Remedieri locale și lucrări de finisare		9
C3	Control și finalizare	Curățarea amplasamentului și demobilizarea		5
C4	Control și finalizare	Pregătirea documentației de execuție		11
R	Rezervă contractuală	Rezervă pentru condiții meteo și întreruperi tehnologice		20
C5	Control și finalizare	Recepția la terminarea lucrărilor și predarea obiectivului		4

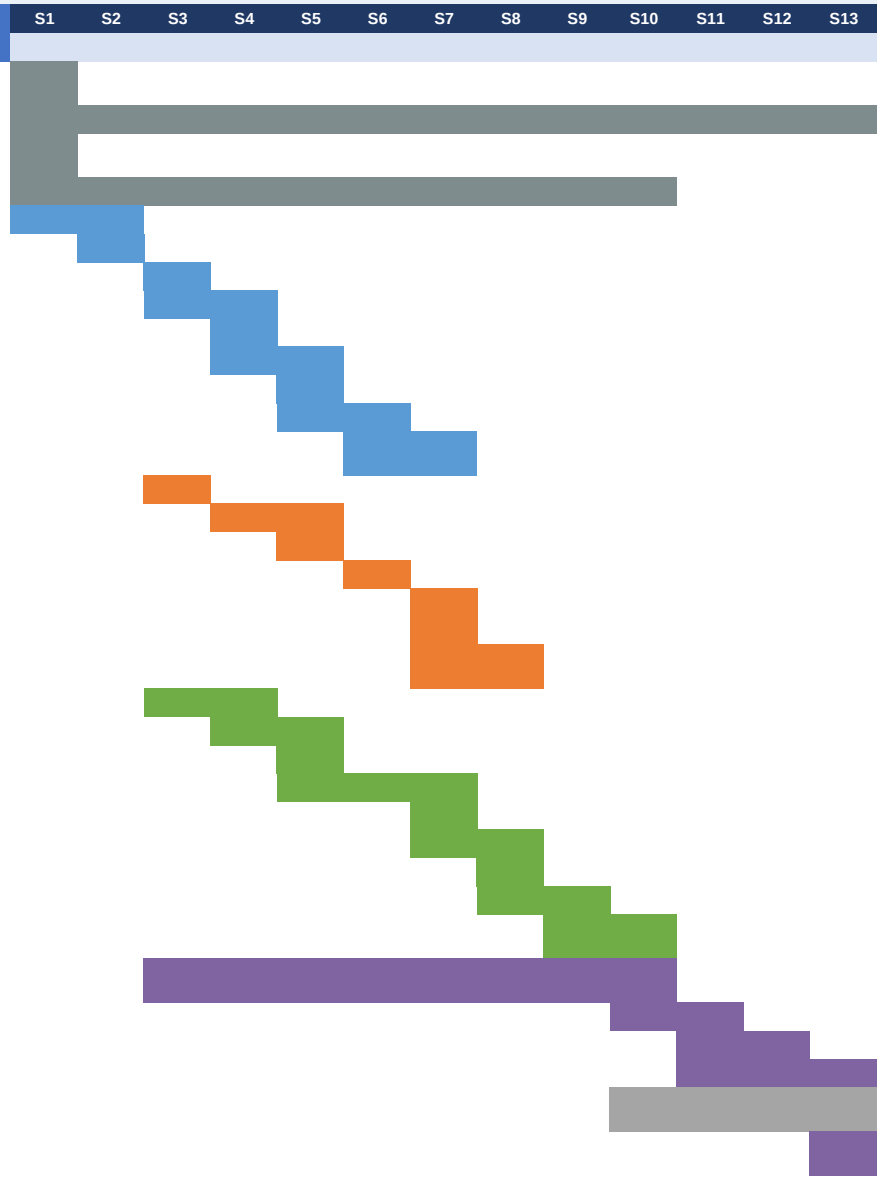

Legendă culori: General | Tricolor/Tineretului | Constituției | Control/finalizare | Rezervă

Digitally signed by Baciu Mihaela
Date: 2026.07.17 16:14:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ
