ID		Activitate a subactivitati	Durata (zile)	Start	Final	Valoare cu TVA
1		**F1. FAZA 1: PROIECT TEHNIC PRELIMINAR**	**130 days**	**Mon 10.04.23**	**Fri 06.10.23**	**506.581,2**
2		**F.1.1. Analiza documentelor**	2 days	Mon 10.04.23	Tue 11.04.23	25.000,0
3		**F.1.2. Colectarea informațiilor**	2 days	Tue 11.04.23	Wed 12.04.23	25.000,0
4		**F.1.3. Documentarea pe teren**	3 days	Wed 12.04.23	Fri 14.04.23	30.000,0
5		**F.1.4. Procesul tehnologic, schemele tehnologice și planul general pentru agrolunc**	17 days	Mon 17.04.23	Tue 09.05.23	11.000,0
6		**F.1.5. Demararea măsurătorilor topo-geodezice**	25 days	Mon 17.04.23	Fri 19.05.23	54.000,0
7		**F.1.6. Demararea prospecțiunilor hidro-geologice**	25 days	Tue 25.04.23	Mon 29.05.23	48.000,0
8		**F.1.7. Precentarea cadrului general al infrastructurii propuse**	10 days	Mon 22.05.23	Fri 02.06.23	12.000,0
9		**F.1.8. Configurarea de ansamblu a componentelor principale ale investiției (amplasarea stației de epurare pe planul topografic la scara 1:500)**	10 days	Mon 22.05.23	Fri 02.06.23	25.000,0
10		**F.1.9. Descrierea tehnică a întregului sistem de epurare propus cu detalierea componentelor și subcomponentelor acestuia**	10 days	Mon 05.06.23	Fri 16.06.23	15.000,0
11		**F.1.10. Detalierea prin intermediul planurilor și diagramelor a soluțiilor tehnice propuse**	15 days	Mon 12.06.23	Fri 30.06.23	25.000,0
12		**F.1.11. Diagrame PAD pentru fiecare componentă și pentru întregul sistem de epurare a apei uzate**	10 days	Mon 26.06.23	Fri 07.07.23	25.000,0
13		**F.1.12. Parametrii de proiectare și ipotezele de calcul**	10 days	Mon 26.06.23	Fri 07.07.23	25.000,0
14		**F.1.13. Schemele tehnologice ale componentelor sistemului de epurare**	20 days	Mon 03.07.23	Fri 28.07.23	25.000,0
15		**F.1.14. Dimensionarea tuturor încăperilor și echipamentelor**	20 days	Mon 03.07.23	Fri 28.07.23	25.000,0
16		**F.1.15. Trasarea rețelelor din interiorul platformei stației de epurare**	15 days	Mon 10.07.23	Fri 28.07.23	25.000,0
17		**F.1.16. Profile longitudinale pentru linia apei și a nămolului**	10 days	Mon 17.07.23	Fri 28.07.23	25.000,0
18		**F.1.17. Calcule hidraulice preliminare**	10 days	Mon 24.07.23	Fri 04.08.23	22.000,0
19		**F.1.18. Estimari de costuri preliminare pentru întregul sistem de epurare a apei uzate**	20 days	Mon 07.08.23	Fri 01.09.23	28.000,0
20		**F.1.19. Raport explicativ succint asupra proiectului preliminar**	5 days	Mon 04.09.23	Fri 08.09.23	25.000,0
21		**F.1.20. Revizuirea proiectului tehnic preliminar**	20 days	Mon 11.09.23	Fri 06.10.23	31.581,2
22		**F2. FAZA 2: PROIECT DE EXECUTIE**	**132 days**	**Mon 09.10.23**	**Tue 09.04.24**	**600.000,0**
23		**F.2.1. Prezentarea cadrului general al infrastructurii propuse**	25 days	Mon 09.10.23	Fri 03.11.23	30.000,0
24		**F.2.2. Configurarea de ansamblu a componentelor principale ale investiției**	20 days	Mon 30.10.23	Fri 24.11.23	20.000,0
25		**F.2.3. Descrierea tehnică a întregului sistem propus cu detalierea componentelor și subcomponentelor acestuia**	25 days	Mon 20.11.23	Fri 22.12.23	17.000,0
26		**F.2.4. Detalierea prin intermediul planurilor și diagramelor a soluțiilor tehnice propuse**	20 days	Mon 04.12.23	Fri 29.12.23	37.000,0
27		**F.2.5. Diagrame PAD pentru fiecare componentă și pentru întregul sistem**	10 days	Mon 25.12.23	Fri 05.01.24	37.000,0
28		**F.2.6. Lista echipamentelor și instrumentației propuse prin proiect**	15 days	Tue 02.01.24	Mon 22.01.24	27.000,0
29		**F.2.7. Planuri de situație în scara 1:500**	15 days	Mon 08.01.24	Fri 26.01.24	27.000,0
30		**F.2.8. Calcule hidraulice detaliate pentru rețele și construcții**	20 days	Mon 15.01.24	Fri 09.02.24	27.000,0
31		**F.2.9. Profile longitudinale pentru toate conductele proiectate**	10 days	Mon 22.01.24	Fri 02.02.24	27.000,0
32		**F.2.10. Calcule de dimensionare statică**	10 days	Mon 29.01.24	Fri 09.02.24	37.000,0
33		**F.2.11. Desene tehnice de execuție**	40 days	Mon 08.01.24	Fri 01.03.24	54.000,0
34		**F.2.12. Desene detalate**	40 days	Mon 08.01.24	Fri 01.03.24	47.000,0
35		**F.2.13. Costul general consolidat estimat al lucrărilor de construcții-montaj**	20 days	Mon 12.02.24	Fri 08.03.24	28.000,0
36		**F.2.14. Documente de licitație inclusiv devize de cheltuieli**	25 days	Mon 05.02.24	Fri 08.03.24	27.000,0
37		**F.2.15. Standarde care trebuiesc respectate**	25 days	Mon 05.02.24	Fri 08.03.24	7.000,0
38		**F.2.16. Specificații tehnice**	20 days	Mon 05.02.24	Fri 01.03.24	13.000,0
39		**F.2.17. Manualul de exploatare și întreținere**	25 days	Mon 05.02.24	Fri 08.03.24	7.000,0
40		**F.2.18. Obținerea avizului sanitar**	20 days	Mon 04.03.24	Fri 29.03.24	6.000,0
41		**F.2.19. Obținerea avizului ecologic de stat**	20 days	Mon 11.03.24	Fri 05.04.24	6.000,0
42		**F.2.20. Obținerea avizului impactului asupra mediului**	20 days	Mon 11.03.24	Fri 05.04.24	6.000,0
43		**F.2.21. Verificarea și expertizarea proiectului**	15 days	Mon 18.03.24	Fri 05.04.24	100.000,0
44		**F.2.22. Raport final**	2 days	Mon 08.04.24	Tue 09.04.24	10.000,0

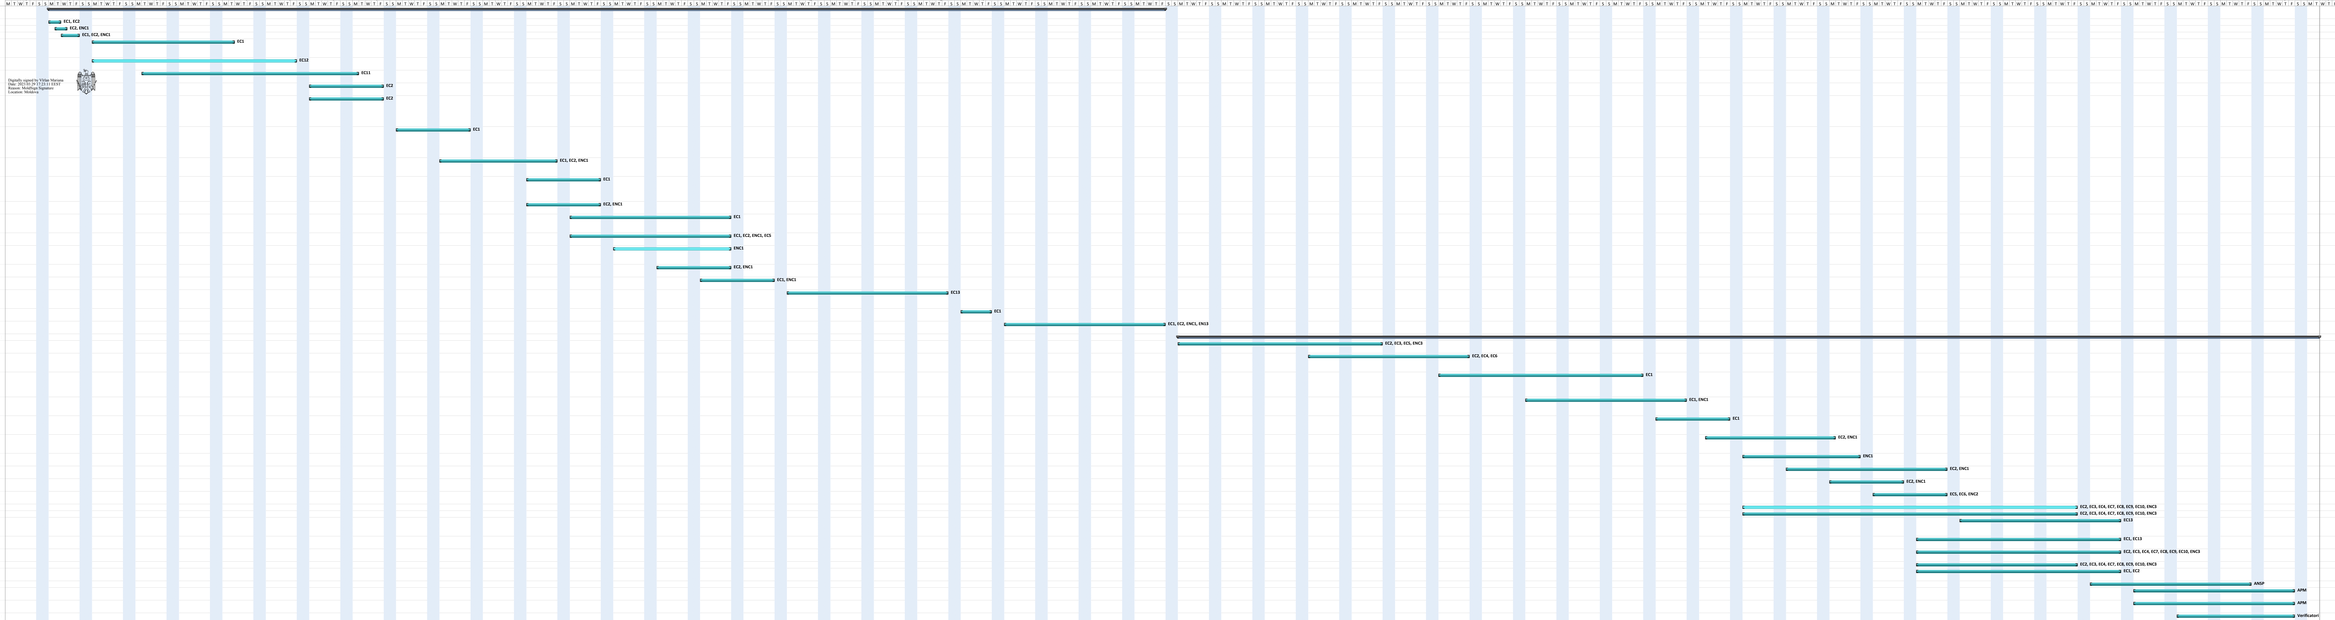

Digitally signed by Vitalie Marasa
Date: 2023.06.13 12:21:15 EEST
Reason: I'm the Signature Creator
Location: Moldova

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | Deadline | Progress
