




ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Half 1, 2025														Half 2, 2025		Half 1, 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
28			Activitatea 20: Elaborarea și prezentarea conceptului preliminar de proiectare în trei variante	25 days	Thu 5/8/25	Wed 6/11/25	7,9,10,11,12,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	D	Half 1, 2025						Half 2, 2025				Half 1, 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
55			Activitatea 40: Predarea Proiectului și Studiilor Realizate în Cadrul Întâlnirii de Lucru	2 days	Thu 1/15/26	Fri 1/16/26	52,53,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Semnat:
Nume: Simona Ciobotaru
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: EDIFICIA CONCEPT S.R.L.

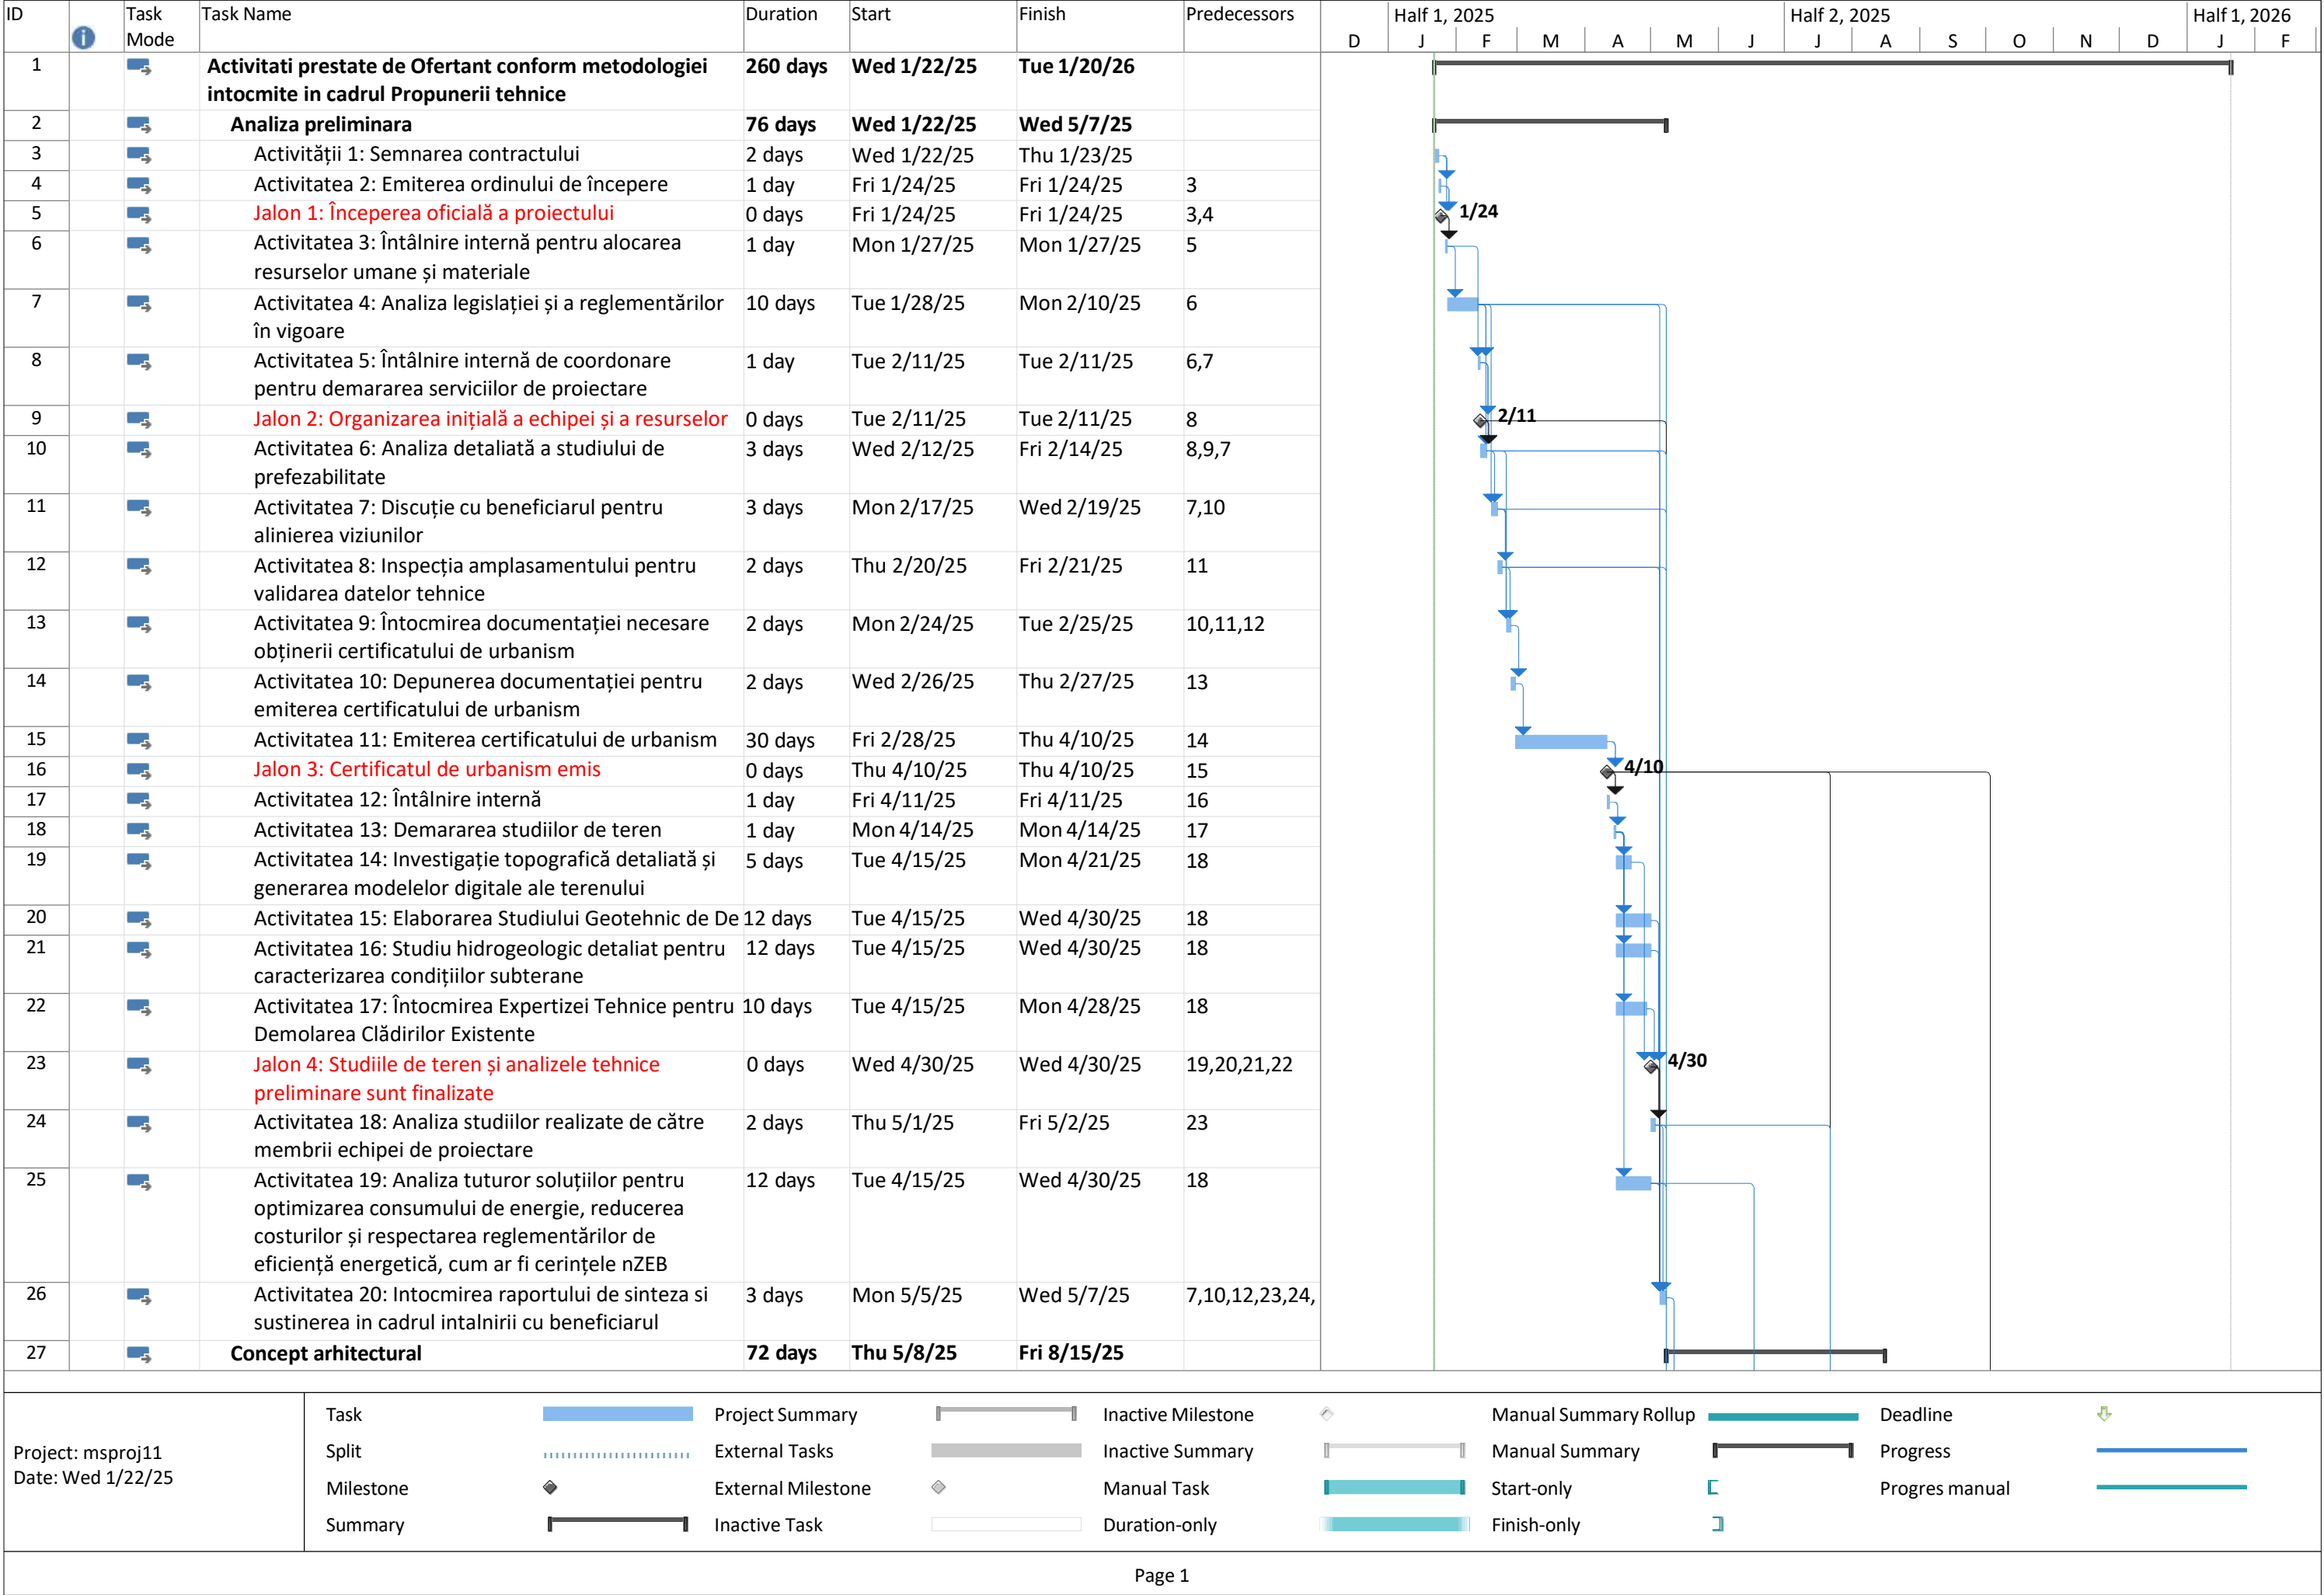

Durata de execuție a fost determinată ca rezultat al detaliilor incluse în graficul Gantt, anexa a Propunerii tehnice, care prezintă o planificare minuțioasă a tuturor activităților necesare pentru implementarea proiectului. Această planificare reflectă nu doar o alocare realistă a timpilor de lucru, ci și o secvențializare logică a activităților, având în vedere interdependențele dintre acestea.

Graficul Gantt, elaborat pe baza metodologiei propunerii tehnice, garantează că toate cerințele și etapele proiectului sunt acoperite în mod riguros. Prin includerea unui număr extins de activități, care depășesc solicitările inițiale din documentația de atribuire, metodologia noastră urmărește să anticipeze provocările și să minimizeze riscurile de întârziere.

Această abordare detaliată este justificată de dorința de a respecta cele mai înalte standarde de profesionalism și de a asigura o livrare eficientă a proiectului. Durata estimată reflectă o înțelegere profundă a cerințelor beneficiarului și o planificare care îmbină realismul cu eficiența, contribuind astfel la atingerea tuturor obiectivelor stabilite.
