

GRAFIC DE EXECUȚIE ETAPA II


Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	01 Сен '25	05	08 Сен '25
1		Lucrări organizatorice și pregătitoare	3 дни	Ср 03.09.25	Пт 05.09.25	30	02	08
2		str. Rasaritului	245 дни	Пн 08.09.25	Пт 14.08.26			
3		<i>Decaparea structurii rutiere</i>	20 дни	Пн 08.09.25	Пт 03.10.25			
4		<i>Lucrari de terasament</i>	25 дни	Пн 06.10.25	Пт 07.11.25			
5		<i>Constructia intrarilor in curti</i>	15 дни	Пн 10.11.25	Пт 28.11.25			
6		<i>Amenajarea trotuarului</i>	10 дни	Пн 01.12.25	Пт 12.12.25			
7		<i>Ajustarea capacelor la fântini</i>	2 дни	Пн 04.05.26	Вт 05.05.26			
8		<i>Drumuri laterale</i>	30 дни	Ср 06.05.26	Вт 16.06.26			
9		<i>Sistem rutier</i>	20 дни	Ср 06.05.26	Вт 02.06.26			
10		Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere	5 дни	Пн 10.08.26	Пт 14.08.26			
11		stradelei Rasaritului	142 дни	Пн 15.12.25	Вт 30.06.26			
12		<i>Constructia intrarilor in curti</i>	5 дни	Пн 15.12.25	Пт 19.12.25			
13		<i>Amenajarea trotuarului</i>	6 дни	Пн 22.12.25	Пн 29.12.25			
14		<i>Sistemul rutier</i>	10 дни	Ср 17.06.26	Вт 30.06.26			
15		stradela M.Sadoveanu	15 дни	Ср 01.07.26	Вт 21.07.26			
16		<i>Constructia intrarilor in curti</i>	3 дни	Ср 01.07.26	Пт 03.07.26			
17		Sistemul rutier	12 дни	Пн 06.07.26	Вт 21.07.26			
18		str. Florilor	6 дни	Ср 22.07.26	Ср 29.07.26			
19		<i>Constructia intrarilor in curti</i>	3 дни	Ср 22.07.26	Пт 24.07.26			
20		Sistemul rutier	3 дни	Пн 27.07.26	Ср 29.07.26			
21		str. Emilian Bucov	7 дни	Чт 30.07.26	Пт 07.08.26			
22		<i>Constructia intrarilor in curti</i>	3 дни	Чт 30.07.26	Пн 03.08.26			
23		Sistemul rutier	4 дни	Вт 04.08.26	Пт 07.08.26			
24		Procesul de verificare și recepție la terminarea lucrărilor	11 дни	Пн 17.08.26	Пн 31.08.26			

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

GRAFIC DE EXECUȚIE ETAPA II


Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

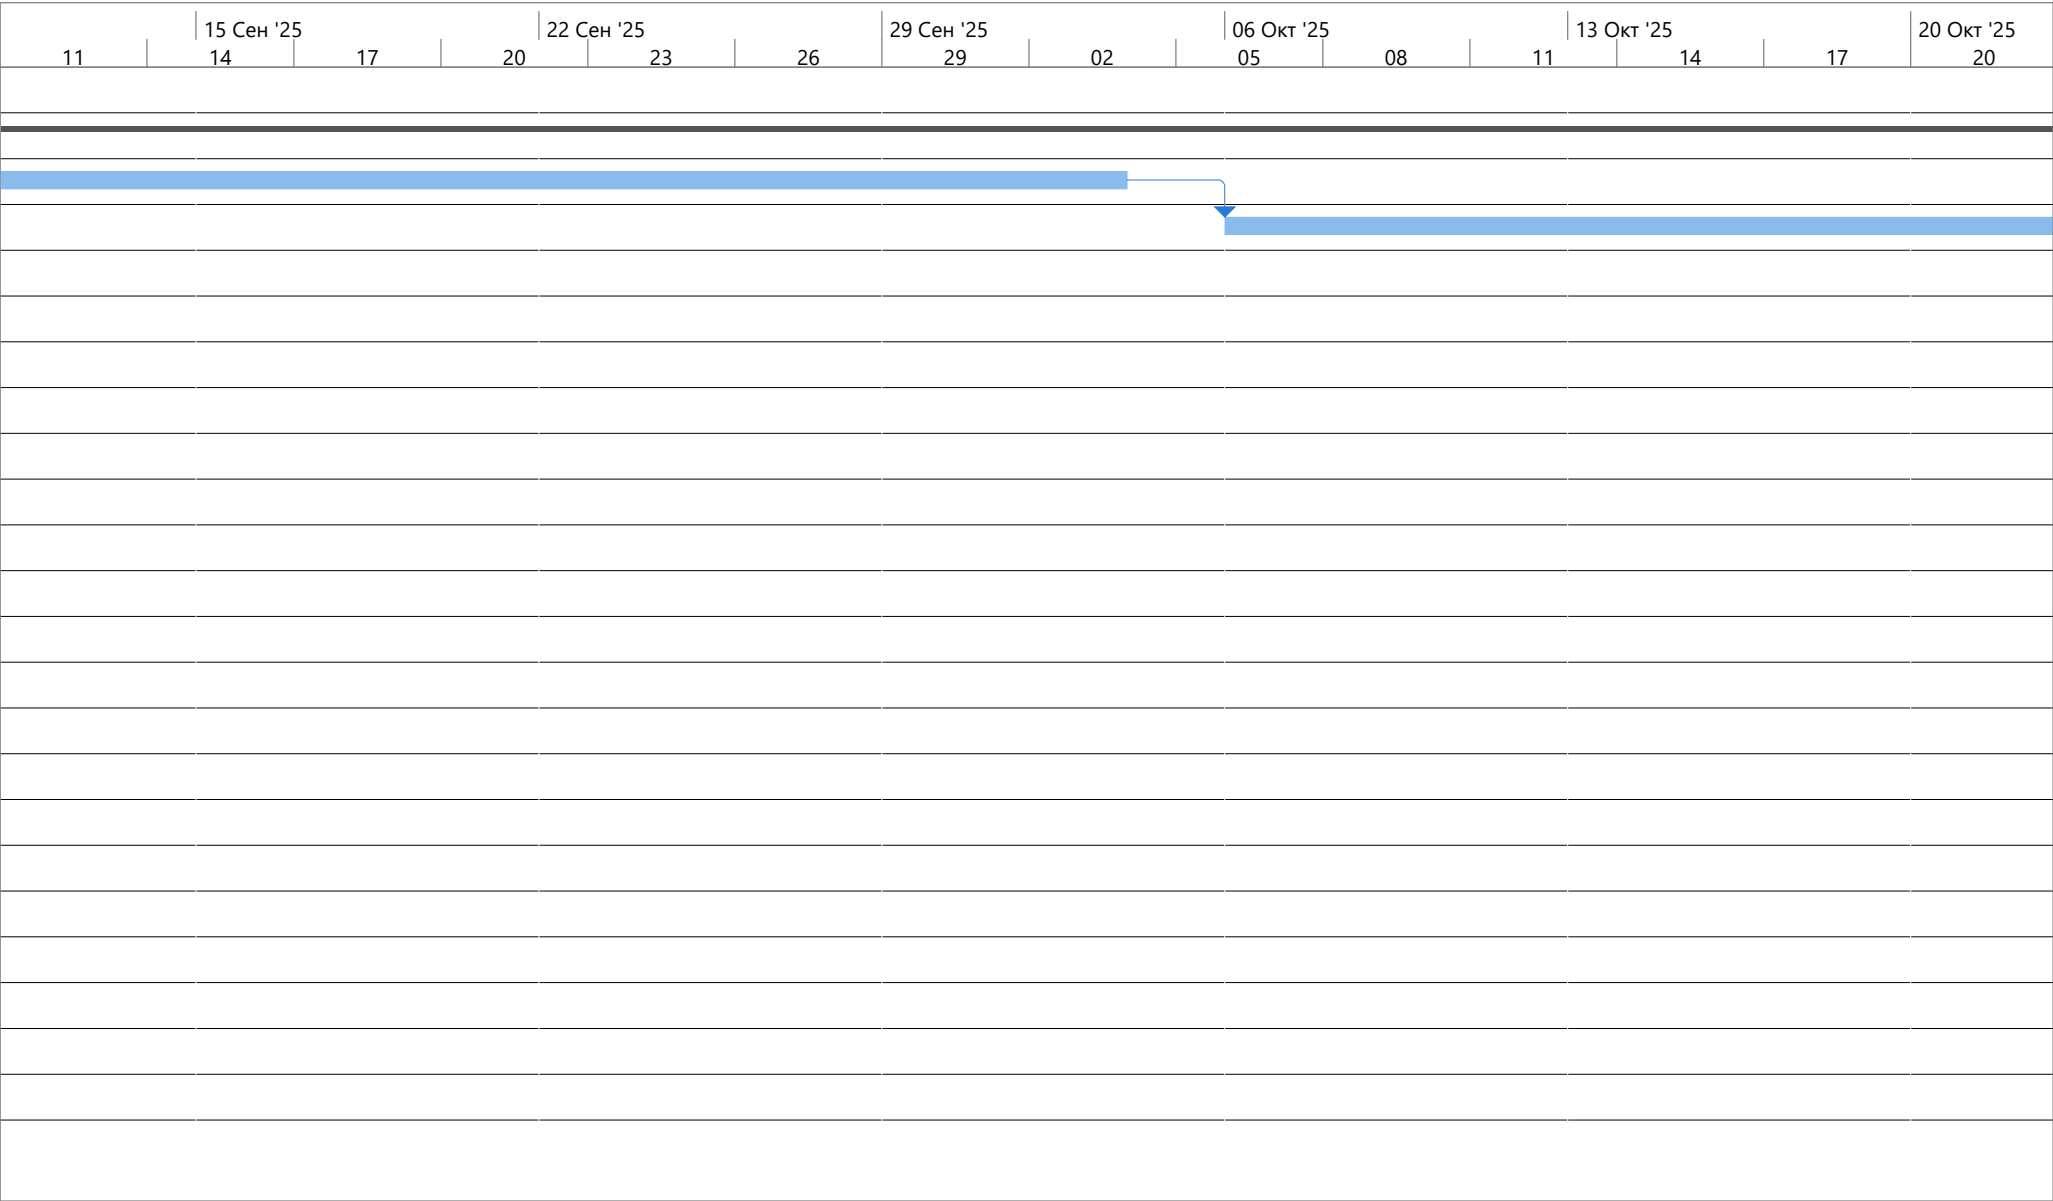

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

GRAFIC DE EXECUȚIE ETAPA II


Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

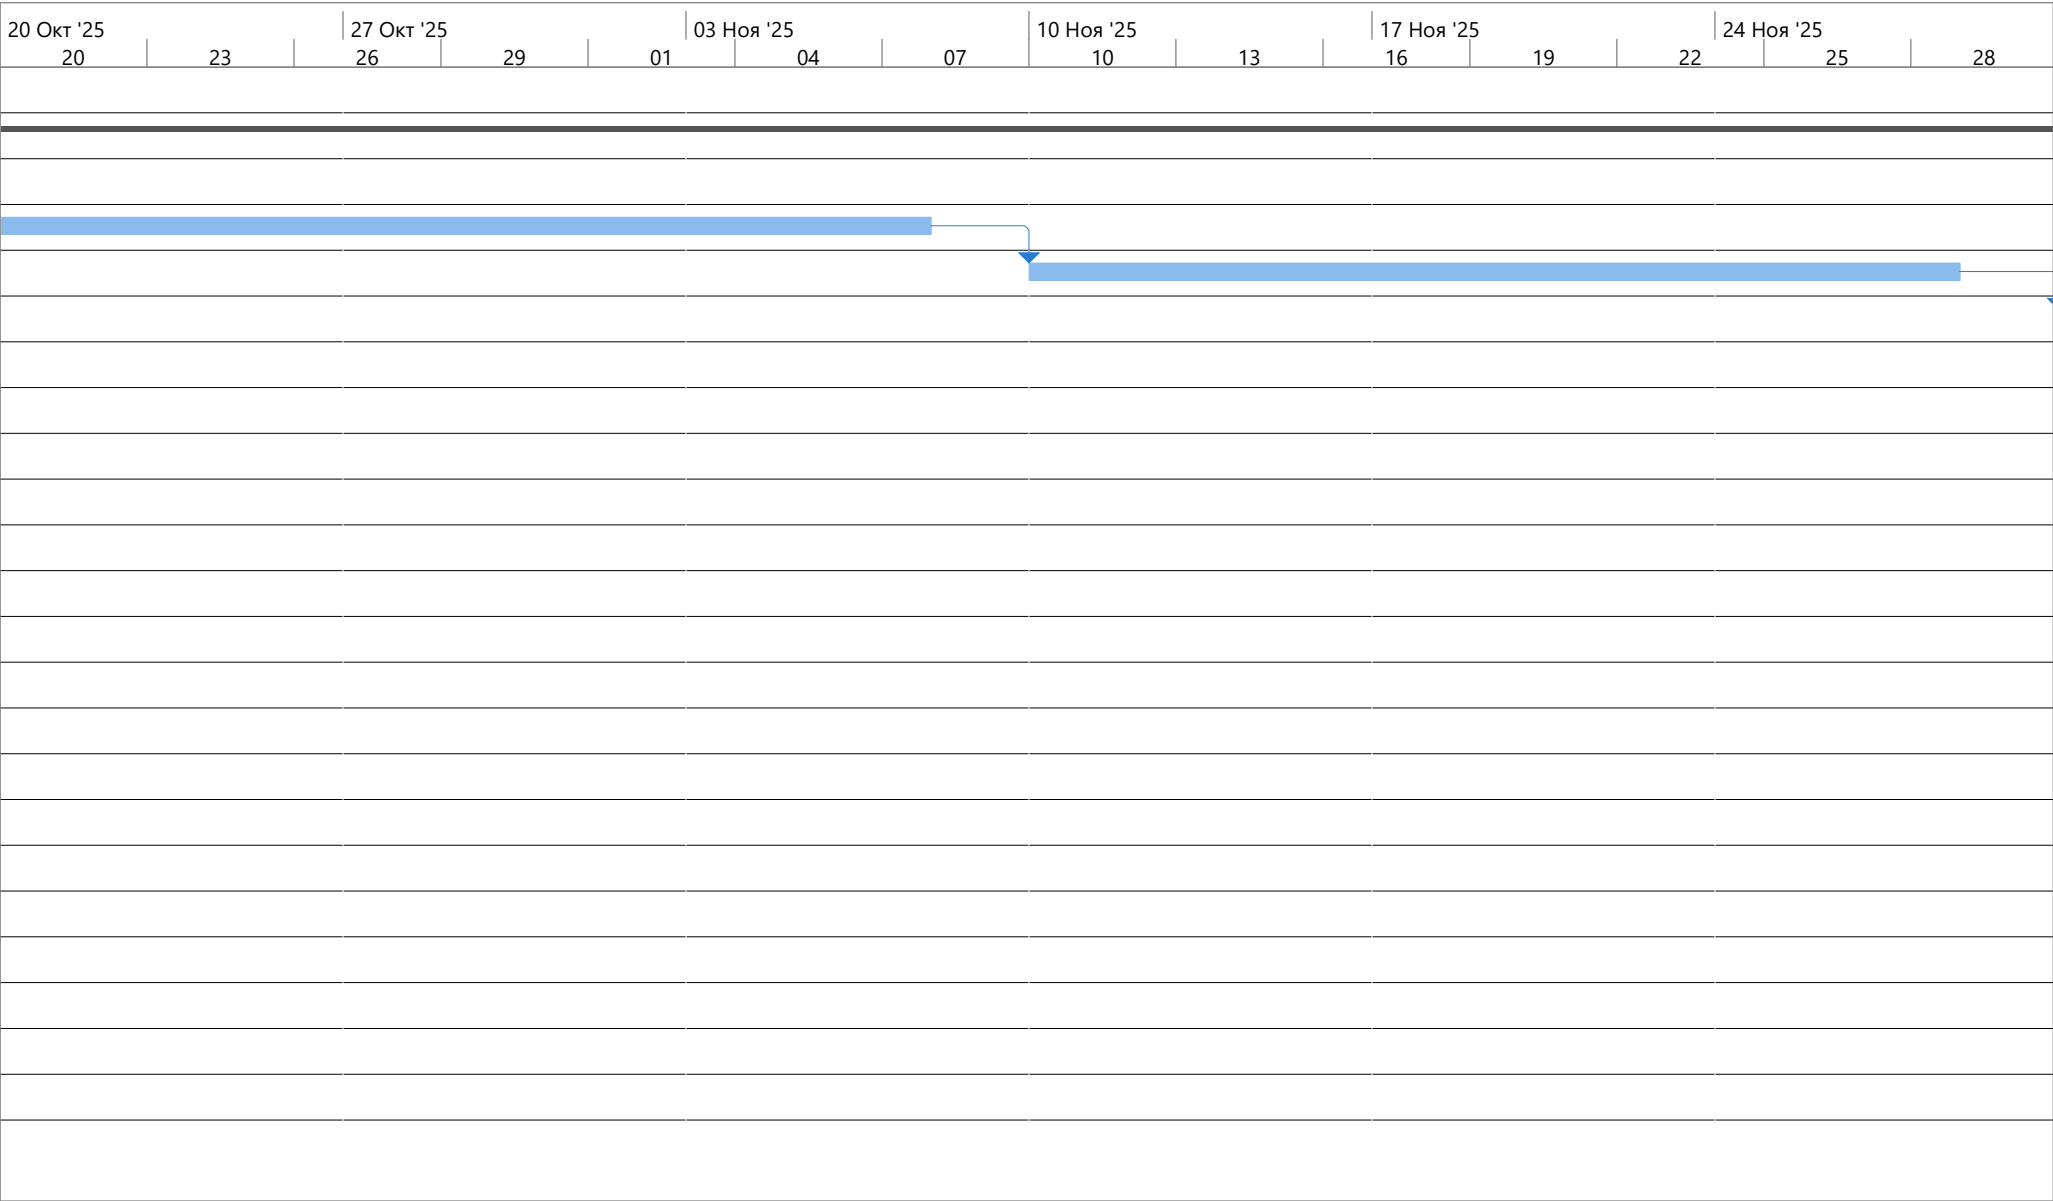

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

GRAFIC DE EXECUȚIE ETAPA II

Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

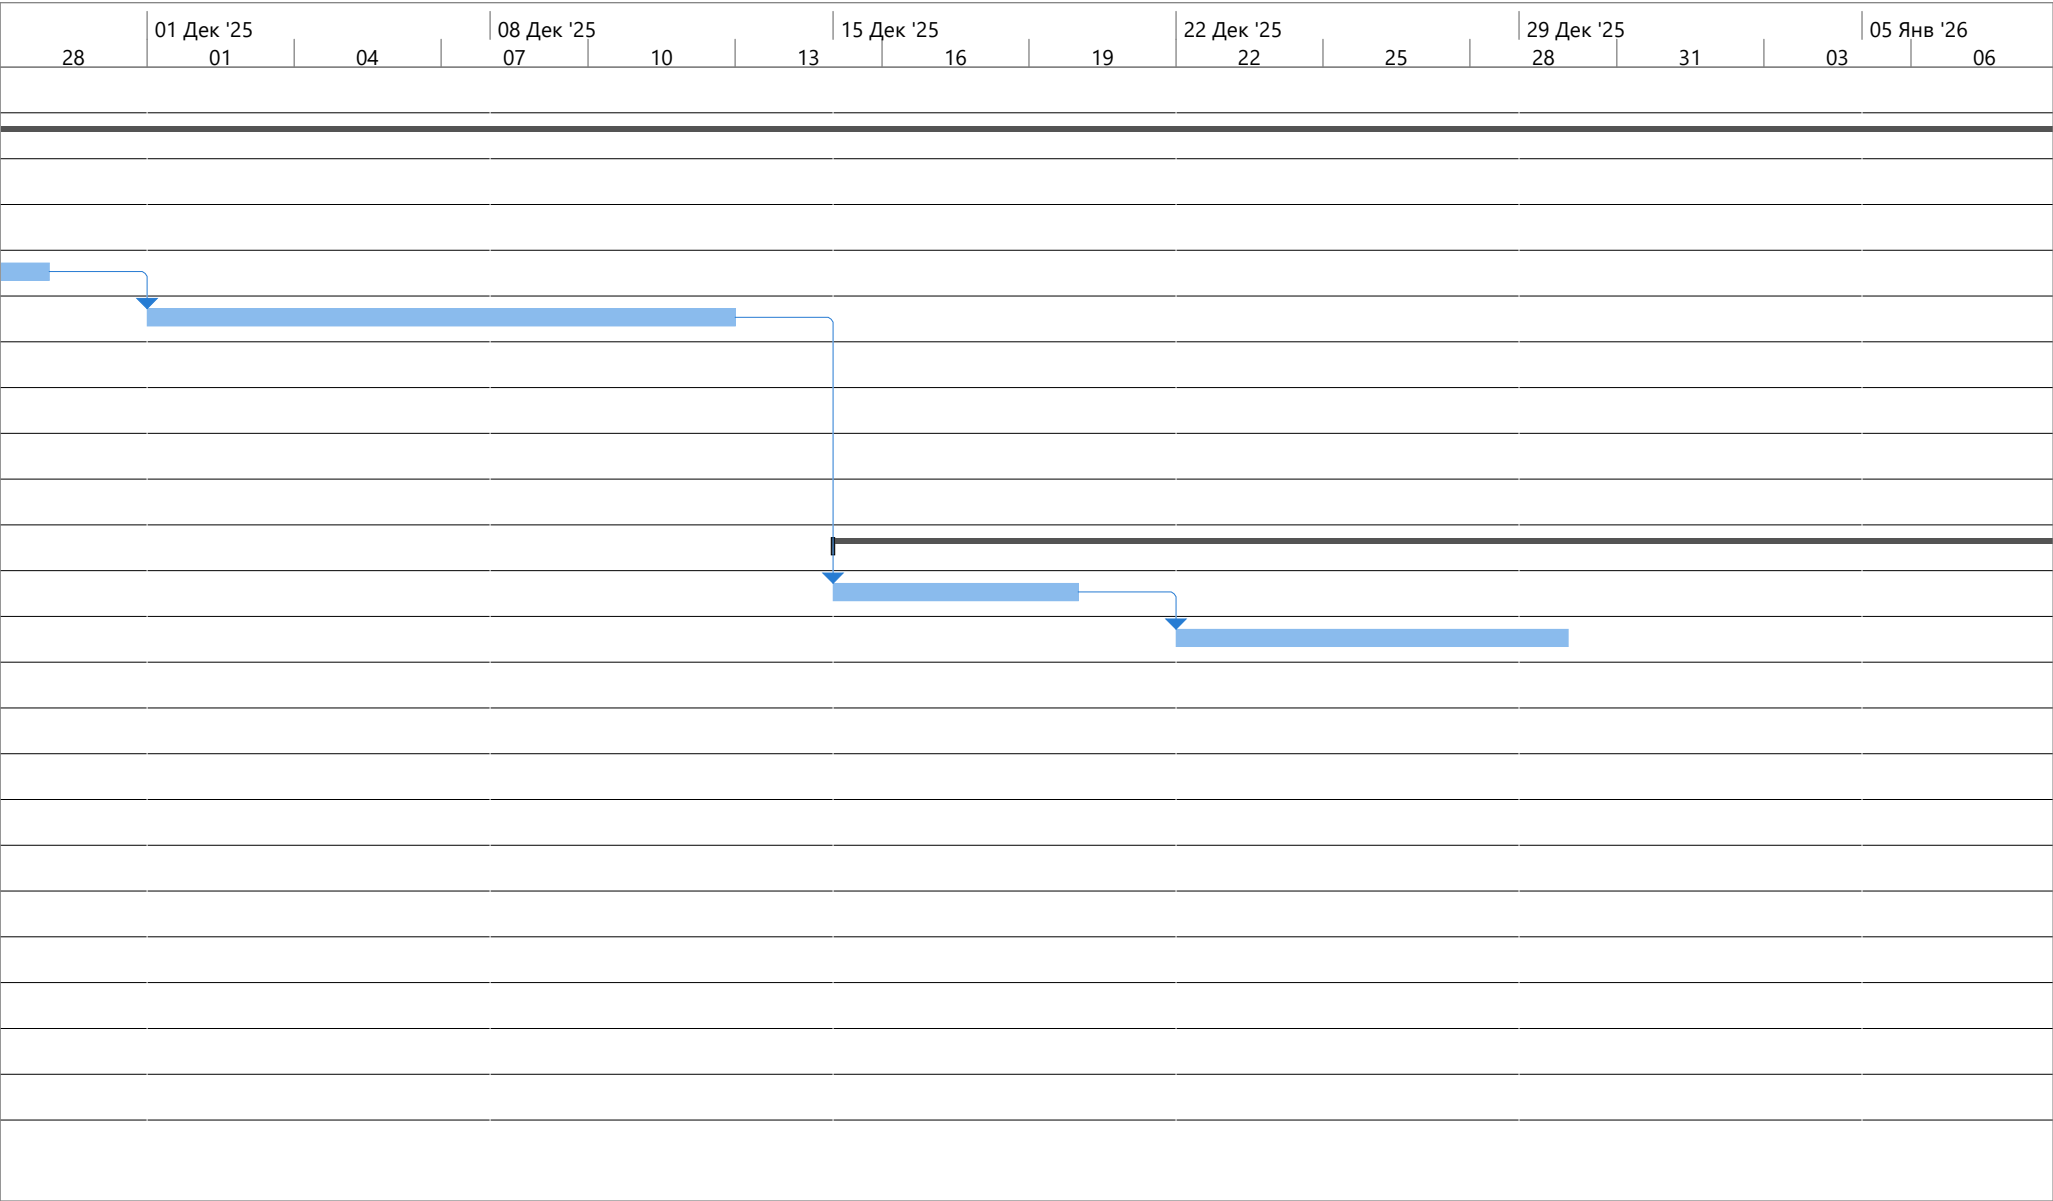

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

GRAFIC DE EXECUȚIE ETAPA II

Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

[illegible]

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

GRAFIC DE EXECUTIE ETAPA II

Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

[illegible]

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

GRAFIC DE EXECUTIE ETAPA II

Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

[illegible]

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

GRAFIC DE EXECUȚIE ETAPA II


Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau



graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

GRAFIC DE EXECUȚIE ETAPA II


Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

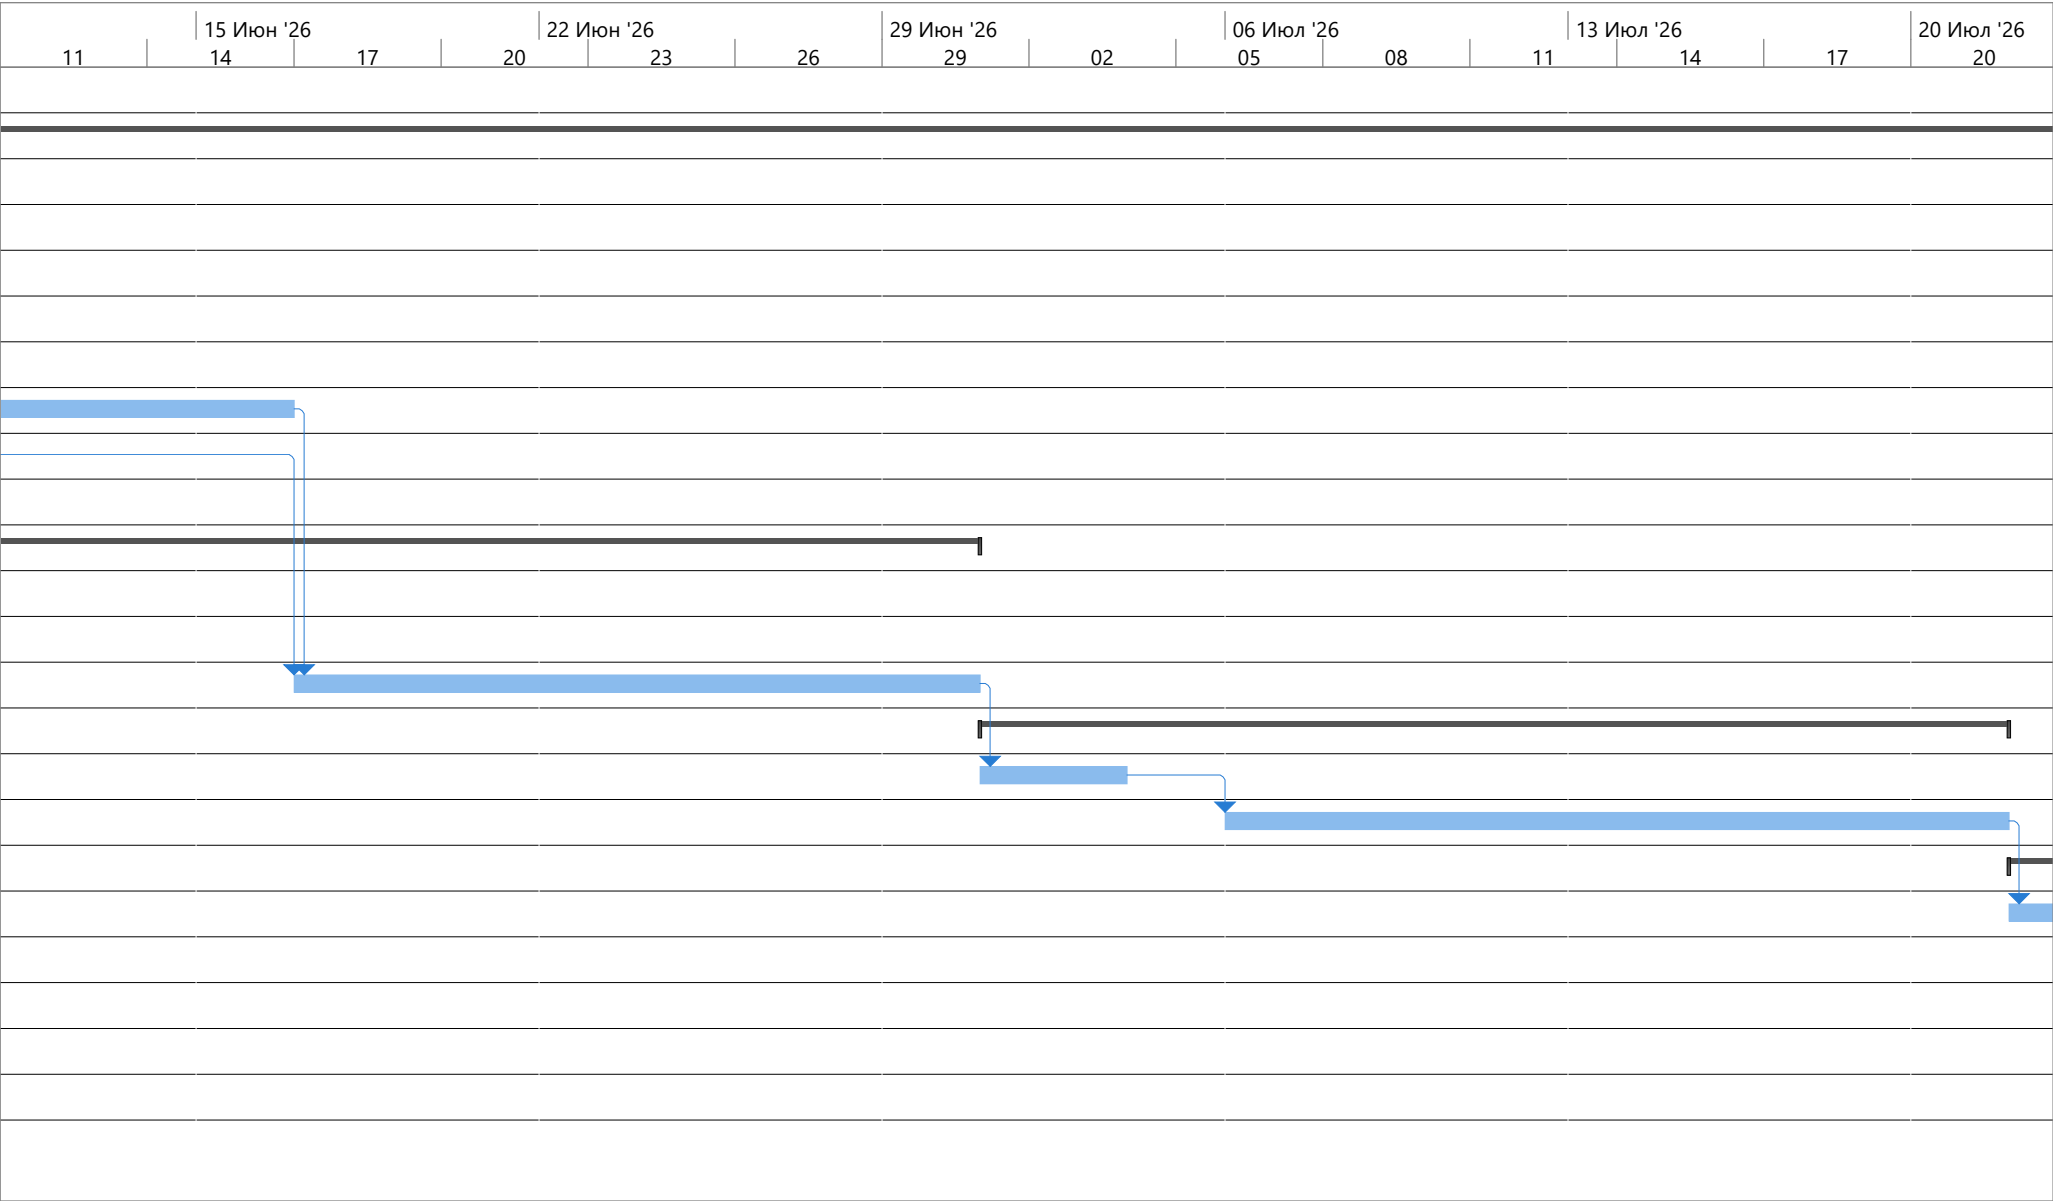

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

GRAFIC DE EXECUȚIE ETAPA II

Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

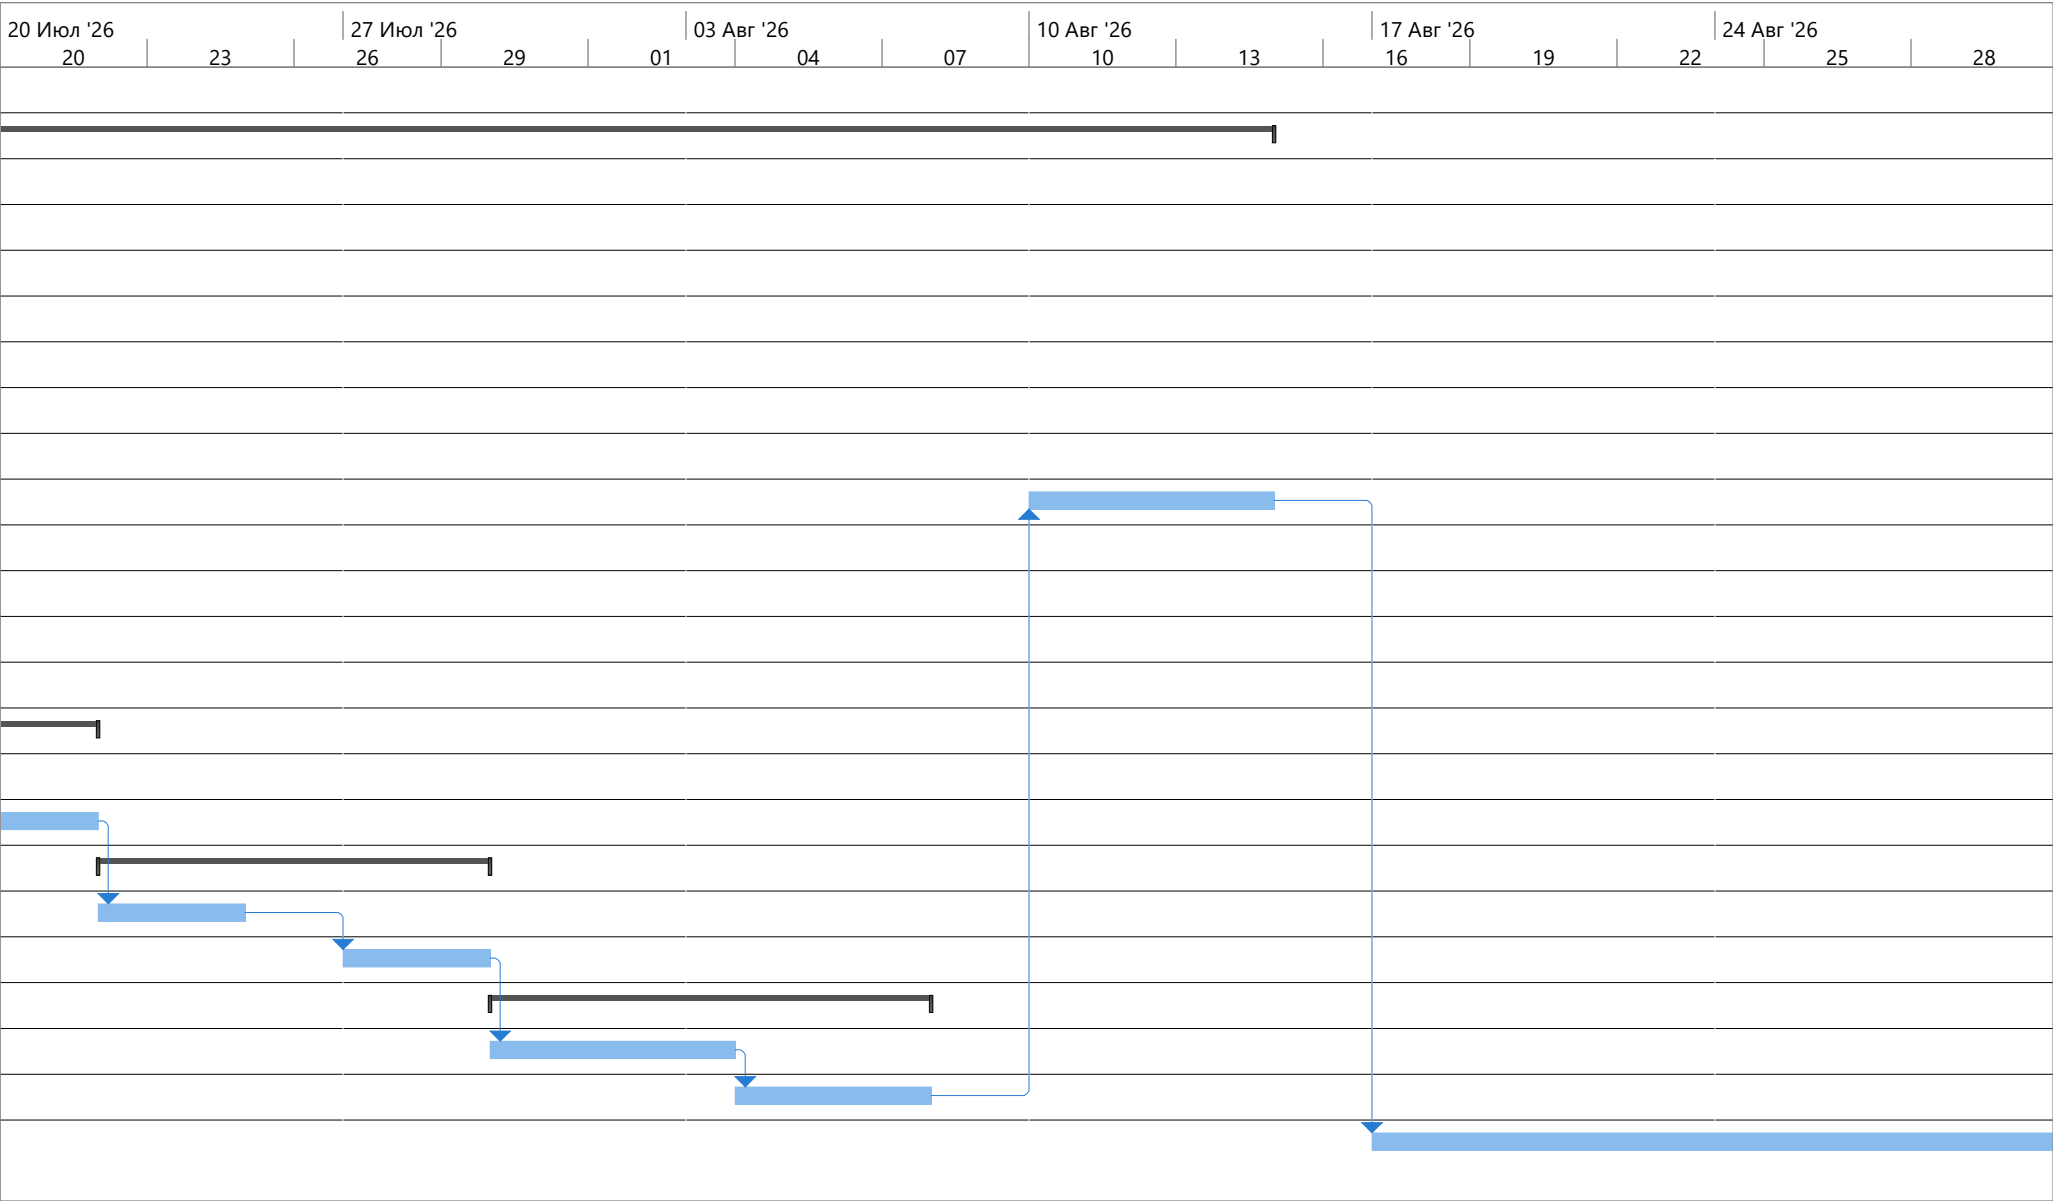

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor

GRAFIC DE EXECUTIE ETAPA II

Reparatia capitala a str. Rasaritului si a sistemului pluvial, din com. Colonita, mun.Chisinau

[illegible]

graficul va fi ajustat în dependență de data primirii ordinului de începere a lucrărilor
