

Digitally signed by Sirbu Marius
Date: 2023.08.01 13:12:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT FOR WORKS

Date: 10 June 2021

Dear Sir,

Ref.: **00106290/ EU4Moldova: Focal Regions**
ItB21/02214: Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage **SC NOUCONST SRL**, duly incorporated under the Laws of Moldova, Republic of (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **works for construction of dry-type pedestrian fountain, repair of road pavement and construction of parking lots in Ungheni municipality, as part of the project "Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre"** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a) this Contract;
 - b) Annex 1 – the General Conditions of Contract for Civil Works
 - c) Annex II – the Contractor's **Price Schedule and Priced Bill of Quantities**, dated 12/04/2021, attached hereto and the Contractor's technical bid, not attached hereto but known to and in the possession of both parties
 - d) the Technical Specifications and Drawings [as listed below], not attached hereto but known to and in the possession of both parties:
 - i. PROIECT DE EXECUTIE 02/20 – RAC Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str. Nationala, Piata Independentii or. Ungheni, Designer: ART FACTORY SRL;
 - ii. PROIECT DE EXECUTIE 05/2020 – REAE Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str. Nationala, Piata Independentii or. Ungheni, Designer: Electro Service Grup SRL;
 - iii. PROIECT DE EXECUTIE 204/2020 – D Reparatia imbracamintei rutiere din st. Nationala, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins intre str. Romana si str. Stefan cel Mare in or. Ungheni, Designer: SIMBO-PROIECT SRL;
 - iv. PROIECT DE EXECUTIE 205/2019 – P Amenajarea parcarilor in zona centrala a or. Ungheni (str. Alexandru cel Bun si str. Mihai Eminescu), Designer: SIMBO-PROIECT SRL.
- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

Digitally signed by Scorobogateo Vadim
Date: 2022.10.17 08:57:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DS

**SC "NOUCONST" SRL
#94, Petricani Sreet, Chisinau MD-2059**

2. Obligations of the Contractor

- 2.1 The Contractor shall commence work within **15 calendar days** from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **28 December 2021**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.
- 2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **17 June 2021**.
- 2.3 This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on **30 December, 2022**.
- 2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **US\$ 1,398,384.71 [one million three hundred ninety eight thousand three hundred and eighty four US dollars 71 cents]**.
- 3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.4 The Contractor shall submit an invoice for advance payment in an amount of **US\$ 29,000.00 [twenty-nine thousand US dollars]** upon signature of this Contract by both parties, invoices for the work performed and materials utilized every 20-40 days and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.
- 3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

- 3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.
- 3.7 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Final Completion by the Engineer.

4. Special conditions

- 4.1 The **Performance GUARANTEE** referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **US\$ 139,838.47 [10% of the total contract value] within a maximum of fifteen (15) days of the contract signature by both parties.**
- 4.2 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.
- 4.3 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **2.5%** of the price of the Contract per week of delay, up to a maximum of **10%** of the final price of the Contract.

5. Submission of invoices

- 5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.
- 5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

- 6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.
- 6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK: BC "Moldindconbank" S.A. fil. "Renastere" Chişinău
SWIFT: MOLDMD2X312
IBAN: MD20 ML00 0000 02251 2123 039
Contractor Fiscal Code: 1005600012120

7. Modifications

- 7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. Notifications

- 8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Alexandru PELIVAN, EU4MD Programme Manager, UNDP Moldova
#131, 31 August 1989 Street, MD 2012 Chisinau, Moldova
e-mail: alexandru.pelivan@undp.org

DS

For the Contractor:

Dorin ODOVENCO, Construction Manager
#94, Petricani Sreet, Chisinau MD 2059, Moldova
GSM: (+373) 068 146 700
e-mail: dorin.odovenco@nouconst.md; vadim.scorobogatco@nouconst.md

- 8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie VIERU, EU4MD Project Officer/ Infrastructure
#104 Sciusev Street, Chisinau, Moldova
GSM: +373 799 98802
vitalie.vieru@undp.org

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.



Yours sincerely,

Andrea Cuzyova

Andrea CUZYOVA
Deputy Resident Representative
UNDP Moldova

For **SC NOUCONST SRL**

Agreed and Accepted.

Signature

Name Vadim SCOROBOGATCO

Title Administrator

Date 12.06.2017



DS

INVESTITOR: EU4MOLDOVA – regiuni cheie
BENEFICIAR: Primăria mun. Ungheni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 03 din 21.04.2022

privind "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcurilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcurilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" executată în cadrul contractului nr. ITB21/02214 din 10.06.2021 încheiat între Programul EU4Moldova – regiuni cheie finanțat de UE și implementat de PNUD Moldova și UNICEF Moldova și SRL "Nouconst" pentru lucrările de construcție a havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni, lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcurilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni, amenajarea parcurilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire nr. 36, 37,38 din 07.06.2021;

2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 20-21 aprilie 2022, fiind formată din:

Presedinte:

- Ion Galușcă, viceprimarul municipiului Ungheni

Membri :

- Vitalie Vieru – inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Eugenia Lebeda - inginer cons. ant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Liliana Tincu - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie
- Vlad Savin – arhitect-șef Primăria mun. Ungheni
- Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Tatiana Pavliuc – contabil - șef Primăria mun. Ungheni
- Emanoil Mocanu – responsabil tehnic domeniul construcții rutiere
- Iacob Mihailov – responsabil tehnic domeniul construcții civile

3. Au mai participat la recepție:

Odovenco Dorin manager proiect
(numele, prenumele) (calitatea)

Furduja Alexei diriginte de șantier
(numele, prenumele) (calitatea)

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor conform scrisorii nr. 122/04 din 07 aprilie 2022 de la SRL "Nouconst".

6. Comisia de recepție mot.vează propunerea făcută prin:

- Executarea volumului de lucrări prezentat în caietul de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Organizarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 3600, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal (nu este necesar).

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 21.04.2022 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție :

Presedinte:

- Ion Galușcă

Membri :

- Vitalie Vieru

- Eugenia Lebeda

- Liliana Tincu

- Vlad Savin

- Anastasia Litviniuc

- Tatiana Pavliuc

- Emanoil Mocanu

- Iacob Mihailev



Invitati:

Dobrovenco Dorin
Furtună Alexei



10. Lucrarea "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcarilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" este :


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " 2022
L.Ș. 
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2022
L.Ș. 
(semnătura)




Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

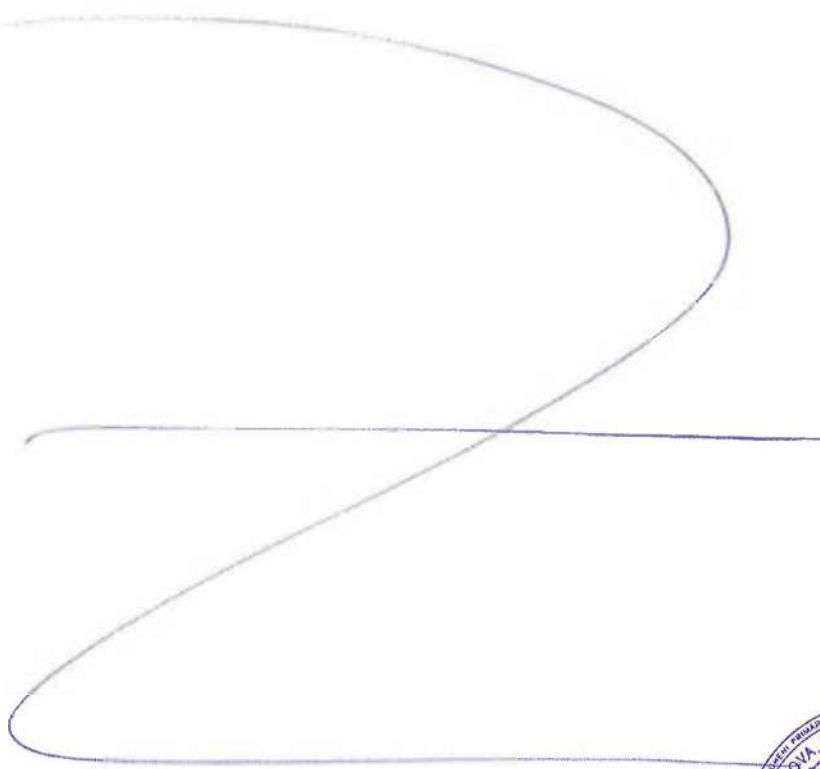

- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie Vieru
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie LEBEDA
- **Liliana Tincu**, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie _____
- **Vlad Savin**, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Anastasia Litviniuc**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Emanoil Mocanu**, responsabil tehnic domeniul construcții rutiere _____
- **Iacob Mihailov**, responsabil tehnic domeniul construcții civile _____



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.

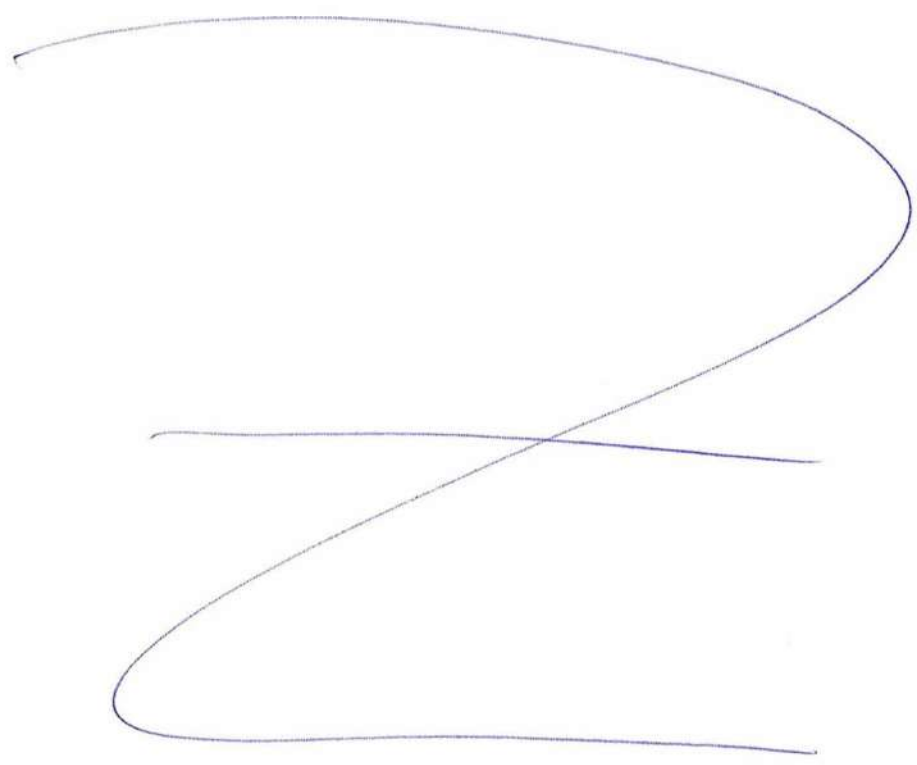

- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie _____
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie LEBEDA
- **Liliana Tincu**, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie _____
- **Vlad Savin**, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Anastasia Litviniuc**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Emanoil Mocanu**, responsabil tehnic domeniul construcții rutiere _____
- **Iacob Mihailov**, responsabil tehnic domeniul construcții _____



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.



- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni 
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- **Liliana Tincu**, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- **Vlad Savin**, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni 
- **Anastasia Litviniuc**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni 
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni 
- **Emanoil Mocanu**, responsabil tehnic domeniul construcții rutiere 
- **Iacob Mihailov**, responsabil tehnic domeniul construcții civile 





Republica Moldova
Ministerul Economiei și Infrastructurii
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Proiectul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale

ANGAJATORUL:



Î.S. „Administrația de Stat a
Drumurilor”

CONTRACTORUL:



S.C. „NOUCONST” S.R.L.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13,

**Contractul 4: LRIP/W4/04: “Drumul L431 Păruceni -
Seliște -Vînători, km 0+000 - km 4+200” și “Drumul de
acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km 3+600”**

Finanțat de către
Asociația Internațională de Dezvoltare (AID)

DOCUMENTE CONTRACTUALE

VOLUMUL 1

Chișinău

Iulie 19, 2019

DOCUMENTUL CONTRACTUAL

Contractul de lucrări Nr. LRIP/W4/04

CUPRINS

VOLUMUL 1

Acord Contractual

Scrisoare de acceptare

Oferta Contractorului

VOLUMUL 2

Condiții Speciale ale Contractului

Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexele

VOLUMUL 3

Specificații Tehnice

VOLUMUL 4

Desene

VOLUMUL 5

Preambul la lista de cantități

Lista de Cantități

VOLUMUL 6

A. Planul de management de mediu și social (PMMS)

B. Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii)

etc

Acord Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi ___ iulie 2019, între **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu adresa juridică: str. Bucuriei, 12A, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Angajator"), pe de o parte, și **SC „NOUCONST” SRL**, cu adresa juridică: str. Petricani, 94, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Contractor"), pe de altă parte:

ÎNTRUCÂT Angajatorul dorește ca **Lucrările de îmbunătățire a Coridorului 13, în cadrul Contractului 4: LRIP/W4/04: „Drumul L431 Păruceni - Seliște - Vinători, km 0+000 - km 4+200” și „Drumul de acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km 3+600”** să fie executate de Contractor și a acceptat Oferta Contractorului pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remediere a oricăror defecte ale acestora,

Angajatorul și Contractorul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
 - (a) Scrisoarea de Acceptare,
 - (b) Oferta Contractorului,
 - (c) Condiții Speciale ale Contractului (CSC),
 - (d) Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexe,
 - (e) Specificații Tehnice,
 - (f) Desene,
 - (g) Lista de cantități,
 - (h) Planul de management de mediu și social (PMMS),
 - (i) Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii) și
 - (j) Orice alt document menționat în CSC ca făcând parte din Contract.
3. În considerarea plăților care trebuie efectuate de către Angajator Contractorului, Contractorul convine cu Angajatorul prin prezentul acord să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în toate privințele și în conformitate cu prevederile Contractului.
4. Angajatorul se obligă să plătească Contractorului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și a remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătitibilă în conformitate cu prevederile Contractului în momentul și în modul prevăzut de Contract.

Drept pentru care Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Semnat de: **Gheorghe CURMEI,**
Director General

Pentru și în numele Angajatorului

în prezența:

Martor:

Numele: *Momcilo Galian*

Adresa: str. Bucuriei 12A, mun. Chisinau, MD
2004, Republica Moldova

Semnat de: **Vadim SCOROBOGATCO,**
Administrator

Pentru și în numele Contractorului

în prezența:

Martor:

Numele: *Odovenco Dorin*

Adresa: str. Petricani 94, mun. Chișinău, MD
2059, Republica Moldova

MC



Î.S."ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”

IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chisinau, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

05.06.2019 nr. 05-11/1633

Către: SC „NOUCONST” SRL
Str. Petricani 94, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2059.
Subiect: Notificare de Adjudecare a Contractului Nr. LRIP/W4/04

Scrisoare de Acceptare

Prin aceasta sunteți informați că Oferta dumneavoastră, datată cu 15 martie 2019, pentru executarea Lucrărilor de îmbunătățire a Coridorului 13, în cadrul Contractului 4: LRIP/W4/04: „Drumul L431 Pâruceni - Seliște - Vinători, km 0+000 - km 4+200” și „Drumul de acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km 3+600” în valoarea totală de 73 073 399,95 MDL (șaptezeci și trei milioane șaptezeci și trei mii trei sute nouăzeci și nouă lei, nouăzeci și cinci bani), este prin prezenta acceptată de către Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Sunteți solicitat să furnizați în termen de 28 de zile:

1. Garanția de bună execuție, în conformitate cu condițiile Contractului, folosind în acest scop Formularul garanției de bună execuție inclus în Secțiunea X – Formulare ale Contractului din Documentele de Licitație.
2. Confirmarea că întreprindeți toate acțiunile necesare în vederea obținerii Asigurărilor, în termenul și suma solicitate, conform prevederilor Condițiilor Contractuale.
3. Confirmarea că personalul esențial propus pentru Contractul LRIP/W4/04 urmează a fi înlocuit cu unul nou (total diferit de cel propus pentru Contractele LRIP/W3/02 și LRIP/W4/03) și va corespunde criteriilor de calificare din tabelul „Personal Esențial” Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare. În acest sens, CV-urile și detaliile despre personalul esențial împreună cu calificările academice și experiența profesională, conform Formularelor relevante din Secțiunea IV – Formulare de Ofertare, urmează a fi prezentate Angajatorului spre aprobare, înainte de semnarea Contractului.
4. Confirmarea că veți întreprinde toate măsurile necesare pentru a vă asigura că progresul lucrărilor din cadrul Contractelor LRIP/W4/03 și LRIP/W4/04 nu va fi afectat într-un mod negativ, dat fiind faptul că echipamentul propus de către dumneavoastră pentru Contractele menționate este același ca și pentru Contractul LRIP/W3/02, care a fost deja semnat cu SC „NOUCONST” SRL. În acest sens, veți asigura disponibilitatea pe șantier a echipamentului solicitat în conformitate cu documentele de licitație, Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare, paragraful 3.6 [Echipament].

În conformitate cu IPO 43.1 din Documentele de Licitație, candidatura lui Samuel BARR, Marea Britanie, propus de Angajator în calitate de Adjudecător este acceptată.

Semnătura autorizată: _____

Numele și funcția semnatarului: Gheorghe CURMEI, Director General

Numele Agenției: Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”

Anexă: Acordul Contractual

Data: 15.03.2019

Nr. LNC: LRIP/W4/01-04 "Drumul L431 Păruceni – Seliste – Vinători km 0+000 – 4+200 și Drum de acces R25 – sat. Seliste, km 0+000 – 3+600"

Invitația de Participare la Licitarea nr.: LRIP/W4/01-04,

Către: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

- (a) Am examinat Documentația de Licitare și nu avem rezerve față de aceasta, inclusiv amendamentele emise în conformitate cu instrucțiunile pentru Ofertanți (IPO 8) _____;
- (b) Înținem cerințele de eligibilitate și nu avem nici un conflict de interese în conformitate cu IPO 4;
- (c) Nu am fost suspendați, nici declarați neeligibili de către Angajator pe baza executării unei Declarații de Garantare a Ofertei în țara Angajatorului, conform IPO 4.6.
- (d) Ne oferim să executăm, în conformitate cu Documentația de Licitare, următoarele Lucrări: "Drumul L431 Păruceni – Seliste – Vinători km 0+000 – 4+200 și Drum de acces R25 – sat. Seliste, km 0+000 – 3+600"
- (e) Prețul total al Ofertei noastre, fără discounturile oferite la punctul (f) de mai jos, este:
În cazul unui singur lot, prețul total al Ofertei: (73 073 269,12 șaptezeci și trei milioane șaptezeci și trei mii două sute șazeci și nouă lei și 12 bani)
În cazul mai multor loturi, prețul total al fiecărui lot *nu este aplicabil*
În cazul mai multor loturi, prețul total al tuturor loturilor (suma loturilor) *nu este aplicabil*
- (f) Discounturile oferite și metodologia pentru aplicarea lor sunt:
- i) Discounturile oferite sunt: nu sunt
- ii) Metoda exactă de calcul pentru stabilirea prețului net după aplicarea discounturilor este prezentată mai jos: nu este aplicabil
- (g) Oferta este valabilă pe o perioadă de 120 (una sută douăzeci) zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertelor conform Documentației de Licitare, și rămâne obligatorie pentru noi, putând fi acceptată de dvs. oricând pînă la expirarea acestei perioade;

- (h) În cazul în care oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obținem garanția de bună execuție conform Documentației de Licitație.
- (i) Nu participăm, ca ofertant sau subcontractor, la mai mult de o ofertă în acest proces de licitație, conform IPO 4.2 (e), alta decât ofertele alternative prezentate conform IPO 13;
- (j) Noi, inclusiv oricare din subcontractorii, furnizorii, consultanții, producătorii, sau prestatorii noștri de servicii pentru oricare parte a Contractului, nu am constituit subiectul, și nefiind controlați de oricare entitate sau persoană care constituie subiectul, al unei suspendări temporare sau descalificări impuse de un membru al Grupului Banca Mondială, sau al unei descalificări impuse de Grupului Banca Mondială, în conformitate cu Acordul reciproc de executare a deciziilor de descalificare între Banca Mondială și alte bănci de dezvoltare. Mai mult ca atât, nu suntem declarați neeligibili în baza legilor sau regulamentelor oficiale din țara Angajatorului sau printr-un act de respectare a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite;
- (k) Nu suntem o entitate deținută de Guvern;
- (l) Am achitat sau vom achita următoarele comisioane, gratuități sau taxe cu privire la procesul de licitație sau la executarea Contractului: NU
- (m) Înțelegem faptul că această ofertă, împreună cu acceptarea de către dvs. în scris a acesteia, inclusă în notificarea de atribuire, va constitui un contract obligatoriu între noi, pînă la întocmirea și semnarea unui contract oficial; și
- (n) Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu prețul cel mai scăzut sau orice ofertă primită.
- (o) Prin prezenta, confirmăm faptul că am luat măsuri pentru a asigura neimplicarea în acte de fraudă sau corupție a vreunei persoane care acționează pentru noi sau în numele nostrum.

Numele ofertantului: S.C. Nouconst S.R.L.

Numele persoanei autorizate să semneze oferta în numele Ofertantului: **Vadim Scorobogateo**

Funcția persoanei care semnează oferta: **administrator;**

Semnătura persoanei numite mai sus: _____

Data semnării: 15.03.2019



Republica Moldova
Ministerul Economiei și Infrastructurii
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Proiectul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale

ANGAJATORUL:



**Î.S. „Administrația de Stat a
Drumurilor”**

CONTRACTORUL:



S.C. „NOUCONST” S.R.L.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13,

Contractul 3: LRIP/W4/03: "Drumul L390 Pîrlița- Nisporeni, km 23+400 – km 32+942"

Finanțat de către
Asociația Internațională de Dezvoltare (AID)

DOCUMENTE CONTRACTUALE

VOLUMUL 1

Chișinău

Iulie 12, 2019

DOCUMENTUL CONTRACTUAL

Contractul de lucrări Nr. LRIP/W4/03

CUPRINS

VOLUMUL 1

Acord Contractual

Scrisoare de acceptare

Oferta Contractorului

VOLUMUL 2

Condiții Speciale ale Contractului

Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexele

VOLUMUL 3

Specificații Tehnice

VOLUMUL 4

Desene

VOLUMUL 5

Preambul la lista de cantități

Lista de Cantități

VOLUMUL 6

A. Planul de management de mediu și social (PMMS)

B. Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii)

M.A.

Acord Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 12 iulie 2019, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu adresa juridică: str. Bucureiei, 12A, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Angajator"), pe de o parte, și **SC „NOUCONST” SRL**, cu adresa juridică: str. Petricani, 94, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Contractor"), pe de altă parte:

ÎNTRUCĂT Angajatorul dorește ca **Lucrările de îmbunătățire a Coridorului 13, în cadrul Contractului 3: LRIP/W4/03: „Drumul L390 Pîrlița-Nisporeni, km 23+400 – km 32+942”** să fie executate de Contractor și a acceptat Oferta Contractorului pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remediere a oricăror defecte ale acestora,

Angajatorul și Contractorul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
 - (a) Scrisoarea de Acceptare,
 - (b) Oferta Contractorului,
 - (c) Condiții Speciale ale Contractului (CSC),
 - (d) Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexe,
 - (e) Specificații Tehnice,
 - (f) Desene,
 - (g) Lista de cantități,
 - (h) Planul de management de mediu și social (PMMS),
 - (i) Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii) și
 - (j) Orice alt document menționat în CSC ca făcând parte din Contract.
3. În considerarea plăților care trebuie efectuate de către Angajator Contractorului, Contractorul convine cu Angajatorul prin prezentul acord să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în toate privințele și în conformitate cu prevederile Contractului.
4. Angajatorul se obligă să plătească Contractorului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și a remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătitibilă în conformitate cu prevederile Contractului în momentul și în modul prevăzut de Contract.

N.A.

Drept pentru care Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Semnat de: **Gheorghe CURMEI,**
Director General

Semnat de: **Vadim SCOROBOGATCO,**
Administrator

Pentru și în numele Angajatorului

Pentru și în numele Contractorului

în prezența:

în prezența:

Martor:

Martor:

Numele: *Mornealo*

Numele: *Odarehed Dorin*

Adresa: str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău, MD
2004, Republica Moldova

Adresa: str. Petricani 94, mun. Chișinău, MD
2059, Republica Moldova



N.A.



Î.S. "ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
S.E. "STATE ROAD ADMINISTRATION"

IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chișinău, str. Bucurei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

05.06.2019 nr. 05-11/1632

Către: SC „NOUCONST” SRL
Str. Petricani 94, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2059.

Subiect: Notificare de Adjudecare a Contractului Nr. LRIP/W4/03

Scrisoare de Acceptare

Prin aceasta sunteți informați că Oferta dumneavoastră, datată cu 15 martie 2019, pentru executarea Lucrărilor de îmbunătățire a Coridorului 13, în cadrul Contractului 3: LRIP/W4/03: „Drumul L390 Pîrlița-Nisporeni, km 23+400 – km 32+942” în valoarea totală de **70 974 287,83 MDL (șaptezeci milioane nouă sute șaptezeci și patru mii două sute optzeci și șapte lei, optzeci și trei bani)**, este prin prezenta acceptată de către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Sunteți solicitat să furnizați în termen de 28 de zile:

1. Garanția de bună execuție, în conformitate cu condițiile Contractului, folosind în acest scop Formularul garanției de bună execuție inclus în Secțiunea X – Formulare ale Contractului din Documentele de Licitație.
2. Confirmarea că întreprindeți toate acțiunile necesare în vederea obținerii Asigurărilor, în termenul și suma solicitate, conform prevederilor Condițiilor Contractuale.
3. Confirmarea că personalul esențial propus pentru Contractul LRIP/W4/03 urmează a fi înlocuit cu unul nou (total diferit de cel propus pentru Contractele LRIP/W3/02 și LRIP/W4/04) și va corespunde criteriilor de calificare din tabelul „Personal Esențial” Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare. În acest sens, CV-urile și detaliile despre personalul esențial împreună cu calificările academice și experiența profesională, conform Formularelor relevante din Secțiunea IV – Formulare de Ofertare, urmează a fi prezentate Angajatorului spre aprobare, înainte de semnarea Contractului.
4. Confirmarea că veți întreprinde toate măsurile necesare pentru a vă asigura că progresul lucrărilor din cadrul Contractelor LRIP/W4/03 și LRIP/W4/04 nu va fi afectat într-un mod negativ, dat fiind faptul că echipamentul propus de către dumneavoastră pentru Contractele menționate este același ca și pentru Contractul LRIP/W3/02, care a fost deja semnat cu SC „NOUCONST” SRL. În acest sens, veți asigura disponibilitatea pe șantier a echipamentului solicitat în conformitate cu documentele de licitație, Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare, paragraful 3.6 [Echipament].

În conformitate cu IPO 43.1 din Documentele de Licitație, candidatura lui Samuel BARR, Marea Britanie, propus de Angajator în calitate de Adjudecător este acceptată.

Semnătura autorizată: _____

Numele și funcția semnatarului: **Gheorghe CURMEL**, Director General

Numele Agenției: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Anexă: Acordul Contractual

N.A.

Data: 15.03.2019

Nr. LNC: LRIP/W4/01-03 "Drum L390 Pîrlita – Nisporeni km 23+400 – km 32+942"

Invitația de Participare la Licitația nr.: LRIP/W4/01-4,

Către: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

- (a) Am examinat Documentația de Licitație și nu avem rezerve față de aceasta, inclusiv amendamentele emise în conformitate cu instrucțiunile pentru Ofertanți (IPO 8) _____;
- (b) Întrunim cerințele de eligibilitate și nu avem nici un conflict de interese în conformitate cu IPO 4;
- (c) Nu am fost suspendați, nici declarați neeligibili de către Angajator pe baza executării unei Declarații de Garantare a Ofertei în țara Angajatorului, conform IPO 4.6.
- (d) Ne oferim să executăm, în conformitate cu Documentația de Licitație, următoarele Lucrări:
"Drumul L390 Pîrlita – Nisporeni. km 23+400 – km 32+942";
- (e) Prețul total al Ofertei noastre, fără discounturile oferite la punctul (f) de mai jos, este:
În cazul unui singur lot, prețul total al Ofertei: **(70 974 287,83 șaptezeci milioane nouă sute șaptezeci și patru mii două sute optzeci și șapte lei și 83 bani)**
În cazul mai multor loturi, prețul total al fiecărui lot **nu este aplicabil**
În cazul mai multor loturi, prețul total al tuturor loturilor (suma loturilor) **nu este aplicabil**
- (f) Discounturile oferite și metodologia pentru aplicarea lor sunt:
- i) Discounturile oferite sunt: nu sunt
- ii) Metoda exacta de calcul pentru stabilirea prețului net după aplicarea discounturilor este prezentată mai jos: nu este aplicabil
- (g) Oferta este valabilă pe o perioadă de **120 (una sută douăzeci) zile calendaristice** de la data limită de depunere a ofertelor conform Documentației de Licitație, și rămâne obligatorie pentru noi, putînd fi acceptată de dvs. oricînd pînă la expirarea acestei perioade;
- (h) În cazul în care oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obținem garanția de bună execuție conform Documentației de Licitație.

SC „Nouconst” SRL, mun. Chișinău, str. Petricani, 94, tel/fax 0-22-788800
cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. fil. 10 Chisinau
SWIFT: AGRNMD2X, IBAN lei: MD68AG000000002251679079

N.A.







- (i) Nu participăm, ca ofertant sau subcontractor, la mai mult de o ofertă în acest proces de licitație, conform IPO 4.2 (e), alta decât ofertele alternative prezentate conform IPO 13;
- (j) Noi, inclusiv oricare din subcontractorii, furnizorii, consultanții, producătorii, sau prestatorii noștri de servicii pentru oricare parte a Contractului, nu am constituit subiectul, și nefiind controlați de oricare entitate sau persoană care constituie subiectul, al unei suspendări temporare sau descalificări impuse de un membru al Grupului Banca Mondială, sau al unei descalificări impuse de Grupului Banca Mondială, în conformitate cu Acordul reciproc de executare a deciziilor de disqualificare între Banca Mondială și alte bănci de dezvoltare. Mai mult ca atât, nu suntem declarați neeligibili în baza legilor sau regulamentelor oficiale din țara Angajatorului sau printr-un act de respectare a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite;
- (k) Nu suntem o entitate deținută de Guvern;
- (l) Am achitat sau vom achita următoarele comisioane, gratuități sau taxe cu privire la procesul de licitație sau la executarea Contractului: NU
- (m) Înțelegem faptul că această ofertă, împreună cu acceptarea de către dvs. în scris a acesteia, inclusă în notificarea de atribuire, va constitui un contract obligatoriu între noi, până la întocmirea și semnarea unui contract oficial; și
- (n) Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu prețul cel mai scăzut sau orice ofertă primită.
- (o) Prin prezenta, confirmăm faptul că am luat măsuri pentru a asigura neimplicarea în acte de fraudă sau corupție a vreunei persoane care acționează pentru noi sau în numele nostrum.

Numele ofertantului: S.C. Nouconst S.R.L.

Numele persoanei autorizate să semneze oferta în numele Ofertantului: **Vadim Scorobogenco**

Funcția persoanei care semnează oferta: **administrator;**

Semnătura persoanei numite mai sus: _____

Data semnării: 15.03.2019





PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 71 din 28 decembrie 2020

Privind „*Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 "Drumul L390 Pirlita-Nisporeni, km 23+400 - km 32+942"*, executat în cadrul contractului: nr. LRIP/W4/03 din 12.07.2019, încheiate între *Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor*” beneficiar și *Nouconst S.R.L., (Moldova), antreprenor.*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 24.07.2019 eliberată de Consiliul Raional Nisporeni.
2. Comisia de recepție desemnată de *Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”* prin ordinul nr. 285 din 18 decembrie 2020 și-a desfășurat activitatea astăzi 22 decembrie 2020

- a) Președinte: I. Mornealo - director adjunct, *Î.S. „ASD”*
- b) membri
- Iu. Pașa - director adjunct, *Î.S. „ASD”*
 - R. Rogovei - șef direcție infrastructura de transport, MEI
 - P. Triboi - șef direcție întreținere drumuri și poduri, *Î.S. „ASD”*
 - A. Rogai - șef secție management ingineresc
 - V. Ivanov - auditor intern al aparatului Președintelui Raionului Nisporeni
 - S. Marian - ofițer sistematizarea circulației rutiere al SST și AR al IP Nisporeni
 - S. Caunov - director, S.A. „Drumuri – Ialoveni”
 - T. Vasilache - șef, S.A. „Drumuri – Ialoveni” district Nisporeni

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- A. Ursu - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor ”Tecnic Hill Sweroad ”
- V. Scorobogatco - executant, ”Nouconst S.R.L.”
- A. Efros - proiectant S.R.L. ”Universinj”
- A. Rogut - responsabil tehnic, ” Tecnic Hill Sweroad”

4. Comisia de recepție a constatat că:

Lucrările au fost executate conform proiectului și documentației tehnice.

- a) Lucrările de construcție au fost executate de către *“Nouconst S.R.L.”*
- b) Documentația de proiect a fost elaborată de către *“Universinj S.R.L.”*
- c) Lucrările de construcție – montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor – **iulie 2019**, sfârșitul lucrărilor – **decembrie 2020**.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a) Situația lucrărilor executate – *cartea tehnică*;
- b) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în anexa 1;
- c) Situația lucrărilor care nu au fost executate (Anexa 2);
- d) Lista lucrărilor neconforme (Anexa 3).

1. 6. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a) Situația lucrărilor executate – *cartea tehnică*;
- b) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în anexa 1;
- c) Situația lucrărilor care nu au fost executate (Anexa 2);
- d) Lista lucrărilor neconforme (Anexa 3).

6. Reabilitarea drumului L 390 Pârlița - Nisporeni km 23+400 - km 32+942, are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului: 9.542 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 6,0 m (2x3,0m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x1,5 m (0,5m piatră spartă + 1,0m consolidare cu iarbă);

Construcția sistemului rutier:

- strat de uzura din beton asfaltic SMBg-II, $h = 40 \text{ mm}$; 60773 m^2
- strat de binder din beton asfaltic poros SKPg-II $h = 60 \text{ mm}$; 60773 m^2
- reciclat la rece tip A = 80 mm; 44906 m^2
- strat de fundatie de piatra sparta $h = 240 \text{ mm}$; 12370 m^2
- strat de fundatie de piatra sparta $h = 290 \text{ mm}$; 3524 m^2
- strat inferior de fundație din balast $h = 150 \text{ mm}$; 2490 m^3

Podete acces laterale – Ø 800 mm – km 27+726; km 27+952; km 28+864; km 29+085; km 29+572; km 29+896; km30+562.

Podete tubulare: km 27+885 – Ø1,50 m; km 29+618 Ø1,20m; km 29+756 Ø1,20m; km 30+405 Ø1,00m; km 30+980 Ø1,00m; km 31+561 Ø1,00m; km 31+869 Ø1,00m; km 32+048 Ø1,00m.

Rigole: 1152 ml.

Pavilioane de așteptare pentru pasageri – 1 buc.

Securitatea circulației rutiere: Indicatoare rutiere 177 buc, stilpi de dirijare 592 buc, parapet de protecție – 530 m.l.,

Marcaje rutiere – 3250 m. p.

Construcția trotuarelor: 6942 m.p.

7. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la construcția drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită parțial/complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Construcția dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

8. Comisia de recepție recomandă următoarele: Prezența la terminarea a lucrărilor.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi 22 decembrie 2020 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte I. Mornealo

membri: Iu. Pașa

R. Rogovei

P. Triboi

A. Rogai

V. Ivanov

S. Marian

S. Caunov

T. Vasilache

invitați:

V. Scorobogatco

A. Efros

A. Rogut



10. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea se recomandă spre recepție la terminarea lucrărilor
cu îndeplinirea prevederilor Anexelor nr. 2 și 3.

[Signature]

2021
2020



Caraciu Alexandru, AST
(numele, prenumele, funcția)

11. Lucrarea privind lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 "Drumul L390 Pirlita-Nisporeni, km 23+400 - km 32+942", în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică _____.

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL
„Noucomst S.R.L.”

[Signature]
2020
V. Scorobogatco



PRIMITĂ - INVESTITORUL
"Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

[Signature]
2020
I. Mornealo



Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Nu este.

- Președinte  I. Mornealo
- membri:  Iu. Pașa
-  R. Rogovei
-  P. Triboi
-  A. Rogai
-  V. Ivanov
-  S. Marian
-  S. Caunov
-  T. Vasilache

- invitați:  A. Ursu
-  V. Scorobogaticu
-  A. Efros
-  A. Rogut



Situația lucrărilor care nu au fost executate

Descriere articol	U.M.	PU	Cantitate	Valoare (Euro)
1) Lucrări de înălțare taluză				
2) Birouri de evacuare a apelor partea dreaptă la km 92+900 - km 92+940				

Președinte _____ I. Mornealo
 membri: _____ Iu. Pașa
 _____ R. Rogovei
 _____ P. Triboi
 _____ A. Rogai
 _____ V. Ivanov
 _____ S. Marian
 _____ S. Caunov
 _____ T. Vasilache



invitați: _____ A. Ursu
 _____ V. Scorobogatco
 _____ A. Efros
 _____ A. Rogut



Lista lucrărilor neconforme

Nr d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	Km 26+720 (ds) - De finalizat amenajarea stației auto
2	Km 26+920 (ds) De reamenajat depozitul timporare
3	Km 32+700 - 32+842 (ds) - Bigak de marcare pe scut și reșet De clasificat cu documentație tehnică
4	Km 30+100 - km 30+800 (st) - De finalizat amenajarea și producția vegetală pe taluzuri
5	De urmasit mersajul rutier în perioada de garantație și de restabilit la necesitate
6)	Monitorizarea de laborator a parametrilor de mediu în perioada de garanție
7)	De reamenajat piesele marginale a parapetului de siguranță și de înglobat în procedură
8	De asigurat accesul persoanelor cu disabili- tăți la traficare.
9	De instalat semne de circulație rutieră ce lipsesc la Km 26+304 (6.3.11); Km 27+860 (1.14.21); Km 30+275 (1.7.31); Km 30+545 (1.7.2); Km 26+600 (6.3.1)

Președinte I. Mornealo

membri: Iu. Pașa
 R. Rogovei
 P. Triboi
 A. Rogai
 V. Ivanov
 S. Marian
 S. Caunov
 T. Vasilache

invitați: A. Ursu
 V. Scorobogatco
 A. Efros
 A. Rogut





PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 72 din 28.12 2020

Privind ,, *Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 " Drumul L431 Paruceni –Seliște -Vinatori, km 0+000 - km 4+200" și "Drumul de acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km 3+600"*, executat în cadrul contractului: nr. LRIP/W4/04 din 19.07.2019, încheiate între Î.S. *Administrația de Stat a Drumurilor*", beneficiar și *Nouconst S.R.L., (Moldova), antreprenor.*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 24.07.2019 eliberată de Consiliul Raional Nisporeni.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 286 din 18.12. 2020 și-a desfășurat activitatea astăzi 28 decembrie 2020 2020 fiind formată din:

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| a) Președinte: | I. Mornealo | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b) membri | Iu. Pașa | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| | R. Rogovei | - șef direcție infrastructura de transport, MEI |
| | P. Triboi | - șef direcție întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD” |
| | A. Rogai | - șef secție management ingineresc Î.S. „ASD” |
| | V. Ivanov | - auditor intern al aparatului Președintelui Raionului Nisporeni |
| | S. Marian | - ofițer sistematizarea circulației rutiere al SST și AR al IP Nisporeni |
| | S. Caunov | - director, S.A. „Drumuri – Ialoveni” |
| | T. Vasilache | - șef, S.A. „Drumuri – Ialoveni” district Nisporeni |

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- | | |
|-----------------|--|
| A. Ursu | - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor "Tehnic Hill Sweroad " |
| V. Scorobogatco | - executant, "Nouconst S.R.L." |
| A. Efros | - proiectant S.R.L. "Universinij" |
| A. Rogut | - responsabil tehnic, "Tehnic Hill Sweroad" |

4. Comisia de recepție a constatat că

Lucrările au fost executate conform proiectului și documentației tehnice

- a) Lucrările de construcție au fost executate de către "Nouconst S.R.L."
- b) Documentația de proiect a fost elaborată de către "Universinij S.R.L."
- c) Lucrările de construcție – montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor – **iulie 2019**, sfârșitul lucrărilor – **decembrie 2020**.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a) Situația lucrărilor executate – *cartea tehnică*;
- b) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în anexa 1;
- c) Situația lucrărilor care nu au fost executate (Anexa 2);
- d) Lista lucrărilor neconforme (Anexa 3).

6. Reabilitarea drumului L431 Păruceni – Seliște - Vânători, km 0+000-km 4+200 (sector 4a) și Drum de acces R 25 - s. Seliște, km 0+000-km 3+600 (sector 4b), are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului: 7,970km;
- b) Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 6,0 m (2x3,0m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x1,5 m (0,5m piatră spartă + 1,0m consolidare cu iarbă);

Construcția sistemului rutier:

- strat de uzura din beton asfaltic SMBg-II, $h = 40 \text{ mm}$; = 51765 m^2
- strat de binder din beton asfaltic poros SKPg-II $h = 60 \text{ mm}$; = 51765 m^2
- reciclat la rece tip A = 80 mm ; = 33400 m^2
- strat de fundatie de piatra sparta $h = 240 \text{ mm}$; = 8205 m^2
- strat de fundatie de piatra sparta $h = 290 \text{ mm}$; 4730 m^2
- strat inferior de fundație din balast $h = 150 \text{ mm}$; 2535 m^3

Pod km 0+135 (sector 4a): Lungimea suprastructurii L – 9,44 m, lățimea B – 10,86 m.

Podețe accese laterale – Ø 800 mm Sector 4a. – km 0+184, 0+612, 0+873; sector 4b km 0+846;.

Podețe tubulare: sector 4a km 1+547 – Ø1,20 m; km 2+428 Ø2x2m. sector 4b: km 0+542 Ø1,00m; km 0+678 Ø1,00m; km 1+501 Ø1,20m; km 1+619 Ø1,0m; km 2+290 Ø1,0m; km 2+695 Ø1,0m; km 2+804 Ø1,0m; km 3+038 Ø1,5m; km 3+219 Ø1,0m; km 3+219 Ø1,0m; km 3+320 Ø2x2.5m.

Rigole: sector 4a - 400 ml

Securitatea circulației rutiere:

Indicatoare rutiere: 853 buc,

parapet de protecție – 460 m.l.,

marcaje rutiere – 2512 m. p.

Construcția trotuarelor: 9283 m.p.

7. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la construcția drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită parțial/complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Construcția dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.
8. Comisia de recepție recomandă următoarele: admiterea cu / fără obiecții a recepției.
9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi 22.12. 2020 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte I. Mornealo

membri: Iu. Pașa

R. Rogovei

P. Triboi

A. Rogai

V. Ivanov

S. Marian

S. Caunov

T. Vasilache

invitați:

A. Ursu

V. Scorobogatco

A. Efros

A. Rogut



10. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea se recomandă spre recepție la terminarea lucrărilor
cu condiția înlăturării neconformităților din Anexa nr. 3



Caracemian Alexandru, AST
(numele, prenumele, funcția)

11. Lucrarea privind lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 " Drumul L431 Paruceni –Seliște - Vînatori, km 0+000 - km 4+200" și "Drumul de acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km 3+600, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL
„ Nouconst S.R.L. ”

V. Scorobogatco 2020

PRIMITĂ – INVESTITORUL
Î.S. „ Administrația de Stat a Drumurilor ”

D. Mornealo 2020

Din documentația scrisă și desenată lipsește


Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Du ate

Președinte  I. Mornealo

membri:  Iu. Pașa

 R. Rogovei

 P. Triboi

 A. Rogai

 V. Ivanov

 S. Marian

 S. Caunov

 T. Vasilache

invitați:  A. Ursu

 V. Scorobogatco

 A. Efros

 A. Rogut



Situația lucrărilor care nu au fost executate

	Descriere articol	U.M.	PU	Cantitate	Valoare (Euro)
1.	Seal 4a - 0+000 - l+700, Seal 4b 0+000 - l+600 - înșăurătorul cu Farbă				

Președinte *I.Mornealo* I.Mornealo
 membri: *Iu. Pașa* Iu. Pașa
R. Rogovei R. Rogovei
P. Triboi P. Triboi
A. Rogai A. Rogai
V. Ivanov V. Ivanov
S. Marian S. Marian
S. Caunov S. Caunov
T. Vasilache T. Vasilache

invitați: *A. Ursu* A. Ursu
V. Scorobogato V. Scorobogato
A. Efros A. Efros
A. Rogut A. Rogut



Lista lucrărilor neconforme

Nr d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	Sect. 4.b. km 0+548 - de colmatat resturile de lucru la reparația podetului
2.	Sect. 4.b. km 1+501 - de reamenajat tasarea carosabilului
3.	Sect. 4.b. km 3+320 - de finalizat umplerea cu hământ în șanțurile heretului dispozitivului în aval.
4.	Sect 4.a. - de finalizat completarea cu hământ vegetal pe taluzuri inclusiv însămânțarea cu iarba.
5.	Sect 4.a - km 0+135 - amenajarea abis podetului - de finalizat.
6.	Sect 4.a km - 1+547 (dreapta) - de restabilit tasarea sistemului rutier
7.	Sect. 4.a km 2+400 - de verificat planșetate și de remediat la necesitate.
8.	De urmărit marcajul rutier în perioada de garanție și de restabilit la necesitate.
9.	De asigurată monitorizarea de laborator a parametrilor de mediu pe perioade de garanție.
10.	De reamenajat pantele marginale și parapetului de siguranță (de înglobat în terasament)
11.	De asigurată accesul hermanelor cu durabilitate la trotuare (la necesitate).
12.	De instalat ambele linii la: km 0+455 (b. s. d); km 0+050 (b. l. s) km 2+740 (l. 20)

Președinte I. Mornealo
 membri: Iu. Pașa
 R. Rogovei
 P. Triboi
 A. Rogai
 V. Ivanov
 S. Marian
 S. Caunov
 T. Vasilache

invitați:

A. Ursu
 V. Scorobogatco
 A. Efros
 A. Rogut





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/139 privind achiziția prin licitație deschisă

03 iunie 2021

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1618904451298** din **13.05.2021**, între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl.Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.C.,„Nouconst” S.R.L.** cu sediul în mun. Chişinău, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1005600012120, reprezentată de administratorul dl Vadim Scorobogateo, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chişinău**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **30 septembrie 2021**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua în 2 etape conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită apartinței impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării. Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **12 595 841,54 (douăsprezece milioane cinci sute nouăzeci și cinci mii opt sute patruzeci și unu lei, 54 bani) inclusiv TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 20 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta ajustarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează, se execută în subantrepriză, dar nu mai mult de 40% din valoarea ofertei, Antreprenorul general trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor contractați și/sau implicați în executarea lucrărilor și lucrările pe care aceștia le vor executa, cu indicarea denumirilor, datelor de contact și a reprezentanților legali ai acestora.

- 5.3. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 5.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualei noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.
- 5.4. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.
- 5.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare.
- 6.2. Documentația de executare va fi repartizată astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) celălalt va fi prezentat altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.3. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor, proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în construcții în vigoare. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea, în condițiile prevederilor regulilor tehnice sanitare și de siguranță.
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția ultimului de către Antreprenorul general.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea/finalizarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor aprobați de Beneficiar, de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.
- 6.10. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

- 6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 15% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.12 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p. 6.11, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.13 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după recepția lucrărilor finalizate.
- 6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție a lucrărilor, în cel mult: 15 zile de la data semnării procesului verbal la recepția lucrărilor finalizate. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.15 Antreprenorul general garantează că, la data recepției lucrărilor finalizate, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii.
- 6.16 La lucrările la care se fac încercări la laboratoarele acreditate în mod corespunzător, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.17 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în atelier, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.19 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.21 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.22 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și/sau inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.23 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii contractați și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către aceștia a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.

6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.27 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.28 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
8. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
9. Lucrările vor începe după semnarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului contract este de **I (unu)** an.
- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției lucrărilor finalizate și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, proiectului de execuție și/sau caietului de sarcini, pe cheltuielă proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții/reconstrucție/întreținere se produce o daună unui terț, părțile port răspundere conform prevederilor legale. Pentru stabilirea a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața, potrivit normelor tehnice prestabilite.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului.

- 10.10 Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, potrivit graficului de execuție anexat la prezentul Contract, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract.
- 10.11 În cazul în care întârzierea depășește 50 zile de întârziere, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună execuție a contractului.
- 10.12 Pentru achitarea cu întârziere. Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 10.13 Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.
- 10.14 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a angajaților acestora.
- 10.15 Antreprenorul general și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție acreditată de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.
- 11.2 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asigurătorii;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările, în termenul indicat în dispoziția scrisă de reîncepere a lucrărilor.
 - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a rețăcut o lucrare în termenul stabilit de Beneficiar.
 - contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 a legii 131/2015.
 - Antreprenorul general întârziează execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.10.
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate, în maximum 15 zile calculate din data rezoluționării contractului.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Ambouarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Proiectul de execuție;
 - c) Propunerea tehnică;
 - d) Oferta financiară;
 - e) Graficul de execuție a lucrărilor;
 - f) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimii semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Prin confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrării.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

SA „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2064-c, Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

tel: 022209923559

IBAN MD2713POCC518430A00891AA

Mecanism Financiar - Trezoreria de Stat

NO-22/Conto-bugetal de stat

c/TVA 0605333

Director general interimar

Vasile POPOT



„Antreprenor general”

S.C. „Nouconst” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Petricani 94

c/f 1005600012120

c/IBAN MD20ML000000022512123039

BC'Moldindconbank'S.A., fil.'Renastere'

Chisinau, BIC:MOLDMD2X312

c/TVA 0605333

Administrator

Vadim SCOROBOGATCO



GRAFIC DE EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău

Nr. dr.	Grupa de obiecte / denumirea proiectului	Tronșonul / Localitate	anul 2021				
			Luna - Săptămâna				
			Iunie	Iulie	August	Septembrie	
Etapă I							
1	M1 Frontiera cu România - Leuseni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 122.80 - 123.80 (selectiv)	raionul Criuleni	50%	50%			
2	R5 MS - Vadul lui Vodă - M4, km 0.00 - 1.10 (selectiv)		50%	50%			
3	G 72 R6 - Branesti - Criuleni, km 33.05 - 34.05 (1000 m.l.)						
4	G68 Orhei - Sasleu - Usti - Criuleni, km 43.50 - 44.50 (1000m.l.)	raionul Dubăsari			100%		
5	M1 fi. cu România - Leuseni - Chișinău - Dubăsari - fi. cu Ucraina 89.00 - 90.00 (500 m.l.)	mun. Chișinău			100%		
6	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 267.00 - 267.40 (400 m.l.)		(regimul de salubritate) - Finisare, (plombare, decapan)			100%	
7	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 268.00 - 268.30 (300 m.l.)		50%	50%			
8	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 270.00 - 270.60 (600 m.l.)				100%		
9	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 272.10 - 272.40 (300 m.l.)				50%	50%	
10	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 274.30 - 274.50 (200 m.l.)					100%	
11	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 276.20 - 277.70 (selectiv)					100%	
12	M1 Frontiera cu România - Leuseni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 122.80 - 123.80 (selectiv)					100%	
Etapă II							
13	R5 MS - Vadul lui Vodă - M4, km 0.00 - 1.10 (selectiv)		raionul Criuleni	20%	60%	20%	
14	G 72 R6 - Branesti - Criuleni, km 33.05 - 34.05 (1000 m.l.)			50%	50%		
15	G68 Orhei - Sasleu - Usti - Criuleni, km 43.50 - 44.50 (1000m.l.)	raionul Dubăsari			100%		
16	M1 fi. cu România - Leuseni - Chișinău - Dubăsari - fi. cu Ucraina 89.00 - 90.00 (500 m.l.)	mun. Chișinău			100%		
17	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 267.00 - 267.40 (400 m.l.)		(Lucrări de aplicare a stratului de beton asfaltic, pentru ștergere)	30%	70%		
18	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 268.00 - 268.30 (300 m.l.)		60%	40%			
19	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 270.00 - 270.60 (600 m.l.)				80%	20%	
20	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 272.10 - 272.40 (300 m.l.)				90%	10%	
21	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 274.30 - 274.50 (200 m.l.)				100%	10%	
22	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 276.20 - 277.70 (selectiv)					100%	
23	M1 Frontiera cu România - Leuseni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 122.80 - 123.80 (selectiv)					100%	

Nume: Scorobogato Vadim
 Funcție în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei: SC "Noucent" SRL

Digitally signed by Scorobogato Vadim
 Date: 2021.05.24 16:05:59 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova





PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 117 din 30 noiembrie 2021

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău, executate în cadrul contractului nr.06-14/139 din 04.06.2021, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Nouconst” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr.160 din 10 noiembrie 2021 și-a desfășurat activitatea în perioada 29-30 noiembrie 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte: *I.Druceș* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) Vicepreședinte: *P.Triboi* - *șef, direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD”*
- c.) membri:
- Gh.Tonu* - *consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
 - S.Godiac* - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*
 - A.Iazinschii* - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*
 - V.Beresteanu* - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*
 - A.Popov* - *director S.A. „Drumuri Criuleni”*
 - Ș.Montaluta* - *S.A. „Drumuri Criuleni” sector Criuleni*
 - V.Buzu* - *S.A. „Drumuri Criuleni” sector Chișinău*
 - V.Zinenco* - *S.A. „Drumuri Criuleni” sector Dubăsari*
 - V.Scorobogatco* - *director, S.R.L. „Nouconst”*
 - V.Chioru* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la întreținerea periodică a drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.R.L. „Nouconst”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iunie 2021* sfârșitul lucrărilor *octombrie 2021*

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv *cheltuielile beneficiarului constituie – 12 951 844, 31 lei, inclusiv LCM – 12 595 840, 80 lei.*
4. *Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de – 12 478 350, 01 lei, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.*
5. *Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi marți
30 noiembrie 2021 în 6 exemplare.*

Anexe: 1. Situația neconformităților depistate de comisia de recepție.
2. Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor

Comisia:

Președinte: I. Drucec

Vicepreședinte: P. Triboi

Membri: Gh. Tonu

S. Godiac

A. Iazinschii

V. Berescanu

S. Montaluț

V. Buzu

V. Zimțico

Sporobogalco

V. Cioba



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 117 din 30 noiembrie 2021

SITUAȚIA

neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate la obiectul:
Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău.

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
	Fară obiectii

Comisia:

Președinte: I. Drucec

Vicepreședinte: P. Triboi

Membri: Gh. Tonu

S. Godiac

A. Iazinschii

V. Beresteanu

P. Popov

Ș. Montaluța

V. Buzu

Anenco

Seorobogatch

Chior





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 3/01

privind achiziția prin Licitație deschisă

“24” iunie 2021

mun. Strășeni

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică organizată prin Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1620722164445 din 27.05.2021 privind achiziționarea: „Lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021”, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, telefon/fax: 0(237) 2 36 30, cod fiscal: 1017601000161, reprezentat prin președintele raionului Strășeni, d-nul Pavel TAMACIUC, care acționează în baza Legii nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SC „NOUCONST” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, 94, cod fiscal: 1005600012120, tel: 022788800, e-mail: dorin.odovenco@nouconst.md, reprezentat prin administratorul dl Vadim SCOROBOGATCO, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lotul 1, Lucrările de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **90 de zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului. Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **6 426 243,94 lei MD**, (*Șase milioane patru sute douăzeci și șase de mii două sute patru zeci și trei, 94 bani, inclusiv TVA 1071040,66 lei.*)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în limitele alocărilor bugetare anuale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările

pe care aceștia le vor executa.

- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor. Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general după semnarea contractului atribuit, în timp de cinci zile lucrătoare, prezintă Beneficiarului contractul-garanție de bună executare a lucrărilor (Cont Bancar de Depozit – Garanție), încheat cu banca unde se deservește „Antreprenorul”, pentru depunerea garanției de bună executare a contractului atribuit în cuantum de 10% prin rețineri succesive din plățile facturilor din valoarea contractului.
- 6.11 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.12 Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării scrise de Beneficiar către agentul bancar, care se va face după finalizarea contractului, semnarea

- procesului-verbal de recepție finală și predare către Beneficiar a certificatului de garanție pentru lucrările executate.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
 - 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
 - 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
 - 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
 - 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
 - 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
 - 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
 - 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
 - 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
 - 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
 - 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
 - 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
 - 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 6.26 În timpul deslășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiș și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului contract este de 36 luni calendaristice.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNE

12.1 Antreprenorul general poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a rezoluționat contractul.

12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.


13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 15.12.2021

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Autoritatea contractantă/ Beneficiar	Antreprenorul
Aparatul Președintelui raionului Strășeni	SC „NOUCONST” SRL
Președintele raionului Pavel TAMACIUC	Administratorul Vadim SCOROBOGATCO
Adresa poștală: or. Strășeni, str. M. Eminescu 28 Telefon: 0237 2-36-30 e-mail: consiliulraional@crstraseni.md Cod IBAN: MD40TRPDAU312120G15745AB Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin 33 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1017601000161	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Petricani 94 tel/mob: 022788800; 068146700 e-mail: dorin.odovenco@nouconst.md Adresa poștală a băncii: BC Moldindconbank'S.A. fil 'Renastere' Chisinau Cod bancar: MOLDMD2X312 <i>HC RN MD2X 41</i> Cont IBAN: MD20ML000000022512123039 Cod TVA: 0605333 Cod fiscal: 1005600012120
Semnătura 	Semnătura 

MD 32 HC 0000000225121 70316

Serviciul juridic


PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.01/RT din 10 februarie 2022

privind lucrarea **„Lotul 1, Lucrări de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021”** este executat în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 3/01 din 24 iunie 2021 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni și SC „NOUCONST” SRL.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10 februarie 2022, conform DISPOZIȚIEI Nr. 9 din 28 ianuarie 2022 fiind formată din:

CROITOR Vladislav - vicepreședinte al raionului, președintele comisiei
SÎRBU Nicolae - șef al Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor din cadrul Direcției economie și infrastructură
GUȚAN Gheorghe - responsabil tehnic
RUSU Gheorghe - șef sector al districtului Strășeni, SA, „Drumuri Strășeni”

2. Au mai participat la recepție:

CRĂCIUN Igor - primar al satului Cojușna
BUTNARU Rodica - primar al comunei Micleușeni
SCHIRLIU Alexandru - primar al satului Negrești
DÎMCENCO Mariana - primar al or. Bucovăț
TĂBĂCARI Svetlana - primar al satului Scoreni
CASIAN Valentina - primar al municipiului Strășeni
MANOLI Maria - primar al satului Zubrești
SCORABOGATCO Vadim - Administrator SC, „NOUCONST” SRL

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: _____

de recepționat lucrările

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Lucrările au fost executate calitativ în termeni contractați cu respectarea documentației de execuție și a actelor normative în vigoare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: _____

Recepționarea lucrărilor executate

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală r-nul Strășeni, destinația „**Lotul 1, Lucrări de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021**” suprafața la sol m. p., suprafața totală _____, numărul de etaje _____,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi 10 februarie 2022, la ora 9⁰⁰ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

CROITOR Vladislav

SÎRBU Nicolae

GUȚAN Gheorghe

RUSU Gheorghe

CRĂCIUN Igor

BUTNARU Rodica

SCHIRLIU Alexandru

DÎMCENCO Mariana

TĂBĂCARI Svetlana

CASIAN Valentina

MANOLI Maria

SCORABOGATCO Vadim

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „**Lotul 1, Lucrări de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021**”

_____ 2022

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea, „Lotul 1, Lucrări de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021” este

_____ 2022

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " _____

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " _____

L.Ș. _____

(semnătura)

2022





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21 privind achiziția prin Licitație Deschisă (Publică)

“18” martie 2021

or. Căușeni
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1612774207041 din data 02.03.2021, între Instituție publică **Consiliul Raional Causeni** 1007601010921, cu sediul în MD-4301, Republica Moldova, or.Căușeni str. bd. M. Eminescu, 31, Tel.: (0243) 2-30-07, fax: (0243) 2-26-50, e-mail: conscauseni@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 12926 din 15.03.2017 reprezentat prin Nicolae GORBAN, Președintele raionului Căușeni, în calitate de **”Beneficiar”**, pe de o parte, și **SC „Nouconst” SRL** 1005600012120, cu sediul în MD-2049, Republica Moldova, mun.Chișinău, str. Petricani, nr. 94, Tel/Fax: (022) 78 88 00, (022) 31 76 38, e-mail: info@nouconst.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD 0024071 din 14.03.2005 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 464610 din 26.02.2021 prin Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberată de Agenția Servicii Publice pe un termen de - ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidările, restaurările), reprezentat prin Scorobogatco Vadim, Director general în calitate de **”Antreprenor”**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările ”Întreținerea curentă și reparația drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2021 din raionul Căușeni”, Lotul II ”Reparația curentă a drumurilor asfaltice”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **4 (patru) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa nr. 1 al prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **8 683 016.18 (opt milioane șase sute optzeci trei mii șaisprezece lei 18 bani)** lei MD, inclusiv TVA.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **8 %** din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile

secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile

conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, **31 decembrie 2021**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: MD-2049, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani, nr. 94.

Telefon: (022) 78 88 00, fax: (022) 31 76 38

Cod fiscal: 1005600012120/065333

Banca: BC "Moldindconbank" SA fil. Renaștere Chișinău

Cod: MOLDMD2X312

IBAN: MD20ML000000022512123039

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-4301, Republica Moldova, or. Căușeni str. bd. M. Eminescu, 31.

Telefon: (0243) 2-30-07, fax: (0243) 2-26-50

Cod fiscal: 1007601010921

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD09TRPDAF312120A15699AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.



BENEFICIAR

L.Ș.



Vizat:

Contabil Șef: Bunduchi Oxana

Secția economie: Nașco Natalia

Serviciul Juridic: Veste Liudmila

GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR an.2021

Nr/ord	Denumirea lucrărilor	Luni (de la semnarea contractului)			
		1.Aprilie	2.Mai	3.Iunie	4.Iulie
1.	Reparația curentă a drumului asfaltat L568.1 Gîsca – Fîrlădeni (selectiv)				
2.	Reparația curentă a drumului asfaltat L569 Bender-Chircăiești – R26 (s. Hagimus, s. Chircaiești)				
3.	Reparația curentă a drumului asfaltat L573.1 drum de acces spre stația Căușeni selectiv (inclusiv str. Alba Iulia)				
4.	Reparația curentă a drumului asfaltat L573.2 L573-R30 selectiv (inclusiv str. Ștefan cel Mare)				
5.	Reparația curentă a drumului asfaltat L574 R26 - drum de acces spre or. Căușeni selectiv (inclusiv str. Alexei Mateevici)				
6.	Reparația curentă a drumului asfaltat L571 R26-drum de acces spre s. Ursoaia				
7.	Reparația curentă a drumului asfaltat L575 R30-drum de acces spre s. Cîrnățeni				
8.	Reparația curentă a drumului asfaltat L581 Copanca – Crimenciuc – Șlobozia - M5				
9.	Reparația curentă a drumului asfaltat L553 R26-Batîr-Ciuflești (selectiv)				
10.	Reparația curentă a drumului asfaltat L508 Mileștii Noi – Cărbuna – Căinari, selectiv.				

Antreprenorul general:

Autoritatea contractantă:

SC „NOUCONST” SRL

CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI

Semnătura autorizată:

Semnătura autorizată:

L.Ș.

L.Ș.





Aprobat:
Președintele raionului Căușeni
N. GORBAN

PROCES-VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 01 din 27 iulie 2021

La executarea lucrărilor la obiectul "Întreținerea curentă și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2021 din r-nul Căușeni", Lotul II "Reparația curentă a drumurilor asfaltice" conform Programului anului 2021

Privind lucrările de reparație a drumurilor publice locale de interes raional din r-nul Căușeni, executate în cadrul contractului nr. 21 din 18 martie 2021 încheiat între Consiliul raional Căușeni și SRL "Nouconst".

1. Comisia desemnată de Consiliul raional Căușeni prin Dispoziția nr. 79-a din 26 iulie 2021 și-a desfășurat activitatea pe data de 27.07.2021 fiind formată din:

a) Președinte:

CUCIUC Oleg, vicepreședinte al raionului Căușeni.

b) Membri:

TURTUREANU Iurie, șef, Direcția economie, construcții și infrastructură;

GLUH Ilie, consilier raional;

CALDAROV Irina, specialist principal, Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri;

AFANASII Oleg, specialist cu activități în construcție atestat;

2. Au mai participat la recepție:

Cavan Alexandru

maistru

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezente și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

4. Comisia a constatat – că lucrarea este definitivată și poate fi dată în folosință.

a) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. "Nouconst".

b) devizele au fost elaborate de Șef SCGCD.

c) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor mai 2021 sfârșitul lucrărilor iunie 2021.

5. Sectoarele de drumuri supuse recepției după cum urmează:

1. L508 Mileștii Noi–Cărbuna–Căinari
2. L569 Bender – Chircăiești - R26, (s.Hagimus, s. Chircăiești)
3. L571 R26 Drum de acces spre s. Ursoaia
4. L573.1 drum de acces spre stația Căușeni, selectiv, (inclusiv str. Alba Iulia)
5. L573.2 L573 – R30, (inclusiv str. Ștefan cel Mare)
6. L574– R26 drum de acces spre or. Căușeni, (inclusiv str. Alexei Mateevici)
7. L575– R30 drum de acces spre s.Cîrnățeni, (s. Cîrnățeni)
8. L581Copanca – Cremenciug – Slobozia – M5

6. Costul lucrărilor recepționate cu alte cheltuieli aferente (verificarea devizelor, serviciul de supraveghere tehnică) (conform anexelor) constituie – 8 728 413,80 lei, inclusiv LCM – 8 683 012,60 lei.

7. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate și a fost întocmit în 5 exemplare.

Comisia:

CUCIUC Oleg



TURTUREANU Iurie



CALDAROV Irina



AFANASII Oleg



GLUH Ilie



Alți membri:

(numele, prenumele, semnătura)

Documentația scrisă și desenată incopletă

Nu s-a depistat

Presedintele comisiei:

CUCIUC Oleg




Membrii comisiei:


TURTUREANU Iurie




AFANASII Oleg



CALDAROV Irina



GLUH Ilie



(numele, prenumele)

Alți membri:

Camin Alexandru



(numele, prenumele, semnătura)

Lucrări neexecutate

Nu s-a defuzat.

Președintele comisiei:

CUCIUC Oleg



Membrii comisiei:

TURTUREANU Iurie



AFANASII Oleg



CALDAROV Irina



GLUH Ilie

(numele, prenumele)

Alți membri:

Cavan Alexandru



(numele, prenumele, semnătura)

L I S T A C H E L T U I E L E L O R
"Reparația curentă a drumurilor asfaltate" pe anul 2021

Nr d/o	Denumirea cheltuielilor, antreprenorul, nr.drumului, trasonul reparat	Costul lucrărilor și altor servicii, lei
1	2	3
	TOTAL:	8 728 413,80
	SRL "Nouconst", antreprenor, Contract de antrepriză nr.21 din 18.03.2021, inclusiv:	8 683 012,60
	L508 Mileștii Noi–Carbuna–Căinari	
1.	Lucrări de antrepriză LCM Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,539% Verificarea devizelor Total:	88 529,78 397,65 640,00 89 567,43
	L569 Bender – Chircăiești - R26	
2.	Lucrări de antrepriză LCM Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,539% Verificarea devizelor Total:	1 106 399,23 4 969,58 640,00 1 112 008,81
	L569 Bender – Chircăiești - R26	
3.	Lucrări de antrepriză LCM Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,539% Verificarea devizelor Total:	2 007 051,80 9 015,01 640,00 2 016 706,81
	L569 Bender – Chircăiești - R26	
4.	Lucrări de antrepriză LCM Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,539 % Verificarea devizelor Total:	3 001 205,12 16 176,50 640,00 3 018 021,62
	L569 Bender – Chircăiești - R26 (lucrări neprevăzute)	
5.	Lucrări de antrepriză LCM Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,539 % Verificarea devizelor Total:	316 465,97 1 421,46 0,00 317 887,43
	L571 R26 drum de acces spre s. Ursoaia, selectiv	
6.	Lucrări de antrepriză LCM Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,539 % Verificarea devizelor Total:	310 900,06 1 396,46 640,00 312 936,52
	L573.1 drum de acces spre stația Căușeni, selectiv, (str. Alaba Iulia)	
7.	Lucrări de antrepriză LCM Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,539 % Verificarea devizelor Total:	804 496,79 3 613,53 640,00 808 750,32



L573.1 drum de acces spre stația Căușeni, selectiv, (str. Alba Iulia), lucrări neprevăzute		
8.	Lucrări de antrepriză LCM	70 955,92
	Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,539 %	318,71
	Verificarea devizelor	640,00
	Total:	71 274,63
L573.2 L573 – R30, selectiv, (str. Ștefan cel Mare)		
9.	Lucrări de antrepriză LCM	363 856,54
	Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,539 %	1 634,32
	Verificarea devizelor	640,00
	Total:	366 130,86
L574– R26 drum de acces spre or. Căușeni, selectiv, (str. Alexei Mateevici)		
10.	Lucrări de antrepriză LCM	390 929,78
	Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,539%	1 755,93
	Verificarea devizelor	640,00
	Total:	393 325,71
L575– R30 drum de acces spre s.Cîrnățeni, selectiv		
11.	Lucrări de antrepriză LCM	130 310,37
	Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,539%	585,31
	Verificarea devizelor	640,00
	Total:	131 535,68
L581Copanca – Cremenciug – Slobozia – M5		
	Lucrări de antrepriză LCM	91 911,24
	Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate 0,539 %	412,84
	Verificarea devizelor	640,00
	Total:	92 964,08
	Notă: din TOTAL pe Listă	
	-Lucrări de antrepriză LCM	8 683 012,60 lei.
	-Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor executate	39 001,20 lei.
	- Verificarea devizelor	6400,00 lei.

Începutul lucrărilor mai 2021

Finalizarea lucrărilor iunie 2021

Șef, Direcție economie, construcții
și infrastructură a Consiliului raional Căușeni

Specialist principal, SCGCD

Iurie TURTUREANU

Irina CALDAROV



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 5-AP privind achiziția prin Licitatie Publică

“07” aprilie 2022

Primăria or. Durlleşti, mun. Chişinău
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643635788024 din data de 21 martie 2022, între **Primăria or. Durlleşti**, cu sediul Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Durlleşti, str. Alexandru cel Bun, 13, telefon/fax: 022584478, e-mail: durllestip@mail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1007601009679 din 27.12.2001, în calitate de **Beneficiar**, reprezentată de către primar, dna Şaran Eleonora, pe de o parte, şi **SC „NOUCONST” SRL**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Petricani, 94, telefon: 022788800; 022317638, e-mail: office@nouconst.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1005600012120 din 14.03.2005, în calitate de **Antreprenor general**, reprezentată de către administrator dl Scorobogatco Vadim, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Livezilor sector 1, str. Livezilor sector 2, str. Cismelelor, str-la 1 Cismelelor, str-la 2 Cismelelor din or. Durlleşti,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este pînă la 31.12.2022 de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 996 900, 39 (cinci milioane nouă sute nouăzeci și șase mii nouă sute lei 39 bani) lei, inclusiv TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul la dispoziție pentru consultare de către persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Antreprenorul prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului general după semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atît timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului general pentru oferta.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din

punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este din culpa dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celelalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% pînă la 0,1% din valoare lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întîrziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2022.


14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "07" aprilie 2022.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR "	" ANTREPRENOR "
Adresa poștală: Mun. Chișinău, orasul Durlști, str. Alexandru cel Bun 5. Telefon: 022587453 Banca: MF-TT Chișinău- bugetul municipal Adresa poștă a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44 Cod IBAN: MD67TRPDAK30000001118300 Cod fiscal: 1007601009679 Cod Bancar: TREZMD2X	Adresa poștală:mun.Chișinău, str.Petricani, 94 Telefon: 022317638, 022728800 Cont de decontare: Banca:BC „Moldova-Agroindbank” SA Adresa poștală a băncii:mun.Chișinău, fil.6 Cod IBAN: MD68AG000000002251679079 Cod fiscal:1005600012120 Cod Bancar: AGRNMD2X413

Semnăturile părților

 Șaran Eleonora, primar Contabil- Șef L.Ș.	 Vadim Scorobogatec, administrator L.Ș.
--	---



**PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR FINALIZATE**

Nr. 01 din 15 ieulie 2022

Privind „Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Livezilor sector 1, str. Livezilor sector 2, str. Cismelelor, str-la 1 Cismelelor, str-la 2 Cismelelor din or. Durlleşti, mun. Chişinău” executate în cadrul contractului Nr. 5-AP din 07 aprilie 2022, încheiat între Primăria or. Durlleşti, și SC „Nouconst” SRL.

Lucrările au fost executate în baza Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea lucrărilor de construcție conform art. 14, p.1, al. g.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, ora _____

fiind formată din:

- a) Președintele comisiei: **Enachi Mihai** – specialist primăria or. Durlleşti
- b) Membrii comisiei: **Morari Petru** – responsabil tehnic
Durleştean Angela – arhitect primăria or. Durlleşti
Mîndru Elena – contabil șef interimar primăria or. Durlleşti
Golban Ivan – specialist în amenajarea teritoriului primăria or. Durlleşti

Au mai participat:

Odoenco Dorin – diriginte de șantier SC „Nouconst” SRL

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1. În urma examinării în teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor materialelor utilizate la lucrările de reparație a drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini, schiței de proiect și a normativelor în vigoare;
- 2. Lucrările au fost complet efectuate la data de 15.07.2022
- 3. Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce nu au fost executate – anexa nr.1;
- 4. Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile obiectului proiectului – anexa nr. 2.
- 5. Cartea Tehnică a construcției obiectului este complectată;
- 6. Costul lucrărilor conform contractului Nr. 5-AP din 07 aprilie 2022 constituie 5,996,809.25 lei

3. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute propune:

- De recepționat obiectul la finalizarea lucrărilor

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

- Examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- De recepționat lucrările finalizate a obiectului.

Prezentul proces verbal, conținând 1 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 15 iulie 2022 în 3 exemplare.

6. Comisia de recepție a lucrărilor :

Președintele comisiei: Enachi Mihai



Membrii comisiei: Morari Petru



Durleștean Angela



Mîndru Elena



Golban Ivan



Lucrarea „Lucrări de reparație capitală a str.Calea Unirii cu lungimea de 0.484 km din or.Durlești, mun. Chișinău” este terminată și transmisă.

Transmis

Executantul

”Nouconst” S.R.L.

Primit

Beneficiar

”Primăria or. Durlești”

” 15 ” iulie 2022

” ” 2022


L.S. 


L.S. 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce nu au fost executate

Executantul

SC "Nouconst" S.R.L.




Beneficiar

"Primăria or. Durlești"




Responsabil tehnic atestat

Morari Petru




Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile obiectului proiectului

Executantul

SC "Nouconst" S.R.L.



Beneficiar

"Primăria or. Durlești"



Responsabil tehnic atestat

Morari Petru

10025499

**UNITED NATIONS DEVELOPMENT
PROGRAMME**



Contract Ref: 10025499
Between United Nations Development Programme
and
(R) SC NOUCONST SRL

10025499

Model Contract

Introduction

Date: 30 March 2023

Dear Sir/Madam,

Ref.:00106290/ EU4Moldova: Focal Regions/ ItB22/02545: Capital rehabilitation of 1.4 km long local road in Manoilesti village, Ungheni district

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **capital repair works of the 1.4 km long local road in Manoilesti village, Ungheni district** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

Contract Documents

1.1

This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2

The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

- a. this Contract;
- b. Annex I – the General Conditions of Contract for Civil Works
- c. Annex II – the Contractor's **Price Schedule and Priced Bill of Quantities**, dated 20/12/2022, attached hereto and the Contractor's technical bid, not attached hereto but known to and in the possession of both parties
- d. the Technical Specifications and Drawings [as listed below], not attached hereto but known to and in the possession of both parties:
 - i. Proiect de executie Nr. 36/2022-PE-SL "Reparatia capitala a drumului local cu lungime de 1.4 km in satul Manoilesti, raionul Ungheni".

1.3

All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other

10025499

negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

SC "NOUCONST" SRL/ #26, Iuri Gagarin Sreet, Vatra city, Chisinau MD-2055

Obligations of the Contractor

2.1

The Contractor shall commence work within **15 calendar days** from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **31 July 2023**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

2.2

The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **15 April 2023**.

2.3

This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on **31 July 2024**.

2.4

The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

Price and Payment

3.1

The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **US\$ 437,246.78 [four hundred thirty-seven thousand two hundred and forty-six US dollars 78 cents]**.

3.2

The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.3

If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.

3.4

10025499

The Contractor shall submit an invoice for advance payment in an amount of **US\$ 29,000.00 [twenty-nine thousand US dollars]** upon signature of this Contract by both parties, invoices for the work performed and materials utilized every 20-40 days and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

3.5

UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

3.6

Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

3.7

Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Final Completion by the Engineer.

4. Special Conditions

Special conditions

4.1.

The amounts of the payments referred to under section 3.4 above shall be subject to a deduction of **10% [ten percent]** of the amount accepted for payment until the cumulative amount of the deductions so effected shall equal the amount of the advance payment. Should the cumulative amount of the deductions so made be lower than the amount of the advance payment after the date of substantial completion of the Works, UNDP may deduct the amount equal to the difference between the advance payment and the cumulative deductions from the payments due after substantial completion or may recover such amount from the Performance guarantee referred to in 4.2 below.

4.2

The **Performance GUARANTEE** referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **US\$ 43,724.68 [10% of the total contract value]** within a maximum of **fifteen (15) days of the contract signature by both parties**. Performance Security shall be valid until a date - 30 days from the date of issue by UNDP of a Certificate of Final Completion. It will be returned to the contractor within 30 days of final completion of the contract and after receipt of the Maintenance Guarantee, including any warranty obligation. The receipt of the Performance GUARANTEE by UNDP shall be a condition for rendering the contract effective.

4.3

The **Maintenance Guarantee** shall be provided in the amount of **2% (US\$ 8,744.94 USD)** of total contract value in form of a letter of bank guarantee to be valid until the end of the Warranty Period. Seven days before the end of Defect Liability Period, UNDP will organize the site inspection and if the works are in line with the contract requirements, UNDP will issue a Satisfactory Certificate of Inspection and will return to the Contractor the

10025499

Performance Guarantee in exchange of a Maintenance Guarantee. If, within the warranty period after the works have been put into service, any defects are discovered or arise in the normal course of usage, the Contractor shall remedy the defect either by replacement or by repair. If the Contractor fails to replace/repair the defect during the above specified period, then UNDP does these repairs at the expense of the Contractor, which shall be deducted from due sums against the **Maintenance Guarantee**.

4.4

The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.5

According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **2.5%** of the price of the Contract per week of delay, up to a maximum of **10%** of the final price of the Contract.

Submission of Invoices

5.1

One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2

Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

Time and manner of payment

6.1

Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2

All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

Bank Name: BC MOLDOVA - AGROINDBANK S.A

Bank Account Number: MD68AG00000002251679079

Modifications

Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

10025499

Notifications

8.1

For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Alexandru PELIVAN, EU4MD Programme Manager, UNDP Moldova

#131, 31 August 1989 Street, MD 2012 Chisinau, Moldova

e-mail: alexandru.pelivan@undp.org

For the Contractor:

Dorin ODOVENCO, Construction Manager

#26, Iuri Gagarin Sreet, Vatra city, Chisinau MD 2055, Moldova

GSM: (+373) 68146700

e-mail: dorin.odovenco@nouconst.md; marius.sirbu@nouconst.md

8.2

For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie VIERU, EU4MD Project Officer/ Infrastructure

#104 Sciusev Street, Chisinau, Moldova


GSM: (+373) 79998802

e-mail: vitalie.vieru@undp.org

Signature

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,

DocuSigned by:

Andrea CUZYOVA,

UNDP Deputy Resident Representative

10025499

For **SC NOUCONST SRL**

Agreed and Accepted:

Signature:

Name:

Title:

Date:

DocuSigned by:

Marius Sirbu

Marius SIRBU
0EC96D04E4684F5...

Administrator
03-Apr-2023

INVESTITOR: Programul EU4MOLDOVA: regiuni-cheie
BENEFICIAR: Primăria com. Mănoilești

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 09 din 11.08.2023

privind "Modernizarea infrastructurii locale pentru dezvoltarea afacerilor în comuna Mănoilești (Reparația capitală a drumului local cu lungime de 1,4 km în satul Mănoilești, raionul Ungheni)" executată în cadrul contractului nr. ItB22/02545 din 30 martie 2023, încheiat între Programul EU4Moldova – regiuni cheie finanțat de UE și implementat de PNUD Moldova și UNICEF Moldova și S.C. "Nouconst" S.R.L. pentru lucrările de reparație capitală a drumului local cu lungime de 1,4 km în satul Mănoilești, raionul Ungheni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 01 din 18 aprilie 2023;
2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 11 august 2023, fiind formată din:

Presedinte:

- Valentina Grosu – Primarul comunei Mănoilești

Membrii comisiei:

- Vitalie Vieru – inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Eugenia Lebeda - inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Sergiu Pleșca - ofițer de proiect pentru îmbunătățirea serviciilor publice Programul EU4Moldova: regiuni – cheie
- Constantin Fuior – responsabil tehnic
- Carolina Bobeica – contabil – șef Primăria comunei Mănoilești
- Vladislav Glodeanu – consilier local

3. Au mai participat la recepție:

<u>Odovenco Dorin</u> (numele, prenumele)	- <u>manager proiect SRL Nouconst</u> (calitatea)
<u>Furtuna Alexei</u> (numele, prenumele)	- <u>diriginte de șantier</u> (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Se acceptă pentru lucrările de reparație capitală recepție,
a drumului local cu l=1,4 km în satul Mănoilești, r. Ungheni.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

realizarea lucrărilor conform catetului de sarcini și contractului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recomandă de a respecta lucrările de mentenanță și întreținere a drumului din asfalt, din piatră și a zigolei din beton.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral-----, adresa poștală -----, destinația -----, compus din următoarele construcții -----, suprafața la sol -----, suprafața totală -----, numărul de etaje -----, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal (nu este necesar).

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 11.08.2023 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție :

Președinte:

- Valentina Grosu

Membri :

- Vitalie Vieru

- Eugenia Lebeda

- Sergiu Pleșca

- Constantin Fuior

- Carolina Bobeica

- Vladislav Glodeanu

Invitați:

- Odavenco Porin

- Furtuna Alexei

10. Lucrarea "Modernizarea infrastructurii locale pentru dezvoltarea afacerilor în comuna Mănoilești (Reparația capitală a drumului local cu lungime de 1,4 km în satul Mănoilești, raionul Ungheni)" este :

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2023

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:


" " 2023

L.Ș.

(semnătura)




Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

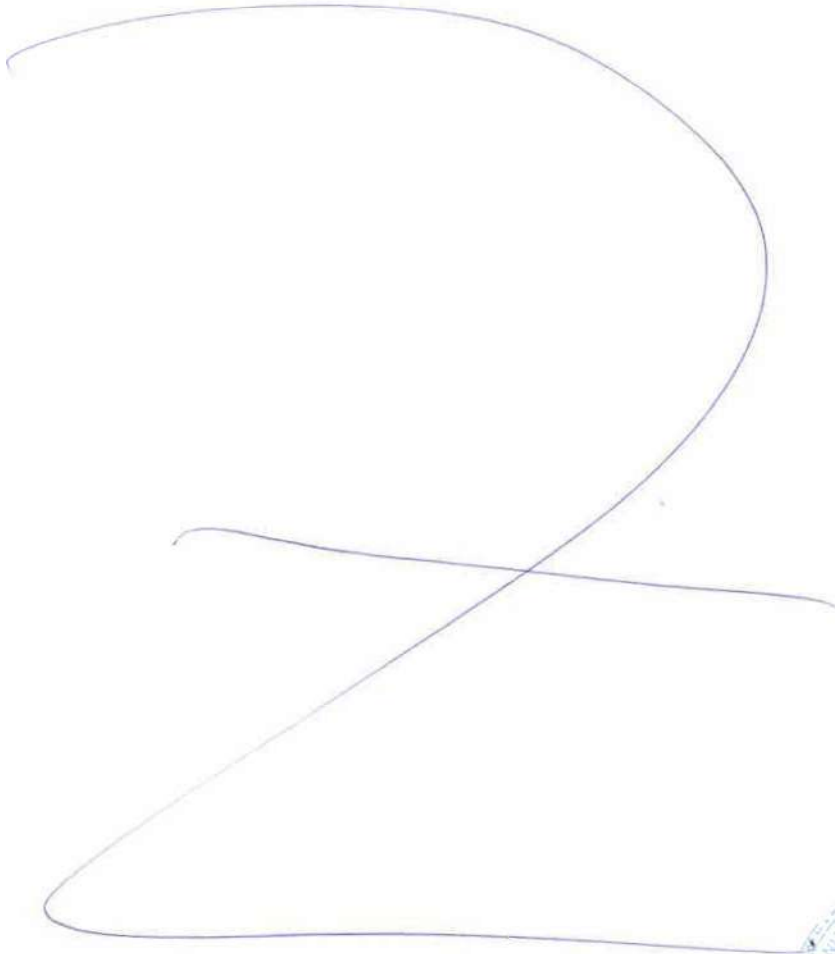

- **Valentina Grosu**, Primarul comunei Mănoilești _____
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie Sieru
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie LEBEDA
- **Sergiu Pleșca**, ofițer de proiect pentru îmbunătățirea serviciilor publice Programul EU4Moldova:
regiuni – cheie _____
- **Constantin Fuior**, responsabil tehnic _____
- **Carolina Bobeica**, contabil – șef Primăria comunei Mănoilești _____
- **Vladislav Glodeanu**, consilier local _____




Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.

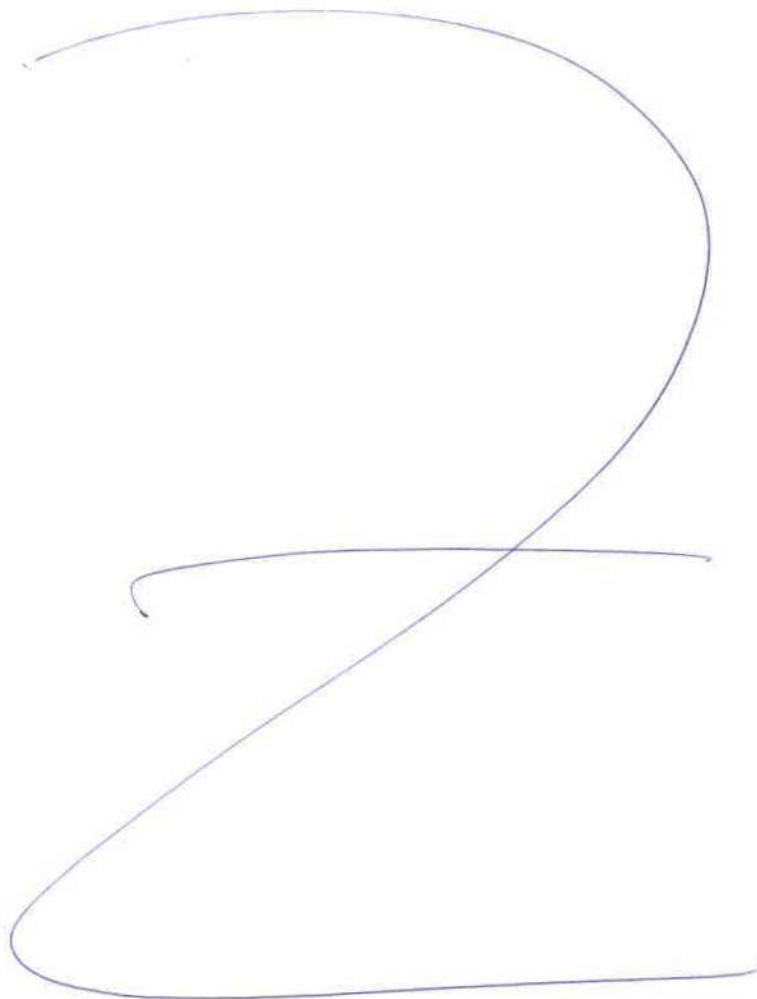

- **Valentina Grosu**, Primarul comunei Mănoilești _____
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie Vieru
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie LEBEDA
- **Sergiu Pleșca**, ofițer de proiect pentru îmbunătățirea serviciilor publice Programul EU4Moldova: regiuni – cheie S.P.
- **Constantin Fuior**, responsabil tehnic _____
- **Carolina Bobeica**, contabil – șef Primăria comunei Mănoilești _____
- **Vladislav Glodeanu**, consilier local _____



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

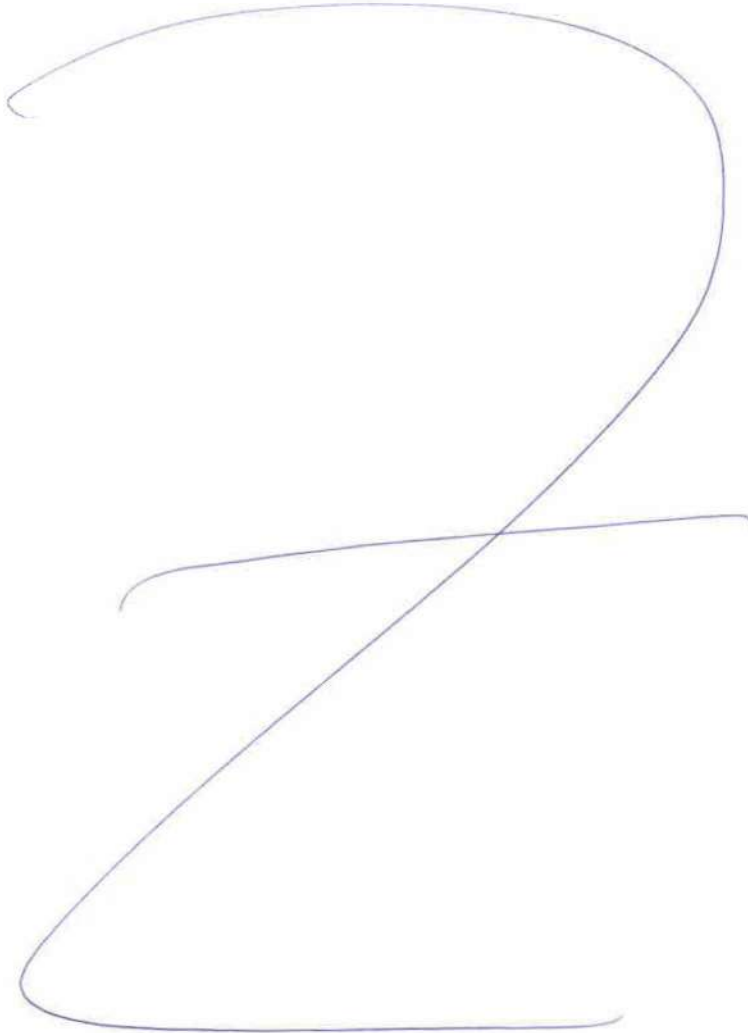

- **Valentina Grosu**, Primarul comunei Mănoilești _____
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie Vieru
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie LEBEDA
- **Sergiu Pleșca**, ofițer de proiect pentru îmbunătățirea serviciilor publice Programul EU4Moldova: regiuni – cheie S.P.
- **Constantin Fuior**, responsabil tehnic _____
- **Carolina Bobeica**, contabil – șef Primăria comunei Mănoilești Blobei
- **Vladislav Glodeanu**, consilier local _____



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.58
Achiziție publică "M-Tender"

" 01 " septembrie 2022

s. Cojușna
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică de tip Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1658999962679 din data 28.07.2022, între

Primaria Cojusna, cu sediul în

(denumirea autorității contractante) **s.Cojușna**

(localitatea) str.Mihai Viteazul 225, telefon: 0237 42236, fax:

023742238, IDNO 1010601000025 reprezentat prin **Craciun Igor** Primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC Nouconst SRL** ,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chisinau str.Petricani 94,

(localitatea)

telefon/fax: 0-22-78-88-00, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1005600012120, Certificat de inregistrare MD0024071 din 14.03.2005 Camera inregistrarii de Stat, Constructii de cladiri si constructii ingineresti, Lucrari de constructie a drumurilor, reprezentat prin administrator **Scorobogatco Vadim**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a strazii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni, conform devizului**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **1 an**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 955 727,68** (Două milioane nouă sute cincizeci și cinci mii șapte sute douăzeci și șapte lei 68 bani) lei MD, inclusiv TVA 492 621.28 lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă,

în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **1 an**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SC Nouconst SRL
Adresa poștală:
mun.Chisinau str.Petricani 94
dorin.odovenko@nouconst.md
Telefon: 0-22-78-88-00
Cod fiscal: **1005600012120**
TVA0605333
Banca:
BC „MOLDOVA-AGROINDBANK ” SA
Suc.6 Chisinau
Cod:**AGRNMD2X**
IBAN MD68AG000000002251679079

BENEFICIARUL

Primaria Cojusna
Adresa poștală: MD3715
Telefon: 0237-42-236
Cod fiscal:1010601000025
Banca: TTCentruStraseni
TREZMD2X
Cod: 226632
IBAN
MD66TRPDAU312120C10718AB

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

Digitally signed by **ANTREPRENOR**
Date: 2022.09.08 11:27:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by **BENEFICIAR**
Date: 2022.09.09 09:47:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by **Vutcariov Oxana**
Date: 2022.09.13 15:08:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



8

2022 - 0000000 909
din 13.09.2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a strazii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni, conform devizului		Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a strazii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni, conform devizului	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a strazii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni, conform devizului	
	TOTAL				

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a strazii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni, conform devizului		vol	1	2955727.68	2955727.68	31.12.2022
	TOTAL					2955727.68	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR FINALIZATE
Nr. 2 din 16 februarie 2023

Privind „Lucrările de reparație a unei porțiuni de drum a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni” executate în cadrul contractului Nr. 58 din 01 septembrie 2022, încheiat între Primăria Cojușna, și SC „Nouconst” SRL.

1. Comisia desemnată și-a desfășurat activitatea în perioada 16 februarie 2023 fiind formată din:

- a) **Președintele comisiei:** Craciun Igor – primar s. Cojușna
- b) **Membrii comisiei:** Boaghie Tatiana – vice primar s. Cojușna
Chiriac Andrei – responsabil tehnic
Botan Teodor – arhitect primăria s. Cojușna
Bivol Margareta – contabil șef primăria s. Cojușna

Au mai participat:

Odoenco Dorin – diriginte de șantier SC „Nouconst” SRL

2. Constatările comisiei de recepție:

- a. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la lucrările de reparație a drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare;
- b. Lucrările au fost complet executate în termenii:
începutul lucrărilor *septembrie 2022* sfârșitul lucrărilor *octombrie 2022*
- c. Cartea Tehnică a construcției obiectului este completată;
- d. Costul lucrărilor de facto conform contractului Nr. 58 din 01 septembrie 2022 constituie **3 203 084,10 lei**

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune:

- *recepționare lucrărilor*

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

- *lipsa neconformităților*

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- *recepționarea și întreținerea obiectivului.*

Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 16 februarie 2023 în 5 exemplare.

Anexa: 1 . Situația neconformităților depistate de comisia de recepție.

6.Comisia de receptie a lucrărilor :

Președintele comisiei: Craciun Igor

Membrii comisiei: Boaghie Tatiana

Chiriac Andrei

Botan Teodor

Bivol Margareta



Lucrarea „**Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni**” este terminată și transmisă.

Transmis
Executantul
„**Nouconst**” S.R.L.

” 16 ” februarie 2023



Primit
Beneficiar
„**Primăria Cojușna**”

” 16 ” februarie 2023



SITUAȚIA

neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate la obiectul:
„Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul
Strășeni”

nr.	Denumirea obiecțiilor și adresa

Executantul
SC "Nouconst" S.R.L.



Beneficiar
"Primăria Cojușna"

Responsabil tehnic atestat
Chririac Andrei



Republica Moldova
Ministerul Economiei și Infrastructurii
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Proiectul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale

ANGAJATORUL:



Î.S. „Administrația de Stat a
Drumurilor”

CONTRACTORUL:



S.C. „NOUCONST” S.R.L.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16,

**Contractul LRIP/W6/02: “G105: R3 - Costești -
Țipala - G106 (km 8+450 - km 17+350)”**

Finanțat de către
Asociația Internațională de Dezvoltare (AID)

DOCUMENTE CONTRACTUALE

VOLUMUL 1

Chișinău

Noiembrie 05, 2020

DOCUMENTUL CONTRACTUAL

Contractul de lucrări Nr. LRIP/W6/02

CUPRINS

VOLUMUL 1

Acord Contractual

Scrisoare de acceptare

Formularul de Depunere a Ofertei Contractorului

VOLUMUL 2

Condiții Speciale ale Contractului

Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexele

VOLUMUL 3

Specificații Tehnice

VOLUMUL 4

Desene

VOLUMUL 5

Preambul la lista de cantități

Lista de Cantități

VOLUMUL 6

A. Planul de management de mediu și social (PMMS)

B. Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii)

Acord Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 05 noiembrie 2020, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu adresa juridică: str. Bucureii, 12A, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Angajator"), pe de o parte, și **SC „Nouconst” SRL**, cu adresa juridică: str. Petricani 94, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Contractor"), pe de altă parte:

ÎNTRUCÂT Angajatorul dorește ca **Lucrările de îmbunătățire a Coridorului 16, în cadrul Contractului LRIP/W6/02: „G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 8+450 - km 17+350)”** să fie executate de Contractor și a acceptat Oferta Contractorului pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remediere a oricărui defecte ale acestora, Angajatorul și Contractorul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.

2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.

- (a) Scrisoarea de Acceptare;
- (b) Formularul de depunere a Ofertei;
- (c) Amendamentele Nr. 1 și 2 la Documentele de Licitatie;
- (d) Condiții Speciale ale Contractului (CSC);
- (e) Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexe;
- (f) Specificații Tehnice;
- (g) Desene;
- (h) Lista de cantități;
- (i) Planul de management de mediu și social (PMMS);
- (j) Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii) și
- (k) Orice alt document menționat în CSC ca făcând parte din Contract.

3. În considerarea plăților care trebuie efectuate de către Angajator Contractorului, Contractorul convine cu Angajatorul prin prezentul acord să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în toate privințele și în conformitate cu prevederile Contractului.

4. Angajatorul se obligă să plătească Contractorului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și a remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului în momentul și în modul prevăzut de Contract.

Drept pentru care Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Semnat de: **Veaceslav POTOP**,
Director General Interimar

Semnat de: **Vadim SCOROBOGATCO**,
Director Companie

Pentru și în numele Angajatorului

Pentru și în numele Contractorului

Adresa: str. Bucureii 12A, mun. Chisinau,
MD 2004, Republica Moldova

Adresa: str. Petricani 94, mun. Chisinau,
MD 2068, Republica Moldova

Data: 05. 11. 2020

Data: 05. 11. 2020



Î.S. "ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
S.E. "STATE ROAD ADMINISTRATION"

IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chișinău, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

02.11.2020 nr. 05-11/5835

Către: SC „Nouconst” SRL
Str. Petricani 94, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2059.

Subiect: Notificare de Adjudecare a Contractului Nr. LRIP/W6/02

Scrisoare de Acceptare

Prin aceasta sunteți informați că Oferta dumneavoastră, datată cu 15 mai 2020, pentru executarea Lucrărilor de îmbunătățire a Coridorului 16, în cadrul Contractului: LRIP/W6/02: „G105: R3 - Costești - Țipala - G106 (km 8+450 - km 17+350)” în valoarea totală de **94,947,821.00 MDL** (*nouazeci și patru milioane nouă sute patruzeci și șapte mii opt sute douăzeci și unu lei, 00 bani*) inclusiv sumele provizionate (cheltuielile neprevăzute și alte sume provizorii), este prin prezenta acceptată de către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Sunteți solicitat să furnizați în termen de 28 de zile:

1. Garanția de bună execuție în sumă de 5% din prețul Contractului, minus orice sume provizionate (4.319.590,19 MDL), în conformitate cu condițiile Contractului, folosind în acest scop Formularul garanției de bună execuție inclus în Secțiunea X – Formulare ale Contractului din Documentele de Licitație, emisă de către o bancă acceptabilă pentru Angajator.
2. Confirmarea că întreprindeți toate acțiunile necesare în vederea obținerii Asigurărilor, în termenul și suma solicitate, conform prevederilor Condițiilor Contractuale.

În conformitate cu IPO 43.1 din Documentele de Licitație, candidatura lui Brian Samuel BARR, Marea Britanie, propus de Angajator în calitate de Adjudecător este acceptată.

Semnătura autorizată:

Numele și funcția semnatarului: **Veaceslav POTOP**, Director General Interimar

Numele Agenției: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Anexă: Acordul Contractual – 1 filă.

Data: 15.05.2020

Nr. LNC: Contractul 2: LRIP/W6/02:
G105: R3 - Costești - Tipala - G106 (km 8+450 - km 17+350)
Invitația de Participare la Licitația nr.: LRIP/W6/01-04,

Către: **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**

- (a) Am examinat Documentația de Licitație și nu avem rezerve față de aceasta, inclusiv amendamentele emise în conformitate cu instrucțiunile pentru Ofertanți (IPO 8) _____;
- (b) Întrunim cerințele de eligibilitate și nu avem nici un conflict de interese în conformitate cu IPO 4;
- (c) Nu am fost suspendați, nici declarați neeligibili de către Angajator pe baza executării unei Declarații de Garantare a Ofertei în țara Angajatorului, conform IPO 4.6.
- (d) Ne oferim să executăm, în conformitate cu Documentația de Licitație, următoarele Lucrări:
“G105: R3 - Costești - Tipala - G106 (km 8+450 - km 17+350)”
- (e) Prețul total al Ofertei noastre, fără discounturile oferite la punctul (f) de mai jos, este:
În cazul unui singur lot, prețul total al Ofertei: **(94 947 821,00 nouăzeci și patru milioane nouă sute patruzeci și șapte mii opt sute douăzeci și unu lei, 00 bani)**
În cazul mai multor loturi, prețul total al fiecărui lot **nu este aplicabil**
În cazul mai multor loturi, prețul total al tuturor loturilor (suma loturilor) **nu este aplicabil**
- (f) Discounturile oferite și metodologia pentru aplicarea lor sunt:
- i) Discounturile oferite sunt: nu sunt
- ii) Metoda exacta de calcul pentru stabilirea prețului net după aplicarea discounturilor este prezentată mai jos: nu este aplicabil
- (g) Oferta este valabilă pe o perioadă de **120 (una sută douăzeci) zile calendaristice** de la data limită de depunere a ofertelor conform Documentației de Licitație, și rămâne obligatorie pentru noi, putând fi acceptată de dvs. oricând până la expirarea acestei perioade;
- (h) În cazul în care oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obținem garanția de bună execuție conform Documentației de Licitație.

SC „Nouconst” SRL, mun. Chișinău, str. Petrișani, 94, tel/fax 0-22-788800
cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. fil. 10 Chisinau
SWIFT: AGRNMD2X, IBAN lei: MD68AG000000002251679079

- (i) Nu participăm, ca ofertant sau subcontractor, la mai mult de o ofertă în acest proces de licitație, conform IPO 4.2 (e), alta decât ofertele alternative prezentate conform IPO 13;
- (j) Noi, inclusiv oricare din subcontractorii, furnizorii, consultanții, producătorii, sau prestatorii noștri de servicii pentru oricare parte a Contractului, nu am constituit subiectul, și nefiind controlați de oricare entitate sau persoană care constituie subiectul, al unei suspendări temporare sau descalificări impuse de un membru al Grupului Banca Mondială, sau al unei discalificări impuse de Grupului Banca Mondială, în conformitate cu Acordul reciproc de executare a deciziilor de discalificare între Banca Mondială și alte bănci de dezvoltare. Mai mult ca atât, nu suntem declarați neeligibili în baza legilor sau regulamentelor oficiale din țara Angajatorului sau printr-un act de respectare a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite;
- (k) Nu suntem o entitate deținută de Guvern;
- (l) Am achitat sau vom achita următoarele comisioane, gratuități sau taxe cu privire la procesul de licitație sau la executarea Contractului: **NU**
- (m) Înțelegem faptul că această ofertă, împreună cu acceptarea de către dvs. în scris a acesteia, inclusă în notificarea de atribuire, va constitui un contract obligatoriu între noi, până la întocmirea și semnarea unui contract oficial; și
- (n) Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu prețul cel mai scăzut sau orice ofertă primită.
- (o) Prin prezenta, confirmăm faptul că am luat măsuri pentru a asigura neimplicarea în acte de fraudă sau corupție a vreunei persoane care acționează pentru noi sau în numele nostrum.

Numele ofertantului: **S.C. Nouconst S.R.L.**

Numele persoanei autorizate să semneze oferta în numele Ofertantului: **Vadim Scorobogatco**

Funcția persoanei care semnează oferta: **administrator;**

Semnătura persoanei numite mai sus: _____

Data semnării: 14.05.2020





PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 35 din 7 octombrie 2022

Privind „Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16, drumul G105, R3-Costești-Țipala-G106, km 8+450 – km 17+350”, executat în cadrul contractului: nr. LRIP/W6/02 din 05.11.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, (beneficiar) și SC “Nouconst” SRL, (antreprenor).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 17.12.2020 eliberată de Consiliul Raional Ialoveni cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 175 din 04.10.2022 și-a desfășurat activitatea astăzi 7 octombrie 2022 fiind formată din:

- a) Președinte: Iulian Mornealo - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b) membri:
 - Sergiu Galușca - director adjunct, Î.S. „ASD”
 - Mircea Dobîndă - șef direcție investiții externe, Î.S. „ASD”
 - Petru Triboi - șef dir. siguranță și întreținerea constr. rutiere, Î.S. „ASD”
 - Roman Gavriluța - șef serviciul management ingineresc, Î.S. „ASD”
 - Victor Serdiuc - șef serviciul poduri, Î.S. “ASD”
 - Ion Eremia - șef adjunct direcția infrastructură de transport, MIDR
 - Nichita Purici - consultant serviciul management ingineresc, Î.S.”ASD”
 - Ion Meșină - șef secție construcții gospodărie comunală și drumuri a Consiliul Raional Ialoveni
 - Sergiu Sarivan - ofițer sistematizarea circulației rutiere al IGP

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- Gheorghe Duplava - șef S.A. “Drumuri-Ialoveni”
- Alexandru Luța - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor, “TECNIC”
- Ștefan Racu - manager de proiect, SC “Nouconst” SRL
- Dumitru Vilicinski - reprezentantul proiectantului „Obermeyer”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a înainta spre recepție lucrările executate

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

coresponderea lucrărilor cu proiectul și documentația tehnică

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția lucrărilor

7¹. Îmbunătățirea coridorului 16, G105, R3-Costești-Țipala-G106, km 8+450 – km 17+350 are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului: 8,9 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 6,0 m (2x3m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x1,5 m.

Construcția sistemului rutier:

Reabilitare:

- strat de uzură din beton asfaltic – 4 cm;
- strat de bază din beton asfaltic – 6 cm;
- strat de fundație din piatră spartă – 11 – 13 cm;
- strat de egalizare din piatră spartă – variabil.

Construcție nouă, supralărgiri:

- strat de uzură din beton asfaltic – 4 cm;
- strat de baza din beton asfaltic – 6 cm;
- strat de fundație din piatră spartă – 11 – 13 cm;
- strat de fundație din piatră spartă – 13 – 15 cm;
- strat inferior de fundație din balast – 20 cm.

Pod km 10+830: Lungimea suprastructurii L – 12 m, lățimea B – 10,4 m.

Podete tubulare: Ø 0,8m – 3 buc; Ø 1m – 3 buc; Ø 1,4m – 2 buc; Ø 1,6m – 1 buc;

Podete dreptunghiulare: 2,5m x 2m – 1 buc; 2m x 2m – 1;

Securitatea circulației rutiere: Indicatoare rutiere 387 buc, parapet de protecție – 894 m.l., marcaje rutiere – 4 795 m. p.

Construcția trotuarelor: L – 5 650m; B – 1,5m.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 7 octombrie 2022 la 11:40 în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

SE ADMITE RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR, ÎN
CONDIȚIILE HG 285, P. 26 și HG 360/1996, AN. 3, P. 5.

08.10.2022

[Semnătură]
(semnătura)

F. LOZAN
(numele, prenumele, funcția)
Inspector
tehnic

Președinte Julian Mornealo

membri: Sergiu Galușca

Mircea Dobîndă

Petru Triboi

Roman Gavriluța

Victor Serdiuc

Ion Eremia

Nichita Purici

Ion Meșină

Sergiu Sarivan

invitați:

Ștefan Racu

Dumitru Vilicinski

10. Lucrarea “Îmbunătățirea coridorului 16, G105, R3-Costești-Țipala-G106, km 8+450 – km 17+350”, este recepționată.

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

SRL „Nouconst”



Ștefan Racu

2022

PRIMITĂ - INVESTITORUL


Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”




Petru Triboi

2022

Din documentația scrisă și desenată lipsește

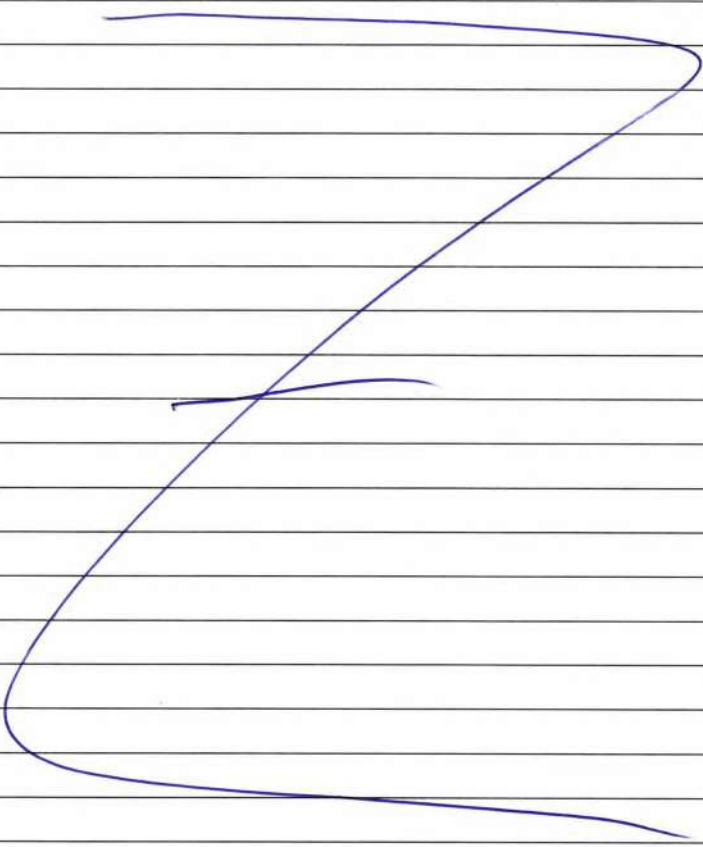
Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	

Președinte



Iulian Mornealo

membri:



Sergiu Galușca




Mircea Dobîndă



Petru Triboi



Roman Gavriluța



Victor Serdiuc



Ion Eremia



Nichita Purici



Ion Meșină



Sergiu Sarivan

invitați:



Gheorghe Duplava



Alexandru Luța



Ștefan Racu



Dumitru Vilicinski






Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	
1.	Finalizarea stabiilor de așteptare
2.	Remedierea tasărilor la km 8+500.
3.	De asigurat accesul persoanelor cu dizabilități la trotuare
4.	De calmabat rosturile la borduri și reparația bordurilor cu mortar special
5.	De reprofilat taluzele după caz pe toată lungimea
6.	De restabilit consolidarea cu iarbă.
7.	De pulăturat eroziunile la podete (12+623) după necesitate
8.	Consolidarea taluzurilor la podete după necesitate.
9.	Podet km 12+165, de asigurat scurgerea apelor în camera de cadere.
10.	Hydrofobizarea și vopsirea elementelor la infrastructură și suprastructură ne completat, pod km 10+830.
11.	De refăcut rosturile dintre dalele platformare la perul din beton, pod km 10+830.
12.	De revăzut schița parapet de protecție pod km 10+830.

Președinte Iulian Mornealo

membri: Sergiu Galușca

Mircea Dobîndă

Petru Triboi

Roman Gavriluța

Victor Serdiuc

Ion Eremia

Nichita Purici

Ion Meșină

Sergiu Sarivan

invitați: Gheorghe Duplava

Alexandru Luța

Ștefan Racu

Dumitru Vilicinski



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta I.C.S. DAS CONINST S.R.L confirmă că conform contractelor de subantrepriză încheiate între I.C.S. DAS CONINST S.R.L și SRL „Nouconst” în calitate de „Subantreprenor” au fost îndeplinite următoarele lucrări:

Contract: nr. 248/SA/I/09-22 din 03.10.2022 „*Lucrări de asfaltare parcare în cadrul proiectului Magazin "Kaufland" MD-2001, str. Kiev nr.7, sect. Riscani, mun. Chișinău, Republica Moldova*” în valoare de 4 697 217,00 lei

Contract: nr. 219/SA/I/07-21 din 30.07.2021 „*Lucrări de asfaltare în cadrul proiectului Magazin Kaufland situat în Chișinău, str. Testemitanu , nr.3*” - în valoare 9 781 591,20 lei.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Obiectele au fost date în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu toată documentația necesară corespunzătoare.

SRL „Nouconst” se caracterizează drept un partener de încredere, care dispune de specialiști calificați în domeniu. echipamente și utilaje performante ce corespund tuturor cerințelor actuale privind construcția, reparația și reabilitarea drumurilor.

Cu respect,
Administrator, **Iulian Solomon**





Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”
IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chișinău, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic cancelaria@asd.md

12.09.2022 nr. 04-04/6031

La nr. 509/09 din 05.09.2022

Scrisoare de recomandare

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” urmare a licitațiilor publice în calitate de beneficiar a încheiat cu S.R.L. „Nouconst” în calitate de antreprenor, pe parcursul anilor 2017 - 2021, următoarele contracte de antrepriză:

Nr.	Obiectul contractului	Contract	Valoarea contractului, lei
1	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G91 Ungheni - Bârboieni - Nemțeni - M1, km 38 - 47	11-18/305 din 17.08.2017	65 883 085,30
2	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G109 Delacău-Bulboaca-R2, km 11.33-13.4	06-14/283 din 19.07.2019	36 038 458,15
3	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași	06-14/260 din 03.07.2020	58 734 336,41
4	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Glodeni, mun. Bălți	06-14/285 din 14.07.2020	44 394 169,04
5	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești, Nisporeni	06-14/236 din 25.06.2020	20 460 572,17
6	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni	06-14/239 din 25.06.2020	22 824 538,12
7	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău	06-14/139 din 03.06.2021	12 595 841,54
		Total	260 931 000,73

Lucrările au fost executate conform cerințelor contractuale, în termen și calitativ, neexistând neconformități depistate în procesul de executare a lucrărilor.

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” recomandă compania S.R.L. „Nouconst” ca un partener de încredere, avînd competențe profesionale și tehnice pentru a oferi servicii de executare a lucrărilor de reparație a drumurilor.

Cu respect,

Director general interimar

Sergiu BEJAN

Ex. P. Triboi
Tel. 0 (22) 74 12 05

Atenționăm că, acest document conține date cu caracter personal înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0002404 - 001. Preluarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Acest document este destinat numai pentru uzul organelor abilitate de lege și nu poate fi dat publicității.



CONSILIUL MUNICIPAL STRĂȘENI
PRIMĂRIA



MD- 3701, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32. tel (237) 2-23-43, fax 2-29-89
e-mail primaria.straseni11@gmail.com

La nr. _____ nr. _____
din _____ 2021

Scrisoare de Recomandare

Tinând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SC "NOUCONST" SRL, ne declarăm mulțumiți de lucrările executate la "**Lucrări de reparație capitală a străzilor P. Rareș, Decebal, Ștefan cel Mare, T. Ciorbă municipiul Strășeni**", conform contractului nr.52 din 28 martie 2019. Reprezentanții companiei SC "NOUCONST" SRL au dat dovadă de profesionalism și promptitudine, termenii de execuție și calitatea lucrărilor sunt criteriile ce caracterizează această companie.

Totodată ținem să menționăm că, compania SC "NOUCONST" SRL a demonstrat că deține capacități mari și potențial suficient în implementarea lucrărilor de acest gen, oferind un nivel foarte înalt în mobilizarea, organizarea și implementarea lucrărilor.

În concluzie, recomandăm compania SC "NOUCONST" SRL drept un colaborator profesionist și credibil, distingându-se atât prin lucrările sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, atribute care o diferențiază într-un mod favorabil de competitori.

Cu respect,

PRIMAR al mun. STRĂȘENI

Valentina CASIAN

Digitally signed by Casian Valentina
Date: 2021.04.09 10:27:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL STRĂȘENI
PREȘEDINTELE RAIONULUI

MD-3701, or. Strășeni, str. M. Eminescu, 28, tel.: +37323723630
e-mail: consiliulraional@crstraseni.md www.crstraseni.md



Nr. 239 din 23 martie 2022

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2021 SC „NOUCONST” SRL a câștigat contractul de antrepriză nr. 3/01 din 24.06.2021 de execuție a lucrărilor de construcție la obiectul „Lucrările de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021” în valoare de 6.426.243,94 lei.

Pe parcursul executării contractului au fost respectate documentele de execuție, normativele în vigoare, tehnologia și termenii de execuție, nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea totală ori parțială a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor enunțate mai sus, Aparatul Președintelui raionului, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii SC „NOUCONST” SRL pentru lucrările executate calitativ și recomandă firma ca Antreprenor de încredere.

Președinte al raionului



Viorel JARDAN



Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”
IDNO 1003600023559

Rep Moldova, Chisinau, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
internet: <http://www.asd.md>, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

16.04.2020 Nr. 04-01/1565

RECOMANDARE

Prin prezenta, ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” confirmă că conform contractelor de antrepriză încheiate între ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” și SC „NOUCONST” SRL au fost îndeplinite lucrări de reparație a următoarelor drumuri publice:

- Contract nr.11-18/366 din 18 septembrie 2018 – ”*Lucrări de reparație a drumului G109 Delacău - Bulboaca - R2, km 9,130 - 11,330*” - în valoare de 32 008 703,33 lei.
- Contract nr.06-14/254 din 10 iulie 2019 - ”*Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Strășeni*” - în valoare de 27 899 499,60 lei.
- Contract nr. 06-14/262 din 11 iulie 2019 - ”*Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Cahul*” - în valoare de 29 637 636,00 lei.
- Contract nr. 6-14/261 din 11 iulie 2019 - ”*Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rîșcani*” - în valoare de 19 494 429,60 lei.
- Contract nr. 06-14/263 din 10 iulie 2019 - ”*Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Edineț*” - în valoare de 19 614 908,40 lei.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Obiectele menționate au fost date în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu toată documentația necesară corespunzătoare.

ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” caracterizează compania ”Nouconst” SRL drept un partener de încredere, care dispune de specialiști calificați în domeniu, echipamente și utilaje performante (inclusiv uzină de beton asfaltic pentru producerea mixturilor asfaltice) ce corespund tuturor cerințelor actuale privind construcția, reparația și reabilitarea drumurilor.

Director adjunct, Î.S. „ASD”

I.Drucec
