

Digitally signed by Ulian Galina
Date: 2021.04.02 16:15:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ulian Galina
Date: 2019.04.04 08:51:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Ulian Galina
Date: 2020.05.01 08:54:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 08-18/123

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 521/12-1 data 25.04.2012
Semnătura Cebucur C

25 aprilie 2012

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 521/12 din 3.03.2012, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 19/12 din 06.03.2012, între **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor**, în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. Mucuriei, 12a, MD-2004, telefon 740570, fax 22 22 80 cont de decontare 222450149802110 deschis la Banca de Economii S.A., fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef Il Vitalie Panurco și **S.R.L. "Construm"** în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în or. Chișinău, str. E. Coca 47, tel. 592643, fax. 592978, c/f 1002600014031, cont de decontare 22247127 deschis la BC "Energbank" S.A., fil. Botanica, c/b ENEGMD22858, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1002600014031 din 29.05.2008 licență de activitate seria A MMII nr. 036190 din 22.12.2005 valabilă până la 22.12.2015, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti, reconstrucții, consolidări reprezentată de directorul dl Igor Ulianov.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R56 Cania-Baimaclia-Taraclia de Salcie-R38, km 2-8**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, proiectului de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – 7 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și transferarea avansului de către Beneficiar.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar.

Підпис - 26.04.2012

Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum este necesar. Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

În cazul încheierii lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **19 807 566,33 (nouăsprezece milioane opt sute șapte mii cinci sute șizeci și șase lei 33 bani) inclusiv TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Beneficiarul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului general în avans 10% din valoarea contractului. Restul sumei se va achita eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și

conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le
cauzeze general din vina căruia s-a reziliat contractul.
garanției de bună execuție se va efectua numai după efectuarea recepției finale, iar în
literale c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea
legale.
Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă
executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca
parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul contract semnat și înregistrat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietul de sarcini;
- e) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la
data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 20.12.2012.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/d 222450149802110
Banca de Economii S.A.
fil. 1 or. Chișinău
c/b BECOMD2X609
c/TVA 0503301

Manager-șef
Vitalie Panurco



S.R.L. "Construm"

or. Chișinău, str. Coca 47
c/f 1002600014031
c/d 22247127
BC „Energbank” S.A.,
fil. Botanica
c/b ENEGMD22858
c/TVA 0500138

Director
Igor Ulianov



Manager – șef interimar _____

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. _____ din _____ 2013

privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R 56 Cania - Baimaclia - Taraclia de Salcie – R 38, km 2 - 8, tronsonul km 2 + 000 ÷ km 4 + 320, executate în cadrul contractului nr. 08 - 18/123 din 05.04.2012 și acordurilor adiționale nr. 1 din 27.10.2011, nr. 2 din 01.07.2013 și nr. 3 din 05.04.2013, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Construm” or. Chișinău, antreprenor

1 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 03 din 23 mai 2012 eliberată de Aparatul Președintelui Raionului Cantemir cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 56 din 12.12. 2013 și-a desfășurat activitatea astăzi, marți 24 decembrie 2013 fiind formată din:

Președinte	Iu. Pașa	- manager- șef adjunct, Î.S. „ASD ”
membri:	R. Rogovei	- șef adjunct, direcția dezvoltarea drumurilor, MTID
	V. Cotruță	- șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
	I. Alexa	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
	V. Manole	- specialist principal, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere Transport și Circulație Rutieră
	V. Mocanu	- șef, direcția construcții, gospodărie comunală, drumuri, și transport, Consiliul Raional Cantemir
	V. Trifan	- director, S.A. „Drumuri – Cahul”
	O. Bolocan	- S.A. „Drumuri – Cahul” sector Cantemir

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- a.) executantul I. Ulianov - director, S.R.L. „Construm”
- b.) proiectantul S. Boroșan - director, S.R.L. „Гунпоцпоўмочм – М ”
- c.) responsabilul tehnic C. Stăvilă - specialist principal, Î.S. „ASD”

4. Comisia de recepție a constatat - lucrarea e definitivată de construcție *cu* rezerve și concluzionează că aceasta poate fi dată în folosință.

- a.) lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Construm”
- b.) documentația de proiect a fost elaborată de S.R.L. „Гунпоцпоўмочм – М ”
- c.) documentația de proiect și deviz a fost aprobată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 312 din 12.12.2012
- d.) lucrările de construcție-montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor **mai 2012** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2013**

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a.) situația lucrărilor executate - cartea tehnică
- b.) situația obiecțiilor

6. Drumul supus recepției are următorii indici de bază :

- a.) Lungimea drumului (tronsonului) - 2320 m, b.) Lățimea platformei drumului b - 10.0 m,
- c.) Lățimea părții carosabile b - 6.0 m, d.) Lățimea acostamentelor b - 2.0 m pe ambele părți dintre care b - 0.5 m pe ambele părți consolidate cu piatră spartă H - 10.0 cm.

Construcția sistemului rutier a tronsonului dat: strat suport de nisip H - 15.0 cm, strat suport din piatră spartă H - 20.0 cm, strat de bază din beton asfaltic poros inferior H - 6.0 cm, strat superior din beton asfaltic uzură H - 4.0 cm, rigole și șanțuri consolidate cu beton - 3115 m.l, sisteme de drenare a apelor - 1405.0 m.l, podețe - 6 bucăți, drumuri laterale - 8 bucăți cu suprafața de - 1482 m², parapet metalic de protecție - 986.0 m.l, indicatoare rutiere - 25 bucăți, marcaj longitudinal - 770.0 m².

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie - **23 226,59 mii lei, inclusiv LCM - 22 680,00 mii lei.**

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a tronsonului menționat constituie - **19 323.253,60 lei inclusiv LCM - 18 437 701,01 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.**

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate - **abateri de la proiect nu au fost depistate.**

10. Comisia de recepție recomandă următoarele **admiterea CII obiecții a recepției.**

11. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă, a fost încheiat, astăzi, **24 decembrie** 2013 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Iu. Pașa

membri: R. Rogovei

V. Cotruță

I. Alexa

V. Manole

V. Mocanu

invitați:

V. Trifan

O. Bolocan

I. Ulianov

S. Borozan

C. Stăvilă

12. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

2013

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

13. Lucrarea cu privire la reparația îmbrăcămintei rutiere pe drumul R 56 Cania - Baimaclia - Taraclia de Salcie - R 38, km 2 - 8, tronsonul km 2 + 000 ÷ 4 + 320, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, **este recepționată.**

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL

S.R.L. „Construm”

decembrie 2013

I. Ulianov




PRIMITĂ - INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

decembrie 2013

V. Cotruță



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Obiectului – 9682. Capitol – 243. Aliniat – 06.

Digitally signed by Ulian Galina
Date: 2019.04.04 08:51:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.

08-18/171

08-18/175

AGENŢIA ACHIZIŢII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr.

1019/11-L

data 28.07.11

Semnătura

04 iulie 2011

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării licitaţiei publice nr. 1019/11 din 21.06.2011, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 43 din 03.06.2011, între **Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"**, în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 740570, fax 22 22 80 cont de decontare 22513014982109 deschis la Banca de Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chişinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-şef dl Vitalie Panurco, **Plătitor Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor**, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162 cod fiscal 1008601001212, cont trezorial 210114071670264, cont bancar 226301, banca plătitoare Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat, codul băncii TREZMD2X şi **S.R.L. "Construm"** în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în or. Chişinău, str. E. Coca 47, tel. 592643, fax.592978, c/f 1002600014031, cont de decontare 22247127 deschis la BC "Energbank" S.A., fil. Botanica, c/b ENEGMD22858, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1002600014031 din 29.05.2008 licenţă de activitate seria A MMII nr. 036190 din 22.12.2005 valabilă până la 22.12.2015, pentru genurile de activitate construcţii de clădiri şi construcţii ingineresti, reconstrucţii, consolidări reprezentată de directorul dl Igor Ulianov.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparaţie a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L649 Ceadâr Lunga-Congaz, km 10-18 (tronsonul Baurci-Congaz)**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitaţie, proiectului de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Termenul limită de execuţie a lucrărilor contractante se stabileşte 6 (şase) luni calendaristice de la data înregistrării contractului de către Agenţia Achiziţii Publice.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Beneficiarul general vor fi plătite de Beneficiar.

La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, comisia va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lucrărilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **10 014 122,42 (zece milioane paisprezece mii una sută douăzeci și doi lei, 42 bani) inclusiv TVA.**

4.2. Suma alocată pe anul 2011 este de 9 871 668,31 (nouă milioane opt sute șaptezeci și unu mii șase sute șasezeci și opt lei, 31 bani) inclusiv TVA. Executarea integrală a lucrărilor se va efectua pe măsura alocării mijloacelor financiare.

4.3. Beneficiarul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului general în avans 10% din valoarea contractului. Restul sumei se va achita eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și

de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din
se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății
reziliere.

Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va
recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează
să se plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le
suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după efectuarea recepției finale, iar în
cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea
prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă
a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca
fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul contract semnat și înregistrat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietul de sarcini;
- e) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la
data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.03.2012.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 22513014982109

Banca de Economii S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-sef
Vitalie Panurco



S.R.L. "Construm"

or. Chișinău, str. Coca 47

c/f 1002600014031

c/d 22247127

BC „Energbank” S.A.

fil. Botanica

c/b ENEGMD22858

c/TVA 0500138

Director
Igor Ulianov



Plătitor - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

Viceministru



Boris Gherasim

Manager - șef



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 11/12 din 16 iulie 2015

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L 649 Ceadîr Lunga - Congaz, km 10 ÷ 18, Baurci - Congaz (tronsonul 15+400 ÷ 17+600) amplasat teritorial în raioanele Ceadîr Lunga și Comrat, executate în cadrul contractului nr.08 - 18/171 din 04 iulie 2012, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Construm” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor nr. 42 din 15 octombrie 2012, eliberată de Primăria satului Congaz, raionul Comrat și nr. 35 din 22 august 2011 eliberată de Primăria satului Baurci, raionul Ceadîr Lunga, ambele cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 37 din 09.07.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi, joi 16 iulie 2015 fiind formată din:

Președinte	Iu.Pașa	- manager- șef adjunct, Î.S. „ASD”
membri:	A.Cuculescu	- șef, direcția dezvoltarea drumurilor, MTID
	V.Cotruță	- șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
	I.Alexa	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
	P.Spînu	- inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră.
	V.Panfilov	- șef, secție construcție, industrie și infrastructura drumurilor UTA „Găgăuz Eri”
	V.Cernuha	- director, S.A. „Drumuri – Ceadîr Lunga”
	N.Tatar	- director, S.A. „Drumuri – Comrat”

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- a.) executant I.Ulianov - director, S.R.L. „Construm”
- b.) proiectant V.Han - manager de proiect, S.R.L. „Giprostroimost - M”
- c.) responsabil tehnic E.Glădcov - specialist principal, Î.S. „ASD”

4. Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:

- a.) cartea tehnică
- b.) situația obiecțiilor și viciilor depistate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor
- c.) informația investitorului privind comportarea construcției în exploatare în perioada de la recepție la terminarea lucrărilor (9 decembrie 2012) pînă la data recepției finale s-a încadrat în reglementările normativelor în vigoare.

5. Comisia de recepție finală în urma examinării lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate a constatat următoarele:

- a.) lucrările de reparație curentă a drumului au fost complet terminate la data de 9 decembrie 2012.
- b.) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei și pînă în prezent, constatările comisiei fiind – lucrarea e definitivată de construcție fără rezerve și se recomandă spre a fi dată în folosință.

6. Lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Construm”

7. Documentația de proiect și deviz a fost elaborată de S.R.L. „Giprostroimost - M”

8. Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **august 2011** sfârșitul lucrărilor **august 2012**

9. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

a.) Lungimea tronsonului L – 2200 m.l, inclusiv îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic L – 449 m.l, îmbrăcămintea rutieră din piatră spartă L – 1751 m.l.

b.) Lățimea părții carosabile B – 7 m.

Construcția sistemului rutier la îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic: - strat drenat din nisip H – 10 cm, stratul de bază din pietriș H – 29cm (în două straturi) beton asfaltic poros H – 6 cm, beton asfaltic mărunț tip B M II H – 4 cm.

Construcția sistemului rutier la îmbrăcămintea rutieră din pietriș: - (variabilă) îmbrăcămintea existentă a drumului, strat de fundație de pietriș H – 22,0 cm, strat superior din pietriș H – 8 cm, strat drenant din nisip H – 10 cm, strat de bază din pietriș H – 29 cm, (în două straturi) strat superior din pietriș H – 8 cm, rigole consolidate cu beton monolitizat – 1970 m.l, pod -1, podețe - 5 bucăți.

10 Costul lucrărilor conform devizului constituie – **12 700,00 mii lei, inclusiv LCM – 12 500,00 mii lei.**

11. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a drumului menționat constituie – **10 584 627,78 lei, inclusiv LCM – 9 923 257,89 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.**

12 În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate - *abateri de la proiect nu au fost depistate.*

13. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală recomandă admiterea *fără* obiecții a recepției.

14. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file a fost încheiat, astăzi, *101 16 iulie* 2015 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

[Signature]

Iu. Pașa

V.Cernuha

membri:

[Signature]

A.Cuculescu

N.Tatar

[Signature]

V.Cotruța

invitat

[Signature]

I.Alexa

I.Chanov

[Signature]


P.Spinu

P.Hanul

[Signature]

V.Panfilov

E.Gladcov



15. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se recomandă a fi recepționată

2015



Stăvănescu Vasile
(numele, prenumele, funcția)

Nr. 590 din 06.08.2015

16. Lucrarea cu privire la reparația îmbrăcămintei rutiere pe drumul L 649 Ceadr Lunga - Congaz, km 10 ÷ 18, Baurci - Congaz (tronsonul 15 + 400 ÷ 17 + 600) amplasat teritorial în raioanele Ceadr Lunga și Comrat, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ
Direcția construcții și reparații
capitale Î.S. „ASD”

1 iulie 2015

V. Coșuta
V. Coșuta



PRIMITĂ
Direcția întreținere drumuri și poduri
Î.S. „ASD”

1 iulie 2015

P. Triboi
P. Triboi



ACHIZIȚII PUBLICE

publică nr. 15/01380
45233160-8

Digitally signed by Ulian Galina
Date: 2019.04.04 08:51:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/215

03 august 2015



Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 15/01380 din 22.06.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 41 din 02.06.2015, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 022222280 cont de decontare 222450149802110 deschis la Banca de Economii S.A., fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei și S.R.L. "Construm" în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în or. Chișinău, str. E. Coca 47, tel. 592643, fax. 592978, c/f 1002600014031, cont de decontare 22247127 deschis la BC "Energbank" S.A., fil. Botanica, c/b ENEGMD22858, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1002600014031 din 29.05.2008 licență de activitate seria A MMII nr. 038112 din 22.12.2005 valabilă până la 22.12.2015, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții inginerești, reconstrucții, consolidări reprezentată de directorul dl Igor Ulianov.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud a republicii pentru lotul 1 (amplasat teritorial raionul Basarabeasca), lotul 3 (amplasat teritorial în raionul Cantemir), lotul 5 (amplasat teritorial în raionul Leova), lotul 6 (amplasat teritorial în raionul Taraclia), lotul 7 (amplasat teritorial în raionul Comrat), lotul 8 (amplasat teritorial în raionul Ceadâr-Lunga) și lotul 9 (amplasat teritorial în raionul Vulcănești)**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, caietului de sarcini pe loturile nominalizate, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – **15 noiembrie 2015.**

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția de acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Beneficiar vor fi plătite de Beneficiar.

Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va comisia de recepție.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatățile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 6 343 869,42 (șase milioane trei sute patruzeci și trei mii opt sute șazeci și nouă lei, 42 bani) inclusiv TVA:

- la lotul 1 – 509 252,77 (cinci sute nouă mii două sute cincizeci și doi lei, 77 bani) inclusiv TVA;
- la lotul 3 – 1 408 147,66 (un milion patru sute opt mii una sută patruzeci și șapte lei, 66 bani) inclusiv TVA;
- la lotul 5 – 759 315,25 (șapte sute cincizeci și nouă mii trei sute cincisprezece lei, 25 bani) inclusiv TVA;
- la lotul 6 – 828 140,89 (opt sute douăzeci și opt mii una sută patruzeci lei, 89 mii) inclusiv TVA;
- la lotul 7 – 919 176,43 (nouă sute nouăsprezece mii una sută șaptezeci și șase lei, 43 bani) inclusiv TVA;
- la lotul 8 – 1 148 409,34 (un milion una sută patruzeci și opt mii patru sute nouă lei, 34 bani) inclusiv TVA;
- la lotul 9 – 771 427,08 (șapte sute șaptezeci și una mii patru sute douăzeci și șapte lei, 08 bani) inclusiv TVA;

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul 2015, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă **nu va accepta** actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, anajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează a fi plătite în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le plătească Beneficiarul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

Beneficiarul de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (recepției finale).

După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea legilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificările tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 30.03.2016.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110

Banca de Economii S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei



S.R.L. "Construm"

or. Chișinău, str. Coca 47

c/f 1002600014031

c/d 22247127

BC „Energbank” S.A.

fil. Botanica

c/b ENEGMD22858

c/TVA 0500138

Director
Igor Ulianov



Manager – șef



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE

Nr. 14 din 17 februarie 2016

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud raionul Taraclia

Privind lucrările de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud, Lotul 6, raionul Taraclia, drumul L 668 M 3 drum de acces spre or. Taraclia, km 1+000 ÷ 2+000, executate în cadrul contractului nr. 11-18/215 din 03.08.2015, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Construm” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 47 din 01.09.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi miercuri 17 februarie 2016 fiind formată din:

- a.) Președinte P. Triboi - șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD”
- b.) membri: V. Cohanco - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
I. Ulianov - director, S.R.L. „Construm”
I. Bondari - director, S.A. „Drumuri - Cahul”
N. Bocicovar - S.A. „Drumuri - Cahul” sector Taraclia
I. Lozov - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoarele, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Construm”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor septembrie 2015 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2015

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie – **0,96 mln. lei, inclusiv LCM – 0,80 mln. lei**
4. Costul lucrărilor de facto, inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – **855 909,09 lei, LCM – 828 140,89 lei, inclusiv pe drumul L 668 M 3 drum de acces spre or. Taraclia, în valoare de 855 909,09 lei.**

5. Comisia de recepție a lucrărilor executate, propune ca costul volumelor lucrărilor finalizate pe drumul menționat, să fie direcționat la majorarea costului drumului respectiv.

6. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, miercuri 17 februarie 2015 în 3 exemplare.

Comisia:


Președinte

P. Triboi

Membri:

V. Cohar

I. Ulian

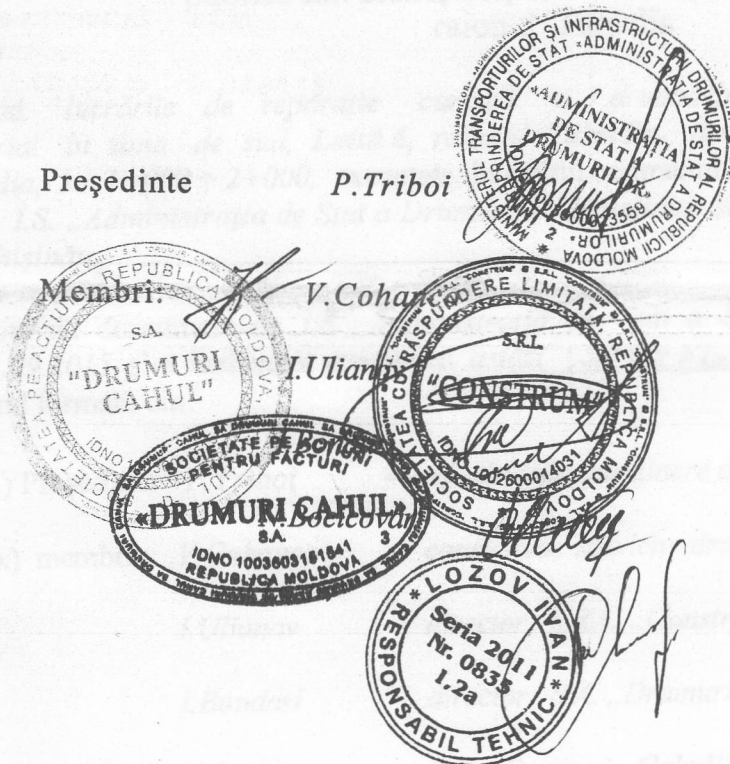

U

Comisia de recepție a lucrărilor executate, propune ca lucrările finalizate pe drumul menționat, să fie direcționate costul drumului respectiv.

Manager – șef _____

Aprob.



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE

Nr. 6 din 11 februarie 2016

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud raionul Ceadăr Lunga

Privind lucrările de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud, **Lotul 8, raionul Ceadăr Lunga, drumul R 36 Basarabeasca – Ceadăr Lunga – Taraclia, km 17+100 ÷ 18+600**, executate în cadrul contractului nr. 11-18/215 din 03.08.2015, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Construm” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 47 din 01.09.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi joi 11 februarie 2016 fiind formată din:

- a.) Președinte *P. Triboi* - șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD”
- b.) membri : *V. Cohanco* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
I. Ulianov - director, S.R.L. „Construm”
V. Cernuha - director, S.A. „Drumuri – Ceadăr Lunga”
Eu. Gladcov - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoarele, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Construm”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **septembrie 2015** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2015**

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie – **1,36 mln. lei, inclusiv LCM – 1,13 mln. lei**


4. Costul lucrărilor de facto, inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – **1 183 896, 01 lei, LCM – 1 148 409, 34 lei, inclusiv pe drumul R 36 Basarabeasca – Ceadăr Lunga – Taraclia, în valoare de 1 183 896, 01 lei.**

5. Comisia de recepție a lucrărilor executate, propune ca costul volumelor lucrărilor finalizate pe drumul menționat, să fie direcționat la majorarea costului drumului respectiv.
6. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 11-02, 2016 în 3 exemplare.

Comisia:

Membri:

I. Uliand

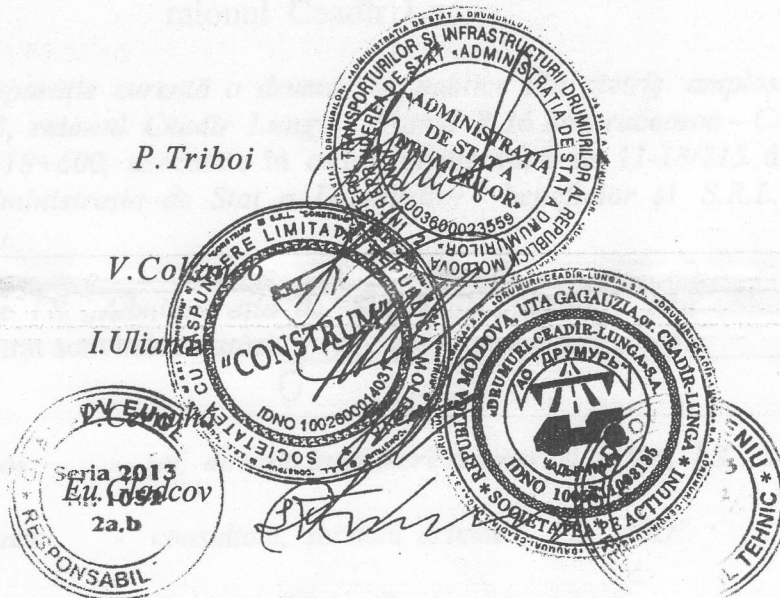

Seria 2013
Eu. Gladcov
2a.b

100

14

Aprob.

Manager – șef

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE

Nr. 2 din 10 februarie 2016

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile
publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud
raionul Comrat

Privind lucrările de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud, **Lotul 7, raionul Comrat, drumurile L 635 Bugeac – Dezghingea – Cenac, km 10+200 ÷ 11+000, L 641.1 drum de acces spre s. Cotovscoe, km 0+300 ÷ 0+700**, executate în cadrul contractului nr.11-18/215 din 03.08.2015, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Construm” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 47 din 01.09.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi marți 10 februarie 2016 fiind formată din:

- a.) Președinte *P.Triboi* - șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *V.Cohanco* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- I.Ulianov* - director, S.R.L. „Construm”
- N.Tatar* - director, S.A. „Drumuri – Comrat”
- Eu.Gladcov* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoarele, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Construm”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor **septembrie 2015** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2015**

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie – **1,08 mln. lei, inclusiv LCM – 0,90 mln. lei**

4. Costul lucrărilor de facto, inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – **956 948, 58 lei, LCM – 919 176, 43 lei, inclusiv pe drumurile L 635 Bugeac – Dezghingea – Cenac, în valoare de 643 344, 12 lei, L 641.1 drum de acces spre s. Cotovscoe, în valoare de 313 604, 46 lei.**

5. Comisia de recepție a lucrărilor executate, propune ca costul volumelor lucrărilor finalizate pe drumurile menționate, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, *miéccuoi*
10 februarie 2016 în 3 exemplare.

Comisia:

Președinte

P. Triboi


Membri:

V. Cohanco

I. Ulianov

N. Tatar

Eu. Gladcov

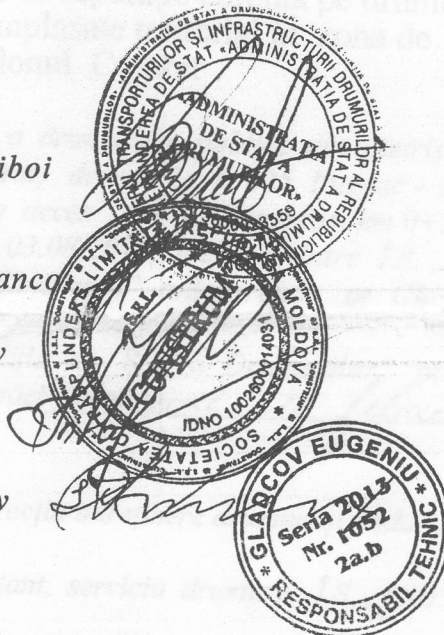

I. Ulianov - director, S.R.L. 'Construm'
N. Tatar - director, S.A. 'Drumuri-Comrat'
Eu. Gladcov - responsabil tehnic, I.S. 'ASD'

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe secțiunile, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul care a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație pe trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. 'Construm'

b.) devizul a fost elaborat de I.S. 'ASD'

c.) lucrările au fost executate în termenii:

Începutul lucrărilor septembrie 2015 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2015


3. Costul lucrărilor conform devizului constituit - 1,08 mln. lei, inclusiv LCM - 0,90 mln. lei

4. Costul lucrărilor de facto, inclusiv cheltuielile Beneficiarului Constituite - 956.948,55 lei, LCM - 919.176,43 lei, inclusiv pe drumurile L 635 Băgac - Dezhingean - Cernăuți, în valoare de 643.344,12 lei, L 641.1 drum de acces spre a. Cotovască, în valoare de 313.604,46 lei.



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 520/12



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 02/L/12
din 30.03.2012

Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 520/12 din 19.03.2012, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 18 din 02.03.2012, între Agentia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare 12, telefon 0/241/2-62-86, fax 0/241/2-62-86, e-mail adsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentat prin Maria Culeșov, director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Primăria satului Cîietu, cu sediul, s. Cîietu, r. Cantemir, tel. 0 (298) 92-436, cod fiscal 1007601007642 prin reprezentantul legal dl. **Dumitru Pîslaru**, Primarul satului Cîietu, numit în continuare **Beneficiar**, altă parte,

și **Societatea Comercială S.R.L. "Construm"**, cu sediul în mun. Chișinău, str. E. Coca, 47, telefon +373 /22/ 59-26-43, 59-32-28 cod fiscal 1002600014031 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0090934 din 29.05.2008, autorizat pentru activitatea în construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții prin licența seria A MMII nr. 038112, din 22.12.2005 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de **5 ani**, prelungită până la 22.12.2015, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentat prin Ulianov Igor, director în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a drumului de acces spre s. Cîietu, sectorul Acui-Dimitrova (etapa I: secțiunea 2 varianta de pietris), din cadrul proiectului „Construcția drumului de acces Dimitrova - Acui”, în conformitate cu



obiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și tehnicile în vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **11 (unsprezece) luni calendaristice** din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice, primirea planului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de plăți.

3.2. Termenul de execuție poate fi prelungit dacă întârzierea executării lucrărilor de datorează constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de **Co-investitor**, Beneficiar, sau altă autoritate publică de stat;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului **Antreprenorului general** sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor, subantreprenor al **Antreprenorului general**;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru **Antreprenorul general**;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a **Co-investitorului**, **Antreprenorul general** va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care **Co-investitorul** consideră necesar. Pe timpul suspendării, **Antreprenorul general** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Co-investitorul**. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de **Antreprenorul general** vor fi plătite de **Co-investitorul**.

3.4. La executarea definitivă a lucrărilor, **Antreprenorul general** va notifica **Co-investitorul** și **Beneficiarul** că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului general**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a **Antreprenorului general**, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Beneficiarul** va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4

VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **14 684 020,90 lei MD (patrusprezece milioane șase sute optzeci și patru noulă mii, douăzeci și două lei, 90 bani MD), inclusiv TVA.**

Co-investitorul va plăti un avans 10% din valoarea lucrărilor stipulată în p.4.1 al prezentului contract, în termen de 30 zile lucrătoare, din momentul înregistrării contractului



Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

mătoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate
integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

ANTREPRENOR

S.R.L. „Construm”

MD-2064, or. Chișinău, str. E.Coca, 47
c/f 1002600014031
cod TVA: 0500138
c/d 22247127
BC „ENERGBANK”, fil. Botanica S.A.
Cod banca: ENEGMD 22858
tel. 0 (22)59-26-43, 59-32-28
fax. 0 (22)59-29-78

Igor ULIANOV

L.Ș.

BENEFICIAR

Primăria satului Cîietu

s. Cîietu, r. Cantemir, R. Moldova
c/f 1007601007642
c/b 226625
c/t 230100000001963
MF Trezoreria de Stat
TREZMD2X

Dumitru PÎSLARU

L.Ș.

CO-INVESTITOR

Agencia de Dezvoltare Regională

Sud

MD-4101 or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare
12

„Banca de Economii”, filial 22, Cimișlia
BECOMD2X622

2224122498318

C/F 1009601000290

Tel./fax: 0 (241) 2-62-86

Maria CULESOV

INVESTITOR:

Agencia de Dezvoltare Regională Sud

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 07.06.2013

privind lucrările *de construcție a drumului de acces spre s. Cîietu, sectorul Acui-Dimitrova (etapa I: secțiunea 2 varianta de pietriș),*

executată la obiectul: „*Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui*”

în cadrul contractului nr. 02/L/12 din 30.03.2012, încheiat între:

Agentia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare 12, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentată prin **Maria Culeșov, director ADR Sud**, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Primăria s. Cîietu, cu sediul în s. Cîietu, r. Cantemir, cod fiscal 1007601007642, reprezentată prin reprezentantul legal dl. **Dumitru Pîslaru, Primarul s. Cîietu**, în calitate de **Beneficiar**, altă parte, și

Societatea Comercială S.R.L. „Construm”, cu sediul în mun. Chișinău, str. E. Coca, 47, cod fiscal 1002600014031, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0090934 din 29.05.2008, autorizat pentru activitatea în construcții prin licența seria A MMII nr. 038112 din 22.12.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită pînă la data de 22.12.2015, reprezentată prin **Ulianov Igor, director**, în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte,

pentru lucrările de *de construcție a drumului de acces spre s. Cîietu, sectorul Acui-Dimitrova (etapa I: secțiunea 2 varianta de pietriș)* în cadrul proiectului „*Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui*”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 02, eliberată de Consiliul
Local Cantemir la data de 18.05.2012, cu valabilitate pînă la 18.05.2014.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.06–07.06.2013, fiind formată din:
Președinte: - **Pîslaru Dumitru**, primarul s. Cîietu, r-nul Cantemir,
Membri: - **Maria Culeșov**, Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud,
- **Valeriu Mocanu**, șef Direcție Construcții și relații Transfrontaliere r. Cantemir,
- **Constantin Stăvilă**, reprezentantul Administrației de Stat a Drumurilor,
- **Sergiu Andronachi**, specialist management proiecte ADR Sud,
- **Tocaru Andrei**, specialistul management proiecte ADR Sud,
- **Dragomir Vera**, contabil-șef primăria s. Cîietu.

3. Au mai participat la recepție:

Valeriu Călin – supraveghetor tehnic al obiectului

Igor Ulianov – director S.C. S.R.L. „Construm”, antreprenor, executorul lucrărilor

Moldovanu Vladimîr – șef Inspectat Ecologică Cantemir

Sandu Eugen – medic igienist C.S.P.

Nastas Anatolie – inspector S.A.I.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De acceptat recepția la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De accepta recepția la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi, 07.06.2013, în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Pislaru Dumitru

Membri: Maria Culeșov

Valeriu Mocanu

Constantin Stăvilă

Sergiu Andronachi

Tocaru Andrei

Dragomir Vera

Specialiști:

Supraveghetor tehnic

Executant

șef Inspectia Ecologica Cantemir

medic igiencist C.S.P.

inspector S.A.I.

Valeriu Călin

Igor Ulianov

Moldovanu Vladimir

Surda Eugen

Nastes Anatolie

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrările de construcție a drumului de acces spre s. Cîietu, sectorul Acui-Dimitrova (etapa I, secțiunea 2 varianta de pietriș).

" " 2013

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de construcție a drumului de acces spre s. Cîietu, sectorul Acui-Dimitrova (etapa I: secțiunea 2 varianta de pietriș) este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Societatea Comercială S.R.L. "Construm"

2013




(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Agentia de Dezvoltare Regională Sud

2013



(semnătura)



ACHIZIȚII PUBLICE

CPV: 45221119-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/591

15 octombrie 2014

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/01841 din 07.10.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 75 din 29.09.2014, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 0 22740570, fax 0 22222280 cont de decontare 222450149802110 deschis la Banca de Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei și S.R.L."Construm" în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în or. Chișinău, str. E. Coca 47, tel. 592643, fax.592978, c/f 1002600014031, cont de decontare 22247127 deschis la BC"Energbank"S.A., fil. Botanica, c/b ENEGMD22858, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1002600014031 din 29.05.2008 licență de activitate seria A MMII nr. 038112 din 22.12.2005 valabilă până la 22.12.2015, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti, reconstrucții, consolidări reprezentată de directorul dl Igor Ulianov.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrărilor de **reparație a podului pe drumul Minjir (raionul Hîncești) – Tomai (raionul Leova)**, PC 2+10,5, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, caietului de sarcini pe lotul nominalizat, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – **30 octombrie 2015.**

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa

cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 746 586,92 (trei milioane șapte sute patruzeci și șase mii cinci sute optzeci și șase lei, 92 bani) cu TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova în limita alocației Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier, eşalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3). Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier în anul 2014 sunt alocate 1 170 000,00 lei (un million una sută șaptezeci mii lei) inclusiv TVA. Beneficiarul va informa în scris Antreprenorul general despre disponibilitatea unor alocații suplimentare față de limita bugetară anuală stabilită.

4.3. La aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015 Beneficiarul prin acord adițional, va include în contract suma alocațiilor financiare pe anul 2015. În cazul nealocării mijloacelor financiare necesare pentru executarea integrală a lucrărilor conform prezentului contract, lucrările vor fi executate în limita alocațiilor financiare, obligațiunile contractuale asumate de către părți fiind îndeplinite și contractul terminat.

4.4. Plata în avans se va efectua în marime de maxim 10% în două etape după depunerea unei garanții de plată a avansului, echivalentă cu suma anticipat achitată:

1) 5% la semnarea contractului și depunerea garanției bancare de bună execuție;

2) 5% la mobilizarea deplină a Antreprenorului pentru a începe lucrările și totodată în funcție de complexitatea lor.

Garanția prezentată de către Antreprenor va fi valabilă și va rămîne în vigoare pînă la data rambursării avansului și valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, incluse în Certificatele de Plată interimare. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției pînă la rambursarea plății în avans. Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată interimare.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale).

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 30.03.2016.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucurei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110

Banca de Economii S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei



S.R.L. "Construm"

or. Chișinău, str. Coca 47

c/f 1002600014031

c/d 22247127

BC „Energbank” S.A.

fil. Botanica


c/b ENEGMD2X609

c/TVA 0500138

Director
Igor Ulianov



Manager - șef interimar



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

din 24 mai 2016

Privind lucrările de construcție a podului pe drumul L 568 Mingir – Tomai PC 2 + 105, executate în cadrul contractului nr. 08 - 18/591 din 15.10.2014, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Construm” or. Chișinău, antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 22 din 23 martie 2015, eliberată de Consiliul Raional Hîncești cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 48 din 10.09.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi, miercuri 16 septembrie 2015 fiind formată din:

- a) Președinte: *Iu. Pașa* - manager - șef adjunct, Î.S. „ASD”
- b) membri:
- A. Cuculescu* - șef, direcția dezvoltare a drumurilor, MTID
 - V. Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
 - I. Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
 - S. Stratulat* - șef serviciu poduri, Î.S. „ASD”
 - N. Orheianu* - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul Raional Hîncești
 - P. Spînu* - inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
 - Ș. Caunov* - director S.A. „Drumuri – Ialoveni”
 - R. Nagacevski* - S.A. „Drumuri – Ialoveni” sector Hîncești

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- a.) executant *I. Ulianov* - director, S.R.L. „Construm”
- b.) proiectant *S. Ponomari* - șef de echipă a Departamentului poduri, S.R.L. „Universinij”
- c.) responsabil tehnic *A. Nagacevski* - specialist principal, Î.S. „ASD”

4. Comisia de recepție a constatat - lucrarea privind construcția podului pe drumul L 568 Mingir – Tomai e definitivată de construcție cu rezerve și concluzionează că aceasta poate fi dată în folosință.

- a.) Lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Construm”
- b.) Documentația de proiect a fost elaborată de S.R.L. „Universinij”
- c.) Documentația de proiect a fost aprobată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 312 din 12.12.2012
- d.) lucrările de construcție-montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor *decembrie 2014* sfîrșitul lucrărilor *august 2015*

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a.) Situația lucrărilor executate - cartea tehnică
- b.) Situația obiectiilor

*Se așază transportul din Chișinău, din Focșani
și din Podușanca.*

6. Podul supus recepției are următorii indici tehnici de bază:

Pod cu o deschidere $L - 12 \text{ m}$, gabaritul podului $- 7 \text{ m} + 2 \times 1,75 \text{ m}$, **fundația:** piloți forajați $- L - 14 \text{ m}$, $\varnothing - 0,55 \text{ m} - 22$ bucăți, **infrastructura:** culee monolite $- 2$ bucăți, **suprastructura:** grinzi monolitizate $L - 12 \text{ m} - 6$ bucăți, strat de egalizare, strat de hidroizolație, strat de protecție, îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic $H - 7 \text{ cm}$ (formată din 2 straturi $H 4 + H 3$), **siguranța:** parapet de siguranță $- 21 \text{ m}$ pe ambele părți, parapet pietonal $- 21 \text{ m}$ pe ambele părți, albia râului sub pod, la intrare și ieșire consolidată cu beton monolit $H - 12 \text{ cm}$.

7. Costul lucrărilor conform devizului aprobat constituie $- 4,01 \text{ mln. lei}$, inclusiv **LCM $- 3,80 \text{ mln. lei}$.**

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a podului constituie $- 3\,891\,031,66 \text{ lei}$, inclusiv **LCM $- 3\,746\,586,92 \text{ lei}$** , care vor fi direcționate la majorarea costului podului respectiv.

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate $-$ **abateri de la proiect nu au fost depistate.**

10. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea ~~ce~~ obiecții a recepției.

11. Prezentul proces-verbal conținând 2 file și 1 anexă a fost încheiat astăzi, *miercuri* 16 septembrie 2015, în 6 exemplare.

Comisia de recepție :

Președinte

Membri:

V. Cotruță

I. Alexa

S. Străluț

S. Orghianu

S. Ponomarev

I. Ulianov

S. Nagacevski

S. Ponomarev

I. Ulianov

S. Nagacevski

S. Ponomarev

I. Ulianov

S. Nagacevski

S. Ponomarev

I. Ulianov

S. Nagacevski

12. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Se recomandă recepția la

06.09.2016

13. Lucrarea privind construcția podului pe drumul L 568 Mingir - Tomai PC 2 + 105, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL

S.R.L. „Construm”

septembrie 2015

I. Ulianov

PRIMITĂ - INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

septembrie 2015

2015

V. Cotruță
