



CONTRACT FOR WORKS

Date: 10 June 2021

Dear Sir,

Ref.: **00106290/ EU4Moldova: Focal Regions**
ItB21/02214: Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage **SC NOUCONST SRL**, duly incorporated under the Laws of Moldova, Republic of (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **works for construction of dry-type pedestrian fountain, repair of road pavement and construction of parking lots in Ungheni municipality, as part of the project "Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre"** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
- a) this Contract;
 - b) Annex 1 – the General Conditions of Contract for Civil Works
 - c) Annex II – the Contractor's **Price Schedule and Priced Bill of Quantities**, dated 12/04/2021, attached hereto and the Contractor's technical bid, not attached hereto but known to and in the possession of both parties
 - d) the Technical Specifications and Drawings [as listed below], not attached hereto but known to and in the possession of both parties:
 - i. PROIECT DE EXECUTIE 02/20 – RAC Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str. Nationala, Piata Independentiei or. Ungheni, Designer: ART FACTORY SRL;
 - ii. PROIECT DE EXECUTIE 05/2020 – REAE Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str. Nationala, Piata Independentiei or. Ungheni, Designer: Electro Service Grup SRL;
 - iii. PROIECT DE EXECUTIE 204/2020 – D Reparatie imbracamintei rutiere din st. Nationala, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins intre str. Romana si str. Stefan cel Mare in or. Ungheni, Designer: SIMBO-PROIECT SRL;
 - iv. PROIECT DE EXECUTIE 205/2019 – P Amenajarea parcarilor in zona centrala a or. Ungheni (str. Alexandru cel Bun si str. Mihai Eminescu), Designer: SIMBO-PROIECT SRL.
- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

Digitally signed by Scorobogateo Vadim
Date: 2022.10.17 08:57:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DS

SC "NOUCONST" SRL
#94, Petricani Sreet, Chisinau MD-2059

2. Obligations of the Contractor

- 2.1 The Contractor shall commence work within **15 calendar days** from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **28 December 2021**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.
- 2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **17 June 2021**.
- 2.3 This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on **30 December, 2022**.
- 2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **US\$ 1,398,384.71 [one million three hundred ninety eight thousand three hundred and eighty four US dollars 71 cents]**.
- 3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.4 The Contractor shall submit an invoice for advance payment in an amount of **US\$ 29,000.00 [twenty-nine thousand US dollars]** upon signature of this Contract by both parties, invoices for the work performed and materials utilized every 20-40 days and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.
- 3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

3.7 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Final Completion by the Engineer.

4. Special conditions

4.1 The **Performance GUARANTEE** referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **US\$ 139,838.47 [10% of the total contract value] within a maximum of fifteen (15) days of the contract signature by both parties.**

4.2 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.3 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **2.5%** of the price of the Contract per week of delay, up to a maximum of **10%** of the final price of the Contract.

5. Submission of invoices

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK: BC "Moldindconbank" S.A. fil. "Renastere" Chişinău

SWIFT: MOLDMD2X312

IBAN: MD20 ML00 0000 02251 2123 039

Contractor Fiscal Code: 1005600012120

7. Modifications

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. Notifications

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Alexandru PELIVAN, EU4MD Programme Manager, UNDP Moldova
#131, 31 August 1989 Street, MD 2012 Chisinau, Moldova
e-mail: alexandru.pelivan@undp.org

DS

For the Contractor:

Dorin ODOVENCO, Construction Manager
#94, Petricani Sreet, Chisinau MD 2059, Moldova
GSM: (+373) 068 146 700
e-mail: dorin.odovenco@nouconst.md; vadim.scorobogatco@nouconst.md

- 8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie VIERU, EU4MD Project Officer/ Infrastructure
#104 Sciusev Street, Chisinau, Moldova
GSM: +373 799 98802
vitalie.vieru@undp.org

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.



Yours sincerely,

Andrea Cuzyova

Andrea CUZYOVA
Deputy Resident Representative
UNDP Moldova

For **SC NOUCONST SRL**

Agreed and Accepted.

Signature

Name Vadim SCOROBOGATCO

Title Administrator

Date 12.06.2012



DS

INVESTITOR: EU4MOLDOVA – regiuni cheie
BENEFICIAR: Primăria mun. Ungheni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 03 din 21.04.2022

privind *"Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcarilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" executată în cadrul contractului nr. ITB21/02214 din 10.06.2021 încheiat între Programul EU4Moldova – regiuni cheie finanțat de UE și implementat de PNUD Moldova și UNICEF Moldova și SRL "Nouconst" pentru lucrările de construcție a havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni, lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni, amenajarea parcarilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu).*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire nr. 36, 37,38 din 07.06.2021;

2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 20-21 aprilie 2022, fiind formată din:

Presedinte:

- Ion Galușcă, viceprimarul municipiului Ungheni

Membri:

- Vitalie Vieru – inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Eugenia Lebeda - inginer cons. ant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Liliana Tincu - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie
- Vlad Savin – arhitect-șef Primăria mun. Ungheni
- Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Tatiana Pavliuc – contabil - șef Primăria mun. Ungheni
- Emanoil Mocanu – responsabil tehnic domeniul construcții rutiere
- Iacob Mihailov – responsabil tehnic domeniul construcții civile

3. Au mai participat la recepție:

Odorencu Dorin manager proiect
(numele, prenumele) (calitatea)

Furduja Alexei diriginte de șantier
(numele, prenumele) (calitatea)

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor conform scrisorii nr. 122/04 din 07 aprilie 2022 de la SRL "Nouconst".

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- Executarea volumului de lucrări prezentat în caietul de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Organizarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 3600, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal (nu este necesar).

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 21.04.2022 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție :

Președinte:

- Ion Galușcă

Membri :

- Vitalie Vieru

- Eugenia Lebeda

- Liliana Tincu


- Vlad Savin

- Anastasia Litviniuc

- Tatiana Pavliuc

- Emanoil Mocanu

- Iacob Mihailev

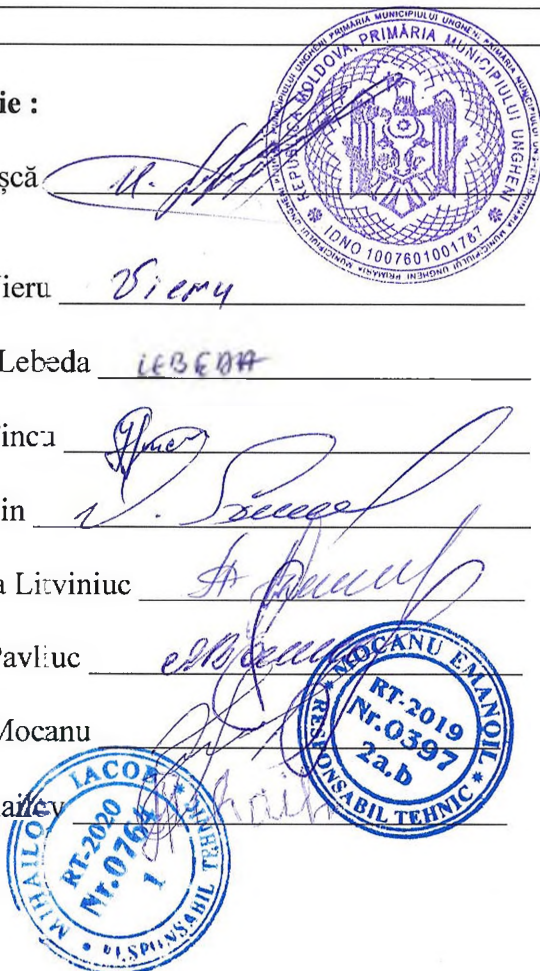

Invitati:

Dobrovenco Dorin

Furfună Alexei




10. Lucrarea "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcarilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" este :




Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

[Large handwritten signature]

- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie Vieru
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie LEBEDA
- **Liliana Tincu**, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie Tincu
- **Vlad Savin**, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Anastasia Litviniuc**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Emanoil Mocanu**, responsabil tehnic domeniul construcții rutiere _____
- **Iacob Mihailov**, responsabil tehnic domeniul construcții civile _____



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.







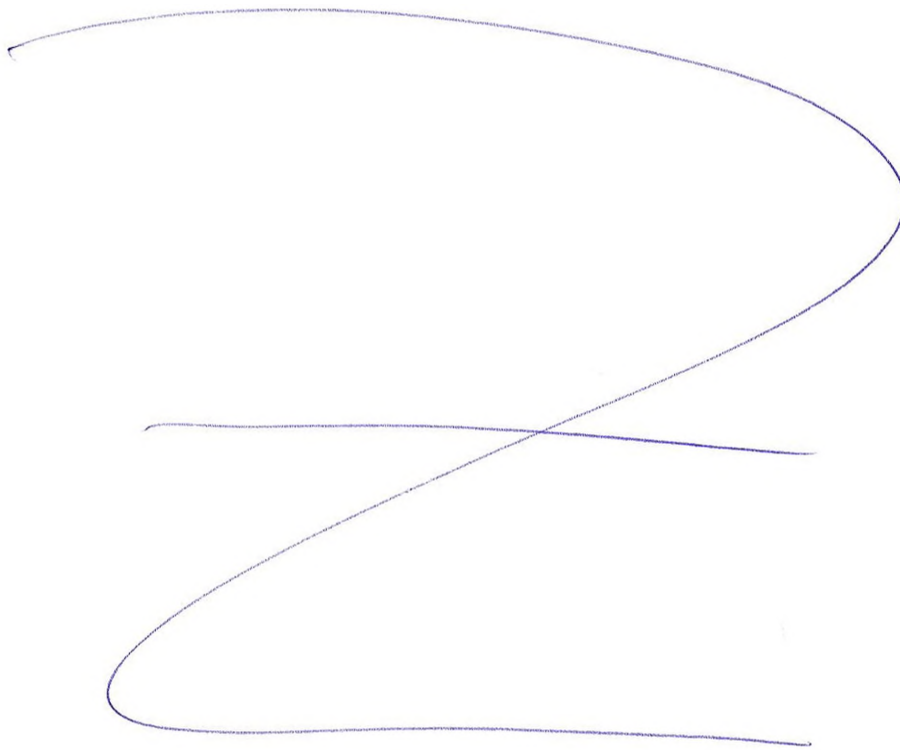


- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie _____
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie LEBEDA
- **Liliana Tincu**, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie _____
- **Vlad Savin**, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Anastasia Litviniuc**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Emanoil Mocanu**, responsabil tehnic domeniul construcții rutiere _____
- **Iacob Mihailov**, responsabil tehnic domeniul construcții rutiere _____



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

2

- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni 
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- **Liliana Tincu**, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni - cheie 
- **Vlad Savin**, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni 
- **Anastasia Litviniuc**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni 
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni 
- **Emanoil Mocanu**, responsabil tehnic domeniul construcții rutiere 
- **Iacob Mihailov**, responsabil tehnic domeniul construcții civile 





Republica Moldova

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Proiectul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale

ANGAJATORUL:



**Î.S. “Administrația de Stat a
Drumurilor”**

CONTRACTORUL:



S.C. „NOUCONST” S.R.L.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13,

**Contractul 4: LRIP/W4/04: “Drumul L431 Păruceni -
Seliște -Vînători, km 0+000 - km 4+200” și “Drumul de
acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km 3+600”**

Finanțat de către
Asociația Internațională de Dezvoltare (AID)

DOCUMENTE CONTRACTUALE

VOLUMUL 1

Chișinău

Iulie 19, 2019

DOCUMENTUL CONTRACTUAL

Contractul de lucrări Nr. LRIP/W4/04

CUPRINS

VOLUMUL 1

Acord Contractual

Scrisoare de acceptare

Oferta Contractorului

VOLUMUL 2

Condiții Speciale ale Contractului

Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexele

VOLUMUL 3

Specificații Tehnice

VOLUMUL 4

Desene

VOLUMUL 5

Preambul la lista de cantități

Lista de Cantități

VOLUMUL 6

A. Planul de management de mediu și social (PMMS)

B. Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii)

etc

Acord Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi ____ iulie 2019, între **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu adresa juridică: str. Bucureiei, 12A, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Angajator"), pe de o parte, și **SC „NOUCONST” SRL**, cu adresa juridică: str. Petricani, 94, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Contractor"), pe de altă parte:

ÎNTRUCÂT Angajatorul dorește ca **Lucrările de îmbunătățire a Coridorului 13, în cadrul Contractului 4: LRIP/W4/04: „Drumul L431 Păruceni - Seliște - Vînători, km 0+000 - km 4+200” și „Drumul de acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km 3+600”** să fie executate de Contractor și a acceptat Oferta Contractorului pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remediere a oricăror defecte ale acestora,

Angajatorul și Contractorul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.

2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.

- (a) Scrisoarea de Acceptare,
- (b) Oferta Contractorului,
- (c) Condiții Speciale ale Contractului (CSC),
- (d) Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexe,
- (e) Specificații Tehnice,
- (f) Desene,
- (g) Lista de cantități,
- (h) Planul de management de mediu și social (PMMS),
- (i) Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii) și
- (j) Orice alt document menționat în CSC ca făcând parte din Contract.

3. În considerarea plăților care trebuie efectuate de către Angajator Contractorului, Contractorul convine cu Angajatorul prin prezentul acord să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în toate privințele și în conformitate cu prevederile Contractului.

4. Angajatorul se obligă să plătească Contractorului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și a remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătitibilă în conformitate cu prevederile Contractului în momentul și în modul prevăzut de Contract.

Drept pentru care Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Semnat de: **Gheorghe CUMEL,**
Director General

Pentru și în numele Angajatorului

în prezența:

Martor:

Numele: *Moritalo Galian*

Adresa: str. Bucuriei 12A, mun. Chisinau, MD
2004, Republica Moldova

Semnat de: **Vadim SCOROBOGATCO,**
Administrator

Pentru și în numele Contractorului

în prezența:

Martor:

Numele: *Odorenco Dorin*

Adresa: str. Petricani 94, mun. Chișinău, MD
2059, Republica Moldova



**Î.S."ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”**

IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chisinau, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

05.06.2019 nr. 05-11/1633

Către: SC „NOUCONST” SRL

Str. Petricani 94, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2059.

Subiect: Notificare de Adjudecare a Contractului Nr. LRIP/W4/04

Scrisoare de Acceptare

Prin aceasta sunteți informați că Oferta dumneavoastră, datată cu 15 martie 2019, pentru executarea Lucrărilor de îmbunătățire a Coridorului 13, în cadrul Contractului 4: LRIP/W4/04: „Drumul L431 Pâruceni - Seliște - Vinători, km 0+000 - km 4+200” și „Drumul de acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km 3+600” în valoarea totală de **73 073 399,95 MDL (șaptezeci și trei milioane șaptezeci și trei mii trei sute nouăzeci și nouă lei, nouăzeci și cinci bani)**, este prin prezenta acceptată de către Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Sunteți solicitat să furnizați în termen de 28 de zile:

1. Garanția de bună execuție, în conformitate cu condițiile Contractului, folosind în acest scop Formularul garanției de bună execuție inclus în Secțiunea X – Formulare ale Contractului din Documentele de Licitatie.
2. Confirmarea că întreprindeți toate acțiunile necesare în vederea obținerii Asigurărilor, în termenul și suma solicitate, conform prevederilor Condițiilor Contractuale.
3. Confirmarea că personalul esențial propus pentru Contractul LRIP/W4/04 urmează a fi înlocuit cu unul nou (total diferit de cel propus pentru Contractele LRIP/W3/02 și LRIP/W4/03) și va corespunde criteriilor de calificare din tabelul „Personal Esențial” Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare. În acest sens, CV-urile și detaliile despre personalul esențial împreună cu calificările academice și experiența profesională, conform Formulelor relevante din Secțiunea IV – Formulare de Ofertare, urmează a fi prezentate Angajatorului spre aprobare, înainte de semnarea Contractului.
4. Confirmarea că veți întreprinde toate măsurile necesare pentru a vă asigura că progresul lucrărilor din cadrul Contractelor LRIP/W4/03 și LRIP/W4/04 nu va fi afectat într-un mod negativ, dat fiind faptul că echipamentul propus de către dumneavoastră pentru Contractele menționate este același ca și pentru Contractul LRIP/W3/02, care a fost deja semnat cu SC „NOUCONST” SRL. În acest sens, veți asigura disponibilitatea pe șantier a echipamentului solicitat în conformitate cu documentele de licitație, Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare, paragraful 3.6 [Echipament].

În conformitate cu IPO 43.1 din Documentele de Licitatie, candidatura lui Samuel BARR, Marea Britanie, propus de Angajator în calitate de Adjudecător este acceptată.

Semnătura autorizată: _____

Numele și funcția semnatarului: **Gheorghe CURMEL**, Director General

Numele Agenției: Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”

Anexă: Acordul Contractual

Data: 15.03.2019

Nr. LNC: LRIP/W4/01-04 "Drumul L431 Păruceni – Seliste – Vinători km 0+000 – 4+200 și Drum de acces R25 – sat. Seliste, km 0+000 – 3+600"

Invitația de Participare la Licitatia nr.: LRIP/W4/01-04,

Către: I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

- (a) Am examinat Documentația de Licitatie și nu avem rezerve față de aceasta, inclusiv amendamentele emise în conformitate cu instrucțiunile pentru Ofertanți (IPO 8) _____;
- (b) Întrunim cerințele de eligibilitate și nu avem nici un conflict de interese în conformitate cu IPO 4;
- (c) Nu am fost suspendați, nici declarați neeligibili de către Angajator pe baza executării unei Declarații de Garantare a Ofertei în țara Angajatorului, conform IPO 4.6.
- (d) Ne oferim să executăm, în conformitate cu Documentația de Licitatie, următoarele Lucrări:
"Drumul L431 Păruceni – Seliste – Vinători km 0+000 – 4+200 și Drum de acces R25 – sat. Seliste, km 0+000 – 3+600"
- (e) Prețul total al Ofertei noastre, fără discounturile oferite la punctul (f) de mai jos, este:
În cazul unui singur lot, prețul total al Ofertei: (73 073 269,12 șaptezeci și trei milioane șaptezeci și trei mii două sute șazeci și nouă lei și 12 bani)
În cazul mai multor loturi, prețul total al fiecărui lot *nu este aplicabil*
În cazul mai multor loturi, prețul total al tuturor loturilor (suma loturilor) *nu este aplicabil*
- (f) Discounturile oferite și metodologia pentru aplicarea lor sunt:
- i) Discounturile oferite sunt: nu sunt
- ii) Metoda exacta de calcul pentru stabilirea pretului net după aplicarea discounturilor este prezentată mai jos: nu este aplicabil
- (g) Oferta este valabilă pe o perioadă de 120 (una sută douăzeci) zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertelor conform Documentației de Licitatie, și rămâne obligatorie pentru noi, putând fi acceptată de dvs. oricând până la expirarea acestei perioade;

- (h) În cazul în care oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obținem garanția de bună execuție conform Documentației de Licitare.
- (i) Nu participăm, ca ofertant sau subcontractor, la mai mult de o ofertă în acest proces de licitație, conform IPO 4.2 (e), alta decât ofertele alternative prezentate conform IPO 13;
- (j) Noi, inclusiv oricare din subcontractorii, furnizorii, consultanții, producătorii, sau prestatorii noștri de servicii pentru oricare parte a Contractului, nu am constituit subiectul, și nefiind controlați de oricare entitate sau persoană care constituie subiectul, al unei suspendări temporare sau descalificări impuse de un membru al Grupului Banca Mondială, sau al unei descalificări impuse de Grupului Banca Mondială, în conformitate cu Acordul reciproc de executare a deciziilor de descalificare între Banca Mondială și alte bănci de dezvoltare. Mai mult ca atât, nu suntem declarați neeligibili în baza legilor sau regulamentelor oficiale din țara Angajatorului sau printr-un act de respectare a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite;
- (k) Nu suntem o entitate deținută de Guvern;
- (l) Am achitat sau vom achita următoarele comisioane, gratuități sau taxe cu privire la procesul de licitație sau la executarea Contractului: NU
- (m) Înțelegem faptul că această ofertă, împreună cu acceptarea de către dvs. în scris a acesteia, inclusă în notificarea de atribuire, va constitui un contract obligatoriu între noi, până la întocmirea și semnarea unui contract oficial; și
- (n) Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu prețul cel mai scăzut sau orice ofertă primită.
- (o) Prin prezenta, confirmăm faptul că am luat măsuri pentru a asigura neimplicarea în acte de fraudă sau corupție a vreunei persoane care acționează pentru noi sau în numele nostrum.

Numele ofertantului: S.C. Nouconst S.R.L.

Numele persoanei autorizate să semneze oferta în numele Ofertantului: **Vadim Scorobogateo**

Funcția persoanei care semnează oferta: **administrator;**

Semnătura persoanei numite mai sus: _____

Data semnării: 15.03.2019



Republica Moldova

Ministerul Economiei și Infrastructurii

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Proiectul de Îmbunătățire a Drumurilor Locale

ANGAJATORUL:



**Î.S. “Administrația de Stat a
Drumurilor”**

CONTRACTORUL:



S.C. „NOUCONST” S.R.L.

Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13,

Contractul 3: LRIP/W4/03: "Drumul L390 Pîrlița- Nisporeni, km 23+400 – km 32+942"

Finanțat de către
Asociația Internațională de Dezvoltare (AID)

DOCUMENTE CONTRACTUALE

VOLUMUL 1

Chișinău

Iulie 12, 2019

DOCUMENTUL CONTRACTUAL

Contractul de lucrări Nr. LRIP/W4/03

CUPRINS

VOLUMUL 1

Acord Contractual

Scrisoare de acceptare

Oferta Contractorului

VOLUMUL 2

Condiții Speciale ale Contractului

Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexele

VOLUMUL 3

Specificații Tehnice

VOLUMUL 4

Desene

VOLUMUL 5

Preambul la lista de cantități

Lista de Cantități

VOLUMUL 6

A. Planul de management de mediu și social (PMMS)

B. Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii)

N.A.

Acord Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 12 iulie 2019, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu adresa juridică: str. Bucurei, 12A, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Angajator"), pe de o parte, și **SC „NOUCONST” SRL**, cu adresa juridică: str. Petricani, 94, mun. Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare "Contractor"), pe de altă parte:

ÎNTRUCĂT Angajatorul dorește ca **Lucrările de îmbunătățire a Coridorului 13, în cadrul Contractului 3: LRIP/W4/03: „Drumul L390 Pîrlița-Nisporeni, km 23+400 – km 32+942”** să fie executate de Contractor și a acceptat Oferta Contractorului pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remediere a oricăror defecte ale acestora,

Angajatorul și Contractorul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
 - (a) Scrisoarea de Acceptare,
 - (b) Oferta Contractorului,
 - (c) Condiții Speciale ale Contractului (CSC),
 - (d) Condiții Generale ale Contractului, inclusiv Anexe,
 - (e) Specificații Tehnice,
 - (f) Desene,
 - (g) Lista de cantități,
 - (h) Planul de management de mediu și social (PMMS),
 - (i) Codul de conduită (MSSS) (măsuri de protecție a muncii) și
 - (j) Orice alt document menționat în CSC ca făcând parte din Contract.
3. În considerarea plăților care trebuie efectuate de către Angajator Contractorului, Contractorul convine cu Angajatorul prin prezentul acord să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în toate privințele și în conformitate cu prevederile Contractului.
4. Angajatorul se obligă să plătească Contractorului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și a remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului în momentul și în modul prevăzut de Contract.

N.A.

Drept pentru care Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Semnăt de: **Gheorghe CURMEI,**
Director General

Pentru și în numele Angajatorului

în prezența:

Martor:

Numele: *Mornealo*

Adresa: str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău, MD
2004, Republica Moldova

Semnăt de: **Vadim SCOROBOGATCO,**
Administrator

Pentru și în numele Contractorului

în prezența:

Martor:

Numele: *Odaveneo Dorin*

Adresa: str. Petricani 94, mun. Chișinău, MD
2059, Republica Moldova

N.A.



Î.S. "ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
S.E. "STATE ROAD ADMINISTRATION"

IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chisinau, str. Bucurei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

05.06.2019 nr. 05-11/1632

Către: SC „NOUCONST” SRL
Str. Petricani 94, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2059.

Subiect: Notificare de Adjudecare a Contractului Nr. LRIP/W4/03

Scrisoare de Acceptare

Prin aceasta sunteți informați că Oferta dumneavoastră, datată cu 15 martie 2019, pentru executarea Lucrărilor de îmbunătățire a Coridorului 13, în cadrul Contractului 3: LRIP/W4/03: „Drumul L390 Pîrlița-Nisporeni, km 23+400 – km 32+942” în valoarea totală de **70 974 287,83 MDL (șaptezeci milioane nouă sute șaptezeci și patru mii două sute optzeci și șapte lei, optzeci și trei bani)**, este prin prezenta acceptată de către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Sunteți solicitat să furnizați în termen de 28 de zile:

1. Garanția de bună execuție, în conformitate cu condițiile Contractului, folosind în acest scop Formularul garanției de bună execuție inclus în Secțiunea X – Formulare ale Contractului din Documentele de Licitatie.
2. Confirmarea că întreprindeți toate acțiunile necesare în vederea obținerii Asigurărilor, în termenul și suma solicitate, conform prevederilor Condițiilor Contractuale.
3. Confirmarea că personalul esențial propus pentru Contractul LRIP/W4/03 urmează a fi înlocuit cu unul nou (total diferit de cel propus pentru Contractele LRIP/W3/02 și LRIP/W4/04) și va corespunde criteriilor de calificare din tabelul „Personal Esențial” Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare. În acest sens, CV-urile și detaliile despre personalul esențial împreună cu calificările academice și experiența profesională, conform Formulelor relevante din Secțiunea IV – Formulare de Ofertare, urmează a fi prezentate Angajatorului spre aprobare, înainte de semnarea Contractului.
4. Confirmarea că veți întreprinde toate măsurile necesare pentru a vă asigura că progresul lucrărilor din cadrul Contractelor LRIP/W4/03 și LRIP/W4/04 nu va fi afectat într-un mod negativ, dat fiind faptul că echipamentul propus de către dumneavoastră pentru Contractele menționate este același ca și pentru Contractul LRIP/W3/02, care a fost deja semnat cu SC „NOUCONST” SRL. În acest sens, veți asigura disponibilitatea pe șantier a echipamentului solicitat în conformitate cu documentele de licitație, Secțiunea III - Criterii de Evaluare și Calificare, paragraful 3.6 [Echipament].

În conformitate cu IPO 43.1 din Documentele de Licitatie, candidatura lui Samuel BARR, Marea Britanie, propus de Angajator în calitate de Adjudecător este acceptată.

Semnătura autorizată: _____

Numele și funcția semnatarului: **Gheorghe CURMEL**, Director General

Numele Agenției: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Anexă: Acordul Contractual

N.A.

Data: 15.03.2019

Nr. LNC: LRIP/W4/01-03 "Drum L390 Pîrlita – Nisporeni km 23+400 – km 32+942"

Invitația de Participare la Licităția nr.: LRIP/W4/01-4,

Către: Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

- (a) Am examinat Documentația de Licităție și nu avem rezerve față de aceasta, inclusiv amendamentele emise în conformitate cu instrucțiunile pentru Ofertanți (IPO 8) _____;
- (b) Întrunim cerințele de eligibilitate și nu avem nici un conflict de interese în conformitate cu IPO 4;
- (c) Nu am fost suspendați, nici declarați neeligibili de către Angajator pe baza executării unei Declarații de Garantare a Ofertei în țara Angajatorului, conform IPO 4.6.
- (d) Ne oferim să executăm, în conformitate cu Documentația de Licităție, următoarele Lucrări:
"Drumul L390 Pîrlita – Nisporeni. km 23+400 – km 32+942";
- (e) Prețul total al Ofertei noastre, fără discounturile oferite la punctul (f) de mai jos, este:
În cazul unui singur lot, prețul total al Ofertei: **(70 974 287,83 șaptezeci milioane nouă sute șaptezeci și patru mii două sute optzeci și șapte lei și 83 bani)**

În cazul mai multor loturi, prețul total al fiecărui lot *nu este aplicabil*

În cazul mai multor loturi, prețul total al tuturor loturilor (suma loturilor) *nu este aplicabil*
- (f) Discounturile oferite și metodologia pentru aplicarea lor sunt:
- i) Discounturile oferite sunt: nu sunt
- ii) Metoda exacta de calcul pentru stabilirea prețului net după aplicarea discounturilor este prezentată mai jos: nu este aplicabil
- (g) Oferta este valabilă pe o perioadă de **120 (una sută douăzeci) zile calendaristice** de la data limită de depunere a ofertelor conform Documentației de Licităție, și rămîne obligatorie pentru noi, putînd fi acceptată de dvs. oricînd pînă la expirarea acestei perioade;
- (h) În cazul în care oferta noastră este acceptată, ne angajăm să obținem garanția de bună execuție conform Documentației de Licităție.

SC „Nouconst” SRL, mun. Chișinău, str. Petricani, 94, tel/fax 0-22-788800
cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. fil. 10 Chisinau
SWIFT: AGRNMD2X, IBAN lei: MD68AG000000002251679079

- (i) Nu participăm, ca ofertant sau subcontractor, la mai mult de o ofertă în acest proces de licitație, conform IPO 4.2 (e), alta decât ofertele alternative prezentate conform IPO 13;
- (j) Noi, inclusiv oricare din subcontractorii, furnizorii, consultanții, producătorii, sau prestatorii noștri de servicii pentru oricare parte a Contractului, nu am constituit subiectul, și nefiind controlați de oricare entitate sau persoană care constituie subiectul, al unei suspendări temporare sau descalificări impuse de un membru al Grupului Banca Mondială, sau al unei descalificări impuse de Grupului Banca Mondială, în conformitate cu Acordul reciproc de executare a deciziilor de descalificare între Banca Mondială și alte bănci de dezvoltare. Mai mult ca atât, nu suntem declarați neeligibili în baza legilor sau regulamentelor oficiale din țara Angajatorului sau printr-un act de respectare a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite;
- (k) Nu suntem o entitate deținută de Guvern;
- (l) Am achitat sau vom achita următoarele comisioane, gratuități sau taxe cu privire la procesul de licitație sau la executarea Contractului: NU
- (m) Înțelegem faptul că această ofertă, împreună cu acceptarea de către dvs. în scris a acesteia, inclusă în notificarea de atribuire, va constitui un contract obligatoriu între noi, până la întocmirea și semnarea unui contract oficial; și
- (n) Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu prețul cel mai scăzut sau orice ofertă primită.
- (o) Prin prezenta, confirmăm faptul că am luat măsuri pentru a asigura neimplicarea în acte de fraudă sau corupție a vreunei persoane care acționează pentru noi sau în numele nostrum.

Numele ofertantului: S.C. Nouconst S.R.L.

Numele persoanei autorizate să semneze oferta în numele Ofertantului: **Vădīm Scorobogatco**

Funcția persoanei care semnează oferta: **administrator;**

Semnătura persoanei numite mai sus: _____

Data semnării: 15.03.2019



N.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 71 din 28 decembrie 2020

Privind „ Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 ”Drumul L390 Pirlita-Nisporeni, km 23+400 - km 32+942”, executat în cadrul contractului: nr. LRIP/W4/03 din 12.07.2019, încheiate între Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și Nouconst S.R.L., (Moldova), antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 24.07.2019 eliberată de Consiliul Raional Nisporeni.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 285 din 18 decembrie 2020 și-a desfășurat activitatea astăzi 22 decembrie 2020

- a) Președinte: I. Mornealo - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b) membri
- | | |
|--------------|--|
| Iu. Pașa | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| R. Rogovei | - șef direcție infrastructura de transport, MEI |
| P. Triboi | - șef direcție întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD” |
| A. Rogai | - șef secție management ingineresc |
| V. Ivanov | - auditor intern al aparatului Președintelui Raionului Nisporeni |
| S. Marian | - ofițer sistematizarea circulației rutiere al SST și AR al IP Nisporeni |
| S. Caunov | - director, S.A. „Drumuri – Ialoveni” |
| T. Vasilache | - șef, S.A. „Drumuri – Ialoveni” district Nisporeni |

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- | | |
|-----------------|--|
| A. Ursu | - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor ”Tecnic Hill Sweroad ” |
| V. Scorobogatco | - executant, ”Nouconst S.R.L.” |
| A. Efros | - proiectant S.R.L. ”Universinj” |
| A. Rogut | - responsabil tehnic, ” Tecnic Hill Sweroad” |

4. Comisia de recepție a constatat că:

Lucrările au fost executate conform proiectului și documentației tehnice.

- a) Lucrările de construcție au fost executate de către ”Nouconst S.R.L.”
- b) Documentația de proiect a fost elaborată de către ”Universinj S.R.L.”
- c) Lucrările de construcție – montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor – **iulie 2019**, sfârșitul lucrărilor – **decembrie 2020**.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a) Situația lucrărilor executate – *cartea tehnică*;
- b) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în anexa 1;
- c) Situația lucrărilor care nu au fost executate (Anexa 2);
- d) Lista lucrărilor neconforme (Anexa 3).

1. 6. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a) Situația lucrărilor executate – *cartea tehnică*;
- b) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în anexa 1;
- c) Situația lucrărilor care nu au fost executate (Anexa 2);
- d) Lista lucrărilor neconforme (Anexa 3).

6. Reabilitarea drumului L 390 Pârlița - Nisporeni km 23+400 - km 32+942, are următorii indici de bază:

- a) Lungimea drumului: 9.542 km;
- b) Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- c) Lățimea părții carosabile: B – 6,0 m (2x3,0m);
- d) Lățimea acostamentelor: B – 2x1,5 m (0,5m piatră spartă + 1,0m consolidare cu iarbă);

Construcția sistemului rutier:

- strat de uzura din beton asfaltic SMBg-II, $h = 40 \text{ mm}; 60773 \text{ m}^2$
- strat de binder din beton asfaltic poros SKPg-II $h = 60 \text{ mm}; 60773 \text{ m}^2$
- reciclat la rece tip A = 80 mm; 44906 m^2
- strat de fundație de piatră spartă $h = 240 \text{ mm}; 12370 \text{ m}^2$
- strat de fundație de piatră spartă $h = 290 \text{ mm}; 3524 \text{ m}^2$
- strat inferior de fundație din balast $h = 150 \text{ mm}; 2490 \text{ m}^3$

Podete accese laterale – Ø 800 mm – km 27+726; km 27+952; km 28+864; km 29+085; km 29+572; km 29+896; km 30+562.

Podete tubulare: km 27+885 – Ø1,50 m; km 29+618 Ø1,20m; km 29+756 Ø1,20m; km 30+405 Ø1,00m; km 30+980 Ø1,00m; km 31+561 Ø1,00m; km 31+869 Ø1,00m; km 32+048 Ø1,00m.

Rigole: 1152 ml.

Pavilioane de așteptare pentru pasageri – 1 buc.

Securitatea circulației rutiere: Indicatoare rutiere 177 buc, stilpi de dirijare 592 buc, parapet de protecție – 530 m.l.,

Marcaje rutiere – 3250 m. p.

Construcția trotuarelor: 6942 m.p.

7. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la construcția drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită parțial/complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Construcția dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

8. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepția la terminarea a lucrărilor.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi 22 decembrie 2020 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte I. Mornealo

membri: Iu. Pașa

R. Rogovei

P. Triboi

A. Rogai

V. Ivanov

S. Marian

S. Caunov

T. Vasilache

invitați:

A. Ursu

V. Scorobogatco

A. Efros

A. Rogut



10. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea se recomandă spre recepție la terminarea lucrărilor
cu îndeplinirea prevederilor Anexelor nr. 2 și 3.

Z

2021
2020

Caramian
(semnătura)



Caramian Alexandru, AST
(numele, prenumele, funcția)

11. Lucrarea privind lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 "Drumul L390 Pirlita-Nisporeni, km 23+400 - km 32+942", în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică _____.

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL
„Nouconst S.R.L.”


V. Scorobogatco

2020


PRIMITĂ - INVESTITORUL
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

I. Mornealo

2020



Din documentația scrisă și desenată lipsește

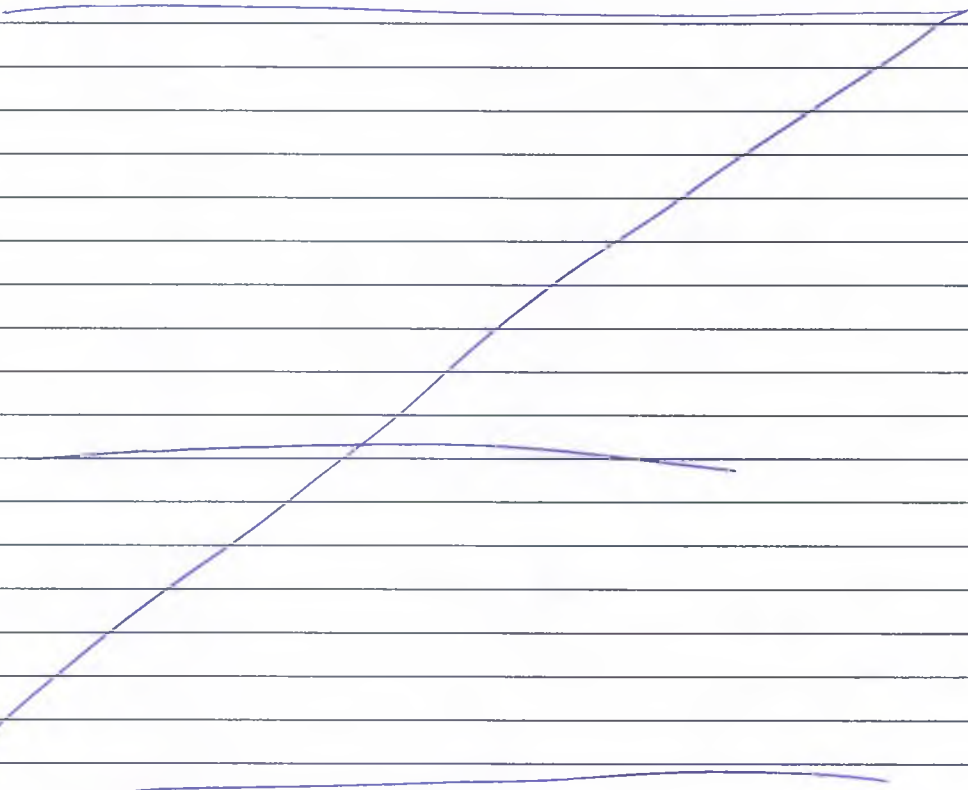Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<i>Nu este.</i> 

Președinte  I. Mornealo

membru:  Iu. Paşa

 R. Rogovei

 P. Triboi

A. Rogai

V. Ivanov

S. Marian

S. Caunov

T. Vasilache

invitați:

A. Ursu

V. Scorobogatco

A. Efros

A. Rogut



Situația lucrărilor care nu au fost executate

[illegible]

Președinte  I. Mornealo

membru: Iu. Paşa

 R. Rogovei

 P. Triboi

 A. Rogai

V. Ivanov

S. Marian

S. Caunov

T. Vasilache


invitați:

A. Ursu

V. Scorobogatco

A. Efros

A. Rogut



Lista lucrărilor neconforme

[illegible]

Presedinte  I. Mornealo

membru:  Iu. Paşa

R. Rogovei

P. Triboi

A. Rogai

V. Ivanov

S. Marian

S. Caunov

T. Vasilache

invitați:

A. Ursu

V. Scorobogatco

A. Efros

A. Rogut





PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 72 din 28.12 2020

Privind „*Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 "Drumul L431 Paruceni –Seliște -Vinatori, km 0+000 - km 4+200" și "Drumul de acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km 3+600"*, executat în cadrul contractului: nr. LRIP/W4/04 din 19.07.2019, încheiate între Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor”, beneficiar și Nouconst S.R.L., (Moldova), antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 24.07.2019 eliberată de Consiliul Raional Nisporeni.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 286 din 18.12. 2020 și-a desfășurat activitatea astăzi 28 decembrie 2020 2020 fiind formată din:

- a) Președinte: I. Mornealo - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b) membri
- | | |
|--------------|--|
| Iu. Pașa | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| R. Rogovei | - șef direcție infrastructura de transport, MEI |
| P. Triboi | - șef direcție întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD” |
| A. Rogai | - șef secție management ingineresc Î.S. „ASD” |
| V. Ivanov | - auditor intern al aparatului Președintelui Raionului Nisporeni |
| S. Marian | - ofițer sistematizarea circulației rutiere al SST și AR al IP Nisporeni |
| S. Caunov | - director, S.A. „Drumuri – Ialoveni” |
| T. Vasilache | - șef, S.A. „Drumuri – Ialoveni” district Nisporeni |

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- | | |
|-----------------|---|
| A. Ursu | - șef de echipă supervizarea execuției lucrărilor
”Tecnic Hill Sweroad ” |
| V. Scorobogatco | - executant, ”Nouconst S.R.L.” |
| A. Efros | - proiectant S.R.L. ”Universinj” |
| A. Rogut | - responsabil tehnic, ” Tecnic Hill Sweroad” |

4. Comisia de recepție a constatat că

Lucrările au fost executate conform proiectului și
documentației Tehnice

- a) Lucrările de construcție au fost executate de către “Nouconst S.R.L.”
- b) Documentația de proiect a fost elaborată de către “Universinj S.R.L.”
- c) Lucrările de construcție – montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor – **iulie 2019**, sfârșitul lucrărilor – **decembrie 2020**.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- Situația lucrărilor executate – *cartea tehnică*;
- Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în anexa 1;
- Situația lucrărilor care nu au fost executate (Anexa 2);
- Lista lucrărilor neconforme (Anexa 3).

6. Reabilitarea drumului L431 Păruceni – Seliște - Vânători, km 0+000-km 4+200 (sector 4a) și Drum de acces R 25 - s. Seliște, km 0+000-km 3+600 (sector 4b), are următorii indici de bază:

- Lungimea drumului: 7,970km;
- Lățimea platformei drumului: 9,0 m;
- Lățimea părții carosabile: B – 6,0 m (2x3,0m);
- Lățimea acostamentelor: B – 2x1,5 m (0,5m piatră spartă + 1,0m consolidare cu iarbă);

Construcția sistemului rutier:

- strat de uzura din beton asfaltic SMBg-II, $h = 40 \text{ mm}$; $= 51765 \text{ m}^2$
- strat de binder din beton asfaltic poros SKPg-II $h = 60 \text{ mm}$; $= 51765 \text{ m}^2$
- reciclat la rece tip A $= 80 \text{ mm}$; $= 33400 \text{ m}^2$
- strat de fundatie de piatra sparta $h = 240 \text{ mm}$; $= 8205 \text{ m}^2$
- strat de fundatie de piatra sparta $h = 290 \text{ mm}$; 4730 m^2
- strat inferior de fundație din balast $h = 150 \text{ mm}$; 2535 m^3

Pod km 0+135 (sector 4a): Lungimea suprastructurii L – 9,44 m, lățimea B – 10,86 m.

Podețe accese laterale – Ø 800 mm Sector 4a. – km 0+184, 0+612, 0+873; sector 4b km 0+846;.

Podețe tubulare: sector 4a km 1+547 – Ø1,20 m; km 2+428 Ø2x2m. sector 4b: km 0+542 Ø1,00m; km 0+678 Ø1,00m; km 1+501 Ø1,20m; km 1+619 Ø1,0m; km 2+290 Ø1,0m; km 2+695 Ø1,0m; km 2+804 Ø1,0m; km 3+038 Ø1,5m; km 3+219 Ø1,0m; km 3+219 Ø1,0m; km 3+320 Ø2x2.5m.

Rigole: sector 4a - 400 ml

Securitatea circulației rutiere:

Indicatoare rutiere: 853 buc,

parapet de protecție – 460 m.l.,

marcaje rutiere – 2512 m. p.

Construcția trotuarelor: 9283 m.p.

- În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la construcția drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită parțial/complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Construcția dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.
- Comisia de recepție recomandă următoarele: admiterea cu / fără obiecții a recepției.
- Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi 22.12. 2020 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte I. Mornealo

membri: Iu. Pașa

R. Rogovei

P. Triboi

A. Rogai

V. Ivanov

S. Marian

S. Caunov

T. Vasilache

invitați:

A. Ursu

V. Scorobogatco

A. Efros

A. Rogut



10. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea se recomandă spre recepție la terminarea lucrărilor
cu condiția înlăturării neconformităților din Anexa nr. 3



2021
2020

Caracemian
(semnătură)

Caracemian Alexandru, AST
(numele, prenumele, funcția)

11. Lucrarea privind lucrări de îmbunătățire a Coridorului 13 " Drumul L431 Paruceni –Seliște -
Vînatori, km 0+000 - km 4+200" și "Drumul de acces R25 - sat. Seliște, km 0+000 - km
3+600, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică


TRANSMISĂ – EXECUTANTUL
„ Nouconst S.R.L. ”

V. Scorobogatco 2020

PRIMITĂ – INVESTITORUL
Î.S. „ Administrația de Stat a Drumurilor ”

I. Mornealo 2020

Din documentația scrisă și desenată lipsește

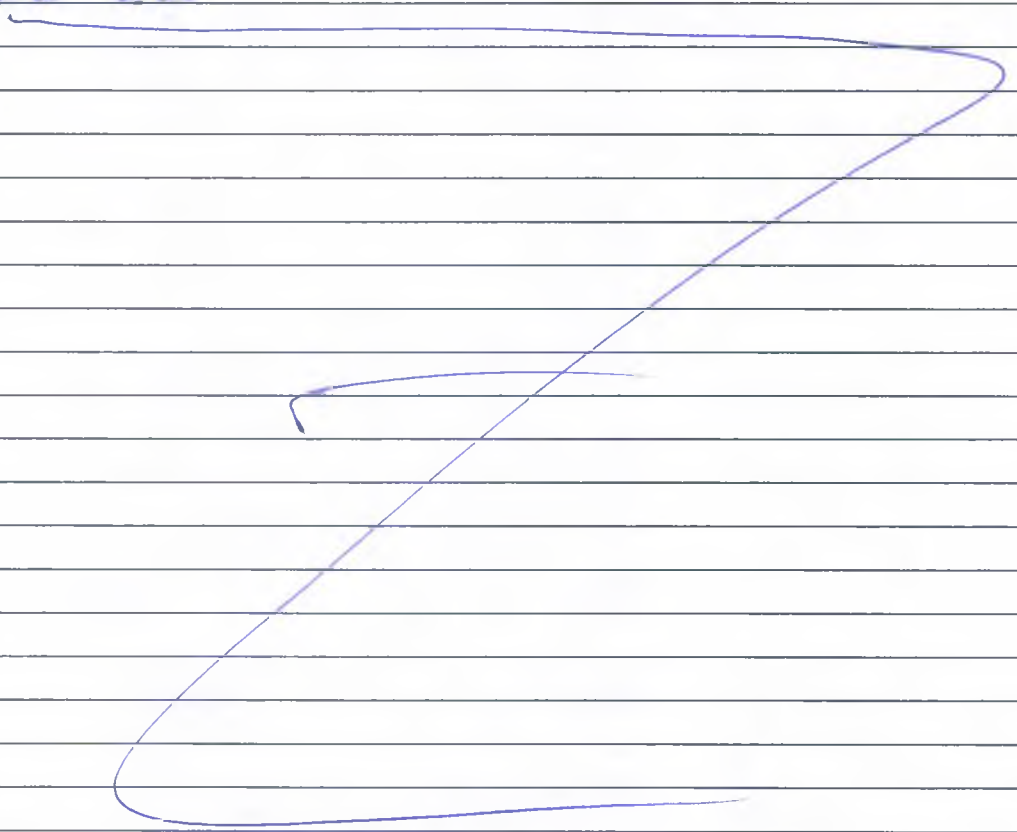Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
	Peste 

Președinte  I. Mornealo

membru:  Iu. Paşa

 R. Rogovei

 P. Triboi

A. Rogai

V. Ivanov

S. Marian

 S. Caunov

T. Vasilache

invitați:


A. Ursu

V. Scorobogatco

A. Efros

A. Rogut





Lista lucrărilor neconforme

Nr d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	Sect. 4.b. km 0+548 - de colmatat resturile de lucru la reparația podetului
2.	Sect. 4.b. km 1+501 - de reamănajat tasarea carosabilului
3.	Sect. 4.b. km 3+320 - de finalizat umplerea cu pământ în șanțurile hercului dispozitivului în aval.
4.	Sect. 4.a. - de finalizat completarea cu pământ vegetal pe taluzuri inclusiv însemnarea cu iarbe.
5.	Sect. 4.a. - km 0+135 - amenajarea abiei podetului - de finalizat.
6.	Sect. 4.a km - 1+547 (dreapta) - de restabilit tasarea sistemului rutier
7.	Sect. 4.a km 2+400 - de verificat planșetate și de remediat la necesitate.
8.	De urmărit marcajul rutier în perioada de garanție și de restabilit la necesitate.
9.	De asigurată monitorizarea de laborator a parametrilor de mediu pe perioade de garanție.
10.	De reamănajat pânzele marginale și parapetului de siguranță (de înglobat în terasament)
11.	De asigurată accesul hornurilor cu durabilitate la trotuare (la necesitate).
12.	De instalat semnele la: km 0+455 (b. 3. 11) km 0+050 (b. 1. 11) km 2+140 (1. 20)

Președinte I. Mornealo

membri: Iu. Pașa

R. Rogovei

P. Triboi

A. Rogai

V. Ivanov

S. Marian

S. Caunov

T. Vasilache

invitați:

A. Ursu
V. Scorobogatco

A. Efros

A. Rogut





ACHIZIȚII PUBLICE

N 43/A/17/07-19

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/283 privind achiziția prin licitație deschisă

“19” iulie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1557919083396-EV-1557986908160** din **07.06.2019**, între Î.S. “**Administrația de Stat a Drumurilor**”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.C., „Nouconst” S.R.L.** cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentată de administratorul dl Vadim Scorobogatco în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G109 Delacău-Bulboaca-R2, km 11,33-13,4** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

Decor

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **36 038 458,15 (treizeci și șase milioane treizeci și opt mii patru sute cincizeci și opt lei 15 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Orăfulu

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform puințului 9.1 a prezentului contract.

Decor

- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în

Ordogo

acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișii și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective

Ozgodu

vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de

Orghita

întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;

- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI

"Antreprenor general"

S.C. "Nouconst" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Petricani 94
c/f 1005600012120

c/IBAN MD68AG000000002251679079

BC „Moldova-Agroindbank” S.A.,
fil.10 Chișinău, c/b AGRNMD2X437
c/TVA 0605333

Administrator
Vadim Scorebogatco

Orașul

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILORNr. 52 din 30 octombrie 2020

Privind lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G109 Delacău – Bulboacă - R2, km 11,33 – km 13,4, executate în cadrul contractului nr. 06-14/283 din 19.07.2019, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Nouconst” S.R.L. antreprenor, or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 103 din 29 iulie 2020 eliberată de Consiliul Raional Anenii Noi cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 222 din 03 septembrie 2020 și-a desfășurat activitatea în intervalul 28-30 octombrie 2020 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|------------|---|---|
| a.) Președinte | Iu. Pașa | - | director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b.) membri: | R. Rogovei | - | șef, direcția infrastructură de transport a MEI |
| | V. Cotruță | - | șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD” |
| | I. Grosu | - | șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD” |
| | I. Alexa | - | șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| | V. Jizdan | - | șef, secția construcții, gospodărie comună, drumuri al Consiliului Raional Anenii Noi |
| | P. Spînu | - | șef, secția sistematizare, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră |
| | A. Popov | - | director, S.A. „Drumuri – Criuleni” |
| | A. Moisei | - | S.A. „Drumuri – Criuleni” sector Anenii Noi |

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant V. Scorobogatco - administrator, S.C. „Nouconst” S.R.L.
- b) proiectant A. Dolganiuc - director, S.R.L. „Universcons”
- c) responsabil tehnic P. Anii - specialist principal, Î.S. „ASD”
- d) Centrul de Sănătate Publică Căușeni C. Măgureanu – medic igienist

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezenta necompletare a anexei nr. 3

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

7¹. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

1) Lungimea drumului 1900 m.l.

2) Lățimea părții carosabile - variabilă (8,0m – 11,5m.)

3) Latimea acostamentelor 2 x 1,0 m. (PC134+86 – PC142+07) consolidate cu piatră spartă H=10cm.
Construcția sistemul rutier: strat din nisip pietriș H – 20 cm, strat din piatră calcaroasă stabilizată cu ciment marca M100 H – 30 cm, strat din beton asfaltic cu porozitate ridicată, granulație mare SKVPg-I H – 8 cm, geocompozit PGM-G 100/100, strat din beton asfaltic poros, granulație mare SKPg-II H – 6 cm, strat din beton asfaltic dens, fin SMAG H – 4 cm.

Podețe tubulare: 2 buc - Ø - 600mm (PC123+80, PC133+39).

Podețe tubulare: 1buc – 3xØ - 1500mm PC123+28, 2buc – Ø - 1000mm PC127+77, PC139+13,

Rigolă trapezoidală din beton monolitizat L = 1137 m.l.

Rigolă carosabilă de acostament L = 1555 m.l.

Drumuri Laterale – 4 buc. (PC123+80, PC124+26, PC127+73, PC133+39).

Indicatoare rutiere – 26 buc., marcaj rutier S=982 m², stâlpi de ghidare - 78 buc,

Borne kilometrice – 4buc.

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a drumului menționat constituie – 36 538 118, 48 lei, inclusiv LCM – 35 999 958, 00 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un număr total de 6 file, a fost încheiat, astăzi, vineri 30 octombrie 2020 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

Iu. Pașa

membri:

R. Rogovei

V. Cotruță

I. Grosu

I. Alexa

V. Jizdan

P. Spînu

invitați:

A. Popov

A. Motsei

V. Scorobogatco

A. Dolganiuc

P. Anii

C. Măgureanu

11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

2020

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

12. Lucrarea: Reparația drumului G109 Delacău – Bulboaca – R2. km 11+330 ÷ 13+400 în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică. este.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL

S.C. „Nouconst” S.R.L.

octombrie 2020

V. Scorobogateo



PRIMITĂ - INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

octombrie 2020

V. Cotruță



Din documentația scrisă și desenată lipsește

[illegible]

[Signature]

Iu.Paşa

2.

R.Rogovei

✓

V.Cotruță

Marleen

I.Grosu

J. Stubbins

I.Alexa

V. 2.1

V.Jizdan

[Handwritten signature]

P. Spînu



A. Popov

A.Moisei

Invitați:

V.Scrobogatco

A. Dolganiuc



P.Anii


2a.b

C. Măgureanu

Nr. d/o	
	Lucrările au fost executate în volumul de plan a proiectului
	2



 C.M.



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. _____ din _____ 2020

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	PC 134+86 - PC 142+04 - consolidarea acostamentelor cu piatră spartă H-10 cm, conform proiectului
2	PC 113+30 - PC 134+86 - consolidarea acostamentelor cu pământ, profilarea și compactarea lor
3	Colmatarea 'fîsurilor' apărute la rigole, podete și la suprafețele din beton - monolit
4	'Executarea' avaramentului în aval conform proiectului (plase nr.84) la podete
5	PC 139+13 - îmbinarea elementelor din beton monolitizat la podete conform proiectului (plase nr.84).

Președinte

Iu. Pașa

Membri:

R. Rogovei

V. Cotruță

I. Grosu

I. Alexa


V. Jizdan

P. Spînu

Invitați:



A. Popov

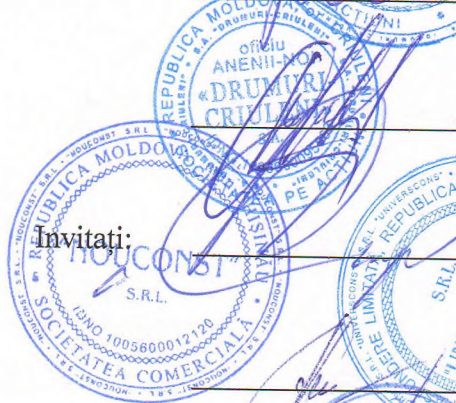

A. Moisei

V. Scorobogatco

A. Dolganiuc



P. Anii

C. Măgureanu





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/139 privind achiziția prin licitație deschisă

03 iunie 2021

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1618904451298 din 13.05.2021**, între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl.Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.C.,„Nouconst” S.R.L.** cu sediul în mun. Chişinău, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1005600012120, reprezentată de administratorul dl Vadim Scorobogateo, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chişinău**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **30 septembrie 2021**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua în 2 etape conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită apartenței impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici. care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

Antrean

suspendării. Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **12 595 841,54 (douăsprezece milioane cinci sute nouăzeci și cinci mii opt sute patruzeci și unu lei, 54 bani) inclusiv TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 20 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta ajustarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează, se execută în subantrepriză, dar nu mai mult de 40% din valoarea ofertei, Antreprenorul general trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor contractați și/sau implicați în executarea lucrărilor și lucrările pe care aceștia le vor executa, cu indicarea denumirilor, datelor de contact și a reprezentanților legali ai acestora.

- 5.3. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 5.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.
- 5.4. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.
- 5.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare.
- 6.2 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) celălalt va fi prezentat altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor, proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în construcții în vigoare. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea, în condițiile prevederilor regulilor tehnice sanitare și de siguranță.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția ultimului de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea/finalizarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor aprobați de Beneficiar, de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.
- 6.10 Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

- 6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 15% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.12 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p. 6.11, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.13 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după recepția lucrărilor finalizate.
- 6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție a lucrărilor, în cel mult 15 zile de la data semnării procesului verbal la recepția lucrărilor finalizate. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.15 Antreprenorul general garantează că, la data recepției lucrărilor finalizate, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii.
- 6.16 La lucrările la care se fac încercări la laboratoarele acreditate în mod corespunzător, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.17 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în atelier, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.19 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.21 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.22 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și/sau inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.23 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii contractați și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către aceștia a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.

6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.27 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.28 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

- 7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
- 9 Lucrările vor începe după semnarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului contract este de **1 (unu) an**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției lucrărilor finalizate și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, proiectului de execuție și/sau caietului de sarcini, pe cheltuielă proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții/reconstrucție/întreținere se produce o daună unui terț, părțile port răspundere conform prevederilor legale. Pentru stabilirea a quantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața, potrivit normelor tehnice prestabilite.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului.

- 10.10 Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, potrivit graficului de execuție anexat la prezentul Contract, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract.
- 10.11 În cazul în care întârzierea depășește 50 zile de întârziere, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună execuție a contractului.
- 10.12 Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 10.13 Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.
- 10.14 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a angajaților acestora.
- 10.15 Antreprenorul general și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGHIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție acreditată de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.
- 11.2 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asigurătorii;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările, în termenul indicat în dispoziția scrisă de reîncepere a lucrărilor.
 - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a rețenut o lucrare în termenul stabilit de Beneficiar.
 - contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 a legii 131/2015.
 - Antreprenorul general întârzie executia lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.10.
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile calculate din data rezoluționării contractului.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor scula sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căreia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Conținutul documentelor vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Proiectul de execuție;
 - c) Propunerea tehnică;
 - d) Oferta financiară;
 - e) Graficul de execuție a lucrărilor;
 - f) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Prin confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu Legile Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

ANEXA 1. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

„Ministerul de Stat a Drumurilor”

MD 2044 str. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1005600012120

c/IBAN MD6773POCC518430A00891AA

Ministerul Finanelor - Trezoreria de Stat

MD-20 Chișinău - Capitala de Stat

c/TVA 0605333

Director general interimar

Vasilescu POTOP

„Antreprenor general”

S.C. „Nouconst” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Petricani 94

c/f 1005600012120

c/IBAN MD20ML000000022512123039

BC 'Moldindconbank' S.A., fil. 'Renastere'

Chișinău, BIC: MOLDMD2X312

c/TVA 0605333

Administrator

Vadim SCOROBOGATCO



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

FORMULARUL F.3.3

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte: denumirea obiectului	Tronsonul	Localitate	anul 2021													
				Luna / Săptămână													
				Iunie	Iulie	August	Septembrie										
Etapa I																	
1	M1 Frontiera cu România - Leuseni - Chisinau - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 122.80 - 123.80 (selectiv)	raionul Criuleni		50%	50%												
2	R5 M5 - Vadul lui Voda - M4, km 0.00 - 1.10 (selectat)				50%	50%											
3	G 72 R6 - Brănești - Criuleni, km 33.05 - 34.05 (1000 m.l.)																
4	G68 Orhei - Susleii - Ustia - Criuleni, km 43.50 - 44.50 (1000m.l.)	raionul Dubăsari								100%							
5	M1 fi. cu România - Leuseni - Chisinau - Dubăsari - fi. cu Ucraina 89.00 - 90.00 (500 m.l.)										100%						
6	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 267.00 - 267.40 (400 m.l.)											100%					
7	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 268.00 - 268.30 (300 m.l.)	mun. Chisinau	(pregătirea suportului plombare, decupari)								50%	50%					
8	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 270.00 - 270.60 (600 m.l.)												100%				
9	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 272.10 - 272.40 (300 m.l.)													50%	50%		
10	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 274.30 - 274.50 (200 m.l.)														100%		
11	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 276.20 - 277.70 (selectiv)															100%	
																	100%
Etapa II																	
12	M1 Frontiera cu România - Leuseni - Chisinau - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 122.80 - 123.80 (selectiv)	raionul Criuleni			20%	60%	20%										
13	R5 M5 - Vadul lui Voda - M4, km 0.00 - 1.10 (selectat)					50%	50%										
14	G 72 R6 - Brănești - Criuleni, km 33.05 - 34.05 (1000 m.l.)																
15	G68 Orhei - Susleii - Ustia - Criuleni, km 43.50 - 44.50 (1000m.l.)	raionul Dubăsari								100%							
16	M1 fi. cu România - Leuseni - Chisinau - Dubăsari - fi. cu Ucraina 89.00 - 90.00 (500 m.l.)											100%					
17	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 267.00 - 267.40 (400 m.l.)											30%	70%				
18	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 268.00 - 268.30 (300 m.l.)	mun. Chisinau	(Lucrări de aplicare a stratului de beton asfaltic, puna spartă)								90%	10%					
19	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 270.00 - 270.60 (600 m.l.)												80%	20%			
20	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 272.10 - 272.40 (300 m.l.)														90%	10%	
21	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 274.30 - 274.50 (200 m.l.)															100%	
22	M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 276.20 - 277.70 (selectiv)																100%

Scorobogato Vadim
în cadrul firmei: Administrator
firmei: SC "Nouconst" SRL

Digitally signed by Scorobogato Vadim
Date: 2021.05.24 16:05:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 117 din 30 noiembrie 2021

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău, executate în cadrul contractului nr.06-14/139 din 04.06.2021, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Nouconst” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 160 din 10 noiembrie 2021 și-a desfășurat activitatea în perioada 29-30 noiembrie 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte: *I.Druce* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) Vicepreședinte: *P.Triboi* - șef, direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD”
- c.) membri:
 - Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
 - S.Godiac* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
 - A.Iazinschii* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
 - V.Beresteanu* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
 - A.Popov* - director S.A. „Drumuri Criuleni”
 - Ș.Montaluța* - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Criuleni
 - V.Buzu* - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Chișinău
 - V.Zinenco* - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Dubăsari
 - V.Scorobogatco* - director, S.R.L. „Nouconst”
 - V.Chioru* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la întreținerea periodică a drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.R.L. „Nouconst”
b.) devizul a fost elaborat de I.S. „ASD”
c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *iunie 2021* sfârșitul lucrărilor *octombrie 2021*

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv *cheltuielile beneficiarului constituie – 12 951 844, 31 lei, inclusiv LCM – 12 595 840, 80 lei.*
4. *Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de – 12 478 350, 01 lei, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.*
5. *Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi marți
30 noiembrie 2021 în 6 exemplare.*

Anexe: 1. Situația neconformităților depistate de comisia de recepție.

2. Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor

Comisia:

Președinte: I.Druce

Vicepreședinte: P.Triboi

Membri: Gh.Tonu

S.Godiac

A.Iazinschii

V.Berescanu

A.Papoi


S.Montaluț

V.Buzu

V.Zimbea

V.Scorobogalco

V.Cioba

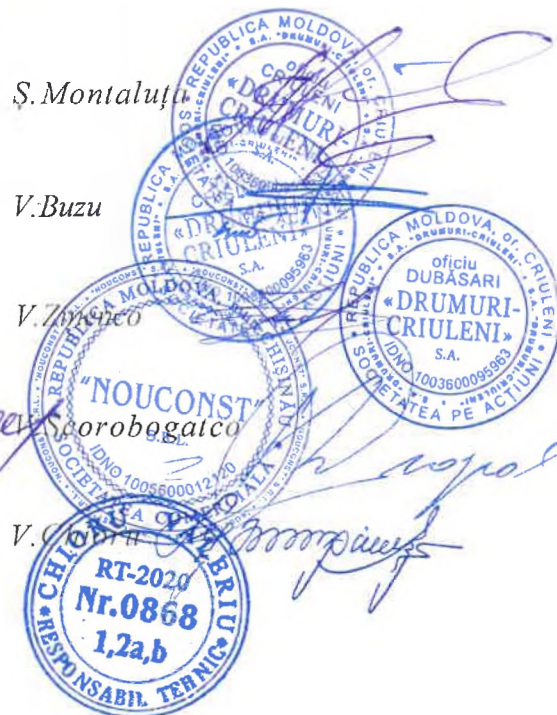

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 117 din 30 noiembrie 2021

SITUAȚIA

neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate la obiectul:
Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în
raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău.

[illegible]

Comisia:

Preşedinte: *I. Druce*

Vicepreşedinte: *P.Triboi*

Membrî:

Gh. Tonu

S. Godiac

A. Iazinschii

Beresteanu

A. Popov

Ş. Montalut

V. Buzu

Zinenco

Scorobogatch

Chior





ACHIZIȚII PUBLICE

Contract-model

p. 28

Obj. 70: 555864

n2. Înțelegere: 201903934

n2. participanti: 1

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.52 privind achiziția prin Licitatie Publică Deschisă

n2.

"28" martie 2019

mun. Strășeni

Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Licitatie Publică nr. **Ocds-b3wdp1-MD-1551887446608sau21005999** din **27.03.2019**, între **Primăria municipiul Strășeni**, str. Mihai Eminescu, 32 telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, cont bancar 226632, cont de virament IBAN:

MD43TRPDAU20000001073500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială de Stat, cod bancar TREZMD2X, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008601000042, reprezentată **prin Primar Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și **SC "Nouconst" SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, 94 telefon: 022317638 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr. 1005600012120 din 14.03.2005, autorizat pentru activitatea Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, Licența nr. 045463 seria A MMII din 15.04.2005 valabil până 14.04.2020 pentru genurile de activitate "Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Administrator Scorobogato Vadim**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute obiectul: „**Lucrări de reparație capitală a str. P. Rareș, Decebal, St. Cel Mare, T. Ciorbă mun. Strășeni**”.

Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice

Perm. Lex

12.04.2019 *Bouf*

în vigoare.

2.PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **8 luni** luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar, inexistența disponibilității financiare;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **28 191 135-15lei** MD, (inclusiv 4 698 522,53 TVA lei MD.) (Douăzeci și opt milioane una sută nouăzeci și una mii una sută treizeci și cinci lei 15 bani) (suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

Pentru anul 2019 -6 400 000-00lei

MD54TRPDAU312120B10735AB-4 050 700-00lei

MD27TRPDAU312120B10735AC-2 349 300-00lei

Pentru anul 2020-21791135-15 lei

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.2 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.3 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.4 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.5 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE

BENEFICIARULUI

- 6.2 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.4 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.5 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.6 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și să întruie cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.7 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.8 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.9 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.10 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină forma de garanție bancară, reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți. Antreprenorul general și Beneficiar și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii.
- 6.12 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de

recepție finală în cel mult 15 zile.

- 6.13 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp înșă cîtpretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.15 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.16 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.17 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.19 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.21 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.22 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.23 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

- 6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.27 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7 FORȚA DE MUNCĂ

- 7.2 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.2 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.3 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general.
- 8.4 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.5 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiere și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.6 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa

la examinarea și măsurarea lucrărilor.

- 8.7 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.8 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.9 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.10 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.2 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.
- 9.3 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.4 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.2 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.3 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.4 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.5 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.6 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.7 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la

dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 10.8 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.9 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.10 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.12 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.2 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.2 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.4 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.5 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.6 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.7 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.8 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.2 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.3 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.4 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți - 28.03.2019
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor - 30.01.2021

14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: **SC „NOUCONST” SRL**
Mun. Chișinău, str. Petricani, 94
Telefon: 022278-88-00, 78-88-00
Cod fiscal: 1005600012120
Banca: BC „Moldova- Agroindbank”
SA, filiala nr. 10 Chișinău
Cod: AGRNMDD2X

BENEFICIARUL

Adresa poștală: **Primăria mun Strășeni**
Min. Strășeni, str. M. Eminescu, 32
Telefon: 02372-23-43, 2-29-89
Cod fiscal: 1008601000042
Banca: Trezoreria Regiunală Centru
a Ministerului Finanțelor, mun. Chișinău
Cod: TREZMD2X

IBAN: MD68AG000000002251679079

IBAN: MD54TRPDAU312120B10735AB
MD27TRPDAU312120B10735AC



modificat și anu.

15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

[Signature]
L.Ș.



BENEFICIAR

[Signature]
L.Ș.



Stamp: 13. APR. 2019
2019-0000000626

ACT ADIȚIONAL Nr. 96

la contractul nr. 58 din 28.03.2019, nr. trezorerial: 2019-0000000626

Încheiat la data de: 12.11.2020, în mun. Strășeni

Prezentul acord adițional la contractul nr. 58 din 28.03.2019 este încheiat privitor la prelungirea termenului de executare al lucrărilor și de valabilitate al contractului, ca urmare a stopării inprevizibile a procesului de executare a lucrărilor, în perioada martie-mai 2020, determinată de starea de urgență în sănătate publică provocată de "Covid-19", între:

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 32; telefon: (0237)22343, fax: (0237)22989, înregistrată de Stat cu nr. 1008601000042, reprezentată prin **Primar Dna Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și

SC "NOUCONST" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, 94; telefon: 068146700; înregistrat de Stat cu nr. 1005600012120, reprezentată prin **administrator Scorobogatco Vadim**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, în privința modificării contractului nr. 58 din 28.03.2019, nr. trezorerial: 2019-0000000626 (numit în continuare Contract).

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele prevederi:

1. Se modifică pct. 2.1 din contract: sintagma "de 8 luni" se substituie cu sintagma: "până la 31.12.2021";
2. Se modifică pct. 13.6 din contract: sintagma: "30.01.2021" se substituie cu sintagma: "31.12.2021"
3. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte contractantă, celelalte prevederi nemodificate rămân în vigoare;
4. Prezentul acord adițional se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării în modul stabilit de lege la Trezoreria de Stat.

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR

L.Ș.



L.Ș.





A C H I Z I T I I P U B L I C E

ACT ADIȚIONAL nr. 57

la contractul nr. 52 din 28.03.2019, nr. trezorerial: 2019-0000000626

Încheiat la data de: 04.08.2021, în mun. Strășeni

Prezentul acord adițional la contractul nr. 52 din 28.03.2019 este încheiat potrivit Deciziei grupului de lucru a Primăriei mun. Strășeni nr. 5 din 04.08.2021, conform art. 76, alin. (7), pct. 1), lit. a;b;c din Legea nr. 131/2015, privitor la:

- achiziționarea lucrărilor suplimentare neincluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia, ca urmare a actualizării proiectului tehnic de execuție a lucrărilor;

-prelungirea termenului de valabilitate al contractului în legătură cu insuficiența bugetară în anul curent.

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 32, înregistrată de Stat cu nr. 1008601000042, reprezentată prin **Primar Dna Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și

SC "NOUCONST" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, 94; telefon: 022788800; înregistrat de Stat cu nr. 1005600012120, reprezentată prin **administrator Scorobogatco Vadim**, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte, în privința modificării contractului nr. 52 din 28.03.2019, nr. trezorerial: 2019-0000000626 (numit în continuare Contract).

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele prevederi:

1. Se modifică pct. 3.1 din contract după cum urmează:

- 1.1. Se majorează, conform devizului local al lucrărilor incluse, valoarea totală a contractului cu 3 497 317,14 MDL (trei milioane patru sute nouăzeci și șapte mii trei sute șaptesprezece lei 14 bani) - ce reprezintă 12,41 % din valoarea inițială a contractului (28 191 135,15 MDL)
- 1.2. Se exclud lucrări, conform devizului local al lucrărilor excluse, în valoare de 1 447 601,68 MDL (un milion patru sute patruzeci și șapte mii șase sute unu lei 68 bani);
- 1.3. Ca urmare a modificărilor operate în volumele de lucrări, precum și a modificării cotei de contribuție a asigurărilor sociale de stat, de la 22,5% în an. 2019 - la 24% în an. 2021, diferența fiind de

+14 622,08 MDL (pasprezece mii șase sute douăzeci și doi lei 08 bani), valoarea totală a lucrărilor, conform devizului local actualizat la str. Ștefan cel Mare din mun Strășeni, va constitui 11 443 090,02 MDL (unsprezece milioane patru sute patruzeci și trei mii nouăzeci lei 02 bani);

- 1.4. Valoarea totală a contractului se modifică și va constitui 30 255 472,69 MDL (treizeci mln. două sute cincizeci și cinci mii patru sute șaptezeci și doi lei 69 bani);
2. Se modifică pct. 13.6 din contract: se prelungește termenul de valabilitate al contractului - pîna la 31 mai 2022;
3. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte contractantă, celelalte prevederi nemodificate rămîn în vigoare;
4. Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

ANTREPRENOR GENERAL

Administrator
Scorobogatco Vadim



BENEFICIAR

Primar
CASIAN Valentina



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 04 din 12.04.2022

privind lucrarea Reparația capitală a străzii Ștefan cel Mare din or. Strășeni cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00) executată la obiectul "Lucrări de reparație capitală a străzilor P. Rares, Decebal, Ștefan cel Mare, T. Ciorbă din mun. Strășeni", în cadrul contractului nr. 52 din 28.03.2019 încheiat între Primăria mun. Strășeni și SC "Nouconst., SRL pentru lucrările de reparație capitală a străzilor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 015 din 19.03.2021 eliberată de Primăria mun. Strășeni, având valabilitatea de 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orelor 12.00-12.30, fiind formată din:

Președintele comisiei : **Valentina CASIAN** - primarul municipiului Strășeni

Membrii comisiei : **Luiza NICOLAESCU** - arhitect - șef mun. Strășeni

Gheorghe GUȚAN - manager șef al ÎM "Gospodăria Comunală Strășeni"

Andrei RUSNAC - responsabil tehnic

Igor JEREGHI - consilier orășenesc

3. Au mai participat: **Andrei BURAGA** – inginer șef proiect SRL "Astral – Proiect"
Vladimir COROBCĂ – diriginte de șantier SC „Nouconst” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- recepționarea la terminarea lucrărilor de reparație capitală a sectorului 2 de strada Ștefan cel Mare din or. Strășeni (PC 10+00.00 - PC 13+50.00)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- **examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate**
- **obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- se acceptă recepția la terminarea lucrărilor a obiectului cu obiectiile specificate în anexe

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul Reparația capitală a străzii Ștefan cel Mare din municipiul Strășeni, (PC 10+00.00 - PC 13+50.00), constă în lucrările de reparație capitală a străzii: lungimea de 350 m.l., suprafața totală de drum –7878 m.p., lățimea părții carosabile -9,0-m, cu structura rutieră din beton asfaltic, trotuar pavat cu suprafața de 3944 m.p., parcări cu suprafața de 1005 m.p..

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 12.04.2022 la ora 12.30 în 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Președintele comisiei : Valentina CASIAN

Specialiști:

Membrii comisiei: Luiza NICOLAESCU

Gheorghe GUȚAN

Andrei RUSNAC

Igor JERECHI



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



10. Lucrarea ” Reparația capitală a străzii Ștefan cel Mare din or. Strășeni cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00)” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SC ”Nouconst” SRL

”12” aprilie 2022

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primăria mun. Strășeni

”12” aprilie 2022

L.Ș.

(semnătura)



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au prezentată sau este incompletă

privind lucrarea ” **Reparația capitală a străzii Stefan cel Mare din or. Strășeni cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00)**”

Executant

SC "Nouconst" SRL

Beneficiar

"Primăria mun. Strășeni"

Responsabil tehnic

Andrei Rusnac



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

privind lucrarea ” **Reparația capitală a străzii Stefan cel Mare din or. Strășeni cu lungimea de 3.7 km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00)**”

Executant

SC ”Nouconst” SRL

Beneficiar

”Primăria mun. Strășeni”

Responsabil tehnic

Andrei Rusnac



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile
proiectului**

privind lucrarea ” **Reparatia capitală a străzii Ștefan cel Mare din or. Strășeni cu lungimea de 3.7
km. Sectorul 2 (PC 10+00.00 - PC 13+50.00)**”

Executant



SC ”Nouconst” SRL

Beneficiar

”Primăria mun. Strășeni”

Responsabil tehnic

Andrei Rusnac

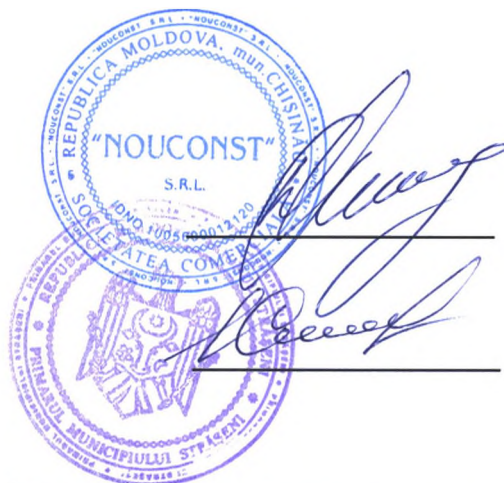

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 02 din 12.04.2022

privind lucrarea Reparația capitală a străzii Decebal din municipiul Strășeni, (sectorul 1) executată la obiectul "Lucrări de reparație capitală a străzilor P. Rares, Decebal, Ștefan cel Mare, T. Ciorbă din mun. Strășeni", în cadrul contractului nr. 52 din 28.03.2019 încheiat între Primăria mun. Strășeni și SC "Nouconst., SRL pentru lucrările de reparație capitală a străzilor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 056 din 06.09.2019 eliberată de Primăria mun. Strășeni, având valabilitatea de 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orelor 11.00-11.30, fiind formată din:

Președintele comisiei : Valentina CASIAN - primarul municipiului Strășeni

Membrii comisiei : Luiza NICOLAESCU - arhitect - șef mun. Strășeni

Gheorghe GUȚAN - manager șef al ÎM "Gospodăria Comunală Strășeni"

Petru MORARI - responsabil tehnic

Igor JERECHI - consilier orășenesc

3. Au mai participat: Mărcel MUNTEANU – inginer șef proiect SRL "Astral – Proiect"
Dorin ODOVENCO – diriginte de șantier SC „Nouconst” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- recepționarea la terminarea lucrărilor de reparație capitală a unui sectorul 1 de drum din strada Decebal din or. Strășeni

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate

- obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- se acceptă recepția la terminarea lucrărilor a obiectului cu obiecțiile specificate în anexe

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul Reparația capitală a străzii Decebal din municipiul Strășeni, (sectorul 1), constă în lucrările de reparație capitală a străzii: lungimea de 1087 m.l., suprafața totală de drum - 6617m.p., lățimea părții carosabile – 4.5 m , cu structura rutieră din beton

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 12.04.2022 la ora 11.00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei : **Valentina CASIAN**

Specialiști:

Membrii comisiei: **Luiza NICOLAESCU**

Gheorghe GUȚAN

Petru MORARI

Igor JEREGHI



10. Lucrarea ” Reparatia capitală a străzii Decebal din municipiul Strășeni, (sectorul 1) ”
este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SC ”Nouconst” SRL
”12” aprilie 2022

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primăria mun. Strășeni
”12” aprilie 2022

L.Ș.

(semnătura)



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au prezentată sau este incompletă

privind lucrarea ” **Reparatia capitală a străzii Decebal din municipiul Strășeni, (sectorul 1)**”

2

Executant

SC "Nouconst" SRL

Beneficiar

"Primăria mun. Strășeni"

Responsabil tehnic

Petru Morari



Lista lucrărilor cuprinse în documentatia tehnică ce nu au fost executate

privind lucrarea ” ” **Reparatia capitală a străzii Decebal din municipiul Strășeni, (sectorul 1)**”

2

Executant

SC ”Nouconst” SRL

Beneficiar

”Primăria mun. Strășeni”

Responsabil tehnic

Petru Morari



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile
proiectului**

privind lucrarea ” **Reparația capitală a străzii Decebal din municipiul Strășeni, (sectorul 1)**”

Executant

SC "Nouconst" SRL

Beneficiar

"Primăria mun. Strășeni"

Responsabil tehnic

Petru Morari



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**
Nr. 03 din 12.04.2022

privind lucrarea Reparația capitală a străzii P. Rares din municipiul Strășeni, (etapa 1) executată la obiectul "Lucrări de reparație capitală a străzilor P. Rares, Decebal, Stefan cel Mare, T. Ciorbă din mun. Strășeni", în cadrul contractului nr. 52 din 28.03.2019 încheiat între Primăria mun. Strășeni și SC "Nouconst., SRL pentru lucrările de reparație capitală a străzilor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 023 din 13.05.2019 eliberată de Primăria mun. Strășeni, având valabilitatea de 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orelor 11.30-12.00, fiind formată din:

Președintele comisiei : **Valentina CASIAN** - primarul municipiului Strășeni

Membrii comisiei : **Luiza NICOLAESCU** - arhitect - șef mun. Strășeni

Gheorghe GUȚAN - manager șef al ÎM "Gospodăria Comunală Strășeni"

Petru MORARI - responsabil tehnic

Igor JERECHI - consilier orașenesc

3. Au mai participat: **Marcel MUNTEANU** – inginer șef proiect SRL "Astral – Proiect"
Dorin ODOVENCO – diriginte de șantier SC,,Nouconst" SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- recepționarea la terminarea lucrărilor de reparație capitală a sectorului de drum din strada P. Rares din or. Strășeni (etapa 1- sectorul str. M. Eminescu -bd. Păcii)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- **examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate**
- **obiectul corespunde cerintelor NCM și legislației în vigoare**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- se acceptă recepția la terminarea lucrărilor a obiectului cu obiectiile specificate în anexe

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul Reparația capitală a străzii P. Rares din municipiul Strășeni, (etapa 1), constă în lucrările de reparație capitală a străzii: lungimea de 710 m.l., suprafata totală de drum – 8006 m.p., lățimea părții carosabile-7,0m, cu structura rutieră din beton asfaltic, trotuar pavat cu suprafata de 1032 m2 cu lățimea de 1.5m.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 12.04.2022 la ora 11.30 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei : Valentina CASIAN

Specialiști:

Membrii comisiei: Luiza NICOLAESCU

Gheorghe GUȚAN

Petru MORARI

Igor JEREGHI





10. Lucrarea ” Reparația capitală a străzii P. Rares din municipiul Strășeni, (etapa1) ” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SC "Nouconst" SRL
"12" aprilie 2022



L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primăria mun. Strășeni
"12" aprilie 2022



L.Ș.

(semnătura)

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au prezentată sau este incompletă

privind lucrarea ” **Reparația capitală a străzii P. Rareș din municipiul Strășeni, (etapa 1)**”

2

Executant

SC ”Nouconst” SRL

Beneficiar

”Primăria mun. Strășeni”

Responsabil tehnic

Petru Morari



Lista lucrărilor cuprinse în documentatia tehnică ce nu au fost executate

privind lucrarea **"Reparatia capitală a unui sector de drum din strada P. Rares
din mun. Strășeni, etapa 1"**

[Handwritten signature]

Executant

SC "Nouconst" SRL

Beneficiar

"Primăria mun. Strășeni"

Responsabil tehnic

Petru Morari



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile
proiectului**

privind lucrarea **"Reparatia capitală a unui sector de drum din strada P. Rares
din mun. Strășeni, etapa 1"**

[Handwritten signature]

Executant

SC "Nouconst" SRL

Beneficiar

"Primăria mun. Strășeni"

Responsabil tehnic

Petru Morari

[Three official blue circular stamps and three handwritten signatures. The top stamp is for "NOUCONST S.R.L." with ID NO 100560002/20. The middle stamp is for "PRIMĂRIA MUN. STRĂȘENI". The bottom stamp is for "MORARI PETRU" with RT-2019 and ID NO 0388. Each stamp has a corresponding handwritten signature over it.]

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 27.05.2020**

privind lucrarea Reparația capitală a unui sector de drum din strada Toma Ciorbă din municipiul Strășeni, cu lungimea de 0.650 km executată la obiectul "Lucrări de reparație capitală a străzilor P. Rares, Decebal, Stefan cel Mare, T. Ciorbă din mun. Strășeni", în cadrul contractului nr. 52 din 28.03.2019 încheiat între Primăria mun. Strășeni și SC "Nouconst., SRL pentru lucrările de reparație capitală a străzilor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 021 din 02.05.2019 eliberată de Primăria mun. Strășeni, având valabilitatea de 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul mai 2020, fiind formată din:

Președintele comisiei : **Valentina CASIAN** - primarul municipiului Strășeni

Membrii comisiei : **Luiza NICOLAESCU** - arhitect - șef mun. Strășeni

Gheorghe GUTAN - manager șef al ÎM "Gospodăria Comunală Strășeni"

Petru MORARI - responsabil tehnic

Igor JEREGHI - consilier orașenesc

3. Au mai participat: **Sergiu BEJAN** – inginer șef proiect SRL "Astral – Expert"
Dorin ODOVENCO – diriginte de șantier SC,,Nouconst" SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- receptionarea la terminarea lucrărilor de reparație capitală a unui sector de drum din strada Toma Ciorbă din or. Strășeni, cu lungimea de 0.650 km

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- **examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate**
- **obiectul corespunde cerintelor NCM si legislatiei în vigoare**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- se acceptă recepția la terminarea lucrărilor a obiectului cu obiectiile specificate în anexe

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul Reparația capitală a unui sector de drum din strada Toma Ciorbă din mun. Strășeni, cu lungimea de 0.650 km, constă în lucrările de reparație capitală a străzii: lungimea totală de - 650m, lățimea părții carosabile - 6,0m , cu structura rutieră din beton asfaltic, trotuar pavat cu suprafata de 400m2.

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au prezentată sau este incompletă

privind lucrarea **"Reparația capitală a unui sector de drum din strada Toma Ciorbă
din mun. Strășeni. cu lungimea de 0.650 km"**



Executant

SC "Nouconst" SRL

Beneficiar

"Primăria mun. Strășeni"

Responsabil tehnic

Petru Morari



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

privind lucrarea **"Reparația capitală a unui sector de drum din strada Toma Ciorbă
din mun. Strășeni, cu lungimea de 0,650 km"**

Executant

SC "Nouconst" SRL

Beneficiar

"Primăria mun. Strășeni"

Responsabil tehnic

Petru Morari



**Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile
proiectului**

privind lucrarea **"Reparatia capitală a unui sector de drum din strada Toma Ciorbă
din mun. Strășeni, cu lungimea de 0.650 km"**

- Restabilirea bordurilor dezaxate

Executant

SC "Nouconst" SRL

Beneficiar

"Primăria mun. Strășeni"

Responsabil tehnic

Petru Morari



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 3/01

privind achiziția prin Licitație deschisă

“24” iunie 2021

mun. Strășeni

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică organizată prin Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1620722164445 din 27.05.2021 privind achiziționarea: „Lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021”, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, telefon/fax: 0(237) 2 36 30, cod fiscal: 1017601000161, reprezentat prin președintele raionului Strășeni, d-nul Pavel TAMACIUC, care acționează în baza Legii nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SC „NOUCONST” SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, 94, cod fiscal: 1005600012120, tel: 022788800, e-mail: dorin.odovenko@nouconst.md, reprezentat prin administratorul dl Vadim SCOROBOGATCO, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lotul 1, Lucrările de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **90 de zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **6 426 243,94 lei MD, (*Șase milioane patru sute douăzeci și șase de mii două sute patru zeci și trei, 94 bani, inclusiv TVA 1071040,66 lei.*)**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în limitele alocărilor bugetare anuale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările

- pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general după semnarea contractului atribuit, în timp de cinci zile lucrătoare, prezintă Beneficiarului contractul-garanție de bună executare a lucrărilor (Cont Bancar de Depozit – Garanție), încheat cu banca unde se deservește „Antreprenorul”, pentru depunerea garanției de bună executare a contractului atribuit în cuantum de 10% prin rețineri succesive din plățile facturilor din valoarea contractului.
- 6.11 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.12 Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării scrise de Beneficiar către agentul bancar, care se va face după finalizarea contractului, semnarea

- procesului-verbal de recepție finală și predare către Beneficiar a certificatului de garanție pentru lucrările executate.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 6.26 În timpul deslășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiș și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului contract este de 36 luni calendaristice.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiulă proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNE


- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 15.12.2021

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Autoritatea contractantă/ Beneficiar	Antreprenorul
Aparatul Președintelui raionului Strășeni	SC „NOUCONST” SRL
Președintele raionului Pavel TAMACIUC	Administratorul Vadim SCOROBOGATCO
Adresa poștală: or. Strășeni, str. M. Eminescu 28 Telefon: 0237 2-36-30 e-mail: consiliulraional@crstraseni.md Cod IBAN: MD40TRPDAU312120G15745AB Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin 33 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1017601000161	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Petricani 94 tel/mob: 022788800; 068146700 e-mail: dorin.odovenko@nouconst.md Adresa poștală a băncii: BC „Moldindconbank” S.A. fil. „Renastere” Chisinau Cod bancar: MOLDMD2X312 <i>HC RN MD2X 41</i> Cont IBAN: MD20ML000000022512123039 Cod TVA: 0605333 Cod fiscal: 1005600012120
Semnătura 	Semnătura 

MD 32 HC 000000022512170316

Serviciul juridic
[Signature]

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.01/RT din 10 februarie 2022

privind lucrarea „Lotul 1, Lucrări de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021” este executat în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 3/01 din 24 iunie 2021 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni și SC „NOUCONST” SRL.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10 februarie 2022, conform DISPOZIȚIEI Nr. 9 din 28 ianuarie 2022 fiind formată din:

CROITOR Vladislav	- vicepreședinte al raionului, președintele comisiei
SÎRBU Nicolae	- șef al Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor din cadrul Direcției economie și infrastructură
GUȚAN Gheorghe	- responsabil tehnic
RUSU Gheorghe	- șef sector al districtului Strășeni, SA, „Drumuri Strășeni”
2. Au mai participat la recepție:	
CRĂCIUN Igor	- primar al satului Cojușna
BUTNARU Rodica	- primar al comunei Micleușeni
SCHIRLIU Alexandru	- primar al satului Negrești
DÎMCENCO Mariana	- primar al or. Bucovăț
TĂBĂCARI Svetlana	- primar al satului Scoreni
CASIAN Valentina	- primar al municipiului Strășeni
MANOLI Maria	- primar al satului Zubrești
SCORABOGATCO Vadim	- Administrator SC „NOUCONST” SRL

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: _____

de recepționat lucrările

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrările au fost executate calitativ în termeni contractați cu respectarea documentației de proiect și a actelor normative în vigoare.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: _____

Recepționarea lucrărilor executate

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală r-nul Strășeni, destinația „**Lotul 1, Lucrări de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021**” suprafața la sol m. p., suprafața totală _____, numărul de etaje _____,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi 10 februarie 2022, la ora 9⁰⁰ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

CROITOR Vladislav

SÎRBU Nicolae

GUȚAN Gheorghe

RUSU Gheorghe

CRĂCIUN Igor

BUTNARU Rodica

SCHIRLIU Alexandru

DÎMCENCO Mariana

TĂBĂCARI Svetlana

CASIAN Valentina

MANOLI Maria

SCORABOGATCO Vadim

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „**Lotul 1, Lucrări de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021**”

_____ 2022

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea, „Lotul 1, Lucrări de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021” este

" " 2022

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2022

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2022

L.Ș.

(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 /RF din 10 februarie 2022

Obiectul „Lotul 1, Lucrări de reparații curente a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anul 2021” este executat în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 3/01 din 24 iunie 2021 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni și SC„NOUCONST” SRL.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 10 februarie 2022, conform DISPOZIȚIEI Nr. 9 din 28 ianuarie 2022 fiind formată din:

CROITOR Vladislav	- vicepreședinte al raionului, președintele comisiei
SÎRBU Nicolae	- șef al Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor din cadrul Direcției economie și infrastructură
GUȚAN Gheorghe	- responsabil tehnic
RUSU Gheorghe	- șef sector al districtului Strășeni, SA„Drumuri Strășeni”

2. Au mai participat la recepție:

CRĂCIUN Igor	- primar al satului Cojușna
BUTNARU Rodica	- primar al comunei Micleușeni
SCHIRLIU Alexandru	- primar al satului Negrești
DÎMCENCO Mariana	- primar al or. Bucovăț
TĂBĂCARI Svetlana	- primar al satului Scoreni
CASIAN Valentina	- primar al municipiului Strășeni
MANOLI Maria	- primar al satului Zubrești
SCORABOGATCO Vadim	- Administrator SC„NOUCONST” SRL

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 08 decembrie 2021;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
sunt completate

- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

sunt în posesia utilizatorului

- 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 08.12.2021 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) valoarea obiectului conform Contractului de Antrepriză nr.3/01 din 24 iunie 2021 constituie **6 426 243,94** lei;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

de receptionat lucrările finalizate

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate calitativ conform contractului de antrepriză și devizului de cheltuieli

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

receptionarea finală a lucrărilor executate

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____ poștală r-nul Strășeni,
destinația „Lotul 1, Lucrări de reparații curente a drumurilor publice locale de interes
raional din raionul Strășeni în anul 2021” suprafața la sol _____, suprafața totală _____ ha,
numărul de etaje _____.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și a fost încheiat astăzi 10 februarie 2022, la 9⁰⁰
în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

CROITOR Vladislav

SÎRBU Nicolae

GUȚAN Gheorghe

RUSU Gheorghe

CRĂCIUN Igor

BUTNARU Rodica

SCHIRLIU Alexandru

DÎMCENCO Mariana

TĂBĂCARI Svetlana

CASIAN Valentina

MANOLI Maria

SCORABOGATCO Vadim



8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „**Lotul 1, Lucrări de reparații curente a drumurilor publice locale de interes rațional din raionul Strășeni în anul 2021**”

" ____ " _____ 2022

L.Ș. _____

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR FINALIZATE
Nr. 2 din 16 februarie 2023

Privind „Lucrările de reparație a unei porțiuni de drum a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni” executate în cadrul contractului Nr. 58 din 01 septembrie 2022, încheiat între Primăria Cojușna, și SC „Nouconst” SRL.

1. Comisia desemnată și-a desfășurat activitatea în perioada 16 februarie 2023 fiind formată din:

- a) Președintele comisiei: Craciun Igor – primar s. Cojușna
- b) Membrii comisiei: Boaghie Tatiana – vice primar s. Cojușna
Chiriac Andrei – responsabil tehnic
Botan Teodor – arhitect primăria s. Cojușna
Bivol Margareta – contabil șef primăria s. Cojușna

Au mai participat:

Odovento Dorin – diriginte de șantier SC „Nouconst” SRL

2. Constatările comisiei de recepție:

- a. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la lucrările de reparație a drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare;
- b. Lucrările au fost complet executate în termenii:
începutul lucrărilor *septembrie 2022* sfârșitul lucrărilor *octombrie 2022*
- c. Cartea Tehnică a construcției obiectului este completată;
- d. Costul lucrărilor de facto conform contractului Nr. 58 din 01 septembrie 2022 constituie 3 203 084,10 lei

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune:

- recepționare lucrărilor

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

- lipsa neconformităților

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- recepționarea și întreținerea obiectivului.

Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 16 februarie 2023 în 5 exemplare.

Anexa: 1 . Situația neconformităților depistate de comisia de recepție.

6.Comisia de recepție a lucrărilor :


Președintele comisiei: Craciun Igor

Membrii comisiei: Boaghie Tatiana

Chiriac Andrei

Botan Teodor

Bivol Margareta

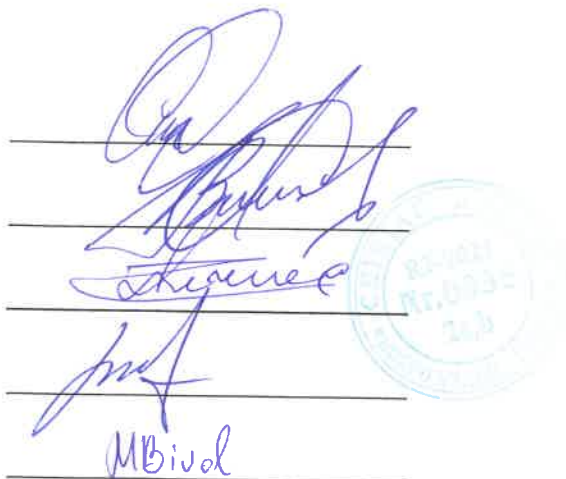

Lucrarea „Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul Strășeni” este terminată și transmisă.

Transmis
Executantul
”Nouconst” S.R.L.

” 16 ” februarie 2023



Primit
Beneficiar
”Primăria Cojușna”

” 16 ” februarie 2023



Nr. 2 din 16 februarie 2023

SITUAȚIA

neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate la obiectul:
„Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, r-ul
Strășeni”

[illegible]

Executantul
SC "Nouconst" S.R.L.

Beneficiar
"Primăria Cojușna"

Responsabil tehnic atestat
Chririac Andrei



[Signature]



**PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR FINALIZATE**

Nr. 1 din 16 februarie 2023

Privind „lucrări de reparație și amenajare a parcarii la sediul Primăriei din satul Cojușna, r-ul Strășeni” executate în cadrul contractului Nr. 59 din 01 septembrie 2022, încheiat între Primăria Cojușna, și SC „Nouconst” SRL.

1. Comisia desemnată și-a desfășurat activitatea în perioada 16 februarie 2023 fiind formată din:

- a) **Președintele comisiei:** Craciun Igor – primar s. Cojușna
- b) **Membrii comisiei:**
 - Boaghie Tatiana – vice primar s. Cojușna
 - Chiriac Andrei – responsabil tehnic
 - Botan Teodor – arhitect primăria s. Cojușna
 - Bivol Margareta – contabil șef primăria s. Cojușna

Au mai participat:

Odovenco Dorin – diriginte de șantier SC „Nouconst” SRL

2. Constatările comisiei de recepție:

- a. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la lucrările de reparație a drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare;
- b. Lucrările au fost complet executate în termenii:
începutul lucrărilor *septembrie 2022* sfârșitul lucrărilor *octombrie 2022*
- c. Cartea Tehnică a construcției obiectului este complectată;
- d. Costul lucrărilor de facto conform contractului Nr. 59 din 01 septembrie 2022 constituie 1 942 234,36 lei

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune:

- *recepționare lucrărilor*

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

- *lipsa neconformităților*

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- *recepționarea și întreținerea obiectivului.*

Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 16 februarie 2023 în 5 exemplare.

Anexa: 1 . Situația neconformităților depistate de comisia de recepție.

6.Comisia de recepție a lucrărilor :


Președintele comisiei: Craciun Igor

Membrii comisiei: Boaghie Tatiana

Chiriac Andrei

Botan Teodor

Bivol Margareta

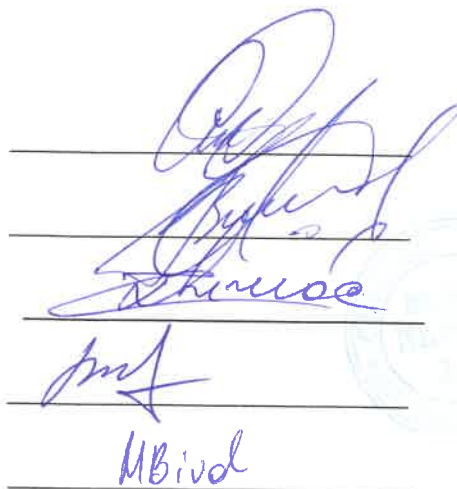


Lucrarea „lucrări de reparație si amenajare a parcării la sediul Primăriei din satul Cojușna, r-ul Strășeni” este terminată și transmisă.

Transmis
Executantul
”Nouconst” S.R.L.

” 16 ” februarie 2023



L.Ș.



Primit
Beneficiar
”Primăria Cojușna”

” 16 ” februarie 2023



L.Ș.



neconformităților depistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate la obiectul:
„lucrări de reparație si amenajare a parcarii la sediul Primăriei din satul Cojușna, r-ul Strășeni”

[illegible]

REPUBLICA MOLDOVA, min. AGRICULTURII ȘI ALIMENTAȚIILOR

"NOUCONS"

S.R.L.

IDNO 1005609012120

SOCIETATE COMERCIALĂ

The image shows a handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. Below the signature is a large, circular official stamp. The stamp is light blue and contains the text "REPUBLIKA SRBIJA" at the top, "MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I VEŠTAČENJA" around the perimeter, and "PRIVATNA" and "S. ULICI C." in the center. There is also a small star symbol in the center of the stamp.

Responsabil tehnic atestat
Chiriac Andrei
