

7

Contract nr. C&W-017/16PRRECI
de executare a lucrărilor civile
privind construcția drumului cu lungimea de 0,66 km către casa de ambalare și depozitul de cereale
din sat. Taraclia, r-l Căușeni

Acest Contract, este încheiat la 11 mai 2016, între

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, în persoana directorului Victor Roșca, cu adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 162, oficiul 1304, (numit în continuare "Angajator"),

Primăria satului Taraclia din raionul Căușeni, reprezentată prin primarul satului Vladimir Cucereavii,

Grupul neoficial de producători agricoli, reprezentat prin reprezentantul autorizat Dumitru Bocancea (numit în continuare "Client"), pe de o parte și

Societatea cu Răspundere Limitată „Construm”, în persoana directorului Ulianov Igor, cu adresa or. Chișinău, str. Eugen Coca, 47 (numit în continuare "Contractant") pe de altă parte.

Prin acest contract, Clientul își manifestă voința ca Contractantul să execute lucrările civile privind construcția drumului cu lungimea de 0,66 km către casa de ambalare și depozitul de cereale din sat. Taraclia, r-l Căușeni, nr. de identificare a contractului **C&W-017/16PRRECI** (în continuare numite "Lucrări"). Clientul și Angajatorul au acceptat Oferta Contractantului de executare și realizare a unor astfel de Lucrări și de înlăturare a oricăror defecte în legătură cu acestea.







Acest Contract confirmă următoarele:

- În acest Contract, termenii și expresiile vor avea sensurile care le sunt atribuite în Condițiile Contractului menționate în continuare, și vor constitui, vor fi percepute și interpretate ca parte a acestui Contract.
- Referitor la plățile care vor fi efectuate de către Angajator în contul Contractantului, după cum este stipulat în continuare, prin prezentul, Contractantul convine cu Clientul să execute și să realizeze Lucrările și să înlătore orice defecte în legătură cu acestea în corespundere totală cu prevederile Contractului.
- Prin prezentul, Angajatorul convine să plătească Contractantului pentru executarea și realizarea Lucrărilor coordonate de către Client și pentru înlăturarea defectelor în legătură cu Prețul Contractului sau o astfel de sumă devenită scadentă în baza prevederilor Contractului la data și în modul prescise în Contract.

Întru confirmarea acestui fapt părțile au convenit ca acest Contract va intra în vigoare la data semnării lui indicată la începutul acestui Contract.

Rechizite bancare:

Angajator	Client	Contractant
<p style="text-align: center;">UCIP-IFAD</p> <p>MD 2001.Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1301</p> <p>Platitor MF-TT Chisinau Bugetul de Stat Unitatea IFAD</p> <p>Cod fiscal 1008601001038</p> <p>Prestatorul platitor Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat</p> <p>Codul bancii TREZMD2X</p> <p>IBAN: _____</p> <p>Art. _____</p> <p>Tel. 022 225046</p>	<p>Primăria s. Taraclia și</p> <p>Grupul neoficial de producători agricoli</p>	<p>SRL „Construm”</p> <p>Codul fiscal: 1002600014031</p> <p>Cont IBAN: MD43EN000000022247127858</p> <p>Banca: BC „Energbank” SA, filiala Botanica, Chișinău</p> <p>Cod bancar: ENEGMD22858</p> <p>MD 2068, or. Chișinău, str. Eugen Coca 47</p>

Semnături:		
<p>Director UCIP-IFAD:</p> <p>Victor ROȘCA</p>  	<p>Primar:</p> <p>Vladimir Cucereavii</p> <p>Reprezentant Autorizat:</p> <p>Dumitru Bocancea</p>  	<p>Director SRL „Construm”</p> <p>Igor Ulianov</p>  

Datele Contractului

Cu excepția cazului când va fi indicat altfel, toate Datele Contractului vor fi completate de către Angajator înainte de eliberarea documentelor de ofertă. Graficele și rapoartele care vor fi oferite de către Angajator vor fi anexate.





#	Referință	Clauza din Contract
1.	Împrumutatul este: Republica Moldova "IFAD" înseamnă: " Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii ". "Împrumutul" înseamnă: un " împrumut IFAD "	[1]
2.	Clientul este: Grupul-client – Primăria satului Taraclia, raionul Căușeni, agenți economici și locuitori ai satului. Adresa: s. Taraclia, raionul Căușeni Primar: Vladimir Cucereavii, 0- 243-61236	[1]
3.	Reprezentantul Autorizat al Grupului-client este: Numele: Dumitru Bocancea, 069645196, Adresa: s. Taraclia, raionul Căușeni	[1]
4.	Angajatorul este: Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor - IFAD. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, oficiul 1301-1304 Numele Persoanei Autorizate: Victor Roșca, director	[1]
5.	Responsabil Tehnic Nume/Prenume/date contact: Andrei Rusnac, tel: 079944312	[1]
6.	Numele și numărul de identificare a Contractului sunt: Lucrări civile privind construcția drumului cu lungimea de 0,66 km către casa de ambalare și depozitul de cereale din sat. Taraclia, r-l Căușeni, nr. de identificare a contractului C&W-017/16PRRECI.	[1]
7.	Lucrările sunt formate din: <u>construcția drumului cu lungimea de 0,66 km către casa de ambalare și depozitul de cereale din sat. Taraclia, r-l Căușeni</u>	[1]
8.	Nu se va permite efectuarea schimbărilor în cantități. Contractantul va respecta strict cantitățile incluse în lista cantităților de lucrări. Nici o schimbare propusă nu va fi întreprinsă fără aprobarea Angajatorului.	[25]
9.	Data Începerii va fi: în decurs de 10 zile de la data semnării contractului	[1]
10.	Data solicitată pentru Finalizarea tuturor Lucrărilor va fi: 21.08.2016 , însă contractul va fi valabil pînă la 31.12.2017 după expirarea perioadei de garanție, înlăturarea defectelor și achitarea completă cu contractantul. Termenul limită pentru finalizarea tuturor lucrărilor de construcție poate fi extins pe un termen maxim 15 zile calendaristice, altfel vor fi aplicate penalitățile conform pct.21.	[19]
11.	Următoarele documente sunt, de asemenea, parte a Contractului: Programul/Orarul de lucru	[2.1]
12.	Contractantul va prezenta un program revizuit pentru efectuarea Lucrărilor: în termen de 20 zile de la primirea Scrisorii de Acceptare.	[18]
13.	Data transmiterii șantierului Contractantului: în termen de 10 zile din data semnării Contractului [Dacă obiectul este predat pe secțiuni, aici vor fi enumerate diferite date.]	[13]
14.	Șantierul este amplasat: în s. Taraclia, raionul Căușeni și este descris în desenele tehnice.	[1]
15.	Perioada de Răspundere pentru Defecte este: 6 luni după emiterea Certificatului de Finalizare Materială. <i>* dacă termenul de garanție expiră în perioada rece a anului acesta se va prelungi încă cu 3 luni</i> <i>* dacă la execuția lucrărilor de construcție au fost depistate abateri de la proiect, dacă nu a fost respectată tehnologia de construcție confirmată prin acte de constatare, termenul de garanție se va prelungi încă cu 6 luni</i>	[23]

16. Următoarele evenimente vor fi de asemenea pasibile de Compensare: [11]
Nu se aplica, sau numai în cazul de aprobare suplimentară de către Angajator.
17. Limba documentelor Contractului este: **Limba de stat** [3]
18. Legislația aplicabilă pentru Contract este legislația : **Republicii Moldova.** [3]
19. Toate litigiile care apar între părți în baza acestui Contract pot fi soluționate în conformitate cu Legislația: **Republicii Moldova.** [3]
20. Ajustarea prețului contractului: [28]
Nu poate fi ajustat în conformitate cu Clauza 34 din Condițiile Contractului.
21. Procentul reținut din fiecare plată este: [31]
În calitate de garanție pentru perioada de întreținere, vor fi reținute câte 5% din fiecare plată. Spre sfârșit, 5% din prețul contractului va fi reținut din Certificatul de Finalizare a Lucrărilor pentru perioada de întreținere.
2,5% din prețul total al contractului sau 50% din mijloacele reținute vor fi plătite Contractantului, atunci când lucrările vor fi finalizate și deficiențele identificate vor fi înlăturate.
Ultimele 2,5% din prețul contractului vor fi plătite la sfârșitul perioadei de răspundere pentru defecte, după corectarea definitivă a defectelor depistate și semnarea Certificatului de Îndeplinire Finală de toate persoanele relevante.
22. Penalitățile percepute de la Contractant pentru depășirea neîntemeiată a datei planificate de finalizare a lucrărilor vor constitui: **0.20% pe zi din prețul contractului.** [32]
Orice prelungire justificată prin argumentare a termenului de încheiere a lucrărilor, convenită de comun acord între Părți, va fi valabilă doar în formă scrisă, nu mai târziu de data finalizării lucrărilor, stabilită în punctul 10 de mai sus. [18-19]
23. Suma maximă a penalităților percepute de la Contractant nu va depăși: [32]
10% din Prețul final al Contractului.
24. Angajatorul nu va plăti Contractantul în avans pentru îndeplinirea lucrărilor de construcții.
25. Garanția de Executare va fi prevăzută pentru următoarea sumă minimă echivalentă ca procentaj din Prețul Contractului: [34]
Garanția Bancară pentru 5% din Prețul Contractului.
26. **Formularul tip al Garanției de Executare acceptat de către Angajator va fi: Garanție Bancară după cum este prezentat în Documentele de Ofertă.** [34]
27. Procentajul perceput la valoarea lucrului nefinalizat, în caz de reziliere, care reprezintă cheltuieli suplimentare pentru Angajator pentru Finalizarea Lucrărilor este: **10%.** [38-39]
28. **Prețul total al contractului constituie 3.776.651,50 MDL (trei milioane șapte sute șaptezeci și șase mii șase sute cincizeci și unu lei, 50 bani).**
29. Plata va fi efectuată în:

Lei Moldovenesti conform certificatelor de plată la prezentarea proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor de construcție. Din suma totală de **3.776.651,50 lei**, în anul curent vor fi achitate **3.684.235,21 lei**, iar reținerea de **94.416,29 lei** se va achita în anul 2017 după expirarea perioadei de garanție.

Conform Hotărârii Guvernului RM nr.246 din 08.04.2010, achizițiile de mărfuri și servicii în cadrul Programelor IFAD se efectuează prin aplicarea TVA la cota 0%.

Semnături:

<p>Director UCIP IFAD: Victor Roșca</p> 	<p>Primar: Vladimir Cucereavii Reprezentant Autorizat: Dumitru Bocancea</p>  	<p>Director SRL „Constrium” SRL Igor Ulianov</p> 
---	--	--

părăsească în decurs de 15 zile din momentul expirării perioadei de notificare.

- 39. Plata la reziliere** **39.1** Dacă Contractul este terminat din cauza unei încălcări fundamentale a Contractului de către Contractant, Reprezentantul Autorizat și Angajatorul vor elibera un certificat pentru valoarea lucrului efectuat și Materialele comandate minus plățile în avans primite până la data când a fost eliberat certificatul și minus procentul ce trebuie aplicat valorii lucrului neterminat, după cum este indicat în Datele Contractului. Daune lichidate suplimentare nu se vor aplica. Dacă suma totală datorată Angajatorului depășește suma totală datorată Contractantului, diferența va fi considerată o datorie ce urmează a fi achitată Angajatorului.
- 40. Proprietatea** **40.1** Dacă contractul este reziliat din cauza Contractantului, toate materialele și echipamentul de construcție de pe Șantier, instalațiile permanente și temporare și lucrările, procurate din contul plăților Angajatorului, se vor considera proprietatea Clientului/Angajatorului.
- 41. Eliberarea de obligațiunile privind executarea contractului** **41.1** Dacă executarea Contractului este imposibilă din cauza izbucnirii unui război sau de orice alt eveniment care nu ține de voința atât a Angajatorului, Clientului cât și a Contractantului, Reprezentantul Autorizat și Angajatorul vor certifica că Contractul a fost imposibil de executat. Contractantul va asigura securitatea șantierului și va opri lucrul cât de repede posibil după primirea acestui certificat și va fi plătit pentru tot lucrul efectuat până la primirea acestuia și pentru orice lucru efectuat după aceea în privința căruia s-a ajuns la un acord.
- 42. Modificarea costurilor cauzate de modificarea Legislației** **42.1** Dacă timp de 28 zile după termenul limită de prezentare a ofertelor, vor apărea careva modificări în Statut, Decret, Legislație, Regulamente, sau articole naționale sau în privința autorităților locale sau altor autorități și asemenea Articole vor fi aprobate și vor avea impactul asupra altor cheltuieli sau costul redus pentru Contractant de a executa contractul, asemenea cheltuieli, ulterior negocierilor între Angajator și Contractant, vor fi determinate de către Responsabilul Tehnic și va fi adăugat sau dedus din costul Contractului și Responsabilul Tehnic va înștiința pe Contractant.
- 43. Contactele cu Angajatorul** **43.1** Contractantul va prezenta îngrijorările sale în privința executării lucrărilor către Responsabilul tehnic în scris. Responsabilul tehnic va semna și prezenta acestea Angajatorului și Clientului.
- 44. Garanția Executării** **44.1** Garanția Executării lucrărilor va fi confiscată în cazul în care Contractantul nu reușește să finalizeze lucrările în termenul stabilit, sau în alt termen convenit de ambele părți în scris.
- 45. Suspendarea împrumutului sau creditului IFAD** **45.1** În cazul în care IFAD suspendă Împrumutul sau Creditul acordat Angajatorului din care sunt efectuate o parte din plățile către Contractant:
- (a) Angajatorul este obligat să înștiințeze Contractantul și Clientul despre o astfel de suspendare timp de 7 zile de la primirea avizului despre suspendare de la IFAD
 - (b) În cazul, în care Contractantul nu a primit sumele ce urmau a fi achitate după expirarea a 28 zile pentru achitarea stipulată în Sub-

clausa 28.1, Contractantul poate imediat elibera notificarea de terminare de 14 zile.

46. Practici corupte și frauduloase

46.1 IFAD solicită ca contractanții (inclusiv beneficiarii împrumuturilor IFAD), precum și Ofertanții/Furnizorii în baza contractelor finanțate de către IFAD, să respecte cele mai înalte standarde de etică în timpul obținerii și executării unor astfel de contracte. În baza acestei politici IFAD:

(a) definește în scopul acestei prevederi termenii următori:

- "practică coruptă" înseamnă oferirea, darea sau primirea sau solicitarea oricărui lucru de valoare pentru a influența acțiunile unui funcționar public în procesul de obținere sau executare a contractului; și
- "practică frauduloasă" înseamnă prezentarea greșită a faptelor pentru a influența procesul de obținere sau executare a contractului în detrimentul Împrumutatului, și include practici coluzive în rândul Contractantului;

46.2 Mai mult decât atât, Contractantul va fi conștient de condițiile anti-corupționale conform legislației Republicii Moldova după cum se menționează în Condițiile generale de Contract

Semnături:

Director UCIP-IFAD: Victor Roșca	Primar: Vladimir Cucereavii Reprezentant Autorizat: Dumitru Bocancea	Director SRL „Construm” Igor Ulianov
-------------------------------------	---	---



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 27.06.2017

Obiectul Construcția drumului cu lungimea de 0,66 km către casa de asamblare și deposit din s. Taraclia r. Căușeni este executat în cadrul contractului nr. C&W-017/16PRRECI din "11.05.2016" încheiat între s. Taraclia r. Căușeni, grupul Clienți și Unitatea Consolidată Pentru Implementarea Programelor IFAD și SRL Construm, pentru efectuarea lucrărilor de construcție.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 26 din 02.06.2016 valabilă până la 6 luni, de către Primăria s. Taraclia

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul orei 9-00 până la 17-00 la data de 27.06.2017, fiind formată din:

Președintele comisiei: Vladimir Cucereavii – Primarul

Secretar al comisiei: Victoria Scorocîrgă – Contabil

Membrii comisiei: Dumitru Bocancea - Director SRL BOGARMOS

Timofei Gangurean – Consilier

Vasile Surchicean - Reprezentant Struguri Chihlimbarii

Alexandru Railean – Reprezentant IFAD

Anatolie Para - Inginer cadastral

2. **Au mai participat la recepție:**

Igor Ulianov – Director SRL Construm

Sergiu Bejan – Director SRL Astral Proiect

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările au fost complet terminate la data de 25.09.2016;
 - 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
 - 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
 - 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ până în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
 - 7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei-anexă nr. 1.
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

De recepționat obiectivul la recepția finală

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examinarea documentației și terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se acceptă recepția finală a obiectivului

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 27.06.2017 la în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei: Vladimir Cucereavii – Primarul

Secretar al comisiei: Victoria Scorocîrgă – Contabil

Membrii comisiei: Dumitru Bocancea - Director SRL BOGARMOS

Timofei Gangurean – Consilier


Vasile Surchicean - Reprezentant Struguri Chihlimbarii

Alexandru Railean – Reprezentant IFAD

Anatolie Para - Inginer cadastral

Igor Ulianov – Director SRL Construm

Sergiu Bejan – Director SRL Astral Proiect

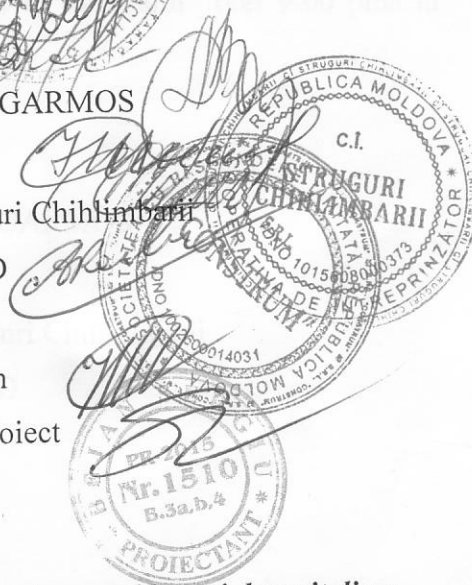

Obiectul Construcția drumului cu lungimea de 0,66 km către casa de asamblare și deposit din s. Taraclia r. Căușeni este:

Transmisă:

Executantul

27.06.2017



Primită:

Investitorul



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

publică nr. 15/01380
45233160-8

Digitally signed by Ulian Galina
Date: 2019.04.04 08:51:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/215

03 august 2015



Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Presentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 15/01380 din 22.06.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 41 din 02.06.2015, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 022222280 cont de decontare 222450149802110 deschis la Banca de Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei și **S.R.L."Construm"** în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în or. Chișinău, str. E. Coca 47, tel. 592643, fax.592978, c/f 1002600014031, cont de decontare 22247127 deschis la BC "Energbank" S.A., fil. Botanica, c/b ENEGMD22858, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1002600014031 din 29.05.2008 licență de activitate seria A MMII nr. 038112 din 22.12.2005 valabilă pînă la 22.12.2015, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții inginerești, reconstrucții, consolidări reprezentată de directorul dl Igor Ulianov.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud a republicii pentru lotul 1 (amplasat teritorial raionul Basarabeasca), lotul 3 (amplasat teritorial în raionul Cantemir), lotul 5 (amplasat teritorial în raionul Leova), lotul 6 (amplasat teritorial în raionul Taraclia), lotul 7 (amplasat teritorial în raionul Comrat), lotul 8 (amplasat teritorial în raionul Ceadâr-Lunga) și lotul 9 (amplasat teritorial în raionul Vulcănești)**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, caietului de sarcini pe loturile nominalizate, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – **15 noiembrie 2015.**

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția de acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum este necesar pentru Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Beneficiar vor fi plătite de Beneficiar.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 6 343 869,42 (**șase milioane trei sute patruzeci și trei mii opt sute șaiszeci și nouă lei, 42 bani**) inclusiv TVA:

- la lotul 1 – 509 252,77 (cinci sute nouă mii două sute cincizeci și doi lei, 77 bani) inclusiv TVA;
- la lotul 3 – 1 408 147,66 (un milion patru sute opt mii una sută patruzeci și șapte lei, 66 bani) inclusiv TVA;
- la lotul 5 – 759 315,25 (șapte sute cincizeci și nouă mii trei sute cincisprezece lei, 25 bani) inclusiv TVA;
- la lotul 6 – 828 140,89 (opt sute douăzeci și opt mii una sută patruzeci lei, 89 mii) inclusiv TVA;
- la lotul 7 – 919 176,43 (nouă sute nouăsprezece mii una sută șaptezeci și șase lei, 43 bani) inclusiv TVA;
- la lotul 8 – 1 148 409,34 (un milion una sută patruzeci și opt mii patru sute nouă lei, 34 bani) inclusiv TVA;
- la lotul 9 – 771 427,08 (șapte sute șaptezeci și una mii patru sute douăzeci și șapte lei, 08 bani) inclusiv TVA;

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru anul 2015, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă **nu va accepta** actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să fie achitate în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le plătească Beneficiarul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

Beneficiarul va efectua recepția de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după recepția finală).

După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea legilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 30.03.2016.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559
c/d 222450149802110
Banca de Economii S.A.
fil. 1 or. Chișinău
c/b BECOMD2X609
c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei



S.R.L. "Construm"

or. Chișinău, str. Coca 47
c/f 1002600014031
c/d 22247127
BC „Energbank” S.A.
fil. Botanica
c/b ENEGMD22858
c/TVA 0500138

Director
Igor Ulianov



HD

Manager – șef



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE

Nr. 14 din 17 februarie 2016

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud raionul Taraclia

Privind lucrările de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud, Lotul 6, raionul Taraclia, drumul L 668 M 3 drum de acces spre or. Taraclia, km 1+000 ÷ 2+000, executate în cadrul contractului nr. 11-18/215 din 03.08.2015, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Construm” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 47 din 01.09.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi miercuri 17 februarie 2016 fiind formată din:

a.) Președinte P. Triboi - șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD”

b.) membri: V. Cohanco - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”

I. Ulianov - director, S.R.L. „Construm”

I. Bondari - director, S.A. „Drumuri - Cahul”

N. Bocicovar - S.A. „Drumuri - Cahul” sector Taraclia

I. Lozov - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoarele, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Construm”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor septembrie 2015 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2015

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie – **0,96 mln. lei, inclusiv LCM – 0,80 mln. lei**

4. Costul lucrărilor de facto, inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – **855 909,09 lei, LCM – 828 140, 89 lei, inclusiv pe drumul L 668 M 3 drum de acces spre or. Taraclia, în valoare de 855 909, 09 lei.**

5. Comisia de recepție a lucrărilor executate, propune ca costul volumelor lucrărilor finalizate pe drumul menționat, să fie direcționat la majorarea costului drumului respectiv.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, miercuri 17 februarie 2015 în 3 exemplare.

Comisia:


Președinte

P. Triboi

Membri:

V. Coșar

I. Uliian

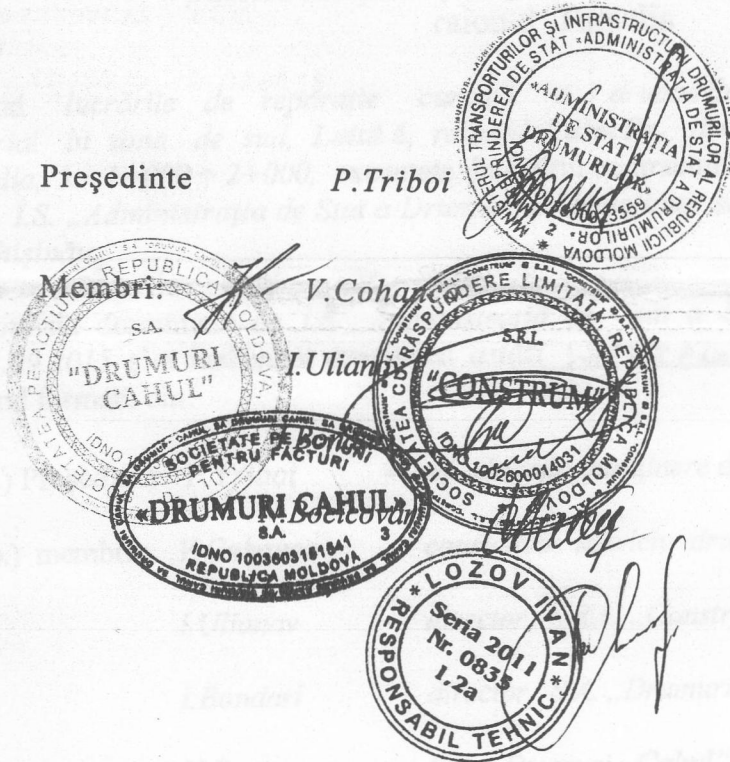

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoarele, cu un grad sporit de degradare, în conformitate cu devizul care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Construm”

b.) devizul a fost elaborat de I.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii

Încesutul lucrărilor septembrie 2015 stăruind lucrărilor noiembrie 2015


3. Costul lucrărilor conform devizului constituit - 876 mii. lei, inclusiv LCM - 8,86 mii. lei

4. Costul lucrărilor de facto, inclusiv cheltuielile beneficiarului constituite - 855.909,99 lei, LCM - 876.140,89 lei, inclusiv pe drumul L.668 M3 drum de acces spre or. Taraclia, în valoare de 855.909,99 lei.

U

Aprob.

Manager – șef



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE

Nr. 6 din 11 februarie 2016

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud raionul Ceadir Lunga

Privind lucrările de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud, Lotul 8, raionul Ceadir Lunga, drumul R 36 Basarabasca – Ceadir Lunga – Taraclia, km 17+100 ÷ 18+600, executate în cadrul contractului nr. 11-18/215 din 03.08.2015, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Construm” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 47 din 01.09.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi joi 11 februarie 2016 fiind formată din:

a.) Președinte P. Triboi - șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD”

b.) membri: V. Cohanco - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”

I. Ulianov - director, S.R.L. „Construm”

V. Cernuha - director, S.A. „Drumuri – Ceadir Lunga”

Eu. Gladcov - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoarele, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Construm”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor **septembrie 2015** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2015**

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie – **1,36 mln. lei, inclusiv LCM – 1,13 mln. lei**

4. Costul lucrărilor de facto, inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – **1 183 896, 01 lei, LCM – 1 148 409, 34 lei, inclusiv pe drumul R 36 Basarabasca – Ceadir Lunga – Taraclia, în valoare de 1 183 896, 01 lei.**

5. Comisia de recepție a lucrărilor executate, propune ca costul volumelor lucrărilor finalizate pe drumul menționat, să fie direcționat la majorarea costului drumului respectiv.


6. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, **11.02.2016** în 3 exemplare. *Joi*

Comisia:

Președinte **P. Triboi**

Membri: **V. Colacov**

I. Uliian

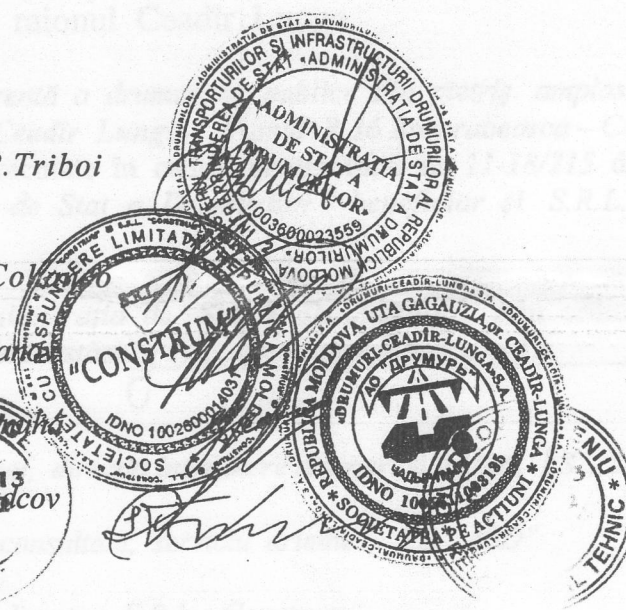

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe secțiunile, cu un grad sporit de degradări, în conformință cu devizul care nu contribuie la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. Construm

b.) devizul a fost elaborat de I.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii începutul lucrărilor septembrie 2015 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2015

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 1,36 mln. lei, inclusiv LCM - 1,13 mln. lei

4. Costul lucrărilor de facto, inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie - 1.183.896, 01 lei, LCM - 1.148.409, 34 lei, inclusiv pe drumul R 36 Basarabeasca - Ceadr Lunga, Terociu, în valoare de 1.183.896, 01 lei.

17
Aprob.

Manager – șef



Prezentul proces-verbal, conținutul și fișe, a fost încheiat în
10 februarie 2016

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE

Nr. 2 din 10 februarie 2016

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile
publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud
raionul Comrat

Privind lucrările de reparație curentă a drumurilor publice din pietriș amplasate teritorial în zona de sud, Lotul 7, raionul Comrat, drumurile L 635 Bugeac – Dezghingea – Cenac, km 10+200 ÷ 11+000, L 641.1 drum de acces spre s. Cotovscoe, km 0+300 ÷ 0+700, executate în cadrul contractului nr.11-18/215 din 03.08.2015, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Construm” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 47 din 01.09.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi marți 10 februarie 2016 fiind formată din:

- a.) Președinte P. Triboi - șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD”
- b.) membri: V. Cohanco - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
I. Ulianov - director, S.R.L. „Construm”
N. Tatar - director, S.A. „Drumuri – Comrat”
Eu. Gladcov - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoarele, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Construm”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor septembrie 2015 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2015

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 1,08 mln. lei, inclusiv LCM – 0,90 mln. lei

4. Costul lucrărilor de facto, inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 956 948, 58 lei, LCM – 919 176, 43 lei, inclusiv pe drumurile L 635 Bugeac – Dezghingea – Cenac, în valoare de 643 344, 12 lei, L 641.1 drum de acces spre s. Cotovscoe, în valoare de 313 604, 46 lei.

5. Comisia de recepție a lucrărilor executate, propune ca costul volumelor lucrărilor finalizate pe drumurile menționate, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, *miéccoci* 10 februarie 2016 în 3 exemplare.

Comisia:



Președinte P. Triboi

Membri: V. Cohancu

I. Ulianov

N. Tatar

Eu. Gladcov



2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe secțiunile, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul care au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație a trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. 'Construm'

b.) devizul a fost elaborat de I.S. 'ASD'

c.) lucrările au fost executate în termenii.

Începutul lucrărilor septembrie 2015 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2015

3. Costul lucrărilor conform devizului constituit - 1,08 mln. lei, inclusiv LCM - 0,90 mln. lei

4. Costul lucrărilor de facto, inclusiv cheltuielile Beneficiarului constituite - 956.948,58 lei, LCM - 919.176,43 lei, inclusiv pe drumurile L. 635 Bugrac - Dezghingea - Cernac, în valoare de 643.344,12 lei, L. 641.3 drum de acces spre s. Cotovascoc, în valoare de 313.604,46 lei.



ACHIZIȚII PUBLICE

CPV: 45221119-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/591

15 octombrie 2014

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/01841 din 07.10.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 75 din 29.09.2014, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 0 22740570, fax 0 2222280 cont de decontare 222450149802110 deschis la Banca de Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei și **S.R.L."Construm"** în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în or. Chișinău, str. E. Coca 47, tel. 592643, fax.592978, c/f 1002600014031, cont de decontare 22247127 deschis la BC"Energbank"S.A., fil. Botanica, c/b ENEGMD22858, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1002600014031 din 29.05.2008 licență de activitate seria A MMII nr. 038112 din 22.12.2005 valabilă pînă la 22.12.2015, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții inginerești, reconstrucții, consolidări reprezentată de directorul dl Igor Ulianov.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrărilor de reparație a podului pe drumul Minjir (raionul Hîncești) – Tomai (raionul Leova), PC 2+10,5**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, caietului de sarcini pe lotul nominalizat, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – **30 octombrie 2015**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa

cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 746 586,92 (trei milioane șapte sute patruzeci și șase mii cinci sute optzeci și șase lei, 92 bani) cu TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova în limita alocației Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3). Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier în anul 2014 sunt alocate 1 170 000,00 lei (un million una sută șaptezeci mii lei) inclusiv TVA. Beneficiarul va informa în scris Antreprenorul general despre disponibilitatea unor alocații suplimentare față de limita bugetară anuală stabilită.

4.3. La aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015 Beneficiarul prin acord adițional, va include în contract suma alocațiilor financiare pe anul 2015. În cazul nealocării mijloacelor financiare necesare pentru executarea integrală a lucrărilor conform prezentului contract, lucrările vor fi executate în limita alocațiilor financiare, obligațiunile contractuale asumate de către părți fiind îndeplinite și contractul terminat.

4.4. Plata în avans se va efectua în marime de maxim 10% în două etape după depunerea unei garanții de plată a avansului, echivalentă cu suma anticipat achitată:

- 1) 5% la semnarea contractului și depunerea garanției bancare de bună execuție;
- 2) 5% la mobilizarea deplină a Antreprenorului pentru a începe lucrările și totodată în funcție de complexitatea lor.

Garanția prezentată de către Antreprenor va fi valabilă și va rămîne în vigoare pînă la data rambursării avansului și valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, incluse în Certificatele de Plată interimare. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției pînă la rambursarea plății în avans. Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată interimare.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale).

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă pentru lucrările executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat și semnat;

c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);

e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;

f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 30.03.2016.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110

Banca de Economii S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef
Gheorghe Curmei



S.R.L. "Construm"

or. Chișinău, str. Coca 47

c/f 1002600014031

c/d 22247127

BC „Energbank” S.A.

fil. Botanica


c/b ENEGMD27888

c/TVA 0500138

Director
Igor Ulianov



Manager - șef interimar



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

din 24 mai 2016

Privind lucrările de construcție a podului pe drumul L 568 Mingir – Tomai PC 2 + 105, executate în cadrul contractului nr. 08 - 18/591 din 15.10.2014, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Construm” or. Chișinău, antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 22 din 23 martie 2015, eliberată de Consiliul Raional Hîncești cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 48 din 10.09.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi, miercuri 16 septembrie 2015 fiind formată din:

- a) Președinte: *Iu. Pașa* - manager - șef adjunct, Î.S. „ASD”
- b) membri:
- A. Cuculescu* - șef, direcția dezvoltare a drumurilor, MTID
 - V. Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
 - I. Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
 - S.Stratulat* - șef serviciu poduri, Î.S. „ASD”
 - N.Orheianu* - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul Raional Hîncești
 - P.Spînu* - inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
 - Ș.Caunov* - director S.A. „Drumuri – Ialoveni”
 - R.Nagacevschi* - S.A. „Drumuri – Ialoveni” sector Hîncești

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- a.) executant *I.Ulianov* - director, S.R.L. „Construm”
- b.) proiectant *S.Ponomari* - șef de echipă a Departamentului poduri, S.R.L. „Universinj”
- c.) responsabil tehnic *A.Nagacevschi* - specialist principal, Î.S. „ASD”

4 Comisia de recepție a constatat - lucrarea privind construcția podului pe drumul L 568 Mingir – Tomai e definitivată de construcție cu rezerve și concluzionează că aceasta poate fi dată în folosință.

- a.) Lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Construm”
- b.) Documentația de proiect a fost elaborată de S.R.L. „Universinj”
- c.) Documentația de proiect a fost aprobată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 312 din 12.12.2012
- d.) lucrările de construcție-montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor *decembrie 2014* sfîrșitul lucrărilor *august 2015*

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

- a.) Situația lucrărilor executate - cartea tehnică
- b.) Situația obiectiilor

*Se va transmite Dnui Ghidicaru, d. 10.10.2015
și d. 10.10.2015 Polina Sarca.*

6. Podul supus recepției are următorii indici tehnici de bază:

Pod cu o deschidere $L - 12\text{ m}$, gabaritul podului $- 7\text{ m} + 2 \times 1,75\text{ m}$, **fundația:** piloți forajați $- L - 14\text{ m}$, $\varnothing - 0,55\text{ m} - 22$ bucăți, **infrastructura:** culee monolite $- 2$ bucăți, **suprastructura:** grinzi monolitizate $L - 12\text{ m} - 6$ bucăți, strat de egalizare, strat de hidroizolație, strat de protecție, îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic $H - 7\text{ cm}$ (formată din 2 straturi $H 4 + H 3$), **siguranța:** parapet de siguranță $- 21\text{ m}$ pe ambele părți, parapet pietonal $- 21\text{ m}$ pe ambele părți, albia râului sub pod, la intrare și ieșire consolidată cu beton monolit $H - 12\text{ cm}$.

7. Costul lucrărilor conform devizului aprobat constituie $- 4,01\text{ mln. lei}$, inclusiv LCM $- 3,80\text{ mln. lei}$.

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a podului constituie $- 3\ 891\ 031,66\text{ lei}$, inclusiv LCM $- 3\ 746\ 586,92\text{ lei}$, care vor fi direcționate la majorarea costului podului respectiv.

9. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate - abateri de la proiect nu au fost depistate.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea *cu* obiecții a recepției.

11. Prezentul proces-verbal conținând 2 file și 1 anexă a fost încheiat astăzi, *miercuri* 16 septembrie 2015, în 6 exemplare.

Comisia de recepție :

Președinte

[Signature]

Membri:

[Signature]



[Signature]

V. Cotruță

[Signature]

I. Alexa

[Signature]

S. Stratiu




[Signature]

S. Orhianu

[Signature]

A. Spînu

[Signature]



12. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Se recomandă recepția la lucrările de construcție.

06 septembrie 2015

[Signature]

(semnatura)

[Signature]

(numele, prenumele, funcția)

13. Lucrarea privind construcția podului pe drumul L 568 Mingir - Tomai PC 2 + 105, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL

S.R.L. „Construm”

16 septembrie 2015

I. Ulianov



PRIMITA - INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

16 septembrie 2015

2015

V. Cotruță

