

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL
REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ
PUBLICĂ

CENTRUL DE SĂNĂTATE
DROCHIA
"Anatolie Manziuc"



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ
УЧЕРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
ДРОКИЯ
«Анатолий Манзюк»

MD - 5202, or. Drochia, bd N. Testemițeanu 4/1
tel/fax. +373-252-2-27-88; 2-68-08
e-mail: cs.drochia@ms.md

MD - 5202, or. Drochia, bd. N. Testemițeanu 4/1
tel/fax. +373-252-2-27-88; 2-68-08
e-mail: cs.drochia@ms.md

«13» 02 20 23 № 39



POTENȚIALILOR PARTENERI AI COMPANIEI SRL ROSIVID CONSTRUCT

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Autoritatea contractantă **IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**, cu sediul în or. Drochia bd. N.Testemițanu, 4/1 tel/fax : 0 252 2-27-88 anticamera /2-68-08 șef CS, reprezentat prin Emilia Lopatenco, șefă CS, în calitate de Beneficiar, în cadrul contractului de antrepriză nr.50 din 06.06.2022, încheiat cu operatorul economic: **SRL Rosivid Construct**, cu sediul în or. Chișinău, str.27 martie 1918 nr. 3 of 3a, telefon: 0 69259421, IDNO 1015600024953 reprezentat prin administrator Cebotari Andrei în calitate de Antreprenor, obiectului căruia a reprezentat:

LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR:

1. Secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”
2. Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA” IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

în valoare de 877 604,16 lei (opt sute șapte zeci și șapte mii șase sute patru lei 16 bani) MD, inclusiv 146 267,36 lei TVA, relatează următoarele:

- Lucrarile contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate in conformitate cu normele in vigoare, în corespundere cu devizurile aprobate, in termenii stabiliti, la nivelul calitatii corespunzator cerintelor impuse. Datorita profesionalismului colaboratorilor săi, SRL “Rosivid Construct” a oferit intodeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii, in vederea indeplinirii calitative si in termeni cit mai restrinsi a lucrarilor incredintate.
- Pe parcursul desfasurarii lucrărilor, nu au avut loc de accidente tehnice si nu au fost depistate neconformități cu normele de executie. Au fost executate calitativ lucrările contractate, în corespundere cu documentația aprobată, a caietului de sarcini și conlucrarea între Beneficiar și Antreprenor a fost foarte eficientă.

In concluzie, recomandăm compania SRL “Rosivid Construct”, ca fiind un antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar, cu care va conlucra si apreciem serviciile sale de calitate si flexibilitate oferite, care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.



Șefă a IMSP Centrul de Sănătate
Drochia „A. Manziuc”

Emilia Lopatenco

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrarilor de reparatie, privind amenajarea spatiului pentru amplasarea unui depozit farmaceutic si a centrului de dilutie.**

2. Numărul și data contractului **Nr. 378-LP din 31.10.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Institutul Oncologic**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau str. N. Testemiteanu 30**

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

a) antreprenorul sau antreprenorul general

7. Valoarea contractului în care s-a încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului) **2 026 637,58 lei**

b) finală (la data finalizării contractului) **2 026 637,58 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 10.12.2022

b) efectiv realizată 10.12.2022

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Obiectul s-a realizat în termen.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV. Nr.4 din 19.01.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte :amenajare spatiului pentru amplasarea unui depozit farmaceutic si a centrului de diluatie

Data completării:**04.04.2023**

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Rosivid Construct SRL**

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 11 septembrie 2020 între Primăria or. Sîngerei, r-nul Sîngerei, reprezentată de Covaliov Arcadie, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei, reprezentată de Ana Gubciac, președinte (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și compania ROSIVID CONSTRUCT S.R.L., cu adresa: mun. Chisinau, str. 27 Martie 1918 of. 3A, reprezentată de Cebotari Andrei, director (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-12077-RO4, "Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Ghiocel"" din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1 084 894,29 lei (un milion optzeci și patru mii opt sute nouăzeci și patru lei 29 bani, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și


să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.

4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:


Covaliov Arcadie, primar

Primăria or. Sîngerei, r-nul Sîngerei
Adresa: or. Sîngerei, str. Independenței, 124
Tel. 060233384

Email: primaria.singerei@mail.ru

Codul IBAN: MD13TRPDAO30000001062800

Banca plătitoare: MF –TR Nord-Sîngerei

Codul băncii: TREZMD2X

Codul fiscal: 1007601002223

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:


Cebotari Andrei, director

Compania: ROSIVID CONSTRUCT S.R.L.
Adresa: mun. Chisinau, str. 27 Martie 1918 of.
3A

Tel. 069259421

Email: rosivid@mail.ru,

andreicebotariandrei@gmail.com

Codul IBAN: MD22MO2224ASV40279557100


Banca beneficiară: BC „Mobiasbanca-OTP

Group” S.A.

Codul băncii: MOBBMD22


Codul fiscal: 1015600024953

Semnat de:


Ana Gubciac, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei

În prezența:


D. Iurie Chiorescu, director,
IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”



Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 12.05.2021
Privind lucrarea Lucrări terle la g/cop nr. 1 "Shicel" executată
la obiectul Încălzirea de cop nr. 1, "Shicel" Sngerei în cadrul
contractului nr. IEB-W-12048-R04 din 26.08.2020 încheiat între Agenția de
Implementare a SP și Rosard Construct SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la
la grad/cop. nr. 1, "Shicel" Sngerei Lucrările au fost executate în baza
autorizației nr. _____ eliberată de Primăria _____ de la _____ 20 _____ având
valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 12.05.2021 până
12.05.2021
2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

- Primarul / Viceprimarul:
Lucas Andru

Membrii Comisiei:

- Președintele Agenției de Implementare, Ștefana Ana
- Membru AI. Contabil-șef a Primăriei, Panciu Elena
- Membru AI, Popescu Oleg
- Consilier Primăria, Ștefan Petru
- Inspector Local, Laschirei Ion
- Gestionarul Microproiectului din partea FISM, Camerson Elena

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei "Cibolaru A" SRL "Rosard Construct"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt
incomplete
piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepție la
terminarea lucrărilor

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examenarea documentației tehnice, exame-
narea lucrărilor executate în teren

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepție la terminarea lucrărilor și

expunerea spre recepția finală
7) Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 12.05.2021 în 6 exemplare.

Președintele Comisiei

Cucos Andrei

Membrii comisiei

Panciu Elena

Popescu Oleg

Laschevici Ion

Lubcica Anu

Therman Petru

Comertan Elena



8) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

„ _____ ” din _____

(funcția ,

numele , prenumele)

L.Ș.

„ _____ ” 20 _____

(semnătura)

„ _____ ” din _____

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

„ 12 ” Mai 2021



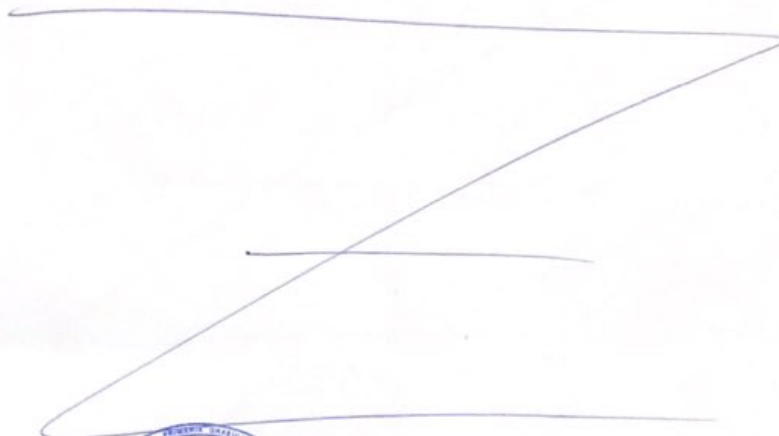
PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

„ 12 ” mai 2021



Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. , din 12.05 2021

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.



Primarul

Preşedintele Ag

Inspector Local



Gubcrae

Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1, din _____ 20

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

[Large handwritten signature]

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Inspector Local



Liberare

Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din 12-05 2021

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Inspector Local




**Acord Adițional Nr. 1
la contractul nr. IFB-W-12077-RO4
semnat la 11 septembrie 2020**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei, de comun cu compania de construcții ROSIVID CONSTRUCT S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din **13 noiembrie 2020**, privind modificarea devizului de lucru și extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12077-RO4 în cadrul implementării SP nr. 4484 „**Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Ghiocel" din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei**”, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-12077-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Ghiocel" din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei**”, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **0,00 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **17 657,88 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **351 545,78 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 369 203,66 lei**, ce constituie 34,03 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 06 noiembrie 2020 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12077-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Ghiocel" din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei**”, data finalizării lucrărilor considerînd-o **11 ianuarie 2021**.
4. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
5. Semnat la data de _____.

BENEFICIAR:

Covaliov Arcadie, Primar,
Primăria or. Sîngerei, r-nul Sîngerei


Ana Gubciac, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
or. Sîngerei, r-nul Sîngerei

CONTRACTOR:

Cebotari Andrei, Director,
ROSIVID CONSTRUCT S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.


**Acord Adițional Nr. 2
la contractul nr. IFB-W-12077-RO4
semnat la 11 septembrie 2020**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei, de comun cu compania de construcții ROSIVID CONSTRUCT S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 11 decembrie 2020, privind modificarea devizului de lucru și extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12077-RO4 în cadrul implementării SP nr. 4484 „Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Ghiocel"” din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-12077-RO4 în cadrul implementării subproiectului „Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Ghiocel"” din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de 0,00 lei – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de 97 228,84 lei – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de 28 177,89 lei – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: (plus) 125 406,73 lei, ce constituie 11,56 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 10 decembrie 2020 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12077-RO4 în cadrul implementării subproiectului „Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Ghiocel"” din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei, data finalizării lucrărilor considerînd-o 10 martie 2021.
4. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
5. Semnat la data de 23.12.2020.

BENEFICIAR:


Covaliov Arcadie, Primar,
Primăria or. Sîngerei, r-nul Sîngerei


Ana Gubciac, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
or. Sîngerei, r-nul Sîngerei

CONTRACTOR:


Cebotari Andrei, Director,
ROSIVID CONSTRUCT S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

**Acord Adițional Nr. 3
la contractul nr. IFB-W-12077-RO4
semnat la 11 septembrie 2020**


Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei, de comun cu compania de construcții ROSIVID CONSTRUCT S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 05 martie 2021**, privind extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12077-RO4 în cadrul implementării SP nr. 4484 „**Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Ghiocel"**” din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12077-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la grădinița de copii nr.1 "Ghiocel"**” din or. Sîngerei, r-nul Sîngerei, data finalizării lucrărilor considerînd-o 01 mai 2021.
2. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
3. Semnat la data de 05.03.2021.



BENEFICIAR:

Covaliov Arcadie, Primar,
Primăria or. Sîngerei, r-nul Sîngerei


Ana Gubciac, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
or. Sîngerei, r-nul Sîngerei

CONTRACTOR:



Cebotari Andrei, Director,
ROSIVID CONSTRUCT S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari civile la gradinita de copii nr.1 „Ghiocel” or. Singerei
2. Numărul și data contractului Nr. IFB-W-12077-RO4 din 11.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Singerei
4. Adresa beneficiarului or. Singerei
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 084 894, 29 lei</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 579 504,68 lei</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 8 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 12.05.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
NU SUNT
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Schimbarea acoperisului 1200 m2, lucrari de termoizolare 600 m2, lucrari de amenajare si pavare 350 m2, constructia gadului cu fundatie din beton si lamele din tabla vopsita 150 m2, etc.

Data completării: 18.03.2021

Semnat: _____

Nume: Andrei Cebotari

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Rosivid Construct SRL



Nr. 1 din 12.05.2021

RECOMANDARE

Adminstratia, Gradinitei de copii nr. 1 „Ghiocel” din or. Singerei, a colaborat cu SRL „Rosivid Construct” in cadrul contractului de antrepriza Nr. IFB-W- 12077-RO4 din 11 septembrie 2020, sub-proiectul nr. 4484 privind “Lucrari civile la gradinita de copii nr.1 „Ghiocel” din or. Singerei, r-nul Singerei in suma finala de 1 579 504.68 lei.

Lucrarile contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate in conformitate cu normele in vigoare, in termenii stabiliti, la nivelul calitatii corespunzator cerintelor impuse. Datorita profesionalismului colaboratorilor SRL “Rosivid Construct”, a oferit intodeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii, in vederea indeplinirii calitative si in termini cit mai restrinsi a lucrarilor incredintate.

Pe parcursul desfasurarii contractelor nu au avut loc de accidente tehnice si nu au fost depistate neconformitati cu normele de executie.

In concluzie, recomandam compania SRL “Rosivid Construct”, ca fiind un antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra si apreciem serviciile sale de calitate si flexibilitate oferite, care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

Președintele Agenției de Implimentare a subproiectului din “Programului de asistență tehnică și financiară acordat de Guvernul României” , director IET nr.1 “Ghiocel” or.Sângerei :

L.Ș.



Gubeiac Ana

Gubeiac Ana

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari civile la gradinita de copii „Lastarel” din s. Cioara, r-nul Hincesti.**
2. Numărul și data contractului **Nr. IFB-W-12071-RO4, din 26.08.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Cioara**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova, r-n Hincesti, s. Cioara**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - ☐ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ☐ antreprenor asociat
 - ☐ subantreprenor
7. Valoarea contractului:
 - a) inițială- **1 264 687,43 lei**
 - b) finală- **1 678 489,44 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată- **Pina la 31.07.2021**
 - b) efectiv realizată- **Obiectul s-a realizat pina pe data de 28.07.2021**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Obiectul s-a realizat in termen.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Proces Verbal №1, din data 28.07.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: acoperis din tabla amprentată tip tigla, sisteme de jgheaburi, sisteme de burlane, etc.

Data completării: **04.04.2023**

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Rosivid Construct”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari civile la gradinita de copii nr.1 „Ghiocel” or. Singerei
2. Numărul și data contractului Nr. IFB-W-12077-RO4 din 11.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Singerei
4. Adresa beneficiarului or. Singerei
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) _1 084 894, 29 lei_____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 579 504,68 lei_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 8 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 12.05.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

NU SUNT
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Schimbarea acoperisului 1200 m2, lucrari de termoizolare 600 m2, lucrari de amenajare si pavare 350 m2, constructia gadului cu fundatie din beton si lamele din tabla vopsita 150 m2, etc.

Data completării: 21.08.2023

Semnat: _____

Nume: Andrei Cebotari

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Rosivid Construct SRL

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 26.08.2020 între Primăria s. Cioara, r-nul Hîncești, reprezentată de Gherela Ion, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Cioara, r-nul Hîncești, reprezentată de Cecilia Olednic, președinte (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și compania ROSIVID CONSTRUCT S.R.L., cu adresa: mun. Chisinau, str. 27 Martie 1918 nr.3 of. 3A, reprezentată de Cebotari Andrei, director (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-12071-RO4, "Lucrări civile la gradinita de copii "Lăstărel"" din s. Cioara, r-nul Hîncești (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1 264 687,43 lei (un milion două sute șasezeci și patru mii șase sute optzeci și șapte lei 43 bani, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord.
- Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.

4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:


Gherela Ion, primar

Primăria s. Cioara, r-nul Hîncești

Adresa: s. Cioara, r-nul Hîncești

Tel. 0269-47236, 47336, 068494969

Email


Codul IBAN: MD78TRPDAE311120A06356AC

Banca plătită: RE: TREZMD2X

Codul băncii: MF Trezoreria Teritorială Centru

Codul fiscal: 1007601008775


Semnat de:


Cecilia Olednic, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Cioara, r-nul Hîncești



În prezența:


Dinel Iurie Chiorescu, director,
IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:


Cebotari Andrei, director

Compania: ROSIVID CONSTRUCT S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. 27 Martie 1918 nr.3
of. 3A

Tel. 069259421

Email

Codul IBAN: MD22MO2224ASV40279557100

Banca beneficiară: BC "MOBIASBANCA-OTP
GROUP" S.A

Codul băncii: MOBBMD22

Codul fiscal: 1015600024953

Condițiile Speciale ale Contractului

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI: **“Lucrari civile la gradinita de copii
"Lăstărel"”**

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI: **s. Cioara, r-nul Hîncești**

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE
al CONTRACTULUI: **IFB-W-12071-RO4**

CC 1.1	Sursa de finanțare este: Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 28 din 18 ianuarie 2019. Denumirea Grantului: Programul de cooperare pe anul 2018 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României Gestionar al sursei de finanțare: IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” (FISM).
CC 1.1	Beneficiarul este: Denumirea: Primăria s. Cioara, r-nul Hîncești Adresa: s. Cioara, r-nul Hîncești, Republica Moldova Numele reprezentatului autorizat: Gherela Ion
CC 1.1	Data de finalizare a tuturor Lucrărilor va fi: 5 luni din data semnării contractului.
CC 1.1	Managerul Proiectului este IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, prin intermediul Consultantului desemnat pentru monitorizarea implementării sub-proiectului.
	Responsabilul tehnic este: Numele: _____. Adresa: _____. Activitatea Responsabilului tehnic va fi reglementată de contractul încheiat între Responsabilul tehnic și Beneficiar (Primăria s. Cioara); Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții și Hotărîrea de Guvern nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor. Orice decizie, care poate serios schimba sau influența implementarea normală a sub-proiectului sau care poate duce la modificarea volumelor de lucrări, ce urmează a fi executate conform contractului, va fi întîi de toate coordonată cu Beneficiarul și FISM.
CC 1.1	Șantierul se găsește în s. Cioara, r-nul Hîncești și este descris în desenele tehnice (după caz).
CC 1.1	Data începerii lucrărilor va fi orice dată în termenul a 15 zile după data semnării contractului de către Părți.

CC 1.1	Lucrările constau din: ▪ ARTICOLE DE TIMPLARIE-ATENTIE! Lucrarile de reparatie se vor executa numai la parter! Lucrarile exterioare si interioare de alimentare cu energie electrica prevazute de proiectul de executie se vor executa de Beneficiar; ▪ LUCRARI PE INTERIOR; ▪ LUCRARI PE EXTERIOR; ▪ RETELELE INTERIOARE DE APEDUCT SI CANALIZARE; ▪ RETELE EXTERIOARE DE APEDUCT SI CANALIZARE; ▪ SISTEMUL DE VENTILARE- Atentie! Se va executa numai sistemul de ventilare B1;2;3;4;7;14 OVE160 pina la cota +3.400, B5; B6;P1 pina la cota +6.900.
CC 3.1	Limba contractului este limba română. Legislația aplicabilă este legislația Republicii Moldova.
CC 8.1	Graficul de lucru al altor contractori: <i>prevederea nu este aplicabilă</i>
CC 9.1	Următoarele documente facă parte din Contract: ▪ Schema personalului de bază
CC 13.1	Sumele minime de asigurare și franșizele deductibile sunt (<i>% din Costul Contractului</i>): (a) pentru pierderea sau deteriorarea Lucrărilor, Instalațiilor și Materialelor: 0,2% (b) pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: 0,25 %. (c) pentru pierderea sau deteriorarea proprietății (cu excepția Lucrărilor, Instalațiilor, Materialelor și Echipamentelor) în legătură cu Contractul: 0,3%. (d) pentru vătămarea corporală sau decesul: (i) angajaților Contractantului: 0,7% (ii) altor persoane: 0,7%.
CC 14.1	Date despre șantier: Șantierul este pe teritoriul primăriei s. Cioara .
CC 21.1	Șantierul va fi transmis de Beneficiar și preluat de Contractor în termen de 7 zile din data semnării Contractului .
CC 25.2	Tariful pe oră și tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator: Suma totală (onorariu + cheltuieli rambursabile (transport)) este de 900 MDL pe oră.
CC 25.3	Instituția ale cărei proceduri de arbitraj se vor utiliza: Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în conformitate cu Regulamentul acestei Curți, în componența a trei arbitri: cîte unul numit de fiecare dintre părți și un supra-arbitru ales de cei doi arbitri. Locul arbitrajului este: Chișinău, Republica of Moldova
CC 26.1	Autoritatea de desemnare a Conciliatorului: Consiliul de mediere de pe lângă

	Ministerul Justiției al Republicii Moldova.
CC 27.1	Contractorul va prezenta un Program (Grafic) de executare a lucrărilor în termen de 10 zile din data emiterii Scrisorii de Acceptare.
CC 27.3	Actualizări periodice ale Programului vor fi efectuate la fiecare 30 de zile . Suma care urmează a fi reținută pentru prezentarea cu întârziere a Programului actualizat este: prevederea nu este aplicabilă .
CC 34.1	Perioada de remediere a defectelor este: 6 luni .
CC 44.1	Contractul NU va fi supus prevederii privind ajustarea prețului, conform Punctului 44 din Condițiile Generale ale Contractului.
CC 45.1	Proporția plăților reținute este: 10%
CC 46.1	Penalități pentru întârziere pentru toate Lucrările sunt 0,10 % pe zi din Prețul Final al Contractului . Suma maximă a Penalităților pentru toate Lucrările este 5% din Prețul Final al Contractului .
CC 47.1	Bonusul de executare anticipată pentru toate Lucrările este 0 % pe zi din Prețul Final al Contractului . Suma maximă a Bonusului pentru toate Lucrările este 0% din Prețul Final al Contractului .
CC 48.1	Plățile în avans sunt: până la 20% din Prețul Total al Contractului și se vor plăti Contractorului nu mai târziu de data începerii lucrărilor.
CC 49.1	Suma Garanției de bună execuție este: 5 % din Prețul Total al Contractului .
CC 55.1	Data până la care se solicită desenele tehnice „conform lucrărilor executate”, manualele privind exploatarea și întreținerea este Data de finalizare a Lucrărilor .
CC 55.2	Suma penalității reținută în cazul neprezentării Desenelor tehnice „conform lucrărilor executate” și/sau manualelor de exploatare și întreținere până la data solicitată conform CC 55.1 este 0,2% din Prețul Contractului .
CC 56.2 (g)	Numărul maxim de zile: 50 zile
CC 57.1	Procentul aplicat la valoarea lucrării nefinalizate, reprezentând costul suplimentar al Beneficiarului pentru finalizarea Lucrărilor, este: 15%

**Acord Adițional Nr. 1
la contractul nr. IFB-W-12071-RO4
semnat la 26 august 2020**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Cioara, r-nul Hîncești, de comun cu compania de construcții ROSIVID CONSTRUCT S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 18 decembrie 2020**, privind modificarea devizului de lucru și extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12071-RO4 în cadrul implementării SP nr. 4408 „**Lucrari civile la gradinita de copii "Lăstărel"**” din s. Cioara, r-nul Hîncești, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-12071-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrari civile la gradinita de copii "Lăstărel"**” din s. Cioara, r-nul Hîncești, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **74 615,22 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **194 474,89 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **99 873,07 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 219 732,74 lei**, ce constituie 17,37 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 18 decembrie 2020 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12071-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrari civile la gradinita de copii "Lăstărel"**” din s. Cioara, r-nul Hîncești, data finalizării lucrărilor considerînd-o **26 martie 2020**.
4. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
5. Semnat la data de _____.

BENEFICIAR:


Gherela Ion, Primar,
Primăria s. Cioara, r-nul Hîncești


Cecilia Olednic, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Cioara, r-nul Hîncești

CONTRACTOR:


Cebotari Andrei, Director,
ROSIVID CONSTRUCT S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

**Acord Adițional Nr. 2
la contractul nr. IFB-W-12071-RO4
semnat la 26 august 2020**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Cioara, r-nul Hîncești, de comun cu compania de construcții ROSIVID CONSTRUCT S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 26 martie 2021**, privind extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12071-RO4 în cadrul implementării SP nr. 4408 „**Lucrari civile la gradinita de copii "Lăstărel"**” din s. Cioara, r-nul Hîncești, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12071-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrari civile la gradinita de copii "Lăstărel"**” din s. Cioara, r-nul Hîncești, data finalizării lucrărilor considerînd-o **15 mai 2021**.
2. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
3. Semnat la data de 26.03.2021.

BENEFICIAR:



Gherela Ion, Primar,
Primăria s. Cioara, r-nul Hîncești

P. Olednic

Cecilia Olednic, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Cioara, r-nul Hîncești

CONTRACTOR:



Cebotari Andrei, Director,
ROSIVID CONSTRUCT S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

**Acord Adițional Nr. 3
la contractul nr. IFB-W-12071-RO4
semnat la 26 august 2020**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Cioara, r-nul Hîncești, de comun cu compania de construcții ROSIVID CONSTRUCT S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 30 aprilie 2021**, privind modificarea devizului de ucru și extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. FB-W-12071-RO4 în cadrul implementării SP nr. 4408 „**Lucrari civile la gradinita de copii "Lăstărel" din s. Cioara, r-nul Hîncești**”, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-12071-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrari civile la gradinita de copii "Lăstărel" din s. Cioara, r-nul Hîncești**”, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **96 231,99 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **71 093,06 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **208 637,44 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 183 498,51 lei**, ce constituie 14,51 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 28 aprilie 2021 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12071-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrari civile la gradinita de copii "Lăstărel" din s. Cioara, r-nul Hîncești**”, data finalizării lucrărilor considerînd-o **01 iulie 2021**.
4. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
5. Semnat la data de 11.05.2021.

BENEFICIAR:



Gherela Ion, Primar,
Primăria s. Cioara, r-nul Hîncești



Cecilia Olednic, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Cioara, r-nul Hîncești

CONTRACTOR:



Cebotari Andrei, Director,
ROSIVID CONSTRUCT S.R.L.

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 28.07.2021

privind lucrarea Lucrări civile la grădinița de copii executată în cadrul
contractului nr. 4408 din 26.08.2020 2021 încheiat între Primăria
Libova și AI pentru lucrările de reparație a _____

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de Primăria
_____ la _____ 2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începînd cu
28.07 2021 fiind formată din:

Președintele Comisiei

Primarul Ghereta Ion

Membrii Comisiei:

Președintele AI Plednic Ecaterina

Consultant FISM Costașcu Stanislav

Responsabil tehnic Dobros Vladimир

Contabilul Primăriei Isacovici Alina

3. Au mai participat la recepție:

Libotari Andrei director _____ și Tiosa Sergiu diriginte de șantier
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piecele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor
conform deciziei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului de recepție rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Primarul

Membrii Comisiei:

Președintele AI

Consultant FISM

Responsabil tehnic

Contabilul Primăriei

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

" " 2021

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " _____ " este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2021

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2021

L.Ș.

(semnătura)

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

1. Împreună pereților în sala de activități nr. 2.
2. Finisarea lucrărilor după faonare și bolile.
3. Se începe graficele exterioare cu tine.
4. Finisarea lucrărilor la toate ferestrele
exterioare.
5. Instalarea plaselor la ventilație
6. Instalarea venturilor în bucătărie
7. Se începe fontana.
8. Se spălat și dezinfectat tot apeductul.
9. Se finisat graficele la toate reșile.
10. Montarea hotelor.



Primarul

Președintele Agenției

Inspector Local

[Handwritten signature]



V. Dobrova

Lista lucrărilor cuprinse în Documentatia Tehnică ce n-au fost executate.

[Large handwritten signature in blue ink]



Primarul

Președintele Agenției

Inspector Local

[Handwritten signature in blue ink]
[Handwritten signature in blue ink]
[Handwritten signature in blue ink]

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 din 28.07 2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.



Primarul
Președintele Agenției
Inspector Local

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Republica Moldova

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 4 din 19.01.2023

Privind lucrarea "Lucrărilor de reparație, privind amenajarea spațiului pentru amplasarea unui depozit farmaceutic și a centrului de diluție" în cadrul contractului Nr. 378-LP din 31.10.2022 încheiat între IMSI' Institutul Oncologic și Rosivid Construct SRL.

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizatiei de construire (conform legii 163 nu este necesar)
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.01.2023 – 19.01.2023, fiind formată din :

Președintele comisiei: Sergiu Robu – vicedirector administrare patrimoniului IMSP I.O

Memori:

Stefan Matcovschi - șef serviciu ascensoare;

Alexei Zavulan- sef sectia POPCA si SM;

Alla Rotari – juriconsult, serviciu juridic;

Alina Prozorovschi – contabil, sectia EF;

(numele, prenumele funcția)

Specialisti :

Vitalie Damian – responsabil tehnic Nr.1115

Serghei Teosa– diriginte de santier, certificat Nr.1529

(numele, prenumele funcția)

Au mai participat:

Andrei Cebotari– administrator Rosivid Construct SRL

(numele, prenumele funcția)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul: " Lucrărilor de reparație, privind amenajarea spațiului pentru amplasarea unui depozit farmaceutic și a centrului de diluție "

Republica Moldova

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 4 din 19.01.2023

Privind lucrarea "Lucrărilor de reparație, privind amenajarea spațiului pentru amplasarea unui depozit farmaceutic și a centrului de diluție" în cadrul contractului Nr. 378-LP din 31.10.2022 încheiat între IMSI' Institutul Oncologic și Rosivid Construct SRL.

1. Lucrarile au fost executate în baza autorizatiei de construire (conform legii 163 nu este necesar)
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.01.2023 – 19.01.2023, fiind formată din :

Președintele comisiei: Sergiu Robu – vicedirector administrare patrimoniului IMSP I.O

Memori:

Stefan Matcovschi - șef serviciu ascensoare;

Alexei Zavulan- sef sectia POPCA si SM;

Alla Rotari – juriconsult, serviciu juridic;

Alina Prozorovschi – contabil, sectia EF;

(numele, prenumele funcția)

Specialisti :

Vitalie Damian – responsabil tehnic Nr.1115

Serghei Teosa– diriginte de santier, certificat Nr.1529

(numele, prenumele funcția)

Au mai participat:

Andrei Cebotari– administrator Rosivid Construct SRL

(numele, prenumele funcția)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul: " Lucrărilor de reparație, privind amenajarea spațiului pentru amplasarea unui depozit farmaceutic și a centrului de diluție "

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost executate conform caietului de sarcini

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a aproba recepția la terminarea lucrărilor cu înlăturarea neconformităților specificate în anexa nr.3

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: "Lucrărilor de reparație, privind amenajarea spațiului pentru amplasarea unui depozit farmaceutic și a centrului de diluție" Obiectul cu numărul cadastral: 0100214.147.16 adresa poștală: N. Testimițeanu 30
destinația: Instituție Medico-Sanitară Publică.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și anexele numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 19.01.2023 în 4 exemplare

Comisia de recepție:

Președinte: Sergiu Robu
Membri: Stefan Matcovschi
Alexei Zavulan
Alla Rotari
Alina Prozorovschi

Specialisti: Vitalie Damian
Serghei Teosa


(numele, prenumele, semnătura)




9. Lucrarea: "Lucrărilor de reparație, privind amenajarea spațiului pentru amplasarea unui depozit farmaceutic și a centrului de diluție" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL
"19" ianuarie 2023.

..S.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL

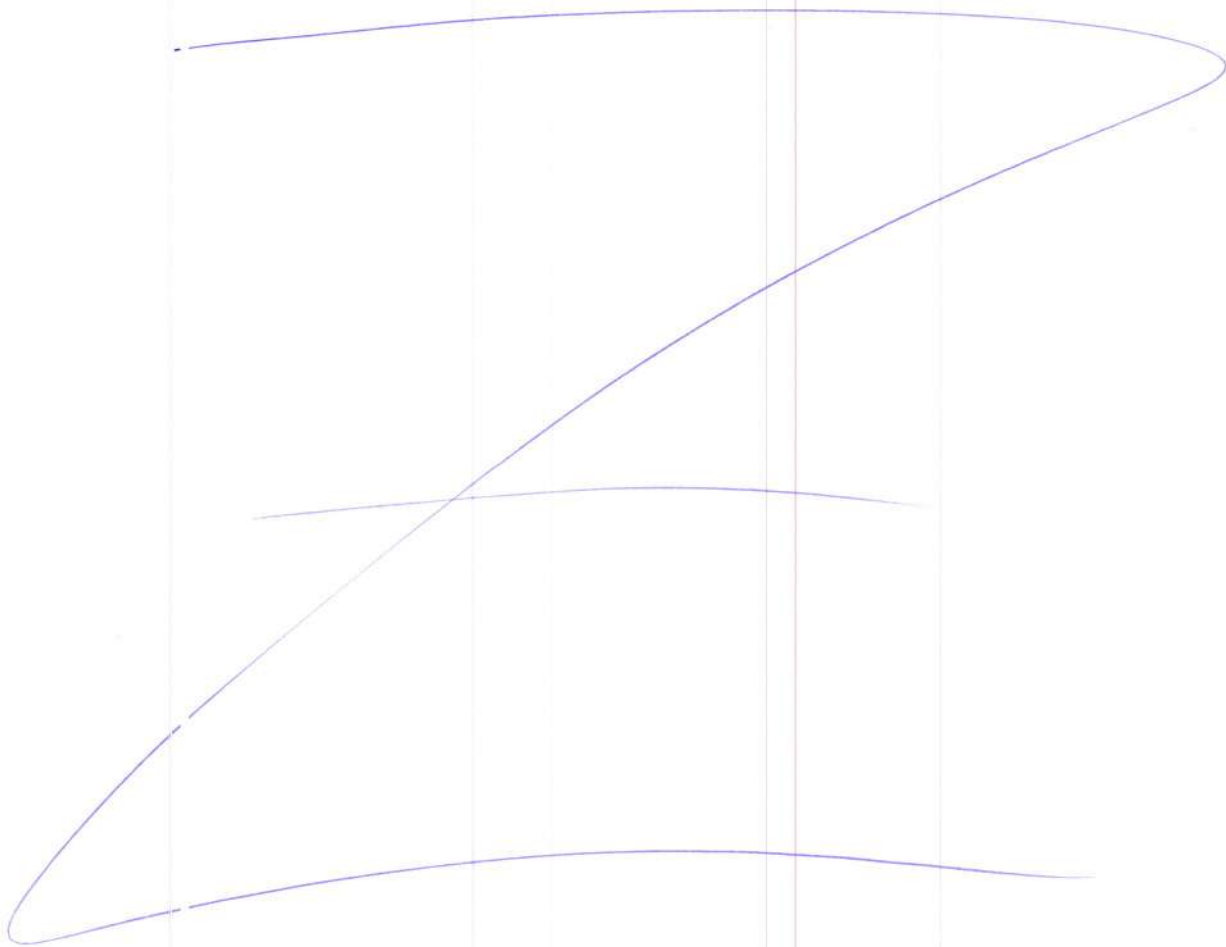
"19" ianuarie 2023.

L.S.

(semnătura)

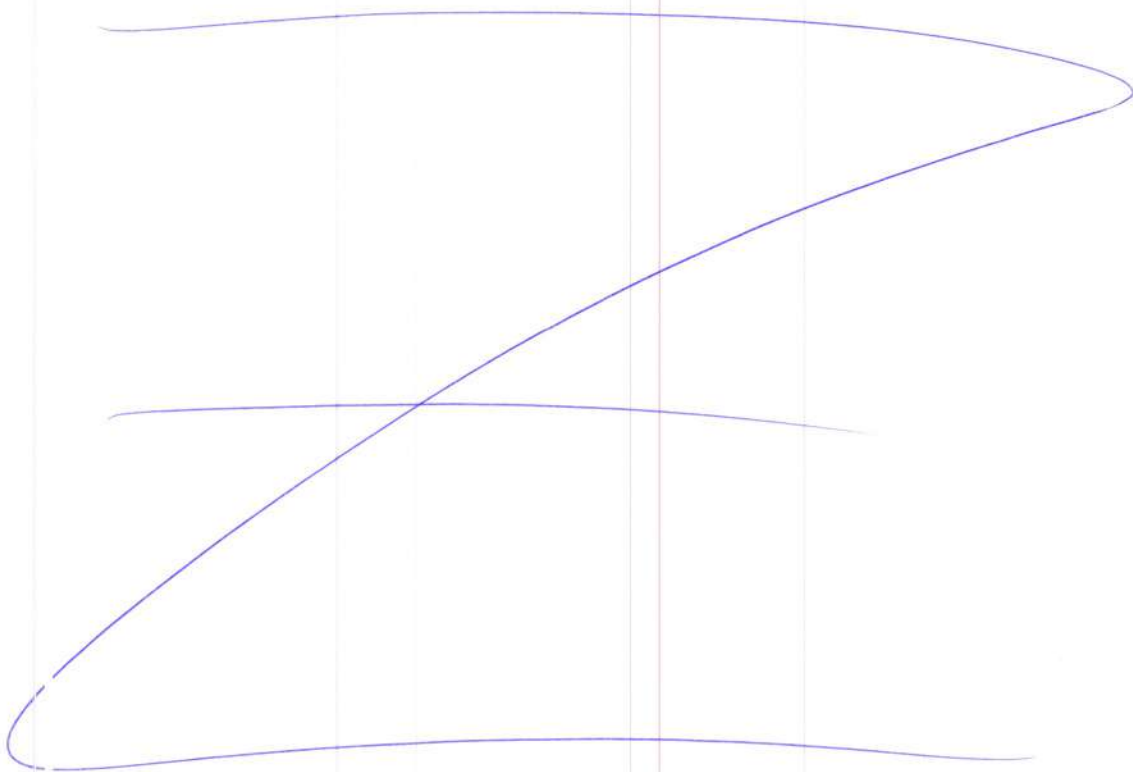


Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

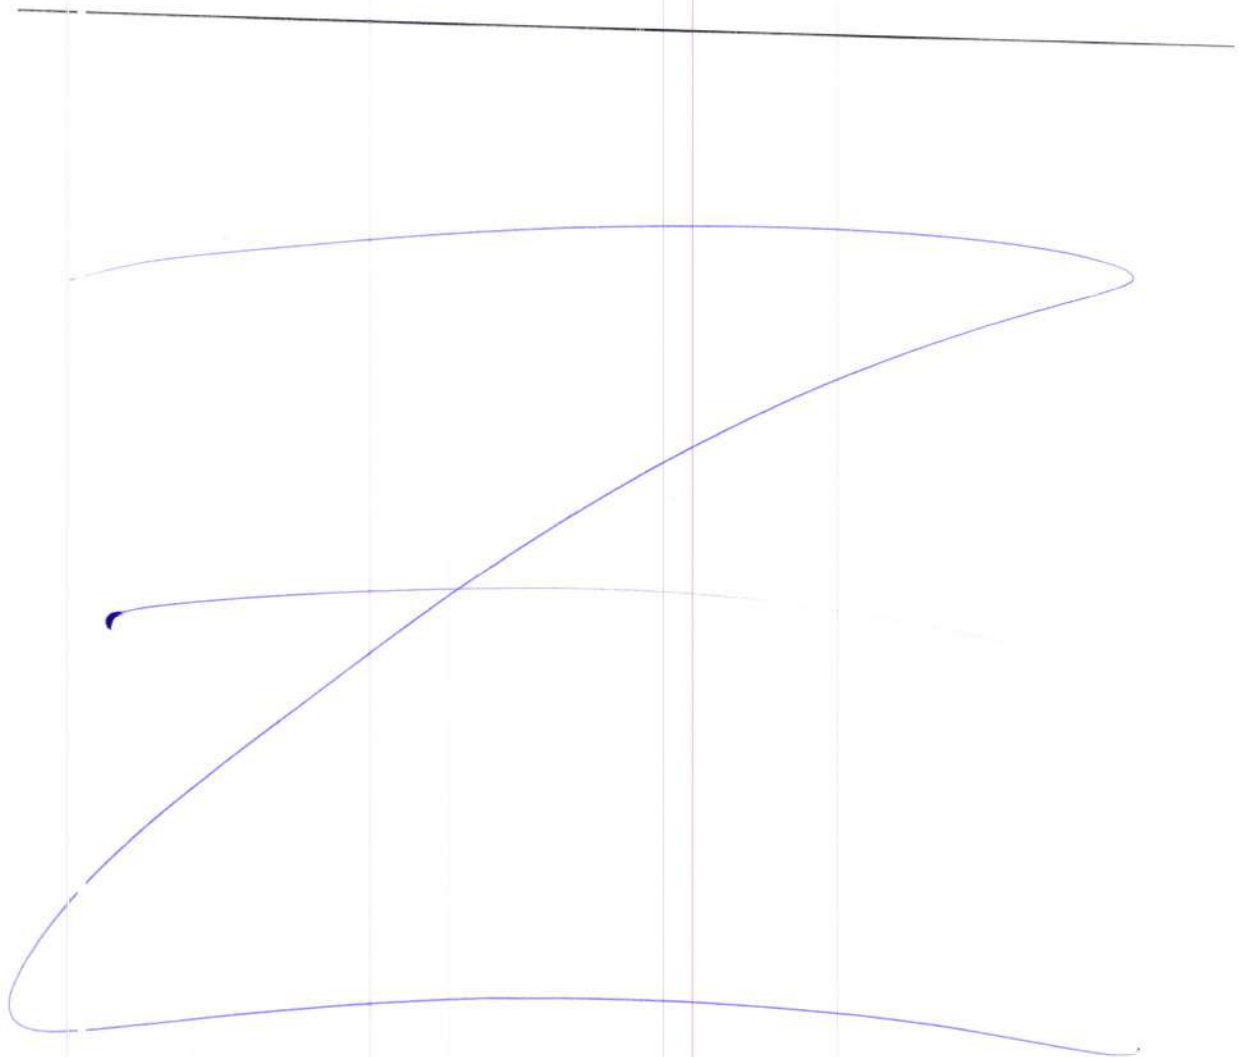


Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr.4, din 19.01.2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 378-LP privind achiziția prin Licitatie deschisă

„1” octombrie 2022

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin Licitatie deschisă nr. ocde-b3wdp1-MD- 1662986939192 din „03” octombrie 2022, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chișinău str. Nicolae Testemitanu 30, telefon: 0-22-85-26-70, fax: 0-22-73-33-63, IDNO: 1003600151023 reprezentat prin **Director Ruslan BALTAGA**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Rosivid Construct SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 27 martie 1918, nr.3, of.3a, telefon: 069259421, IDNO 1015600024953 autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. : 405579 din „27” februarie 2019, eliberată de I.P Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările reprezentat prin **Administrator Andrei CEBOTARI** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ” Lucrărilor de reparație, privind amenajarea spațiului pentru amplasarea unui depozit farmaceutic și a centrului de diluție” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de: Din data aprobării contractului de antrepriză în BAP până la 10.12.2022, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influența factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentei contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Mun. Chișinău, str.27 martie 1918,
nr.3, of.3a; str.Calea Ieșilor 61/1
Telefon: 069259421
C/I MD36VI022511100000078MDL
Banca: „VICTORIABANK,, SA
Adresa poștală a băncii: suc.
Cod: VICBMD2X883
Cod fiscal: 1015600024953
Cod TVA: 0507477
E-mail: rosivid@mail.ru

BENEFICIARUL

Mun. Chișinău str. Nicolae Testemițanu 30
Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD94ML000000002251702316
Banca: SC „Moldindcombank,, SA
Adresa poștală a băncii: Fil. Testemițanu
Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1003600151023

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Nr. 1 din 19.01.2023

RECOMANDARE

Adminstratia, „IMSP Institutul Oncologic “ a colaborat cu SRL “Rosivid Construct” in cadrul contractului de antrepriza 31.10.2022 Nr.378-LP, privind **“Lucrarilor de reparatie ,privind amenajarea spatiului pentru amlasarea unui depozit farmaceutic si a centrului de dilutie in suma de 2 026 637 ,58lei.**

Lucrarile contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate in conformitate cu normele in vigoare, în termenii stabiliți, la nivelul calității corespunzator cerintelor impuse. Datorita profesionalismului colaboratorilor **SRL “Rosivid Construct”,** a oferit intodeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii, in vederea indeplinirii calitative si in termeni cit mai restrinsi a lucrarilor incredintate.

Pe parcursul desfasurarii contractelor nu au avut loc de accidente tehnice si nu au fost depistate neconformitati cu normele de executie.

In concluzie, recomandam compania **SRL “Rosivid Construct”,** ca fiind un antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra si apriem serviciile sale de calitate si flexibilitate oferite, care o deferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

Se f Directie:

 A. Lavulov

