

Diagrama Gantt. Descifrarea etapelor.

	Ti M	Denumirea etapei	Durata	Inceput etapa	Sfarsit etapa	Etapa predece-
1	🚀	Semnarea contractului	4 days	Wed 5/3/23	Mon 5/8/23	
2	🔧	Instalarea, configurarea și setarea infrastructurii în Mcloud, aplicațiilor de conversie și de integrare/publicare pe Web	1 wk	Wed 5/10/23	Tue 5/16/23	
3	🔧	Testarea și corectarea aplicațiilor	1 wk	Wed 5/17/23	Tue 5/23/23	2
4	🔧	Sistemul informatic de gestiune si publicare pregatit	0 days	Tue 5/23/23	Tue 5/23/23	3
5	🚀	Generarea codurilor PIN și transmiterea lor personalului Beneficiarului pentru repartizare	1 day	Thu 6/1/23	Thu 6/1/23	4
6	🚀	Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Wed 5/31/23	Wed 5/31/23	1
7	🔧	Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Thu 6/1/23	Thu 6/1/23	6
8	🔧	Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Thu 6/1/23	Thu 6/1/23	6
9	🔧	Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 1, sesiunea primară	14 days	Tue 6/6/23	Fri 6/23/23	8
10	🚀	Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Wed 5/31/23	Wed 5/31/23	1
11	🔧	Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Thu 6/1/23	Thu 6/1/23	10
12	🔧	Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Thu 6/1/23	Thu 6/1/23	10
13	🔧	Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 2, sesiunea primară	14 days	Tue 6/6/23	Fri 6/23/23	12
14	🚀	Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 3	1 day	Fri 6/2/23	Fri 6/2/23	1
15	🔧	Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 3	1 day	Mon 6/5/23	Mon 6/5/23	14
16	🔧	Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 3	1 day	Mon 6/5/23	Mon 6/5/23	14
17	🔧	Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 3, sesiunea primară	11 days	Fri 6/9/23	Fri 6/23/23	16
18	🚀	Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 4	1 day	Fri 6/2/23	Fri 6/2/23	1
19	🔧	Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 4	1 day	Mon 6/5/23	Mon 6/5/23	18
20	🔧	Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 4	1 day	Mon 6/5/23	Mon 6/5/23	18
21	🔧	Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 4, sesiunea primară	11 days	Fri 6/9/23	Fri 6/23/23	20
22	🚀	Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară	1 day	Mon 6/26/23	Mon 6/26/23	
23	🔧	Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe Web	1 day	Tue 6/27/23	Tue 6/27/23	22
24	🔧	Sesiunea primara incheiata	0 days	Tue 6/27/23	Tue 6/27/23	23
25	🚀	Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 3, perioada de contestații sesiunea primară	4 days	Wed 6/28/23	Mon 7/3/23	23
26	🚀	Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 4, perioada de contestații sesiunea primară	4 days	Wed 6/28/23	Mon 7/3/23	23
27	🚀	Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 4, sesiunea suplimentară	7 days	Mon 7/17/23	Tue 7/25/23	
28	🔧	Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea suplimentară	1 day	Wed 7/26/23	Wed 7/26/23	27
29	🔧	Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe suplimentară	1 day	Thu 7/27/23	Thu 7/27/23	28
30	🔧	Sesiunea suplimentara incheiata	0 days	Thu 7/27/23	Thu 7/27/23	29
31	🚀	Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 4, perioada de contestații sesiunea suplimentară	2 days	Fri 7/28/23	Sun 7/30/23	29
32	🚀	Asigurarea accesului reprezentanților Beneficiarului la toate testele scanate prin intermediul aplicației Web	90 days	Mon 6/26/23	Fri 10/27/23	
33	🔧	Distrugerea infrastructurii și a datelor din Mcloud	1 day	Mon 10/30/23	Mon 10/30/23	32
34	🔧	Proiectul incheiat	0 days	Mon 10/30/23	Mon 10/30/23	33

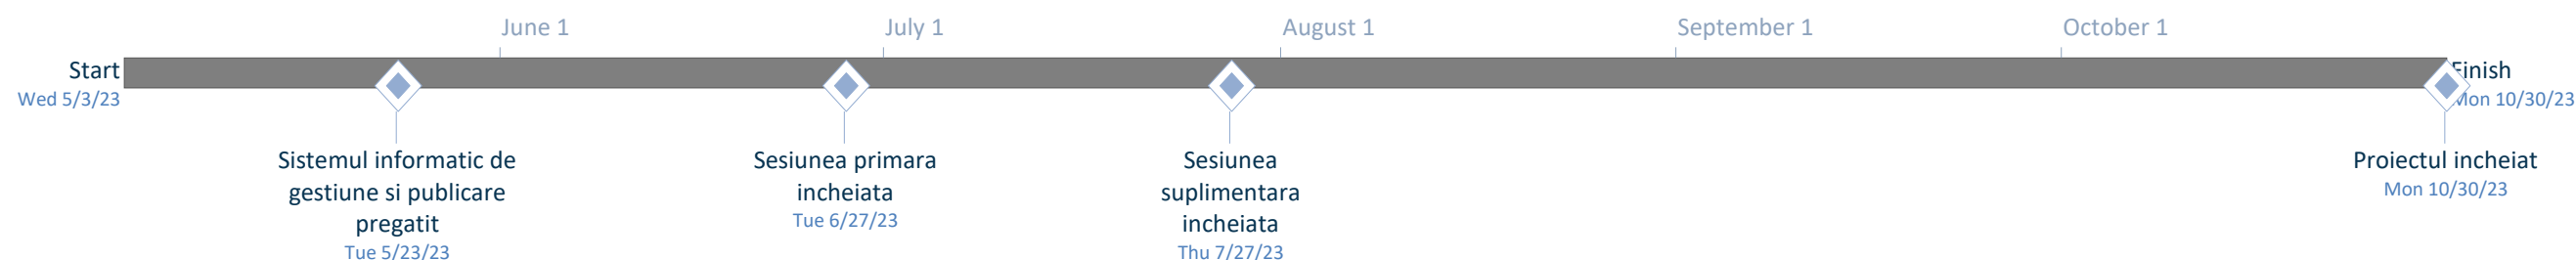


Diagrama Gantt

