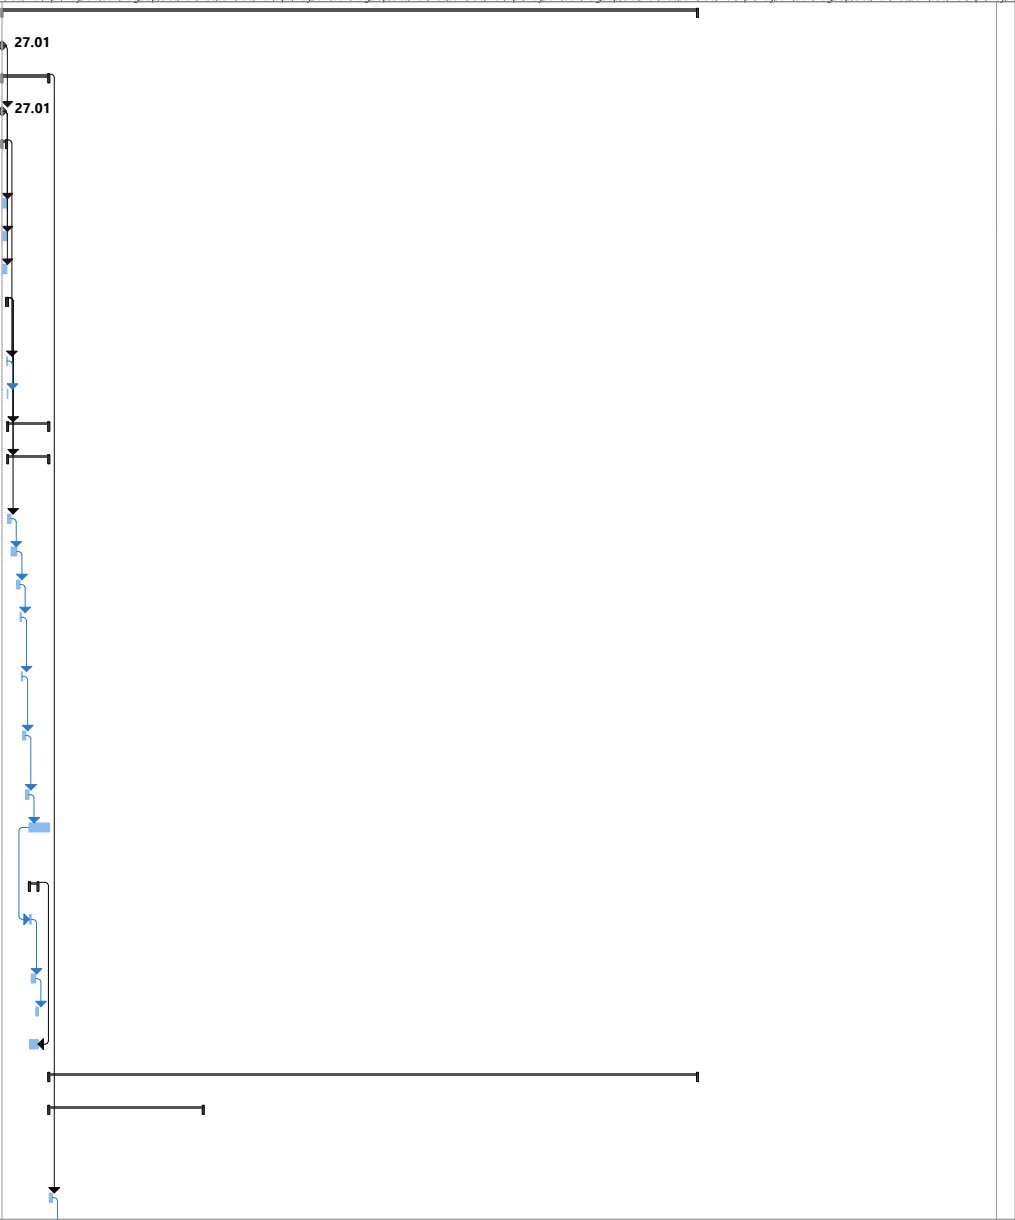


ID	 Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2024 Qtr 1, 2024 Qtr 2, 2024 Qtr 3, 2024 Qtr 4, 2025 Qtr 1, 2025 Qtr 2, 2025 Qtr 3, 2025 Qtr 4, 2026 Qtr 1, 2026 Qtr 2, 2026 Qtr 3, 2026 Qtr 4, 2027 Qtr 1, 2027 Qtr 2, 2027 Qtr 3, 2027 Qtr 4, 2028 Qtr 1, 2028 Qtr 2, 2028 Qtr 3, 2028 Qtr 4, 2029 Qtr 1, 2029 Qtr 2, 2029 Qtr 3, 2029 Qtr 4, 2030 Qtr 1, 2030 Qtr 2, 2030 Qtr 3, 2030 Qtr 4
1		Dezvoltarea și implementarea sistemului informațional	759 days	Mon 27.01.25	Mon 31.01.28		
2		Semnarea contractului	0 days	Mon 27.01.25	Mon 27.01.25		
3		Etapă de planificare și analiză	54 days	Mon 27.01.25	Fri 11.04.25		
4		Sedinta de kick-off	0 days	Mon 27.01.25	Mon 27.01.25	2	
5		Elaborarea si aprobarea planului de management al proiectului	5 days	Mon 27.01.25	Mon 03.02.25		
6		Detalierea planului de comunicare	5 days	Mon 27.01.25	Mon 03.02.25	4	
7		Detalierea planului de management al modificărilor	5 days	Mon 27.01.25	Mon 03.02.25	4	
8		Detalierea planului de management al riscurilor	5 days	Mon 27.01.25	Mon 03.02.25	4	
9		Sedinta de prezentare a planului de management al proiectului	2 days	Mon 03.02.25	Wed 05.02.25		
10		Pregatirea materialelor	1 day	Mon 03.02.25	Tue 04.02.25	5	
11		Organizarea sedinței	1 day	Tue 04.02.25	Wed 05.02.25	10	
12		Analiza și proiectare	47 days	Wed 05.02.25	Fri 11.04.25	9	
13		Elaborarea si aprobarea sarcinii tehnice si arhitecturii	47 days	Wed 05.02.25	Fri 11.04.25	9	
14		Analiza cadrului documentar	3 days	Wed 05.02.25	Mon 10.02.25	9	
15		Analiza fluxurilor de date și a proceselor existente	7 days	Mon 10.02.25	Wed 19.02.25	14	
16		Identificarea integrărilor necesare	3 days	Wed 19.02.25	Mon 24.02.25	15	
17		Identificarea standardelor pentru interfețele grafice	2 days	Mon 24.02.25	Wed 26.02.25	16	
18		Identificarea standardelor pentru documentele generate	2 days	Wed 26.02.25	Fri 28.02.25	17	
19		Identificarea datelor care se vor importa din sisteme terțe, inclusiv migrarea datelor istorice	3 days	Fri 28.02.25	Wed 05.03.25	18	
20		Analiza necesarului tehnologic	3 days	Wed 05.03.25	Mon 10.03.25	19	
21		Documentarea cerințelor funcționale și a proceselor business	24 days	Mon 10.03.25	Fri 11.04.25	20	
22		Elaborare și coordonare backlog	10 days	Tue 11.03.25	Tue 25.03.25		
23		Identificare epicilor care vor acoperi funcționalitățile SI	3 days	Tue 11.03.25	Fri 14.03.25	21SS+1 day	
24		Crearea și detalierea user stories	5 days	Fri 14.03.25	Fri 21.03.25	23	
25		Coordonare și aprobare grafic de implementare	2 days	Fri 21.03.25	Tue 25.03.25	24	
26		Configurarea mediilor de Dev și Staging	10 days	Tue 11.03.25	Tue 25.03.25	22FF	
27		Etapă de elaborare	705 days	Fri 11.04.25	Mon 31.01.28		
28		Dezvoltare faza 1 - Gestiunea utilizatorilor. Gestiunea consumatorilor și locurilor de consum. Notificări și administrare. (Funcționalități de bază)	168 days	Fri 11.04.25	Thu 11.12.25		
29		Planificare faza 1	3 days	Fri 11.04.25	Wed 16.04.25	3	

Project: Graficul de lucru_v0.2
Date: Tue 22.10.24

Task

Split

Milestone

.....

◆

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

↓

Manual Progress

Page 1

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2024 Qtr 1, 2024 Dec	2024 Qtr 2, 2025 Jan	2024 Qtr 3, 2025 Apr	2024 Qtr 4, 2025 Jul	2025 Qtr 1, 2026 Jan	2025 Qtr 2, 2026 Apr	2025 Qtr 3, 2026 Jul	2025 Qtr 4, 2026 Oct	2026 Qtr 1, 2027 Jan	2026 Qtr 2, 2027 Apr	2026 Qtr 3, 2027 Jul	2026 Qtr 4, 2027 Oct	2027 Qtr 1, 2028 Jan	2027 Qtr 2, 2028 Apr	2027 Qtr 3, 2028 Jul	2027 Qtr 4, 2028 Oct	2028 Qtr 1, 2029 Jan	2028 Qtr 2, 2029 Apr	2028 Qtr 3, 2029 Jul	2028 Qtr 4, 2029 Oct	2029 Qtr 1, 2030 Jan	2029 Qtr 2, 2030 Apr	2029 Qtr 3, 2030 Jul	2029 Qtr 4, 2030 Oct	
30		Sprint 1 - Gestiunea utilizatorilor (funcționalități de bază). Autentificare utilizatori, integrarea cu AD DS. Operații asupra utilizatorilor. Roluri.	15 days	Wed 16.04.25	Tue 13.05.25	29																									
31		Sprint 2 - Jurnalizarea și auditarea acțiunilor (funcționalități de bază)	15 days	Tue 13.05.25	Tue 03.06.25	30																									
32		Sprint 3 - Notificările de sistem (funcționalități de bază)	15 days	Tue 03.06.25	Tue 24.06.25	31																									
33		Sprint 4 - Modulul de administrare și configurare a sistemului (funcționalități de bază)	15 days	Tue 24.06.25	Tue 15.07.25	32																									
34		Sprint 5 - Gestiunea consumatorilor. Adăugarea, editarea, salvarea. Crearea în masă a fișelor. Validarea. Stabilirea regulilor business.	15 days	Tue 15.07.25	Tue 05.08.25	33																									
35		Sprint 6 - Gestiunea consumatorilor. Istoricul modificărilor. Managementul modificărilor. Modificările în masă. Verificările în masă a modificărilor.	15 days	Tue 05.08.25	Tue 26.08.25	34																									
36		Sprint 7 - Gestiunea locurilor de consum. Adăugarea, editarea, salvarea. Crearea în masă a fișelor. Validarea. Stabilirea regulilor business.	15 days	Tue 26.08.25	Wed 17.09.25	35																									
37		Sprint 8 - Sprint 6 - Gestiunea locurilor de consum. Istoricul modificărilor. Managementul modificărilor. Modificările în masă. Verificările în masă a modificărilor. Rapoarte privind modificările.	15 days	Wed 17.09.25	Wed 08.10.25	36																									
38		Sprint 9 - Sincronizarea locurilor de consum. Definirea regulilor business. Validări. Analiză și raportare divergențe.	15 days	Wed 08.10.25	Thu 30.10.25	37																									
39		Sprint 10 - Sincronizarea locurilor de consum. Corectarea datelor. Sincronizarea automată. Modificarea datelor și sincronizarea după modificare. Rapoarte de sincronizare. Notificări.	15 days	Thu 30.10.25	Thu 20.11.25	38																									
40		Sprint 11 - Cautarea. Filtarea datelor privind Locurile de consum și consumatorii. Generare documente.	15 days	Thu 20.11.25	Thu 11.12.25	39																									
41		Validarea fazei	9 days	Thu 11.12.25	Wed 24.12.25	40																									
42		Review faza 1	1 day	Thu 11.12.25	Fri 12.12.25	40																									
43		Pregătirea planului testării de acceptanță	3 days	Fri 12.12.25	Wed 17.12.25	42																									
44		Testarea de acceptanță	5 days	Wed 17.12.25	Wed 24.12.25	43																									
45		Dezvoltare faza 2 - Calcularea Volumelor gazelor naturale. Gestionarea acrodurilor tehnice. Data Warehouse.	148 days	Wed 17.12.25	Tue 21.07.26	43																									
46		Planificare faza 2	4 days	Wed 17.12.25	Tue 23.12.25	43																									

Project: Graficul de lucru_v0.2
Date: Tue 22.10.24

Task

Split

Milestone

.....

◆

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

◇

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

◇

↓

Manual Progress

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2024 Qtr 1, 2024 Qtr 2, 2024 Qtr 3, 2024 Qtr 4, 2025 Qtr 1, 2025 Qtr 2, 2025 Qtr 3, 2025 Qtr 4, 2026 Qtr 1, 2026 Qtr 2, 2026 Qtr 3, 2026 Qtr 4, 2027 Qtr 1, 2027 Qtr 2, 2027 Qtr 3, 2027 Qtr 4, 2028 Qtr 1, 2028 Qtr 2, 2028 Qtr 3, 2028 Qtr 4, 2029 Qtr 1, 2029 Qtr 2, 2029 Qtr 3, 2029 Qtr 4, 2030 Qtr 1, 2030 Qtr 2, 2030 Qtr 3, 2030 Qtr 4
47		Sprint 1 - Calcularea Volumelor gazelor naturale. Gestionarea perioadei de raportare. Închiderea/Deschiderea perioadei de raportare. Primirea citirilor.	12 days	Tue 23.12.25	Tue 13.01.26	46	
48		Sprint 2 - Calcularea Volumelor gazelor naturale. Vizualizarea și verificare informațiilor introduse și a indicațiilor încărcate.	15 days	Tue 13.01.26	Tue 03.02.26	47	
49		Sprint 3 - Corectarea volumelor facturate. Transmiterea datelor privind volumele consumate de către întreprinderile de distribuție. Schimbul de date dintre OSD și Furnizor.	15 days	Tue 03.02.26	Tue 24.02.26	48	
50		Sprint 4 - Calculul consumului de gaz natural. Recalculul consumului de gaz natural. Sarcini de calculare.	15 days	Tue 24.02.26	Tue 17.03.26	49	
51		Sprint 5 - Gestionarea acordurilor tehnice. Generarea documentelor. Notificarea consumatorilor. Transmiterea documentelor prin e-mail.	15 days	Tue 17.03.26	Tue 07.04.26	50	
52		Sprint 6 - Integrarea cu sisteme terțe (1C/ERP, Prestatori de plăți)	13 days	Tue 07.04.26	Tue 28.04.26	51	
53		Sprint 7 - Data Warehouse. Stocarea informațiilor istorice. Curățarea, transformarea și agregarea datelor. Versionare.	14 days	Tue 28.04.26	Tue 19.05.26	52	
54		Sprint 8 - Data Warehouse. Integrarea cu surse externe. Accesarea informației. Gestionarea accesului.	15 days	Tue 19.05.26	Tue 09.06.26	53	
55		Sprint 9 - Verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare. Notificări.	15 days	Tue 09.06.26	Tue 30.06.26	54	
56		Sprint 10 - Actualizarea funcționalităților precedente în contextul noilor implementări (notificări, jurnalizări, configurări).	15 days	Tue 30.06.26	Tue 21.07.26	55	
57		Validarea fazei	11 days	Tue 21.07.26	Wed 05.08.26	56	
58		Review faza 2	1 day	Tue 21.07.26	Wed 22.07.26	56	
59		Pregătirea planului testării de acceptanță	5 days	Wed 22.07.26	Wed 29.07.26	58	
60		Testarea de acceptanță	5 days	Wed 29.07.26	Wed 05.08.26	59	
61		Dezvoltare faza 3 - Gestiune sarcini. Jurnalizarea și auditarea acțiunilor. - Modulul de administrare și configurare a sistemului. Rapoarte. Integrare cu sisteme terțe.	177 days	Wed 29.07.26	Tue 13.04.27	59	
62		Planificare faza 3	4 days	Wed 29.07.26	Tue 04.08.26	59	
63		Sprint 1 - Notificarea consumatorilor. Expediere notificari: SMS, E-mail, Apeluri automatizate.	15 days	Tue 04.08.26	Tue 25.08.26	62	

Project: Graficul de lucru_v0.2
Date: Tue 22.10.24

Task

Split

Milestone

.....

◆

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

◇

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone


Deadline

Progress


◇

↓

Manual Progress

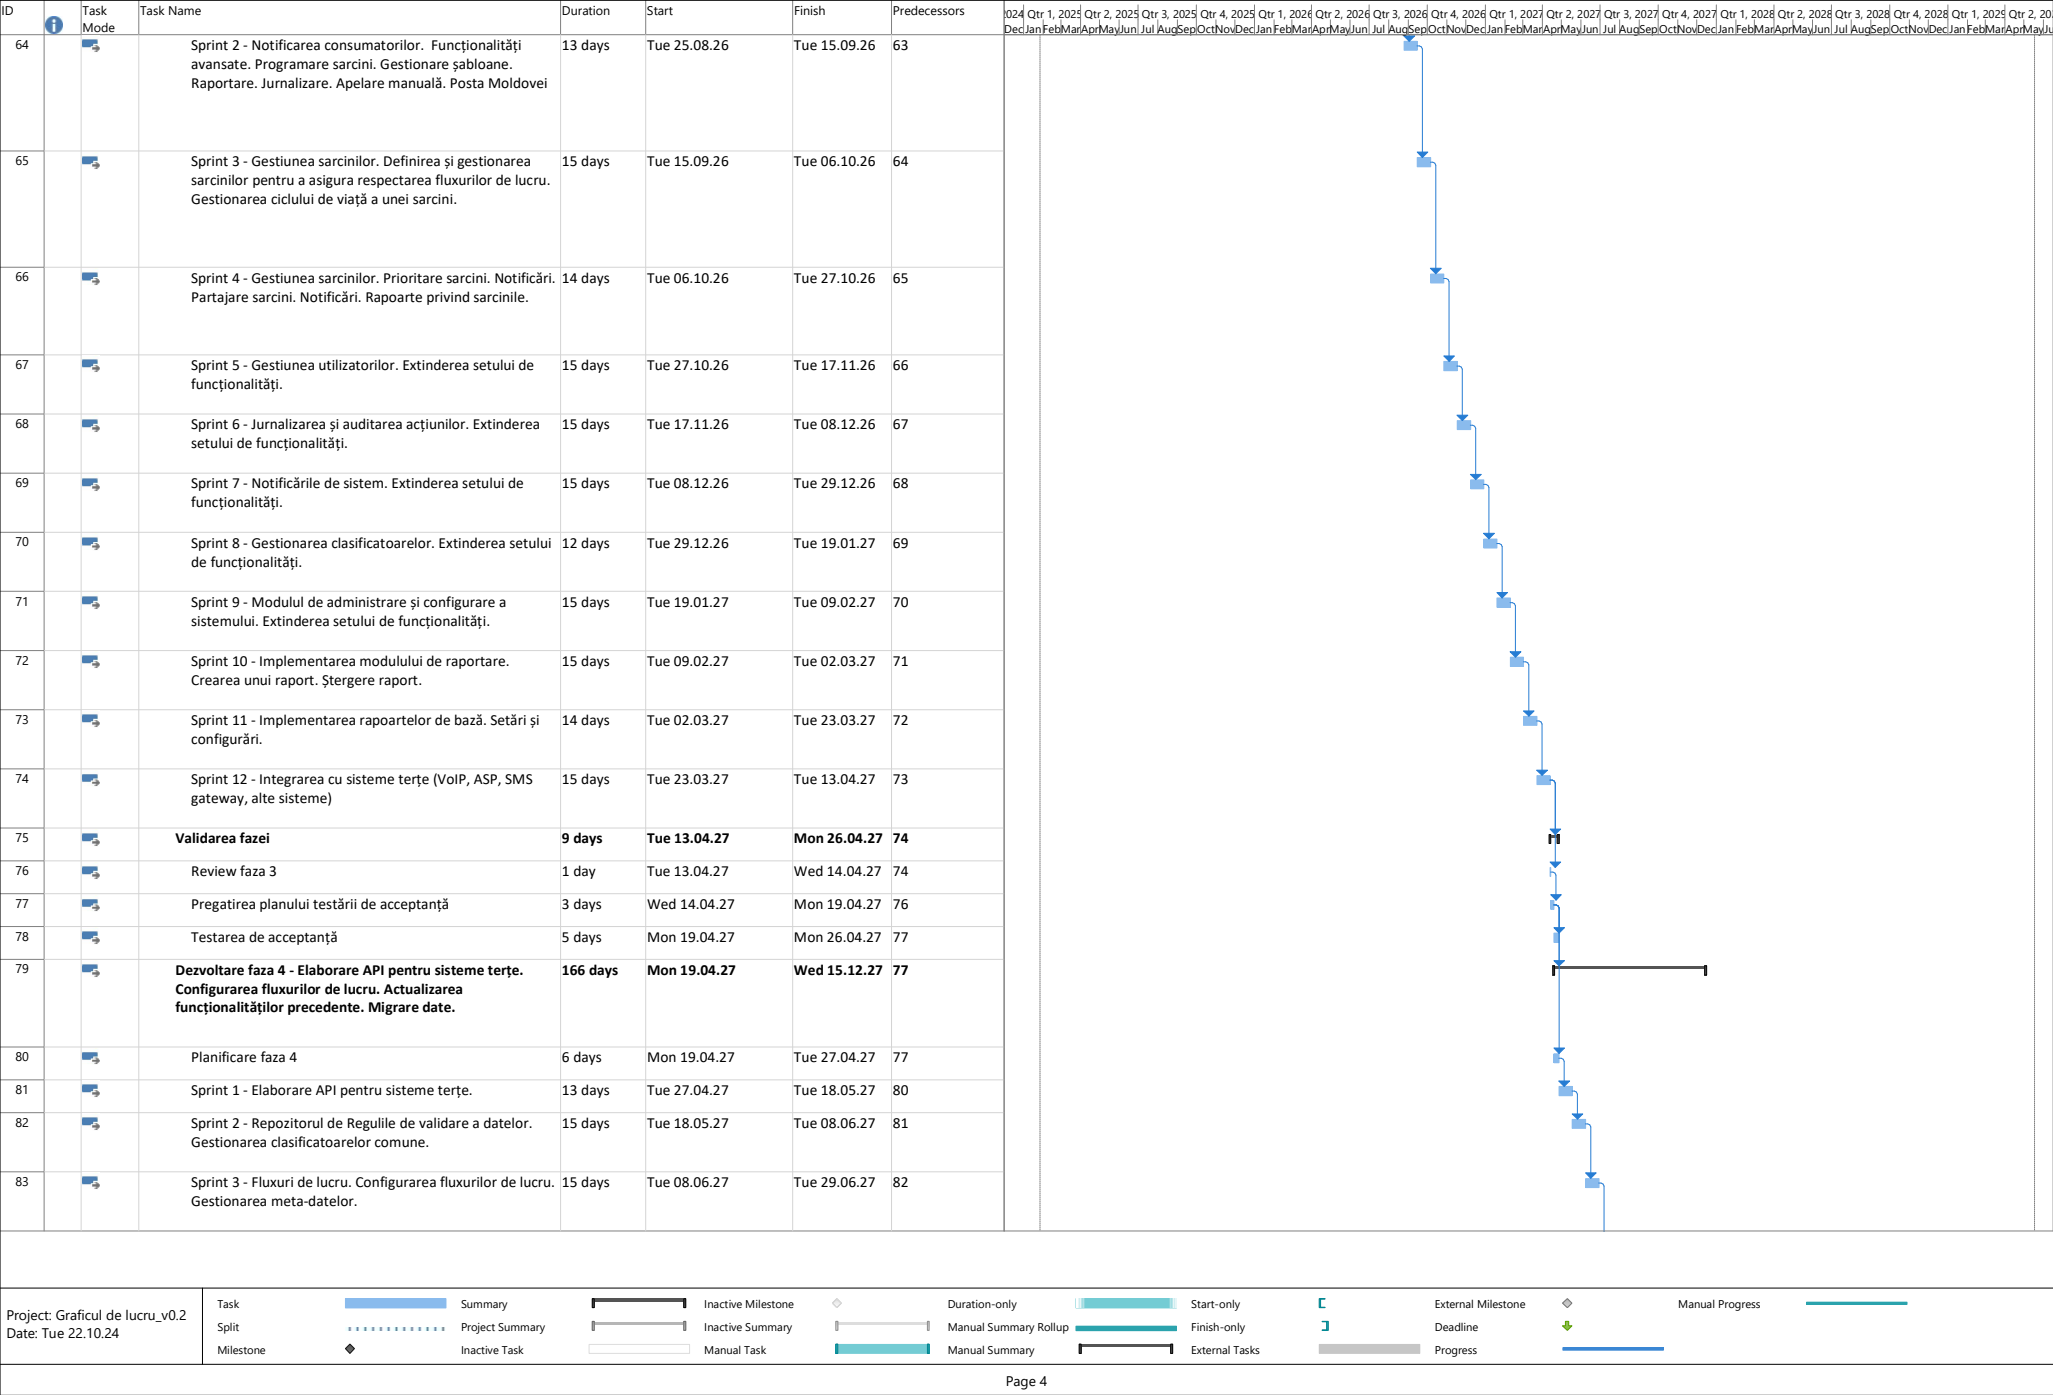

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2024 Qtr 1, 2024 Dec	2024 Qtr 2, 2024 Jan	2024 Qtr 3, 2024 Apr	2024 Qtr 4, 2024 Jul	2025 Qtr 1, 2025 Oct	2025 Qtr 2, 2025 Jan	2025 Qtr 3, 2025 Apr	2025 Qtr 4, 2025 Jul	2026 Qtr 1, 2026 Oct	2026 Qtr 2, 2026 Jan	2026 Qtr 3, 2026 Apr	2026 Qtr 4, 2026 Jul	2027 Qtr 1, 2027 Oct	2027 Qtr 2, 2027 Jan	2027 Qtr 3, 2027 Apr	2027 Qtr 4, 2027 Jul	2028 Qtr 1, 2028 Oct	2028 Qtr 2, 2028 Jan	2028 Qtr 3, 2028 Apr	2028 Qtr 4, 2028 Jul	2029 Qtr 1, 2029 Oct	2029 Qtr 2, 2029 Jan	2029 Qtr 3, 2029 Apr	2029 Qtr 4, 2029 Jul
84			Sprint 4 - Modulul de raportare. Implementarea rapoartelor secundare. Configurarea rapoartelor noi. Elaborarea materialelor de instruire.	15 days	Tue 29.06.27	Tue 20.07.27	83																								
85			Sprint 5 - Actualizarea funcționalităților precedente în contextul noilor implementări (notificări, jurnalizări, configurări). Elaborarea materialelor de instruire.	15 days	Tue 20.07.27	Tue 10.08.27	84																								
86			Sprint 6 - Actualizarea funcționalităților precedente în contextul noilor implementări (notificări, jurnalizări, configurări). Elaborarea materialelor de instruire (continuare).	13 days	Tue 10.08.27	Mon 30.08.27	85																								
87			Sprint 7 - Migrarea datelor. Stabilirea seturilor de date. Strategia, metodologia și planul de migrare. Elaborarea instrumentelor ETL.	15 days	Mon 30.08.27	Tue 21.09.27	86																								
88			Sprint 8 - Migrarea datelor. Transformarea datelor. Etape de migrare. Validarea datelor migrate.	15 days	Tue 21.09.27	Tue 12.10.27	87																								
89			Sprint 9 - Configurarea instrumentelor de lucru în cadrul platformei tehnologice. Backup. Monitorizare. Notificare. Management. Integrări. (Etapa finală).	13 days	Tue 12.10.27	Tue 02.11.27	88																								
90			Sprint 10 - Instruirea personalului. Instruirea administratorilor. Instruirea dezvoltatorilor de rapoarte. Instruirea trainerilor.	15 days	Tue 02.11.27	Tue 23.11.27	89																								
91			Sprint 11 - Completarea/Actualizarea documentației tehnice. Pregătirea serviciului de suport. Configurarea mediului de producție	15 days	Tue 23.11.27	Tue 14.12.27	90																								
92			Review faza 4	1 day	Tue 14.12.27	Wed 15.12.27	91																								
93			Testarea de acceptanță a întregului SI	32 days	Wed 15.12.27	Mon 31.01.28	92																								
94			Review faza 1, 2, 3, 4	2 days	Wed 15.12.27	Fri 17.12.27	92																								
95			Pregătirea planului testării de acceptanță	10 days	Fri 17.12.27	Fri 31.12.27	94																								
96			Testarea de acceptanță	10 days	Fri 31.12.27	Mon 17.01.28	95																								
97			Documentare testării de acceptanță	10 days	Mon 17.01.28	Mon 31.01.28	96																								
98			Etapă exploatarei experimentale a întregului SI	75 days	Mon 31.01.28	Wed 17.05.28																									
99			Instalarea ultimei versiuni a SI pe mediul de producție	5 days	Mon 31.01.28	Mon 07.02.28	91;93																								
100			Definirea scopului și participanților	5 days	Mon 31.01.28	Mon 07.02.28	93																								
101			Exploarea experimentală	65 days	Mon 07.02.28	Wed 10.05.28	99																								
102			Elaborarea și semnarea raporului și a actului	5 days	Wed 10.05.28	Wed 17.05.28	101																								
103			Etapă de mentenanță	257 days	Wed 17.05.28	Thu 17.05.29	102																								

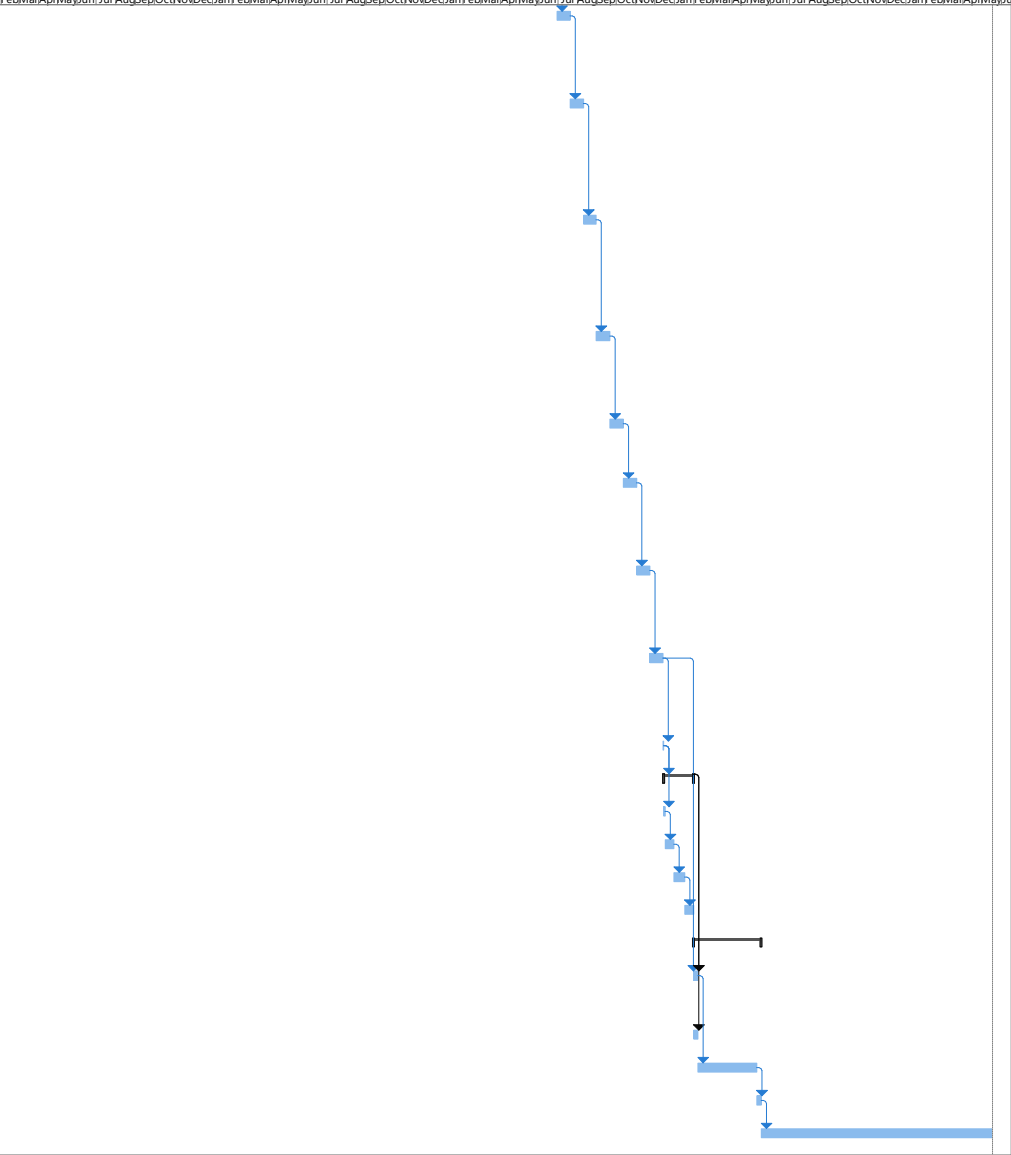

Project: Graficul de lucru_v0.2
Date: Tue 22.10.24

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			
