ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1		Management de proiect	339 days	Tue 01/09/26	Fri 17/12/27
2		**1. Etapa de planificare și inițiere**	**17 days**	**Tue 01/09/26**	**Wed 23/09/26**
3		1.1 Mobilizare echipă și ședință de lansare (kick-off)	5 days	Tue 01/09/26	Mon 07/09/26
4		1.2 Elaborare/actualizare PID și plan de proiect	12 days	Tue 08/09/26	Wed 23/09/26
5		1.3 Agreare strategie de implementare și criterii de acceptanță	8 days	Mon 14/09/26	Wed 23/09/26
6		1.4 Instalare mediu de demonstrare preconfigurat	8 days	Tue 08/09/26	Thu 17/09/26
7		Jalon: Aprobare PID / baseline	0 days	Wed 23/09/26	Wed 23/09/26
8		**2. Etapa de analiză și design**	**54 days**	**Thu 24/09/26**	**Tue 08/12/26**
9		2.1 Ateliere de analiză pe arii funcționale (resurse materiale/financiare	24 days	Thu 24/09/26	Tue 27/10/26
10		2.2 Analiză diferențe (gap) și propunere soluții	16 days	Mon 12/10/26	Mon 02/11/26
11		2.3 Document arhitectură soluție + specificații integrare cu CBS/migrar	16 days	Thu 22/10/26	Thu 12/11/26
12		2.4 Specificații de testare	8 days	Tue 03/11/26	Thu 12/11/26
13		2.5 Revizuire și acceptanță Beneficiar (analiză și design) [15–25 zl]	18 days	Fri 13/11/26	Tue 08/12/26
14		Jalon: Acceptanță analiză și design	0 days	Tue 08/12/26	Tue 08/12/26
15		**3. Etapa de construcție**	**130 days**	**Wed 09/12/26**	**Tue 08/06/27**
16		3.1 Set 1 module – configurare/customizare/dezvoltare	55 days	Wed 09/12/26	Tue 23/02/27
17		3.2 Set 2 module – configurare/customizare/dezvoltare	50 days	Wed 27/01/27	Tue 06/04/27
18		3.3 Set 3 module + integrare cu CBS + migrare date	45 days	Wed 17/03/27	Tue 18/05/27
19		3.4 Sesiune de demonstrare pe mediul de dezvoltare	5 days	Wed 19/05/27	Tue 25/05/27
20		3.5 Revizuire și acceptanță provizorie construcție [10 zl]	10 days	Wed 26/05/27	Tue 08/06/27
21		Jalon: Acceptanță construcție	0 days	Tue 08/06/27	Tue 08/06/27
22		**4. Etapa de testare**	**114 days**	**Wed 10/03/27**	**Mon 16/08/27**
23		4.1 Planificare și pregătire testare	16 days	Wed 10/03/27	Wed 31/03/27
24		4.2 Executare testare integrată (SIT)	70 days	Thu 01/04/27	Wed 07/07/27
25		4.3 Testare de acceptanță (UAT)	28 days	Mon 14/06/27	Wed 21/07/27
26		4.4 Revizuire și acceptanță testare [15–25 zl]	18 days	Thu 22/07/27	Mon 16/08/27
27		Jalon: Acceptanță testare	0 days	Mon 16/08/27	Mon 16/08/27
28		**5. Etapa de instruire**	**49 days**	**Thu 03/06/27**	**Tue 10/08/27**
29		5.1 Pregătire materiale și mediu de instruire	12 days	Thu 03/06/27	Fri 18/06/27
30		5.2 Sesiuni de instruire (train-the-trainer + pe roluri)	32 days	Mon 21/06/27	Tue 03/08/27
31		5.3 Raport de instruire	5 days	Wed 04/08/27	Tue 10/08/27
32		**6. Etapa de pregătire pentru lansarea în producție (Go-live)**	**28 days**	**Tue 17/08/27**	**Thu 23/09/27**
33		6.1 Pregătire mediu de producție și migrare finală a datelor	20 days	Tue 17/08/27	Mon 13/09/27
34		6.2 Acceptanța soluției pentru lansare	8 days	Tue 14/09/27	Thu 23/09/27
35		Jalon: Acceptanță pentru lansare (Go-live)	0 days	Thu 23/09/27	Thu 23/09/27
36		**7. Etapa de exploatare experimentală (soak)**	**35 days**	**Fri 24/09/27**	**Thu 11/11/27**
37		7.1 Exploatare experimentală (soak) și remediere defecte	35 days	Fri 24/09/27	Thu 11/11/27
38		**8. Etapa de acceptanță finală**	**26 days**	**Fri 12/11/27**	**Fri 17/12/27**
39		8.1 Verificare finală și raport de autoevaluare	8 days	Fri 12/11/27	Tue 23/11/27
40		8.2 Acceptanța finală a soluției [15–25 zl]	18 days	Wed 24/11/27	Fri 17/12/27
41		Jalon: Acceptanță finală a soluției	0 days	Fri 17/12/27	Fri 17/12/27

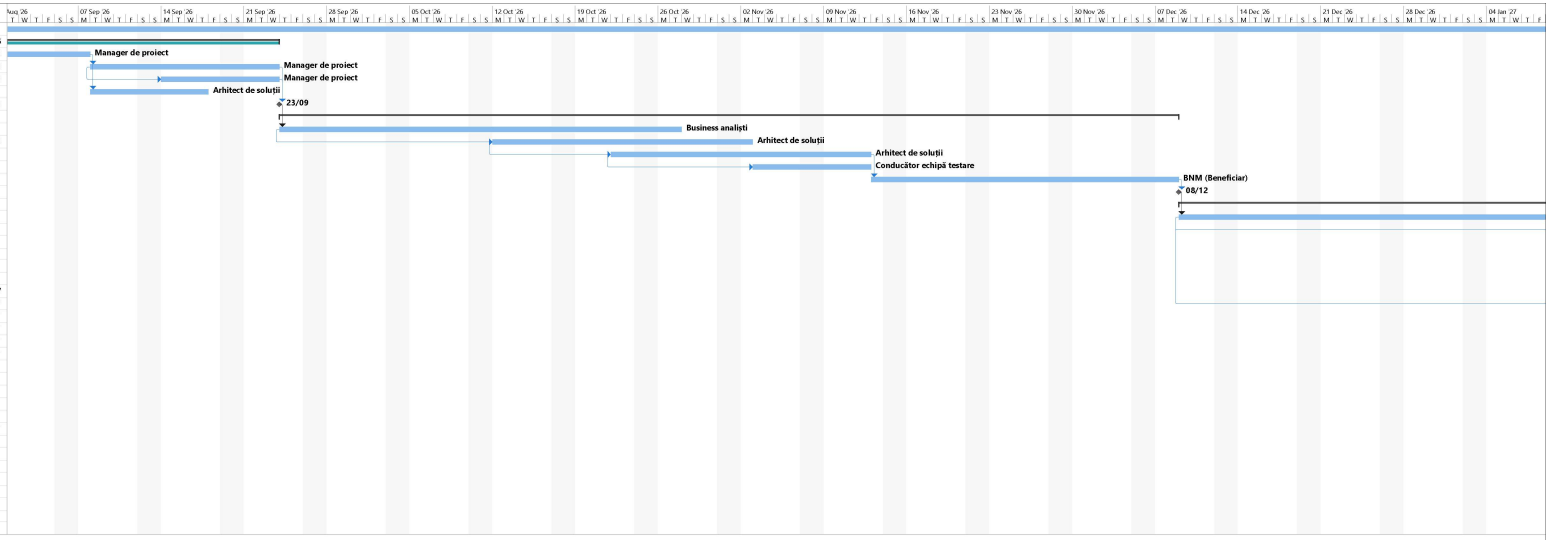

Gabriel-Viorel Zainea

Digitally signed by Gabriel-Viorel Zainea
Date: 2026.06.14 23:49:24 +03'00'

Project: Project1
Date: Sun 14/06/26

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress

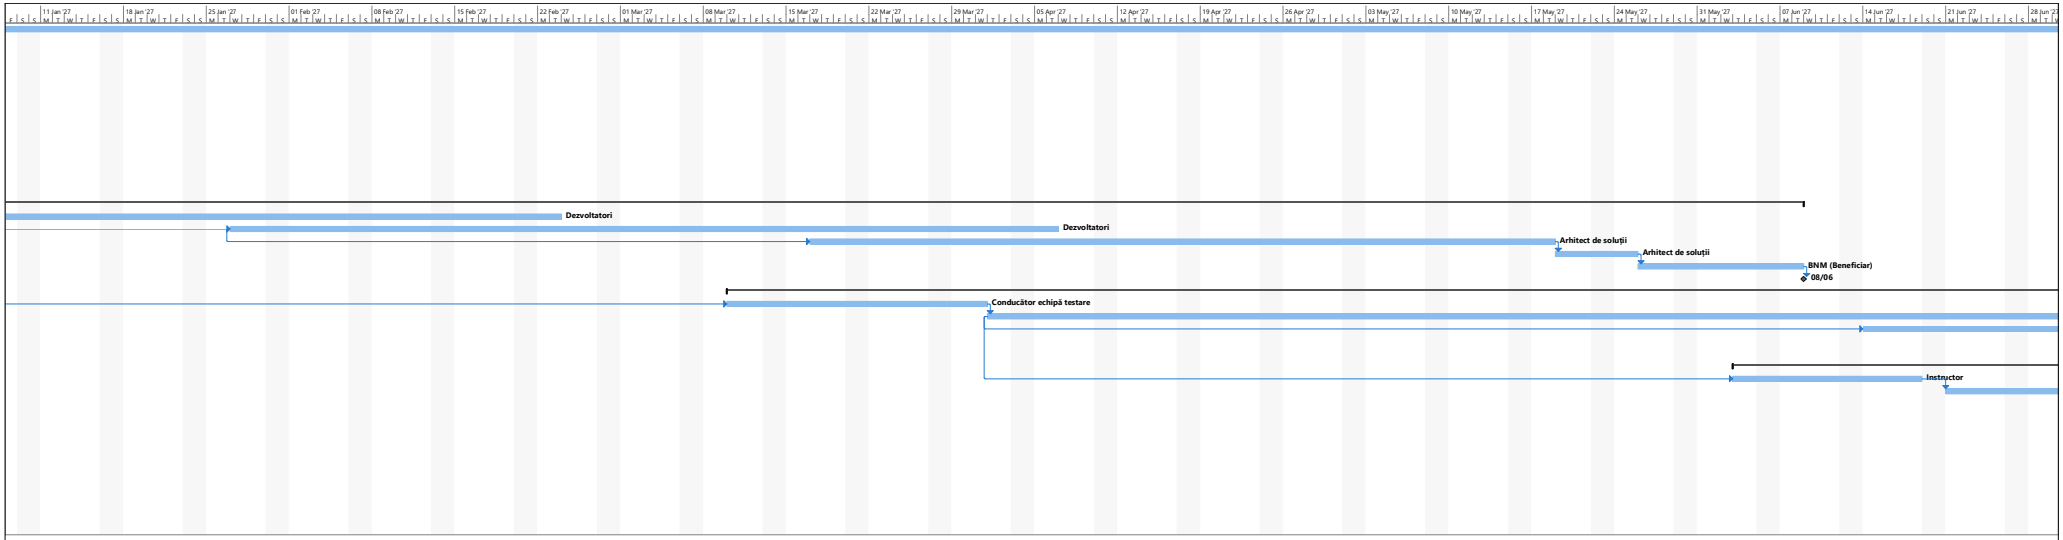

Project: Project1
Date: Sun 14/06/26

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress

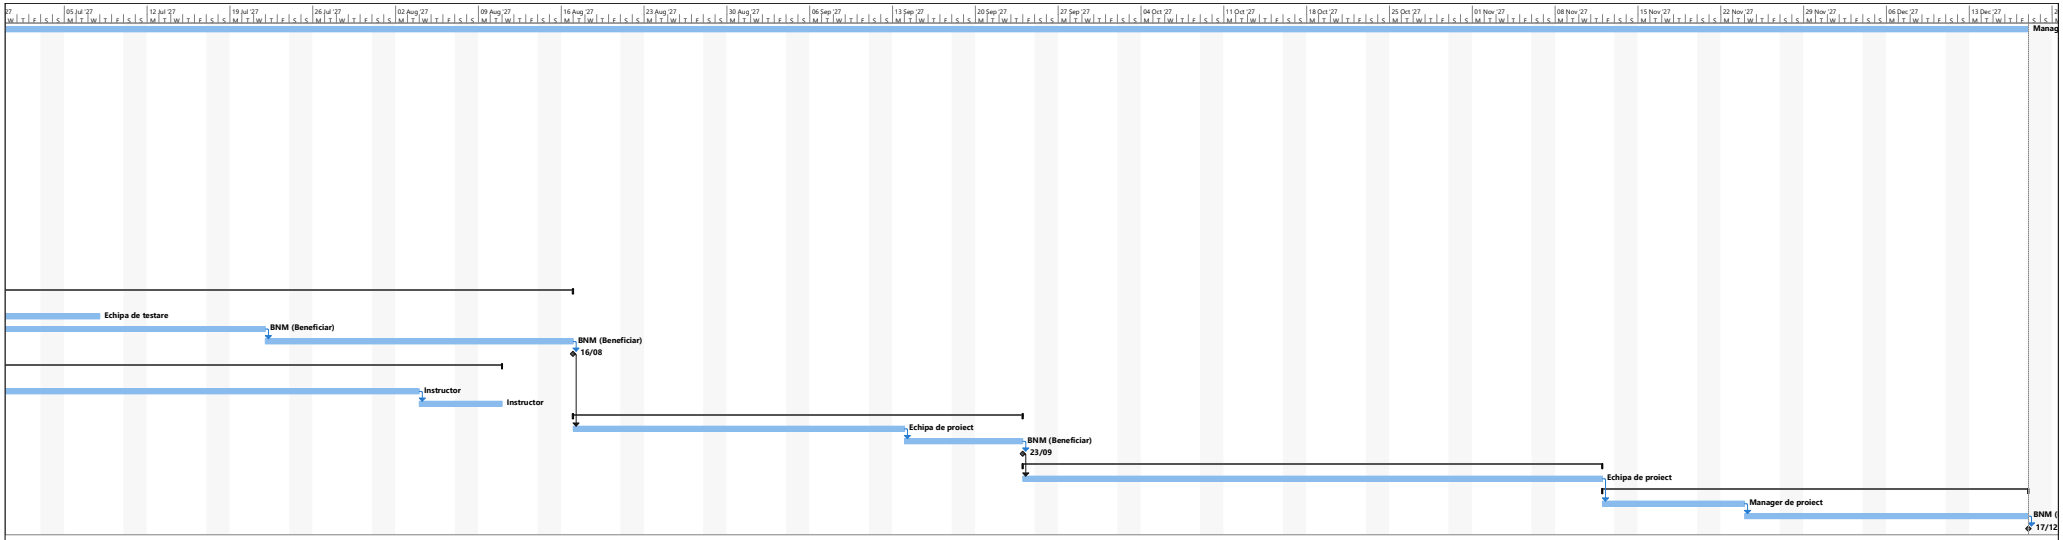

Project: Project1
Date: Sun 14/06/26

Task | Milestone | Project Summary | Inactive Milestone | Manual Task | Manual Summary Rollup | Start-only | External Tasks | Deadline | Manual Progress
Split | Summary | Inactive Task | Inactive Summary | Duration-only | Manual Summary | Finish-only | External Milestone | Progress
