Diagrama Gantt. Descifrarea etapelor.

	Denumire etapa	Durata	Inceput etapa	Sfarsit etapa	Etapa predece-soare
1	Semnarea contractului	4 days	Wed 4/7/21	Mon 4/12/21	
2	Instalarea, configurarea şi setarea infrastructurii în Mcloud, aplicaţiilor de conversie şi de integrare/publicare pe Web	1 wk	Mon 5/10/21	Fri 5/14/21	
3	Testarea şi corectarea aplicaţiilor	1 wk	Mon 5/17/21	Fri 5/21/21	2
4	Sistemul informatic de gestiune si publicare pregatit	0 days	Fri 5/21/21	Fri 5/21/21	3
5	Instalarea şi setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Thu 6/3/21	Thu 6/3/21	1
6	Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Fri 6/4/21	Fri 6/4/21	5
7	Instruirea şi aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Mon 6/7/21	Mon 6/7/21	
8	Instalarea şi setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Wed 6/2/21	Wed 6/2/21	1
9	Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Thu 6/3/21	Thu 6/3/21	8
10	Instruirea şi aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Thu 6/3/21	Thu 6/3/21	8
11	Generarea codurilor PIN şi transmiterea lor personalului Beneficiarului pentru repartizare	1 day	Mon 5/31/21	Mon 5/31/21	
12	Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 1, sesiunea primară	12 days	Thu 6/10/21	Fri 6/25/21	7
13	Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 2, sesiunea primară	16 days	Fri 6/4/21	Fri 6/25/21	10
14	Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară	1 day	Sun 6/27/21	Sun 6/27/21	
15	Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe Web	1 day	Mon 6/28/21	Mon 6/28/21	14
16	Sesiunea primara incheiata	0 days	Mon 6/28/21	Mon 6/28/21	15
17	Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 2, perioada de contestații sesiunea primară	5 days	Tue 6/29/21	Sat 7/3/21	15
18	Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 2, sesiunea suplimentară	7 days	Mon 7/19/21	Tue 7/27/21	
19	Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea suplimentară	1 day	Wed 7/28/21	Wed 7/28/21	18
20	Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe suplimentară	1 day	Thu 7/29/21	Thu 7/29/21	19
21	Sesiunea suplimentara incheiata	0 days	Thu 7/29/21	Thu 7/29/21	20
22	Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 2, perioada de contestații sesiunea suplimentară	2 days	Fri 7/30/21	Sun 8/1/21	20
23	Asigurarea accesului reprezentanților Beneficiarului la toate testele scanate prin intermediul aplicației Web	89 days	Sat 6/26/21	Wed 10/27/21	
24	Distrugerea infrastructurii și a datelor din Mcloud	1 day	Thu 10/28/21	Thu 10/28/21	23
25	Proiectul incheiat	0 days	Thu 10/28/21	Thu 10/28/21	24



Digitally signed by Acristinii Tudor
Date: 2021.03.23 12:17:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
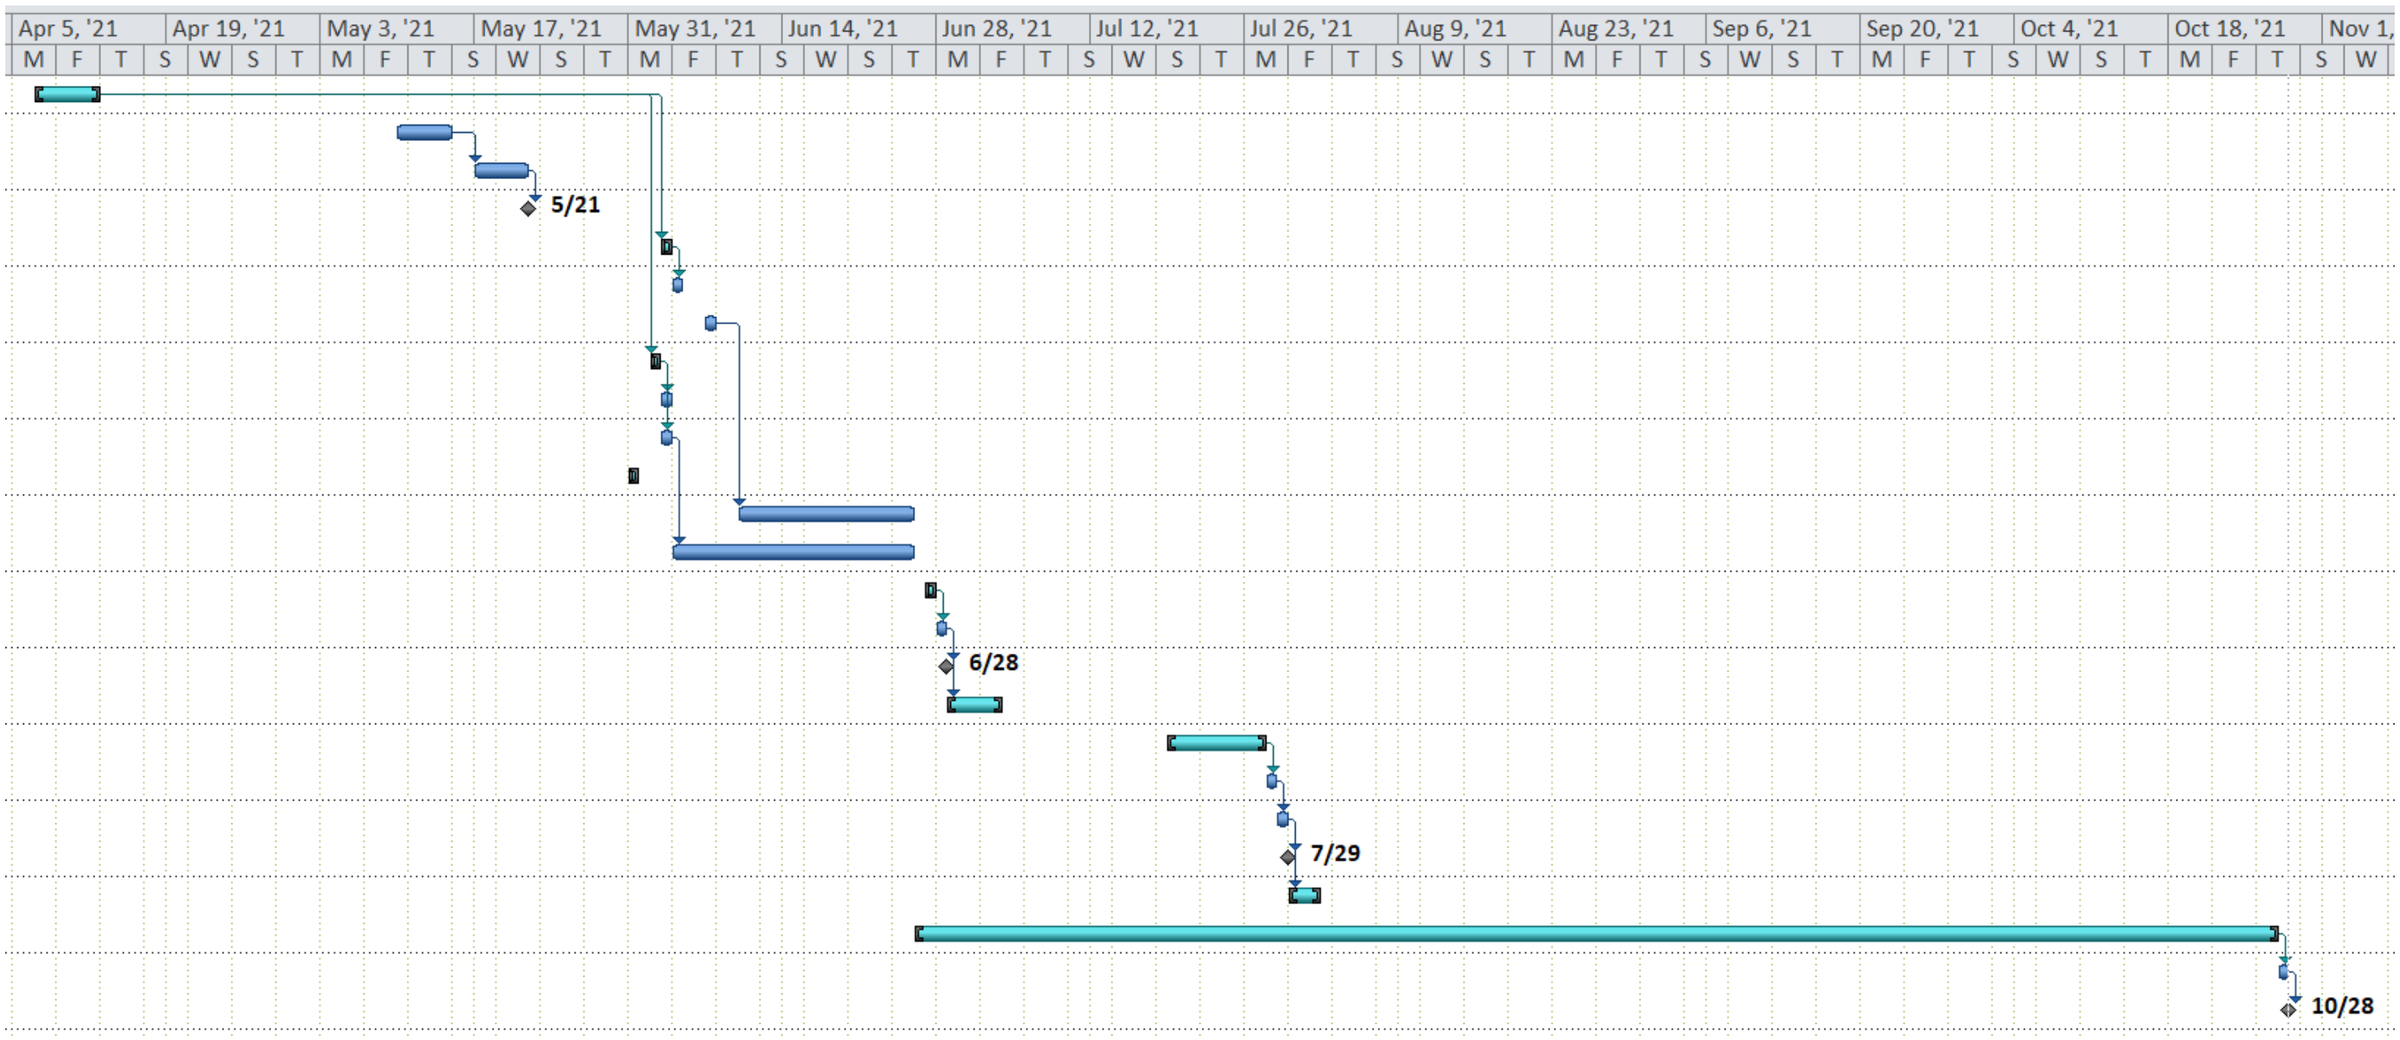
Diagrama Gantt
