ID	Activitati si subactivitati	Durata [zile]	Start	Final
1	ELABORAREA PROIECTULUI	89 days	Mon 14.03.22	Thu 14.07.22
2	**1. RAPORT INIȚIAL**	**10 days**	**Mon 14.03.22**	**Fri 25.03.22**
3	1.1. Analiza documentelor	3 days	Mon 14.03.22	Wed 16.03.22
4	1.2. Colectarea informațiilor	2 days	Thu 17.03.22	Fri 18.03.22
5	1.3. Documentarea pe teren	2 days	Mon 21.03.22	Tue 22.03.22
6	1.4. Întocmirea raportului inițial	2 days	Wed 23.03.22	Thu 24.03.22
7	1.5. Prezentarea raportului inițial	1 day	Fri 25.03.22	Fri 25.03.22
8				
9	**2. ELABORAREA PROIECTULUI DE EXECUȚIE**	**60 days**	**Mon 28.03.22**	**Fri 17.06.22**
10	2.1. Prezentarea cadrului general al infrastructurii propuse	5 days	Mon 28.03.22	Fri 01.04.22
11	2.2. Configurarea de ansamblu a componentelor principale ale investiției	10 days	Wed 30.03.22	Tue 12.04.22
12	2.3. Descrierea tehnică a întregului sistem propus cu detalierea componentelor și subcomponentelor acestuia	8 days	Mon 04.04.22	Wed 13.04.22
13	2.4. Detalierea prin intermediul planurilor și diagramelor a soluțiilor tehnice propuse	15 days	Mon 04.04.22	Fri 22.04.22
14	2.5. Scheme tehnologice ale componentelor sistemului	16 days	Mon 04.04.22	Mon 25.04.22
15	2.7. Calcule hidraulice	10 days	Mon 11.04.22	Fri 22.04.22
16	2.8. Planuri de situație în scara 1:500	25 days	Mon 04.04.22	Fri 06.05.22
17	2.9. Profile longitudinale pentru toate conductele proiectate	35 days	Mon 18.04.22	Fri 03.06.22
18	2.10. SPAU 1. Str. Alexandru Vodă	10 days	Mon 18.04.22	Fri 29.04.22
19	2.11. SPAU 2. Str. Băcioi	10 days	Mon 02.05.22	Fri 13.05.22
20	2.12. SPAU 2. Str. Puhoi	10 days	Mon 16.05.22	Fri 27.05.22
21	2.13. Liniile aeriene pe str. Puhoi și Alexandru Negru Vodă	15 days	Mon 09.05.22	Fri 27.05.22
22	2.14. Stațiile de transformare electrică pe str. Puhoi și Alexandru Negru Vodă	10 days	Mon 30.05.22	Fri 10.06.22
23	2.15.Elaborarea documentației de deviz	10 days	Mon 06.06.22	Fri 17.06.22
24				
25	**3. COORDONAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECTARE CU INSTANȚELE CORESPUNZĂTOARE**	**19 days**	**Mon 20.06.22**	**Thu 14.07.22**
26	3.1. Coordonarea proiectului cu instanțale corespunzătoare	10 days	Mon 20.06.22	Fri 01.07.22
27	3.2. Modificarea proiectului conform cerințelor instanțelor (la necesitate)	13 days	Mon 27.06.22	Wed 13.07.22
28	3.3. Prezentarea proiectului de execuție	1 day	Thu 14.07.22	Thu 14.07.22

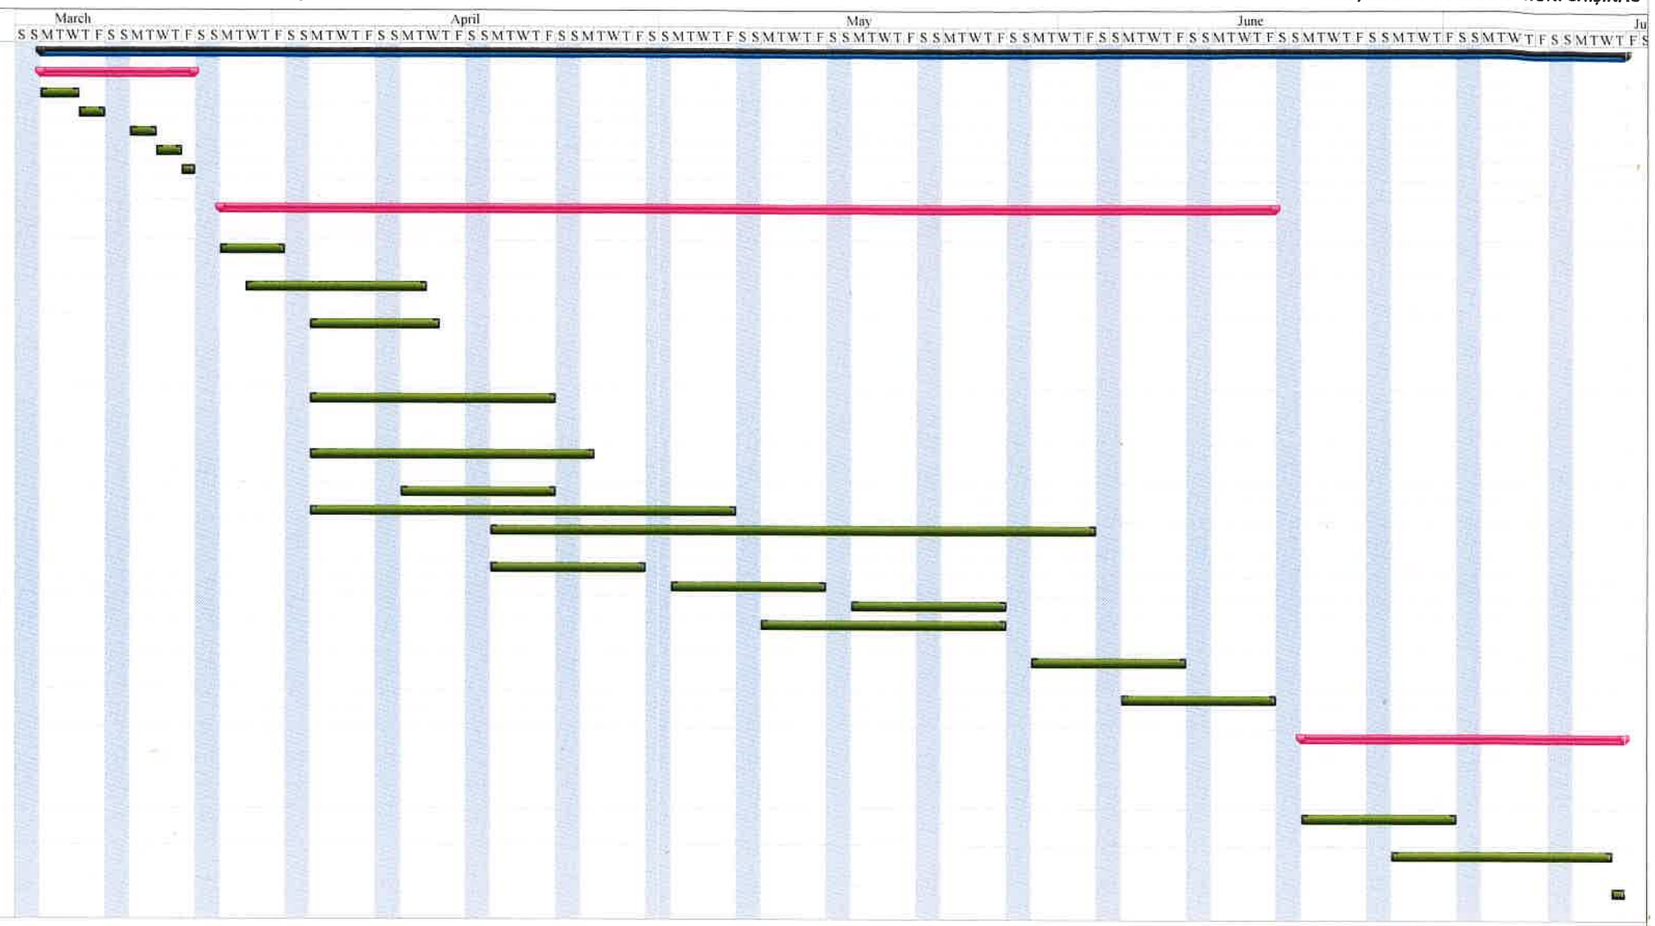
March
April
May
June
Ju
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
