Graficul de executie a lucrarilor pe obiect:

Lucrari de renovare si construire - Centrul de Sanatate din s. Malaesti, r-nul Criuleni in cadrul Progr

Etapa	Nr.	Denumirea lucrarilor	Luna 1-2 Zile: 1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44	45 46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14
	1	2-1-2 Centrul de sanatate																																					
	2	2-1-3 Retelele interioare de alimentare cu apa si canalizare																																					
	3	2-1-4 Incalzire																																					
	4	2-1-5 Conditionarrea																																					
	5	2-1-6 Ventilare																																					
	6	2-1-7 Retele electrice interioare																																					
	7	2-1-8 SEAE																																					
	8	2-1-9 Ventilarea Автоматизация (марка A1-IVC)																																					
	9	2-1-10 Video supraveghere																																					
	10	2-1-11 Охранная сигнализация																																					
	11	2-1-12 Semnalizare incendiu																																					
	12	2-1-13 Автоматизация ASM																																					
I	13	3-1 Pereti de sprigin.2 buc.																																					
	14	4-1 Alimentarea cu energie electrica exteriora																																					
	15	4-2 Panouri solare																																					
	16	6-1 REAC (canalizarea, drenaj, evacuarea apa pluviala)																																					
	17	6-2 Rezervor antiincendar 50m3. Общестроительные работы (марка AC)																																					
	18	6-3 Rezervor antiincendar 50m3. Общестроительные работы (марка AC)																																					
	19	7-1 Amenajare teritoriu																																					
	20	7-3 Amenajare.Gard Gabion 22ml																																					

Graficul resurselor umane pe obiect:

Etapa	Nr.	Denumirea muncitorilor pe specialitati	Nr.muncit	H/Zi	Luna 1-2 Zile: 1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44	45 46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14
		Lucrari de constructie montaj																																						
	1	zidar	4	8																																				
	2	tencuitor	6	8																																				
	3	betonist	4	8																																				
	4	dulgher	6	8																																				
	5	faiantar	4	8																																				
	6	mozaicar	4	8																																				
	7	zugrav	5	8																																				
	8	lacatus	10	8																																				
	9	montator constructii metalice	4	8																																				

II	10	muncitor	10	8
	11	instalator apa canalizare	5	8
	12	instalator incalzire si gaze	5	8
	13	finisor	6	8
	14	instalator ventilare si conditionare	4	8
	15	izolator hidrofug	5	8
	16	tinighiu	5	8
	17	electrician	8	8
	18	pavator	6	8
	19	montator	6	8
	20	Diriginte de santier lucrari	4	8

Programul mecanismelor la şantier:

Etapa	Nr.	Denumirea mecanismelor	Nr.mecan.	H/Zi	Luna 1-2 Zile: 1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44	45 46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14
III	1	Excavator	4	6																																					
	2	Vibrator	3	6																																					
	3	Malaxor	4	5																																					
	4	Mai mecanic	2	4																																					
	5	Automacara	2	6																																					
	6	Macara	2	5																																					
	7	Grup termic de sudura	2	4																																					
	8	Grup electrogen mobil	2	5																																					
	9	Autobasculanta	2	5																																					
	10	Schele	20	8																																					
	11	Macara de fereastra	4	6																																					
	12	Buldozer	2	5																																					
	13	Malaxor	3	6																																					
	14	Masina de gaurit	4	5																																					
	15	Aparat de sudura	3	6																																					
	16	perforator	4	6																																					
	17	ascensoare hidraulice	2	6																																					
	18	instalatii sudare	2	6																																					
	19	cabestane electrice	2	6																																					
	20	autolaborator verificari	1	8																																					
	21	presa armaturi	2	6																																					
	22	vibrator de adincime	2	6																																					
	23	compresor	2	5																																					
	24	masina de gaurit electrica	5	4																																					
	25	Motocompresor	2	3																																					

Ofertant: "Casa Construct" SRL

Director: Cotoman Catalin

Digitally signed by Cotoman Cătălin
Date: 2026.04.08 09:28:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

ramul Interreg NEXT Romania - Republica Moldova 2021-2027 - Partener de Proiect PP2

Luna 3-4																										Luna 5-6																									
Zile																										Zile																									
15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44	45 46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44				

Luna 3-4																										Luna 5-6																									
Zile																										Zile																									
15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44	45 46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44				



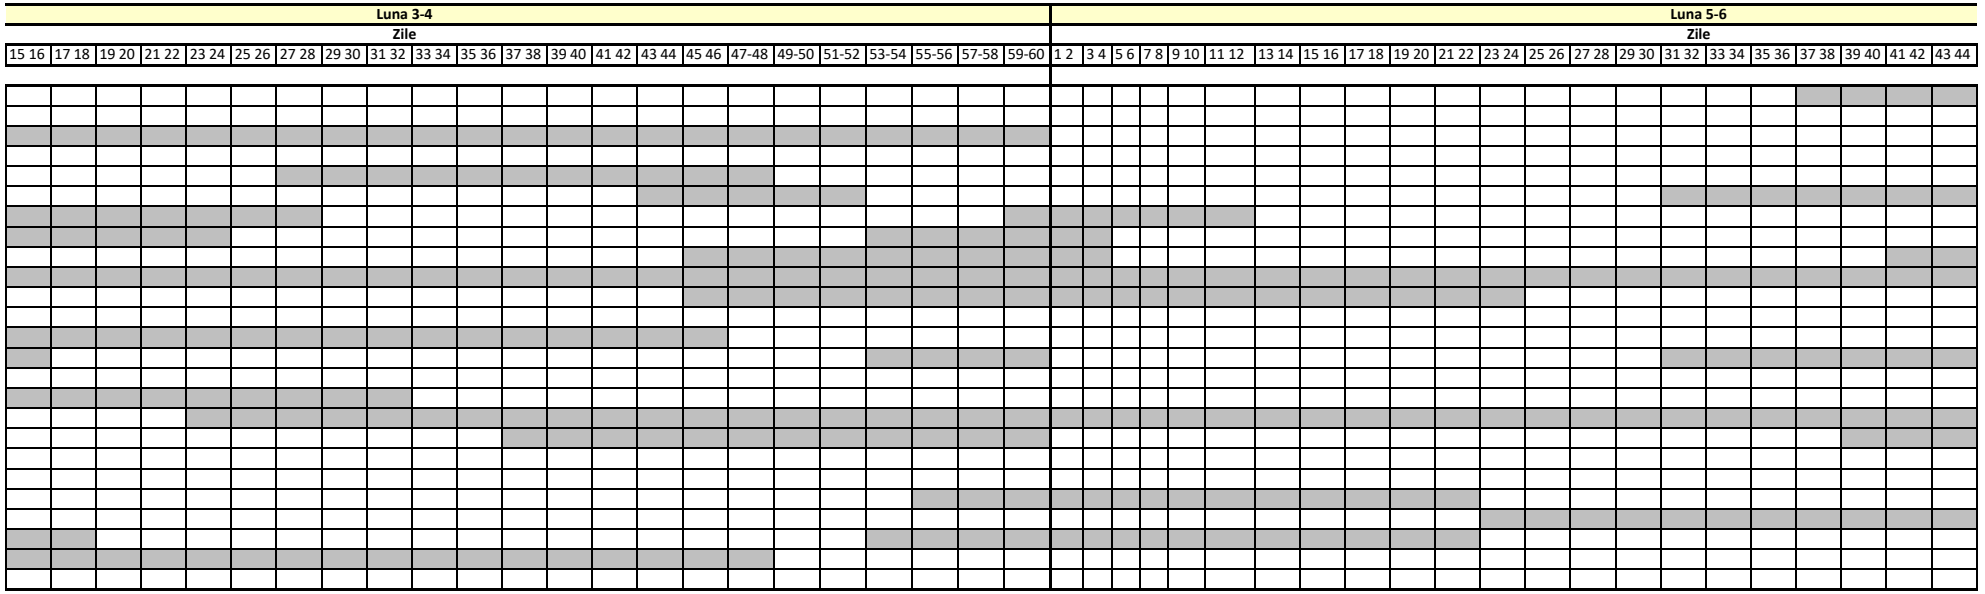
Luna 3-4
Zile
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
43 44
45 46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
Luna 5-6
Zile
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
43 44

								Luna 7-8																													
								Zile																													
45 46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44	45 46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60

								Luna 7-8																													
								Zile																													
45 46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 42	43 44	45 46	47-48	49-50	51-52	53-54	55-56	57-58	59-60



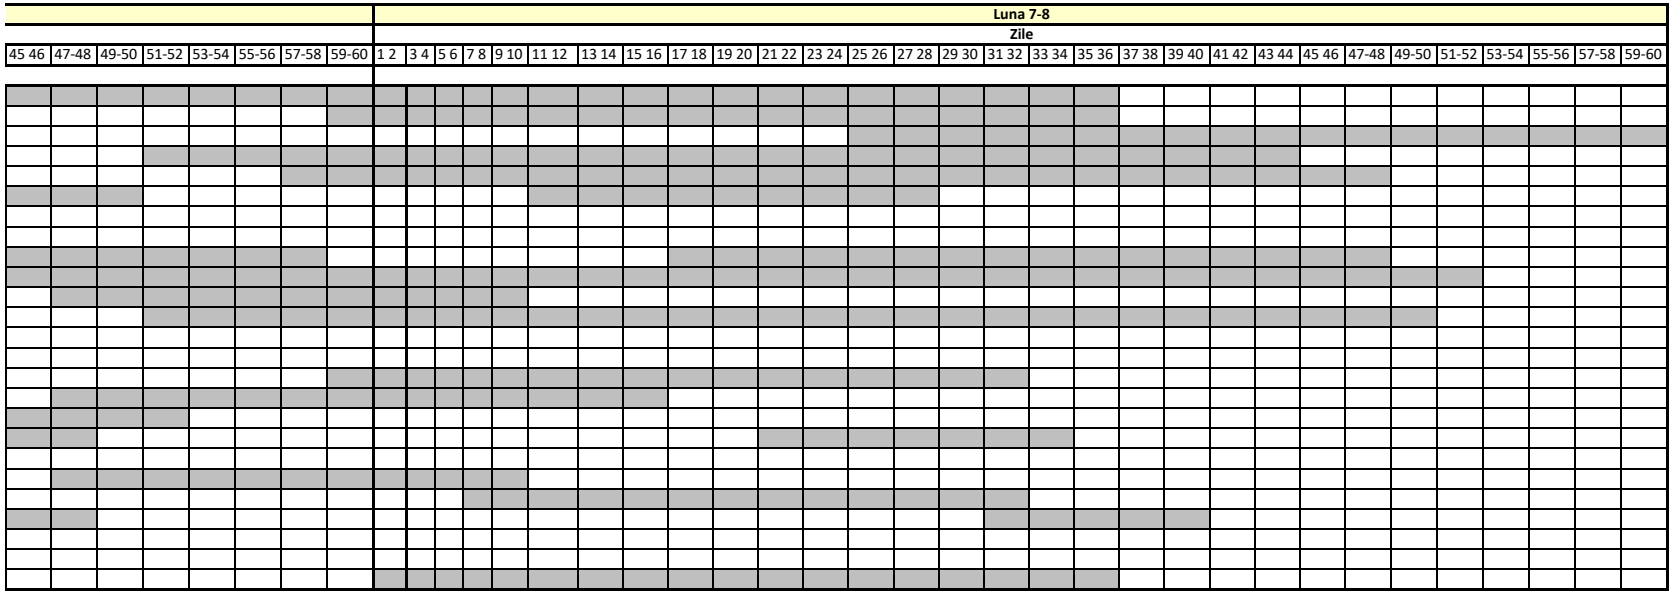
Luna 7-8
Zile
45 46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
43 44
45 46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
