Gantt Diagrame — AKIS

Tip	ID	Cerința	Start	Durata (zile)	End
P	P1	**Inițiere și planificare**	**01.07.2026**	**5**	**07.07.2026**
T		Kick-off meeting și confirmarea guvernanței proiectului	01.07.2026	1	01.07.2026
T		Plan de management proiect, comunicare, riscuri și acces	02.07.2026	4	07.07.2026
◆	M1	**Planul de proiect aprobat**	**07.07.2026**	**1**	**07.07.2026**
P	P2	**Analiză cerințe și backlog**	**01.07.2026**	**15**	**21.07.2026**
T		Analiza ToR și clarificarea cerințelor AKIS	01.07.2026	5	07.07.2026
T		Ateliere cu stakeholderii și modelarea proceselor BPMN/UML	06.07.2026	7	14.07.2026
T		Definirea cerințelor funcționale și nefunctionale	08.07.2026	8	17.07.2026
T		Backlog inițial și criterii de acceptanță	15.07.2026	5	21.07.2026
◆	M2	**Cerințele și backlog-ul validate**	**21.07.2026**	**1**	**21.07.2026**
P	P3	**UX/UI și prototipuri**	**22.07.2026**	**10**	**04.08.2026**
T		Design system și aliniere la Modelul Unitar de Design	22.07.2026	4	27.07.2026
T		Prototip portal public AKIS	27.07.2026	5	31.07.2026
T		Prototip panou administrare	29.07.2026	5	04.08.2026
T		Validare UX/UI cu beneficiarul	03.08.2026	2	04.08.2026
◆	M3	**UX/UI și prototipurile aprobate**	**04.08.2026**	**1**	**04.08.2026**
P	P4	**HLD/LLD și model date**	**05.08.2026**	**10**	**18.08.2026**
T		HLD servicii, MConsul și Kubernetes	05.08.2026	5	11.08.2026
T		Model date PostgreSQL/PostGIS și ERD	05.08.2026	6	12.08.2026
T		Contracte API OpenAPI și fluxuri de integrare	10.08.2026	6	17.08.2026
T		Plan de integrare eDov și securitate	12.08.2026	5	18.08.2026
◆	M4	**HLD/LLD și modelul de date aprobate**	**18.08.2026**	**1**	**18.08.2026**
P	P5	**Dezvoltare module AKIS**	**19.08.2026**	**60**	**10.11.2026**
T		Configurare infrastructură dezvoltare/test și CI/CD	19.08.2026	10	01.09.2026
T		Client SPA: portal public și panou administrare	19.08.2026	30	29.09.2026
T		API Gateway și servicii backend de bază	19.08.2026	25	22.09.2026
T		CMS: pagini statice, știri, articole și politici	02.09.2026	25	06.10.2026
T		Bază de cunoștințe și bibliotecă de documente	09.09.2026	30	20.10.2026
T		Registru organizații	09.09.2026	25	13.10.2026
T		Registru consilieri și servicii de consultanță	16.09.2026	30	27.10.2026
T		Formare profesională, calendar instruiri și evenimente	23.09.2026	30	03.11.2026
T		Proiecte și inițiative de inovare	01.10.2026	25	04.11.2026
T		Căutare globală și indexare full-text	07.10.2026	23	06.11.2026
T		Hartă interactivă și localizare entități AKIS	12.10.2026	22	10.11.2026
T		Rapoarte operaționale, statistici și KPI	19.10.2026	17	10.11.2026
◆	M5	**Modulele principale AKIS finalizate**	**10.11.2026**	**1**	**10.11.2026**
P	P6	**Integrări servicii eDov**	**15.09.2026**	**35**	**02.11.2026**
T		Integrare MPass	15.09.2026	11	29.09.2026
T		Integrare MSign	23.09.2026	15	13.10.2026
T		Integrare MNotify	30.09.2026	15	20.10.2026
T		Integrare MLog	07.10.2026	15	27.10.2026
T		Integrare MConnect și MConnect Events	14.10.2026	14	02.11.2026
T		Testare fluxuri de interoperabilitate	26.10.2026	6	02.11.2026
◆	M6	**Integrările eDov finalizate**	**02.11.2026**	**1**	**02.11.2026**
P	P7	**Testare, securitate și UAT**	**19.08.2026**	**60**	**10.11.2026**
T		Testare funcțională și regresie	19.08.2026	60	10.11.2026
T		Testare API și integrare	19.08.2026	60	10.11.2026
T		Testare performanță și încărcare	07.10.2026	25	10.11.2026
T		Testare securitate și remediere vulnerabilități	07.10.2026	25	10.11.2026
T		UAT cu beneficiarul și corecții finale	26.10.2026	12	10.11.2026
◆	M7	**UAT aprobat de beneficiar**	**10.11.2026**	**1**	**10.11.2026**
P	P8	**Deployment, instruire și stabilizare**	**11.11.2026**	**7**	**19.11.2026**
T		Deployment în MCloud și verificări post-instalare	11.11.2026	2	12.11.2026
T		Instruire administratori și utilizatori	11.11.2026	5	17.11.2026
T		Predare documentație, cod sursă și ghiduri operaționale	16.11.2026	3	18.11.2026
T		Stabilizare, suport post-tranșare și recepție finală	16.11.2026	4	19.11.2026
◆	M8	**Recepția finală și predare sistem AKIS**	**19.11.2026**	**1**	**19.11.2026**

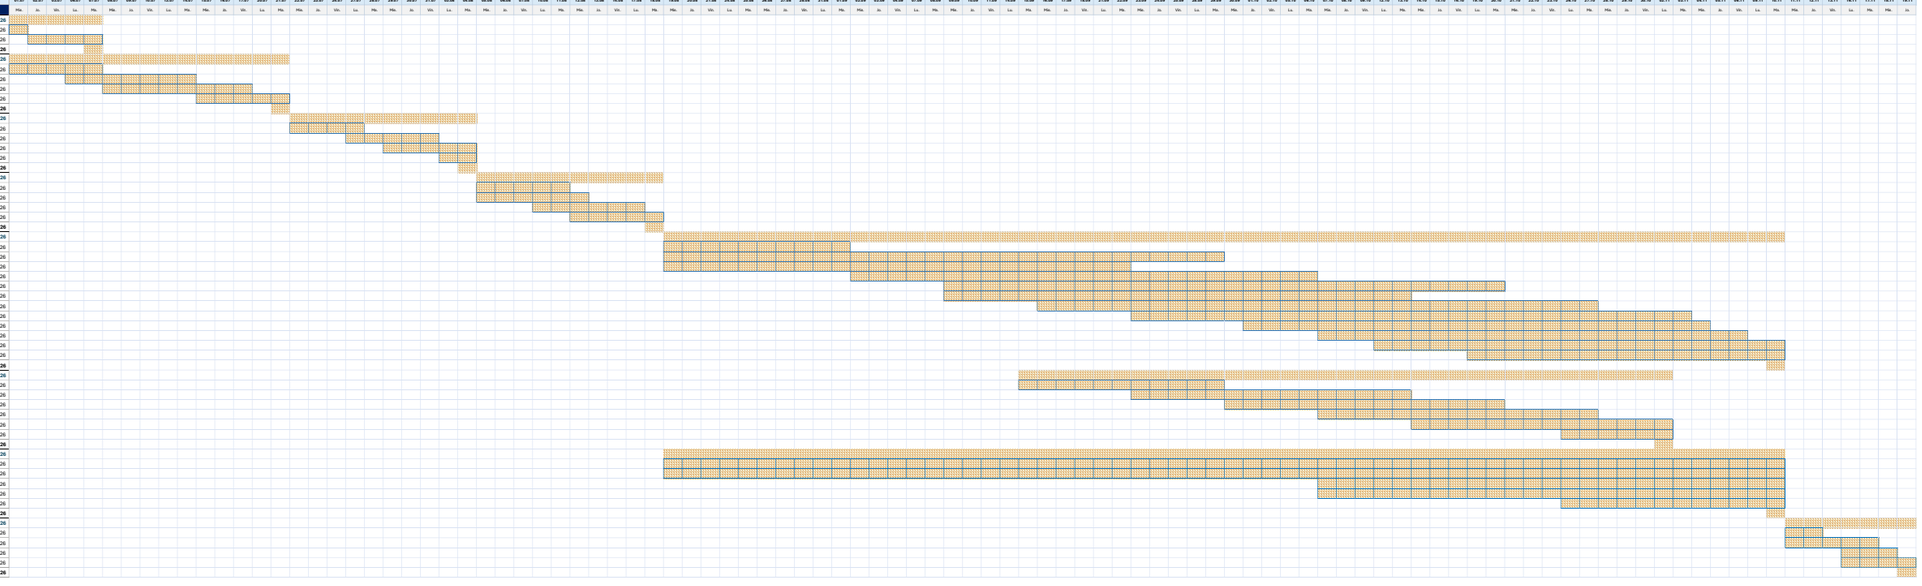

Digitally signed by Cojocari Andrei
Date: 2026.06.08 15:52:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ
