ID	Activitati si subactivitati	Durata [zile]	Start	Final
1	IMPLEMENTAREA PROIECTULUI	109 days	Mon 01.08.22	Thu 29.12.22
2	**1.ORGANIZAREA ȘANTIERULUI**	**10 days**	**Mon 01.08.22**	**Fri 12.08.22**
3	**1.1. Analiza proiectului**	5 days	Mon 01.08.22	Fri 05.08.22
4	**1.2. Analiza documentației aferente proiectului**	5 days	Mon 01.08.22	Fri 05.08.22
5	**1.3. Documentarea pe teren**	5 days	Mon 08.08.22	Fri 12.08.22
6				
7	**2. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE MONTAJ**	**80 days**	**Mon 15.08.22**	**Fri 02.12.22**
8	**2.1. Lucrări de excavare**	30 days	Mon 15.08.22	Fri 23.09.22
9	**2.2. Pregătirea tranșeului**	30 days	Mon 22.08.22	Fri 30.09.22
10	**2.3. Montarea conductelor**	30 days	Mon 29.08.22	Fri 07.10.22
11	**2.4. Compactarea tranșeului**	30 days	Mon 05.09.22	Fri 14.10.22
12	**2.5. Montarea căminelor de vizitare**	35 days	Mon 29.08.22	Fri 14.10.22
13	**2.7. Montarea armărurilor la conductele sub presiune**	20 days	Mon 03.10.22	Fri 28.10.22
14	**2.8. Verificarea conductelor la presiune și etanțietate**	10 days	Mon 31.10.22	Fri 11.11.22
15	**2.9. Spălarea conductelor**	35 days	Mon 10.10.22	Fri 25.11.22
16	**2.10. Construcția SPAU 1. Str. Alexandru Vodă**	15 days	Mon 26.09.22	Fri 14.10.22
17	**2.11. Construcția SPAU 2. Str. Băcioi**	15 days	Mon 10.10.22	Fri 28.10.22
18	**2.12. Construcția SPAU 2. Str. Puhoi**	15 days	Mon 24.10.22	Fri 11.11.22
19	**2.13. Construcția liniilor aeriene pe str. Puhoi și Alexandru Negru Vodă**	20 days	Mon 31.10.22	Fri 25.11.22
20	**2.14. Construcția stațiilor de transformare electrică pe str. Puhoi și Alexandru Negru Vodă**	20 days	Mon 31.10.22	Fri 25.11.22
21	**2.15. Lucrări de restabilire și reamenajare a drumurilor**	45 days	Mon 03.10.22	Fri 02.12.22
22				
23	**3. PREGĂTIREA PENTRU RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**	**19 days**	**Mon 05.12.22**	**Thu 29.12.22**
24	**3.1. Pregătirea șantierului**	10 days	Mon 05.12.22	Fri 16.12.22
25	**3.2. Pregătirea documentelor**	10 days	Mon 12.12.22	Fri 23.12.22
26	**3.3. Formarea comisiei la terminarea lucrărilor**	1 day	Fri 23.12.22	Fri 23.12.22
27	**3.4. Obținerea avizelor**	18 days	Mon 05.12.22	Wed 28.12.22
28	**3.5. Organizarea recepției la terminarea lucrărilor**	1 day	Thu 29.12.22	Thu 29.12.22

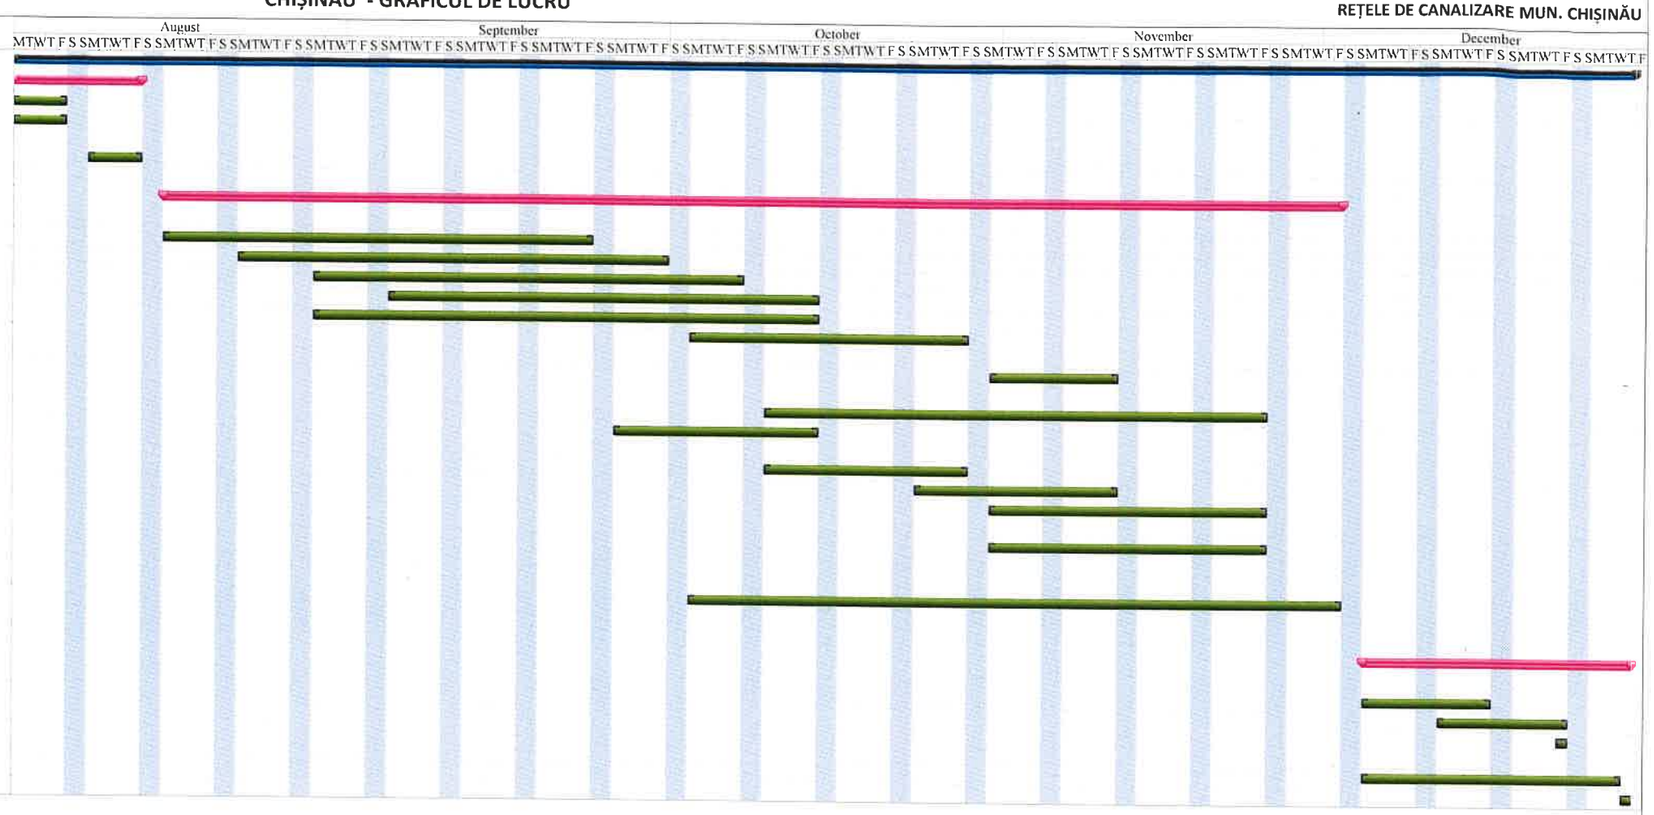

Digitally signed by Vîrlan Mariana
Date: 2022.03.08 20:15:35 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

V. Vîrlan

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress	
