ID	Activitati si subactivitati	Durata [zile]	Start	Final
1	**1: ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE**	**90 days**	**Mon 16.05.22**	**Fri 16.09.22**
2	**1.1. Analiza documentelor**	5 days	Mon 16.05.22	Fri 20.05.22
3	**1.2. Colectarea informațiilor**	15 days	Mon 16.05.22	Fri 03.06.22
4	**1.3. Documentarea pe teren**	15 days	Thu 19.05.22	Wed 08.06.22
5	**1.4. Efectuarea/Prezentarea versiunii preliminare a studiului de fezabilitate (draft 1)**	35 days	Mon 30.05.22	Fri 15.07.22
6	**1.5. Efectuarea modificărilor și solicitărilor apărute la draft 1**	30 days	Mon 18.07.22	Fri 26.08.22
7	**1.6.Prezentarea versiunii preliminare a studiului de fezabilitate (draft 2)**	1 day	Mon 29.08.22	Mon 29.08.22
8	**1.7. Efectuarea modificărilor și solicitărilor apărute la draft 2**	13 days	Tue 30.08.22	Thu 15.09.22
9	**1.8. Prezentarea versiunii finale a studiului de fezabilitate**	1 day	Fri 16.09.22	Fri 16.09.22
10	**2.1: PROIECT TEHNIC PRELIMINAR**	**67 days**	**Mon 16.05.22**	**Tue 16.08.22**
11	**2.1.1. Prezentarea cadrului general al infrastructurii propuse (prezentarea traseului preliminar)**	2 days	Mon 06.06.22	Tue 07.06.22
12	**2.1.2. Demararea/efectuarea măsurătorilor topo-geodezice**	25 days	Wed 08.06.22	Tue 12.07.22
13	**2.1.3. Demararea/efectuarea prospecțiunilor hidro-geologice**	25 days	Wed 08.06.22	Tue 12.07.22
14	**2.1.4. Configurarea de ansamblu a componentelor principale ale investiției**	30 days	Mon 20.06.22	Fri 29.07.22
15	**2.1.5. Descrierea tehnică a întregului sistem propus cu detalierea componentelor și subcomponentelor acestuia**	7 days	Wed 13.07.22	Thu 21.07.22
16	**2.1.6. Detalierea prin intermediul planurilor și diagramelor a soluțiilor tehnice propuse**	10 days	Wed 13.07.22	Tue 26.07.22
17	**2.1.7. Diagrame P&ID pentru fiecare componentă și pentru întregul sistem**	12 days	Wed 13.07.22	Thu 28.07.22
18	**2.1.8. Parametrii de proiectare și ipotezele de calcul**	15 days	Mon 04.07.22	Fri 22.07.22
19	**2.1.9. Scheme tehnologice ale componentelor sistemelor**	8 days	Wed 20.07.22	Fri 29.07.22
20	**2.1.10. Diagrame C&D**	10 days	Fri 22.07.22	Thu 04.08.22
21	**2.1.11. Trasarea rețelelor de canalizare pe planul topografic, scara 1:500**	20 days	Tue 12.07.22	Mon 08.08.22
22	**2.1.12. Calcule hidraulice pentru întreg sistemul**	20 days	Tue 12.07.22	Mon 08.08.22
23	**2.1.13. Dimensionarea stațiilor de pompare a apelor uzate**	10 days	Fri 22.07.22	Thu 04.08.22
24	**2.1.14. Stabilirea punctelor de racordare pentru energia electrică**	2 days	Mon 01.08.22	Tue 02.08.22
25	**2.1.15. Estimări de costuri**	10 days	Tue 02.08.22	Mon 15.08.22
26	**2.1.16. Raport explicativ succint asupra proiectului preliminar**	1 day	Tue 16.08.22	Tue 16.08.22
27	**PERIOADA DE AVIZARE A PROIECTULUI TEHNIC PRELIMINAR**	**10 days**	**Wed 17.08.22**	**Tue 30.08.22**
28	**Notificare scrisă privind obiecțiile depistate**	5 days	Wed 17.08.22	Tue 23.08.22
29	**Efectuarea / corectarea obiecțiilor apărurte**	4 days	Wed 24.08.22	Mon 29.08.22
30	**Notificare srisă privind lipsa obiecțiilor / aprobarea proiectului preliminar**	1 day	Tue 30.08.22	Tue 30.08.22
31	**2.2. PROIECT DE EXECUȚIE DETALIAT ȘI VERIFICAT**	**66 days**	**Thu 01.09.22**	**Thu 01.12.22**
32	**2.2.1. Raport final**	1 day	Thu 01.12.22	Thu 01.12.22
33	**2.2.2. Desene tehnice de execuție**	25 days	Thu 01.09.22	Wed 05.10.22
34	**2.2.3. Specificații tehnice**	25 days	Thu 01.09.22	Wed 05.10.22
35	**2.2.4. Standarde care trebuiesc respectate**	25 days	Thu 01.09.22	Wed 05.10.22
36	**2.2.5. Hărți și planuri gata pentru execuție**	35 days	Thu 01.09.22	Wed 19.10.22
37	**2.2.6. Planuri de situație la scara 1:500**	35 days	Thu 01.09.22	Wed 19.10.22
38	**2.2.7. Profile longitudinale pentru toate conductele proiectate**	25 days	Sat 24.09.22	Thu 27.10.22
39	**2.2.8. Desene detaliate**	15 days	Thu 20.10.22	Wed 09.11.22
40	**2.2.9. Calcule de dimensionare hidraulică pentru stațiile de pompare**	15 days	Thu 20.10.22	Wed 09.11.22
41	**2.2.10. Calcule de dimensionare statică**	10 days	Tue 25.10.22	Mon 07.11.22
42	**2.2.11. Diagrame P&ID pentru fiecare componentă și pentru întregul sistem**	25 days	Thu 06.10.22	Wed 09.11.22
43	**2.2.12. Lista echipamentelor și instrumentației propuse prin proiect**	15 days	Thu 20.10.22	Wed 09.11.22
44	**2.2.13. Calculul detaliat al costurilo**	27 days	Thu 06.10.22	Fri 11.11.22
45	**2.2.14. Documente de licitație inclusiv devizele de cheltuieli**	27 days	Tue 25.10.22	Wed 30.11.22
46	**2.2.15. Caiet de sarcini cu parametrii tehnici generali**	27 days	Tue 25.10.22	Wed 30.11.22
47	**2.2.16. Manualul de exploatare și întreținere**	8 days	Mon 21.11.22	Wed 30.11.22
48	**2.2.17. Precizări privind protecția mediului**	12 days	Tue 15.11.22	Wed 30.11.22
49	**2.1.18. Verificarea proiectului**	13 days	Mon 14.11.22	Wed 30.11.22

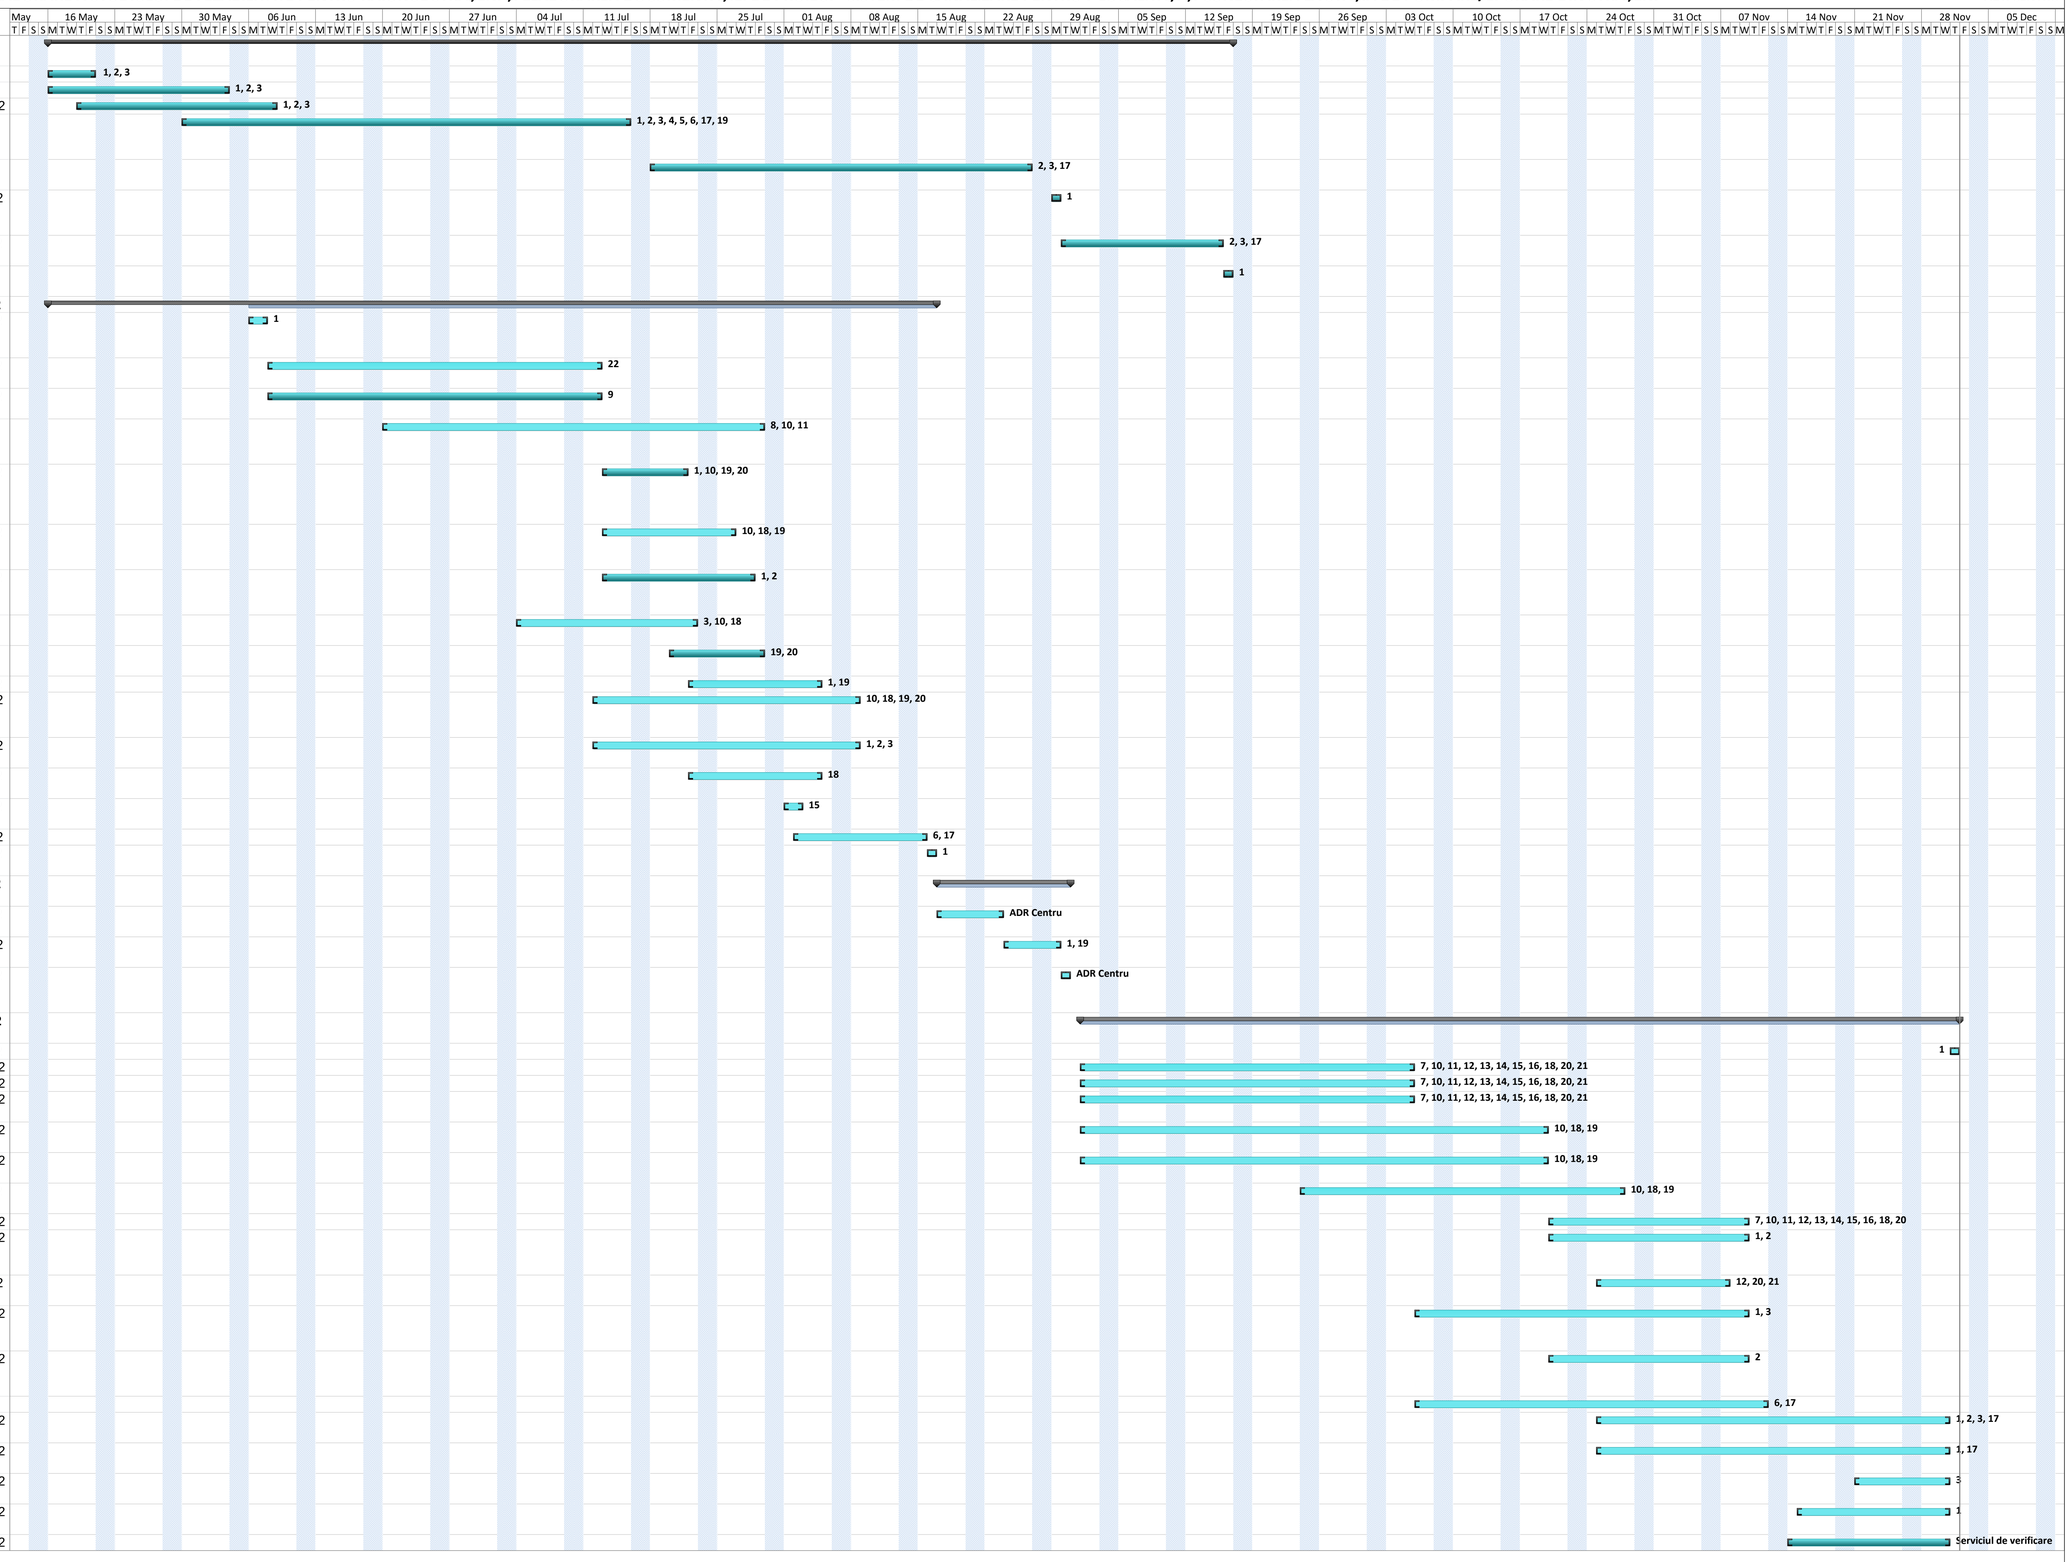

Digitally signed by Vîrlan Mariana
Date: 2022.04.25 15:58:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | Deadline | Progress
